تطوير المناطق التقنية - الدمام

Development of the Technology City in Dammam

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة أنساب للمقاولات العامة	إيجيس (EGIS)	م. Afat Elanzey	23-ديسمبر-2025	22-فبراير-2027

النطاق: الطرق التجميعية والمحلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والمياه المعالجة والجهد المتوسط وإنارة الشوارع والاتصالات، ومحطة ضخ الصرف الصحي، وبحيرات تصريف السيول، والسور وغرفة الحارس، ومباني المرافق، في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. يذكر التقرير الأسبوعي (WPR-39) إنجازاً فعلياً 37.09% مقابل 68.43% مخطط في الخطة الأساسية الأصلية و54.12% في الخطة المعدلة. ومقارنة بتقرير الأسبوع الماضي (32.47%) تقدّم المشروع 4.62% هذا الأسبوع.

نسبة الإنجاز الفعلي
37.09% / 68.43%
مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.54 متأخر بنسبة 31.34% · الخطة المعدلة 54.12%، مؤشر الأداء 0.69

التقدم هذا الأسبوع
+4.62% / 3.89%
مخطط
▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.73%

المدة المنقضية من العقد
73.9% · اليوم 315 من 426
▼ الانتهاء المتوقع 15-يونيو-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
11.2% · 7.6 مليون ريال
آخر فترة مستخلص تنتهي في 05-أكتوبر-2026

ارتفع التأخير المتوقع إلى 113 يوماً.

يتوقع التقرير الأسبوعي وتحديث P6 كلاهما الآن الانتهاء في 15-يونيو-2027، أي بعد أسبوع من توقع الأسبوع الماضي، مقابل التاريخ التعاقدي 22-فبراير-2027؛ ولَعلم الانتهاء فائض زمني سالب قدره 86 يوماً في P6. بدأت الشبكات تتحرك: مُدّت لأول مرة مواسير الصرف الصحي وتصريف السيول ومياه الشرب (331 م و500 م و390 م). وللانتهاء في 22-فبراير-2027 يجب إنجاز النسبة المتبقية 62.91% خلال 15 أسبوعاً، أي نحو 4.19% أسبوعياً.

صور الموقع هذا الأسبوع

الصور الأربع المضافة في ملفات التقرير WPR-39. لا تحمل الصور ختم تاريخ أو GPS. اضغط على أي صورة لعرضها مكبّرة، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



حلقة خرسانية دائرية
حلقة خرسانية مصبوبة حول كومة رملية في الوسط.



الحلقة الخرسانية الدائرية، منظر ثانٍ
الحلقة من الجهة المقابلة بعد فك الشدات.



تمديد المواسير في الخندق

ماسورة كبيرة القطر ممدودة في خندق مفتوح عميق.




صب بلاطة الأساس

ضخ الخرسانة على البلاطة المسلحة التي ظهرت الأسبوع الماضي.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data في التقرير WPR-39.

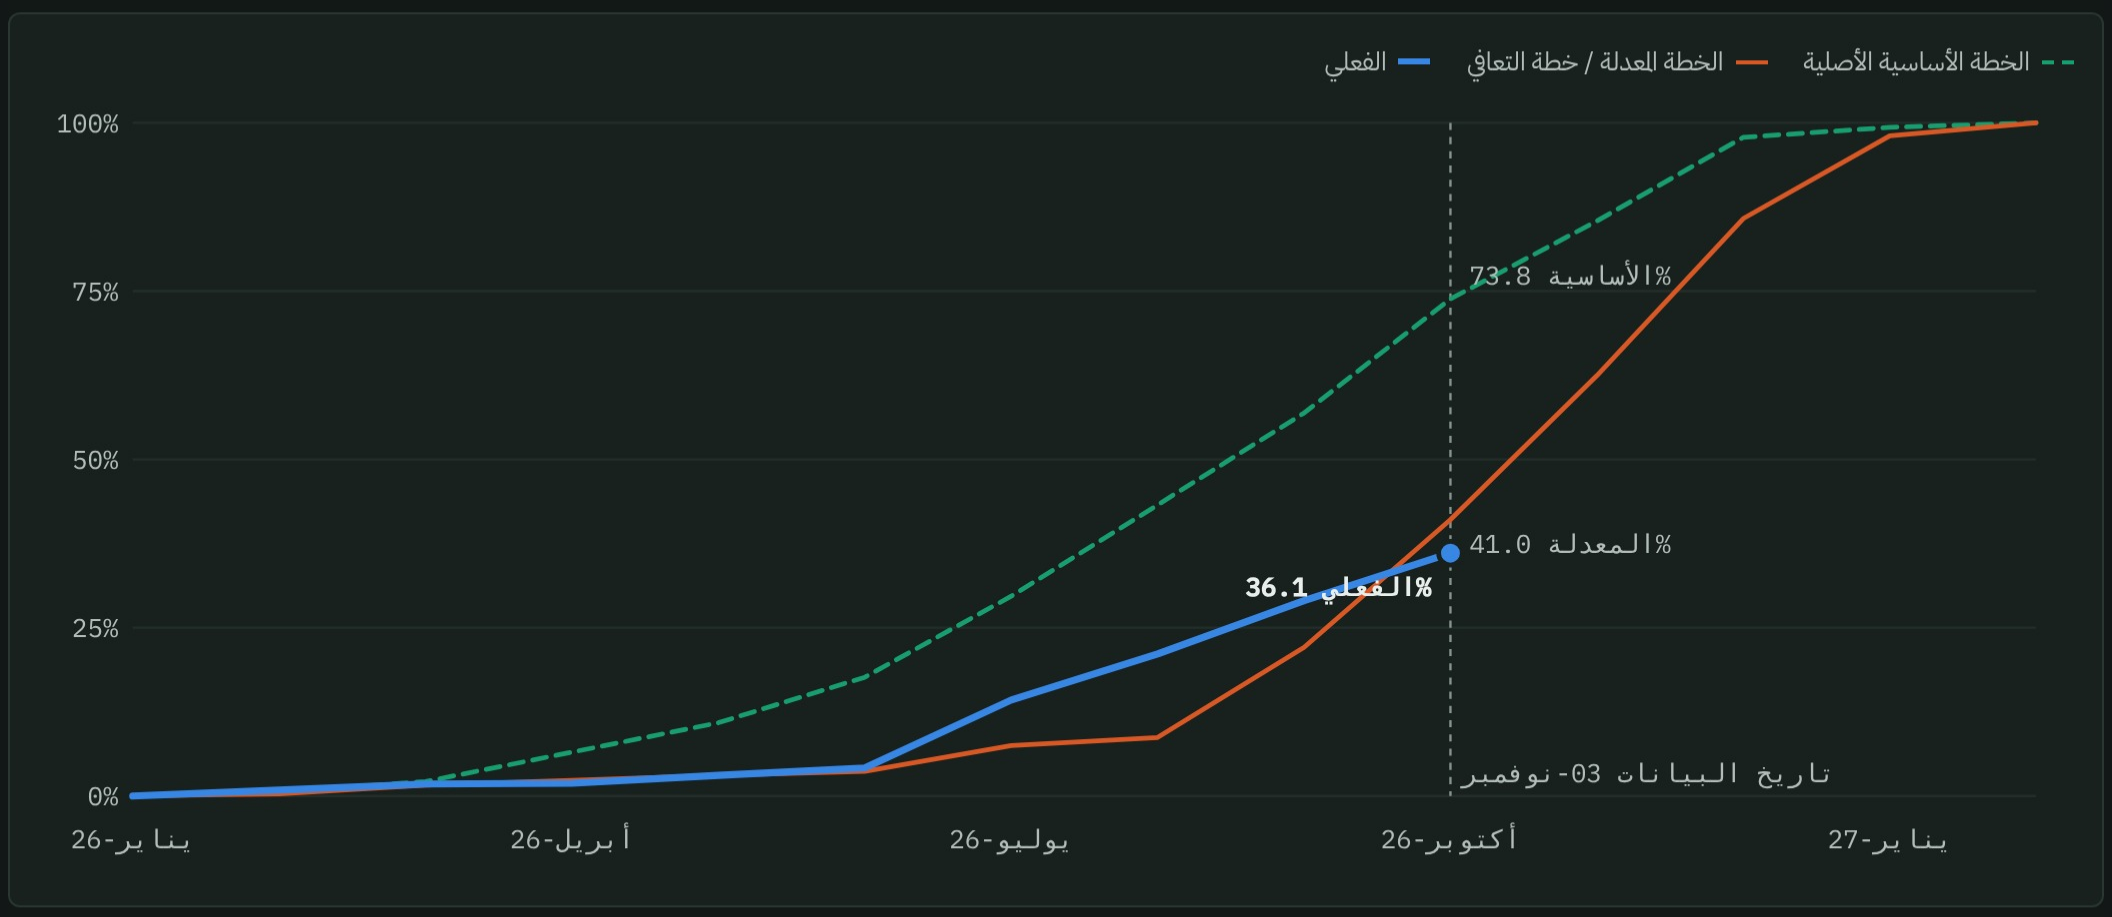

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
29-أكتوبر-2026	68.43	32.47	−35.96%	—	0.47
03-نوفمبر-2026	**68.43**	**37.09**	**−31.34%**	**+4.62%**	**0.54**

يستخدم الجدول الورقة الرئيسية في التقريرين WPR-38 وWPR-39؛ ولم تُرفع الأسابيع السابقة. الخطة المعدلة: 50.23% الأسبوع الماضي و54.12% هذا الأسبوع. تستخدم ورقة المنحنى كامل ميزانية P6 البالغة 151,920 ساعة عمل، لذا فإن آخر قيمة فعلية فيها 36.08%، مرسومة عند أكتوبر. أما الرقم الأسبوعي في الورقة الرئيسية نفسها فهو 2.93% مقابل 3.35% مخطط؛ انظر ملاحظات على البيانات.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المخطط هو الخطة المعدلة (P6) حتى تاريخه. المصدر: مستخرج P6 في ورقة Progress في التقرير WPR-39.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التصميم الهندسي	3.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	20.0%	88.9%	63.3%	−25.5%	0.71	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	2.7%	86.8%	17.1%	−69.8%	0.20	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	6.4%	64.6%	25.6%	−39.0%	0.40	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	3.1%	64.7%	11.4%	−53.3%	0.18	▼ متأخر
شبكة الري	2.3%	17.7%	0.0%	−17.7%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة المياه المعالجة	1.2%	15.7%	0.0%	−15.7%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الجهد المتوسط	0.6%	1.7%	0.0%	−1.7%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الاتصالات	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
شبكة إنارة الشوارع	2.2%	0.5%	0.0%	−0.5%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الطرق	4.8%	66.7%	65.3%	−1.4%	0.98	▼ متأخر قليلاً
السور وغرفة الحارس	30.2%	56.7%	38.2%	−18.5%	0.67	▼ متأخر
مباني المرافق	11.7%	20.8%	28.0%	+7.2%	1.35	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**52.7%**	**36.1%**	**−16.6%**	**0.69**	▼ متأخر

الأوزان هي حصة كل مرحلة من 18,990 يوم عمل مخطط في P6. يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) عدد 873 نشاطاً: 344 مكتملاً و71 قيد التنفيذ و458 لم تبدأ. ارتفع عدد الأنشطة المتأخرة عن موعد بدئها من 77 إلى 84 هذا الأسبوع.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود التي سُجّل لها تقدم. أطوال مواسير الشبكات من ورقة Conclusion في التقرير WPR-39، وبقية البنود من ورقة Major Quantities. و"المنفذ هذا الأسبوع" هو الفرق عن التقرير WPR-38.

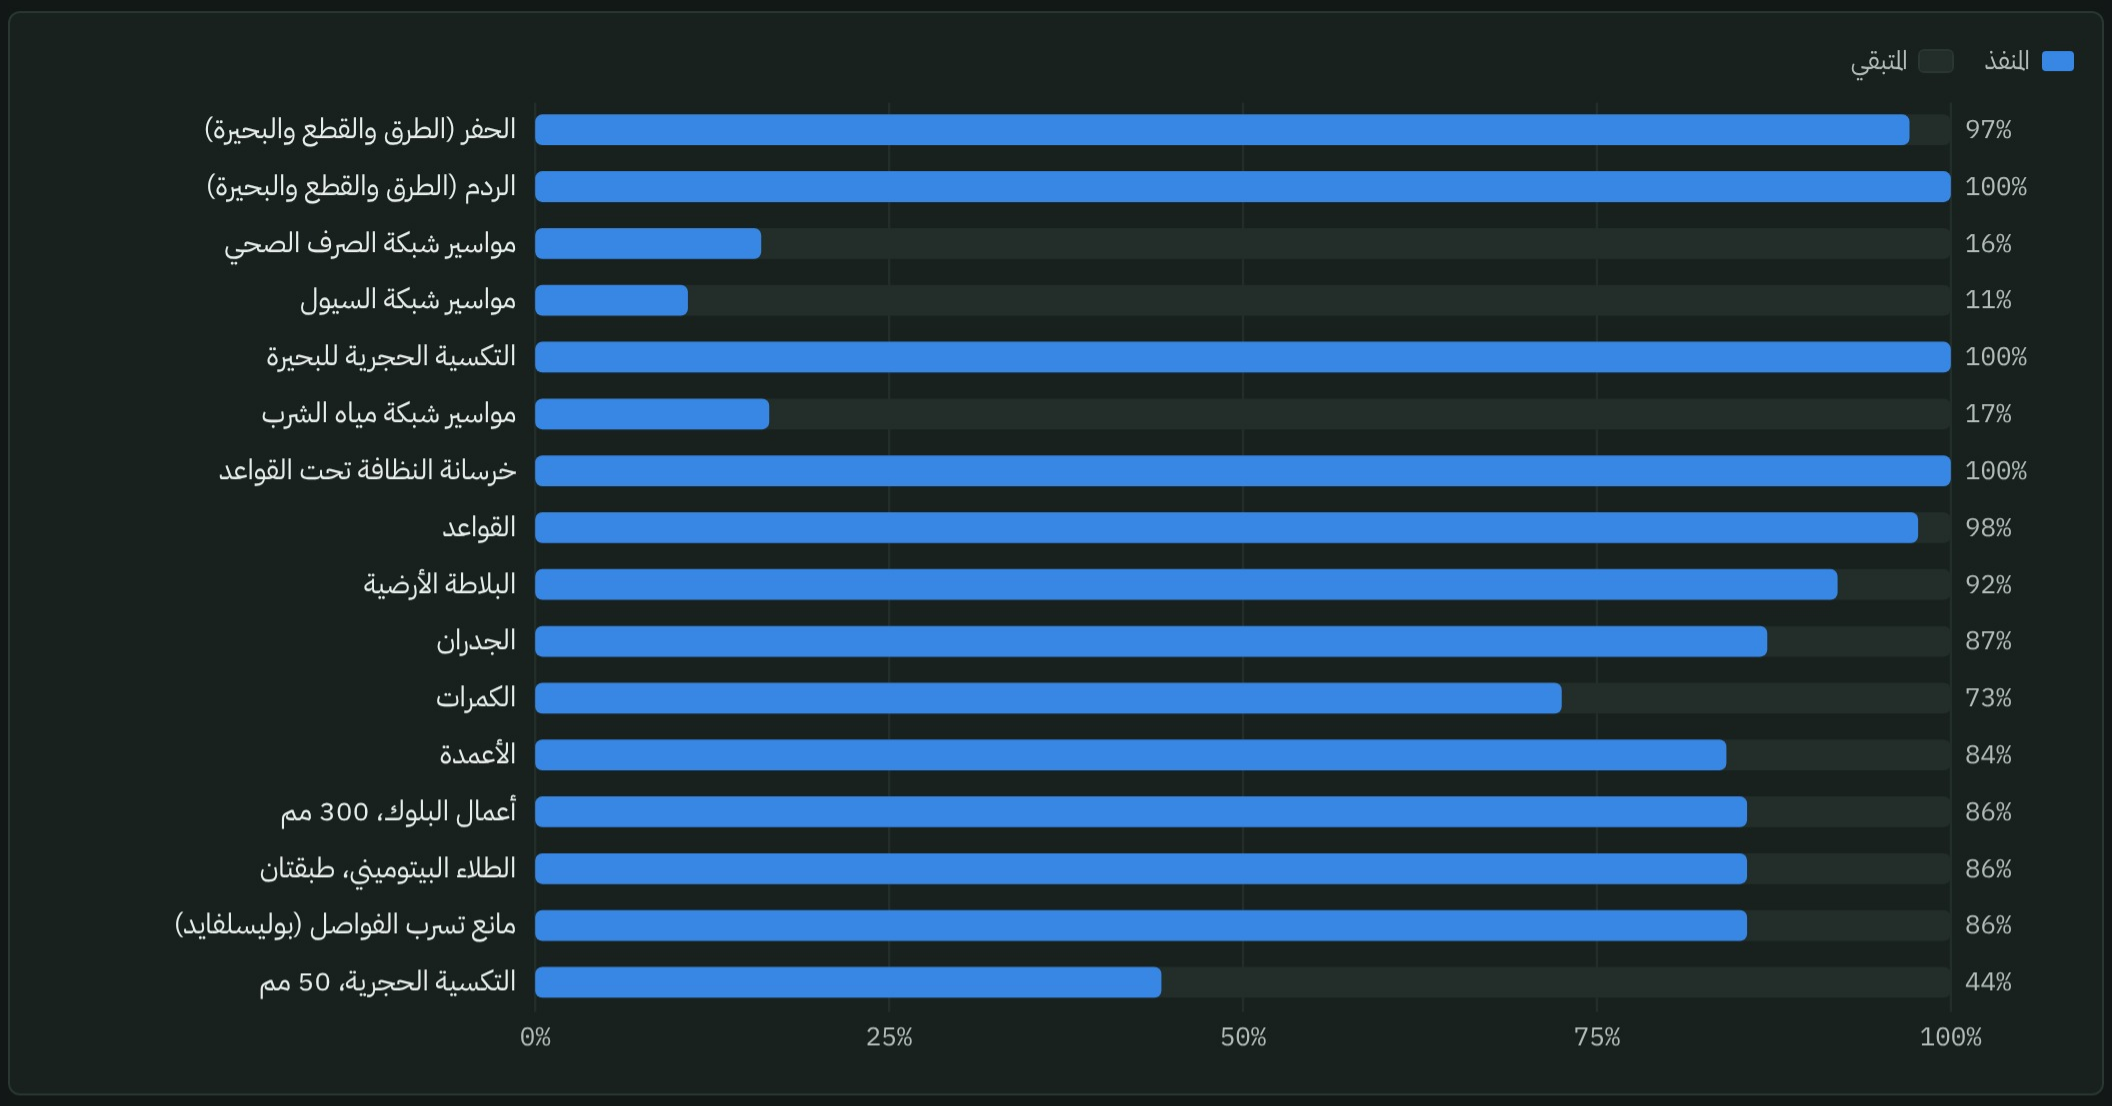

بند النطاق	الشبكة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر (الطرق والقطع والبحيرة)	الطرق	م³	502,417	487,746	41,861+	14,671	97.1%	–
الردم (الطرق والقطع والبحيرة)	الطرق	م³	314,650	314,650	39,772+	0	100.0%	–
مواسير شبكة الصرف الصحي	الصرف الصحي	م.ط	2,073	331	331+	1,742	16.0%	–
مواسير شبكة السيول	تصريف السيول	م.ط	4,635	500	500+	4,135	10.8%	–
التكسية الحجرية للبحيرة	تصريف السيول	م²	3,720	3,720	0	0	100.0%	–
مواسير شبكة مياه الشرب	مياه الشرب	م.ط	2,359	390	390+	1,969	16.5%	–
خرسانة النظافة تحت القواعد	السور وغرفة الحارس	م³	1,500	1,500	138.2+	0	100.0%	–
القواعد	السور وغرفة الحارس	م³	7,310	7,141	325+	169	97.7%	–
البلاطة الأرضية	السور وغرفة الحارس	م³	20	18.4	18.4+	1.6	92.0%	–
الجدران	السور وغرفة الحارس	م³	1,960	1,706	562.1+	254.2	87.0%	–
الكمرات	السور وغرفة الحارس	م³	288	208.8	88.5+	79.2	72.5%	–
الأعمدة	السور وغرفة الحارس	م³	372	313	126.1+	59	84.1%	–
أعمال البلوك، 300 مم	السور وغرفة الحارس	م²	8,775	7,512	2,247+	1,263	85.6%	–
الطلاء البيتوميني، طبقتان	السور وغرفة الحارس	م²	39,170	33,532	10,030+	5,638	85.6%	–
مانع تسرب الفواصل (بوليسلفايد)	السور وغرفة الحارس	م.ط	415	355.3	106.3+	59.7	85.6%	–
التكسية الحجرية، 50 مم	السور وغرفة الحارس	م²	14,317	6,333	6,333+	7,984	44.2%	–

أول تمديد للمواسير في ثلاث شبكات

تظهر لأول مرة مواسير الصرف الصحي (331 م، 16.0%) وتصريف السيول (500 م، 10.8%) ومياه الشرب (390 م، 16.5%). وما زالت شبكات الري والمياه المعالجة والاتصالات والجهد المتوسط وإنارة الشوارع عند الصفر.

الأعمال الترابية والسور قاربت على الاكتمال

اكتمل الردم وبلغ الحفر 97.1%. واكتملت خرسانة النظافة، وبلغت القواعد 97.7% وجدران السور 87.0%؛ وبدأت التكسية الحجرية للسور (44.2%).

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتوقع من التقرير الأسبوعي؛ وتواريخ التوقع والفائض الزمني من تحديث P6 (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026). الأيام بين القوسين هي التأخير عن الخطة الأساسية.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	23-ديسمبر-2025	23-ديسمبر-2025	23-ديسمبر-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
خطة التنفيذ والبرنامج الزمني الأساسي	17-مارس-2026	17-مارس-2026	18-يناير-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد المخططات التنفيذية والمواد	13-أبريل-2026	13-أبريل-2026	21-أغسطس-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
التجهيز وإعداد الموقع	19-مايو-2026	19-مايو-2026	18-يناير-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
شبكة تصريف السيول	06-يناير-2027	21-أبريل-2027 (+105 يوماً)	05-أبريل-2027	−66.5	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	06-يناير-2027	04-مارس-2027 (+57 يوماً)	04-مارس-2027	−33.9	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	07-مارس-2027	02-مايو-2027 (+56 يوماً)	02-مايو-2027	−78.5	▼ متأخر
شبكة إنارة الشوارع	18-مارس-2027	06-مايو-2027 (+49 يوماً)	06-مايو-2027	−70	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	18-مارس-2027	10-مايو-2027 (+53 يوماً)	10-مايو-2027	−86	▼ متأخر
أعمال الطرق	18-مارس-2027	30-مايو-2027 (+73 يوماً)	30-مايو-2027	−71.5	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	22-مارس-2027	27-أبريل-2027 (+36 يوماً)	27-أبريل-2027	−55.8	▼ متأخر
شبكة الري	22-مارس-2027	11-أبريل-2027 (+20 يوماً)	11-أبريل-2027	−42	▼ متأخر
شبكة المياه المعالجة	22-مارس-2027	25-أبريل-2027 (+34 يوماً)	25-أبريل-2027	−53.5	▼ متأخر
انتهاء المشروع	22-فبراير-2027	15-يونيو-2027 (+113 يوماً)	15-يونيو-2027	−86	▼ متأخر

يتفق التقرير الأسبوعي وP6 الآن على كل المعالم عدا شبكة تصريف السيول.

يتوقع التقرير الأسبوعي انتهاء شبكة تصريف السيول في 21-أبريل-2027، أي بعد 16 يوماً من P6 (05-أبريل-2027). وتقدّم موعد الصرف الصحي من 01-مايو-2027 إلى 04-مارس-2027، بينما تأخرت مواعيد الجهد المتوسط وإنارة الشوارع والاتصالات وانتهاء المشروع. ولشبكة الاتصالات وانتهاء المشروع أكبر فائض سالب (86 يوماً).

التوريدات للمواد الرئيسية

نسبة ما وزّد إلى الموقع من الكمية الإجمالية. المصدر: سجل متابعة التوريدات المحدّث في 03-نوفمبر-2026، ورقة ملخص البنود.



مواد الكهرباء والاتصالات والري: 0% موزّد


ما زالت أوامر الشراء لتمديدات الجهد المتوسط ولتمديدات ومناهل الاتصالات غير صادرة؛ وسيقدم المقاول طلب استيضاح (RFI) للجهد المتوسط، ويربط أوامر الاتصالات بصرف المستخلص. وما زال كل بند متابع متأخراً عن تاريخ التوريد في الخطة الأساسية بما بين يوم و217 يوماً.

تقدّم توريد مواد السيول والمياه المعالجة ومياه الشرب

بلغت مواسير الخط الرئيسي للسيول 95.8% (4,772 من 4,982 م) واكتملت مناهل السيول؛ ومواسير المياه المعالجة 86.1%، ومحابس مياه الشرب 93.5% واكتملت صناديق المحابس؛ وارتفعت غرف تجميع السيول من 12 إلى 60 من 195. وما زالت خرسانة السور 8,300 من 12,500 م³.

القوى العاملة

عدد العمالة اليدوية في الموقع هذا الأسبوع حسب المهنة، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower في التقرير WPR-39.

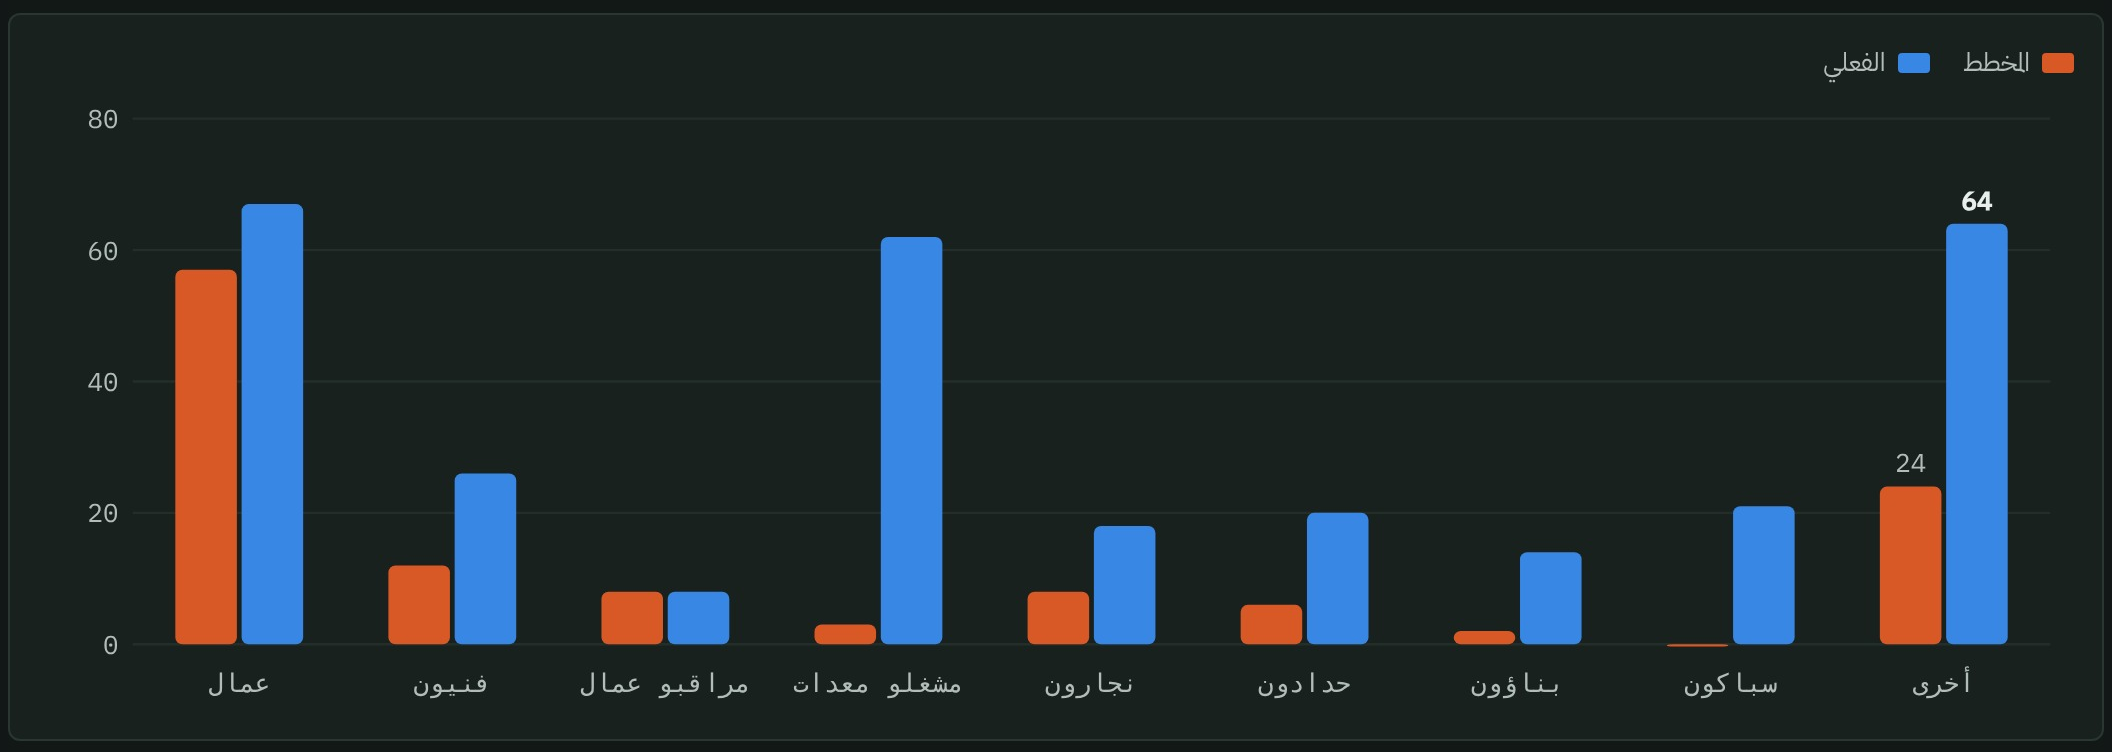

300 عامل يدوي مقابل 120 مخطط (260 الأسبوع الماضي)، إضافة إلى 19 من الجهاز الإداري والفني مقابل 9 مخطط: الإجمالي 319 مقابل 129. المعدات في الموقع: 175 مقابل 117 مخطط (145 الأسبوع الماضي)، ولا يوجد معدات متوقفة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)	**67,768,369.77**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	77,933,625.23
أوامر التغيير	0
الدفعة المقدمة (10%)	6,776,836.98

جميع القيم بالريال السعودي. القيمة شاملة الضريبة من ورقة Conclusion. سجل أوامر التغيير فارغ.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة (سجل المستخلصات / الورقة الرئيسية)	3 / 2
القيمة الإجمالية المقدمة	7,617,509.90
المعتمد من مدير المشروع - مدن	7,617,509.90
المدفوع (سجل المستخلصات / الورقة الرئيسية)	3,596,613.90 / 0
المحتجزات	0
الخصومات والغرامات	0

لا تغيير عن الأسبوع الماضي. تبلغ المستخلصات 11.2% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 37.09%. وما زالت الورقة الرئيسية وسجل المستخلصات مختلفين في عدد المستخلصات وفي المدفوعات.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.82

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	222,884
ساعات العمل هذا الأسبوع	18,000
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	1
اجتماعات التوعية (عدد الجلسات / الحضور)	169 / 2,554

الجودة التقييم 0.90

طلبات الفحص الميداني: صادرة / مغلقة / معلقة	477 / 390 / 87
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	15 / 8 / 7
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / مفتوحة	16 / 15 / 1
تعليمات الموقع	0
طرق التنفيذ المعتمدة	8 من 20

تفتيش مراقبة الجودة 03-نوفمبر-2026. صدر 83 طلب فحص ميداني هذا الأسبوع.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
نزاع على ملكية الأرض	مدن	نزاع مع أحد المواطنين على ملكية أرض المشروع. مفتوح منذ 01-يناير-2026؛ وأفادت الشرطة بأن النزاع خارج اختصاصها، وقد مضى التاريخ المستهدف 20-أبريل-2026.
تأخر أوامر الشراء	المقاول	ما زالت أوامر شراء معلقة (مفتوحة منذ 10-أبريل-2026)، منها تمديدات الجهد المتوسط ووصلاتها ومواد الاتصالات.
تأخر بدء أعمال الشبكات	المقاول	الخطر 07، الدرجة 20. بدأت الشبكات متأخرة وتتقدم ببطء بينما تتركز الموارد في السور؛ ولأنشطة الشبكات فائض زمني سالب بين 75 و84 يوماً تقريباً.
استشاري ومقاول الجهد المتوسط	المقاول / الاستشاري	الخطر 08، الدرجة 16. لا يمكن المضي في توريد وأعمال الجهد المتوسط قبل اعتماد الاستشاري المتخصص ومقاول الباطن للجهد المتوسط.
المياه الجوفية	المقاول	الخطر 05، الدرجة 16. تحتاج الحفريات إلى نزح مستمر للمياه.
توريد المواد	المقاول	الخطر 01، الدرجة 15. قد يؤدي تأخر توريد المواد إلى توقف الأنشطة أو تأخرها.

سجل المشكلات وسجل المخاطر دون تغيير عن الأسبوع الماضي. مخاطر أخرى قائمة: تأخر صرف الدفعة المقدمة والمستخلصات، وتأخر الاختبارات أو إخفاقها، وجاهزية البنية التحتية القائمة للربط.

ملاحظات على البيانات

- تاريخ البيانات: التقرير WPR-39 وتحديث P6 وسجل التوريدات والجدول الاستباقي كلها بتاريخ 03-نوفمبر-2026 (يوم ثلاثاء)، بعد خمسة أيام من تاريخ الأسبوع الماضي 29-أكتوبر-2026. وتُظهر ورقة Milestones الآن "Contract Weeks 0 of 0"، لذا حُسب رقم الأسبوع من (03-نوفمبر-2026 – 23-ديسمبر-2025) = 315 يوماً ÷ 7، أي الأسبوع 45.
- إجمالي ساعات العمل: ما زالت الورقة الرئيسية وورقة Progress تُسقطان أيام عمل الصرف الصحي (516) (الإجمالي 18,474 بدلاً من 18,990 في P6). وبالميزانية الكاملة تكون نسبة الإنجاز الفعلي 36.08%، كما في ورقة Physical-Chart Data. ويستخدم ملخص التقرير النسبة المعلنة 37.09%. أما تحديث P6 نفسه فيعطي 6,711.7 يوم عمل مكتسب (35.34%) مقابل 6,852 في التقرير الأسبوعي؛ والفرق (140 يوم عمل) كله في التوريدات.
- تقدم هذا الأسبوع: ارتفع الرقم التراكمي بمقدار 853 يوم عمل (4.62%)، بينما يذكر العمود الأسبوعي في الورقة الرئيسية 542 مكتسباً مقابل 619 مخططاً (2.93% مقابل 3.35%).
- بقي رقم الخطة الأصلية دون تغيير عند 68.43% (12,641.76 يوم عمل) للأسبوع الثاني، فلا يتغير مؤشر الأداء مقابل الخطة الأساسية مع الزمن. وتبلغ الخطة الأساسية في ورقة المنحنى 73.84% بنهاية أكتوبر و85.41% بنهاية نوفمبر.
- أصبحت تواريخ "الخطة الأحدث" في ورقة Milestones أبكر من الخطة الأساسية لمعظم الشبكات (مثلاً الجهد المتوسط 11-يناير-2027 مقابل 07-مارس-2027)، ويُحسب عمود فرق الأيام بالنسبة إليها؛ أما الجدول أعلاه فيقيس التأخير مقابل الخطة الأساسية.
- تصف ورقة Conclusion التقدم المبني على التكلفة بأنه "فعلي"؛ ولم يُستخدم في هذا التقرير. وتغيّر فيها إجمالي شبكة السيول من 5,560 م إلى 4,635 م وإجمالي مياه الشرب من 2,439 م إلى 2,359 م، وبقيت الأعمال الترابية للطرق (637,536 م³) دون تغيير عن الأسبوع الماضي مقابل 802,396 م³ في ورقة Major Quantities.
- الكميات: في ورقة Major Quantities تُوزَّع كميات مواسير ومناهل الشبكات والبلوك والطلاء البيتوميني ومانع تسرب الفواصل نسبياً (كل بنود المجموعة تحمل النسبة نفسها، مثلاً 85.6% للبلوك والطلاء ومانع التسرب)، فهي ليست قيماً مقاسة. لذا أُخذت أطوال الشبكات من ورقة Conclusion.
- سجل التوريدات: انخفضت أغطية مناهل الصرف الصحي من 42 من 42 الأسبوع الماضي إلى 0 من 42؛ وتغيّر إجمالي صنبور إطفاء الحريق من 45 إلى 18؛ وعدة تواريخ توريد متوقعة في ديسمبر 2027 أو في الماضي (تمديدات الاتصالات 30-يناير-2026)؛ وبقي رقم خرسانة السور (8,300 م³) وملاحظة 30% دون تغيير. ولم تُرفق ورقة تفاصيل الكميات هذا الأسبوع.
- السلامة: ساعات العمل "هذا الشهر" (9,000) أقل من ساعات هذا الأسبوع (18,000). وما زالت ورقة تفتيش السلامة تحمل رقم المشروع DAMT-02-001.
- المستخلصات: تُظهر الورقة الرئيسية مستخلصين وصفراً مدفوعاً؛ بينما يورد سجل المستخلصات 3 مستخلصات دُفع أول اثنين منها (3,596,613.90 ريال)، ويشير إلى المشروع DAMT-02-001 ويذكر قيمة عقد معدلة 21,100,000. دون تغيير عن الأسبوع الماضي.
- قائمة "الأعمال الرئيسية هذا الأسبوع" في ورقة ملخص الصور مطابقة للأسبوع الماضي عدا سطرين.
- لا تحمل الصور ختم تاريخ أو GPS. وصورتان من الصور الأربع الجديدة تُظهران الحلقة الخرسانية نفسها من جهتين. وتعذّر فتح ملف PowerPoint المرفوع (ملف تالف)، ورُفع ملف قفل مؤقت لـ Excel (~$) بالخطأ.
