تطوير المناطق التقنية - الظهران

Development of the Technology City in Dhahran

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة أنساب للمقاولات العامة	إيجيس (EGIS)	م. عفات العنزي	06-Jan-2026	05-Mar-2027

النطاق: الطرق التجميعية والمحلية؛ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والمياه المعالجة والجهد المتوسط والإنارة والاتصالات؛ محطة رفع للصرف الصحي وبحيرات لتصريف السيول؛ السور وغرفة الحارس ومباني المرافق.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 21.1% مقابل 36.4% مخطط في الخطة الأساسية (مؤشر الأداء الزمني 0.58)، ومقابل 34.8% في خطة الاستعادة المقدمة من المقاول (مؤشر الأداء الزمني 0.61). أُنجز هذا الأسبوع 0.31%، كلها في الطرق والصرف الصحي، مقابل 2.78% مخطط في خطة الاستعادة.

نسبة الإنجاز الفعلي
21.1% / 36.4% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.58 −15.2%

التقدم هذا الأسبوع
+0.31% / +2.78% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 2.47%

المدة المنقضية من العقد
70.9% · اليوم 300 من 423
▼ انتهاء P6: 22-يوليو-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
11.3% · 10.5 مليون ريال
4 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 15-أكتوبر-2026

تحديث البرنامج الزمني ينهي المشروع الآن متأخراً أربعة أشهر ونصف.

يحدد تحديث P6 بتاريخ بيانات 02-نوفمبر-2026 انتهاء المشروع في 22-يوليو-2027، أي بعد 139 يوماً من تاريخ الانتهاء التعاقدي 05-مارس-2027، وبعد 7 أيام من تحديث الأسبوع الماضي. ولا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع الانتهاء في 05-مارس-2027 دون أي تغيير في المعلم. ويتطلب الانتهاء في الموعد إنجازاً فعلياً بنحو 4.6% أسبوعياً خلال الأسابيع السبعة عشر المتبقية، مقابل 0.31% هذا الأسبوع.

صور الموقع هذا الأسبوع


أربع صور من ملفات هذا الأسبوع: صورة مرفوعة كملف مستقل وثلاث صور مضمّنة في ملف التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026. ولا تحمل ختماً إلا صورة الطبقة التأسيسية (02-نوفمبر-2026، 15:20، حي الظهران الصناعي). اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



طبقة أساس الطريق
تنفيذ طبقة الأساس الحصوية، مع فرّادة وشاحنات تعمل في الأمام.



خندق مواسير السيول
رفع مساحي لمناسيب خندق مواسير السيول، مع المواسير المدودة والحفّارة في الخلف.

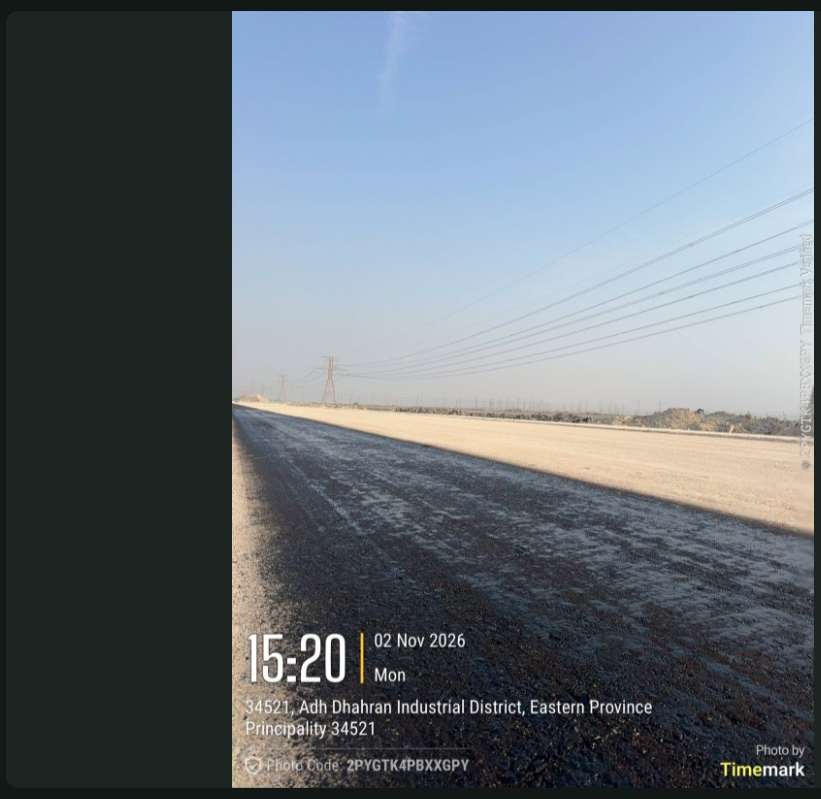

الطبقة التأسيسية (Prime Coat)

رش الطبقة التأسيسية MC1 على طبقة الأساس. مختومة 02-نوفمبر-2026، 15:20.




شدات بلاطة السقف

دعامات وشدات خشبية لبلاطة سقف مبنى بين الأعمدة الخرسانية.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

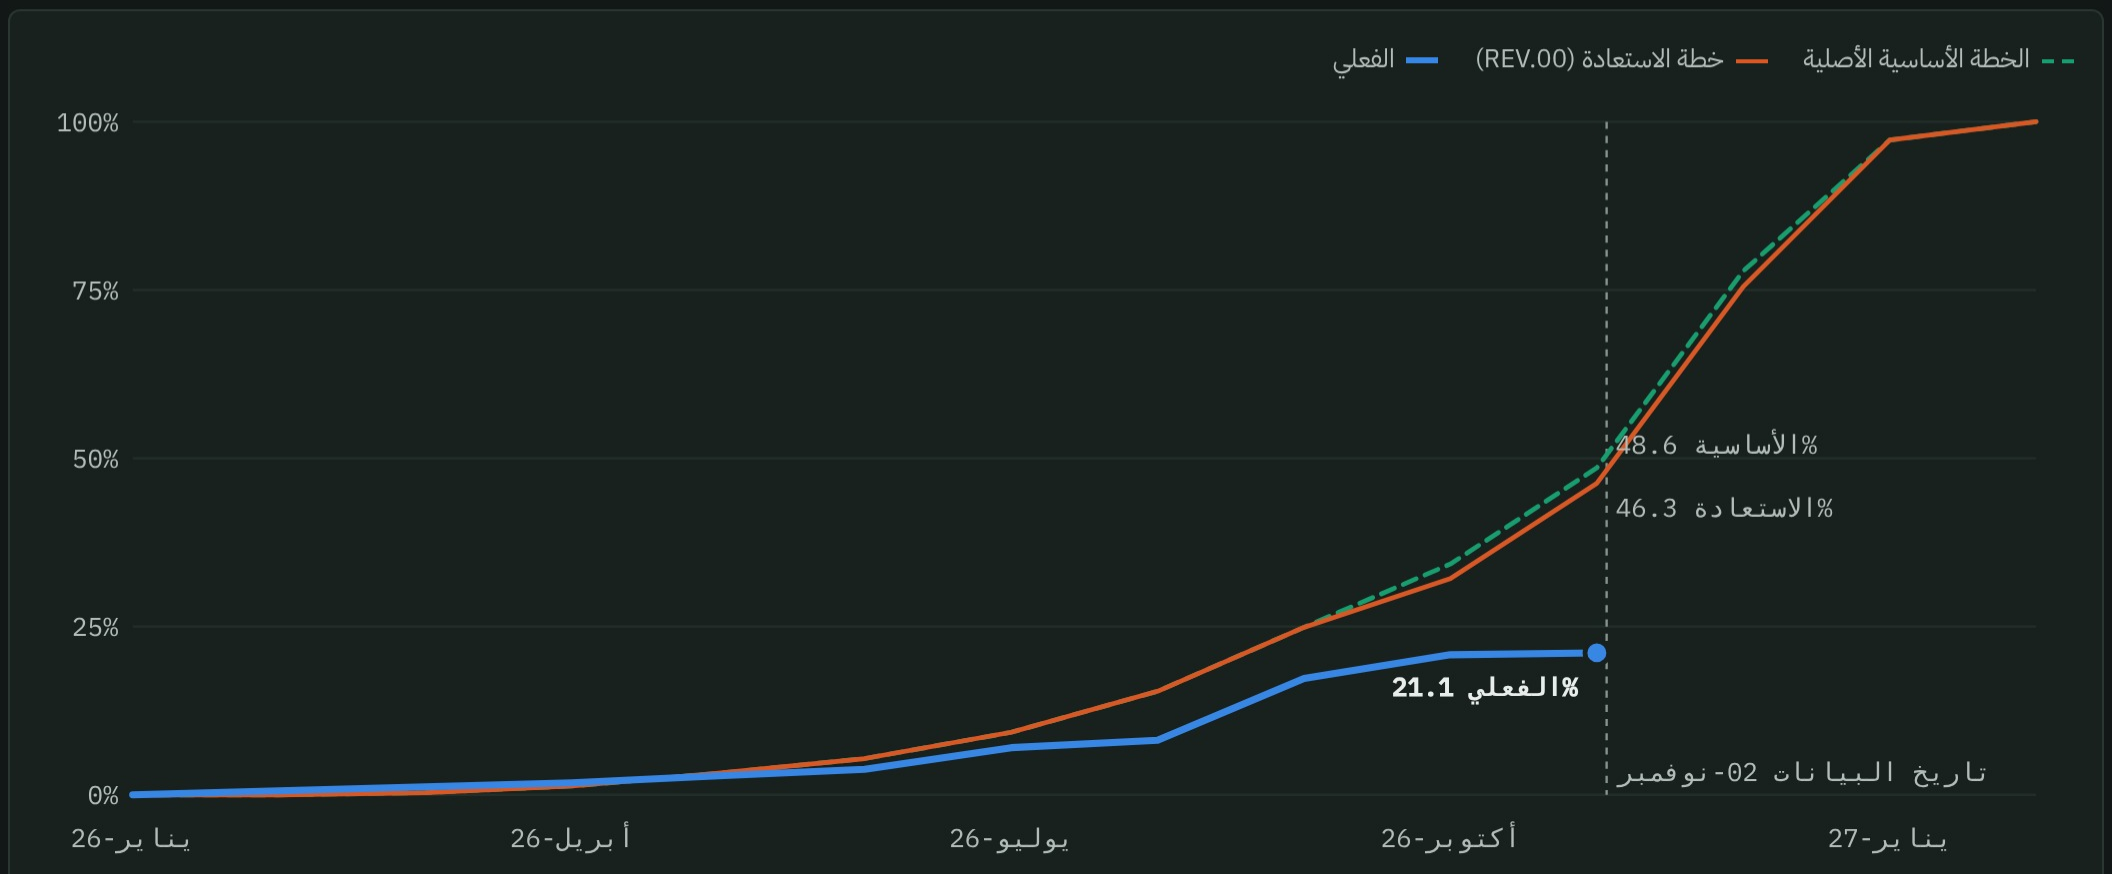

نهاية الفترة	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الفترة	مؤشر الأداء
يونيو-2026	5.4	3.8	−1.6%	+1.0%	0.70
يوليو-2026	9.3	7.0	−2.3%	+3.2%	0.75
أغسطس-2026	15.4	8.1	−7.3%	+1.1%	0.52
سبتمبر-2026	24.9	17.3	−7.5%	+9.2%	0.70
26-Oct-2026	36.4*	20.8	−15.6%	+3.5%	0.57
02-Nov-2026	**36.4***	**21.1**	**−15.2%**	**+0.31%**	**0.58**

القيم المخططة من الخطة الأساسية الأصلية؛ والصفوف الشهرية قيم نهاية الشهر من بيانات المنحنى، والصفان الأخيران من التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 26-أكتوبر و02-نوفمبر-2026. * يذكر ملخص التقدم أن المخطط حتى تاريخه 36.4% في الأسبوعين، أي أن الخطة الأساسية لم تتقدم هذا الأسبوع؛ بينما تعطي بيانات المنحنى الشهرية 34.3% لنهاية أكتوبر و48.6% لنهاية نوفمبر. وارتفعت خطة الاستعادة من 32.1% إلى 34.8% هذا الأسبوع.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة (131,328 ساعة إجمالاً). جميع ساعات العمل مدرجة تحت التنفيذ، ولا توجد ساعات للتصميم أو التوريدات أو الاختبار.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
السور وغرفة الحارس	28.5%	56.3%	51.1%	−5.2%	0.91	▼ متأخر قليلاً
شبكة الطرق	17.2%	0.0%	1.9%	+1.9%	–	▲ بدأ مبكراً
مباني المرافق	14.1%	59.6%	28.8%	−30.8%	0.48	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	10.6%	80.4%	19.3%	−61.0%	0.24	▼ متأخر
الزراعة والتشجير	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
شبكة الجهد المنخفض	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
شبكة مياه الشرب	4.1%	10.4%	0.0%	−10.4%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الصرف الصحي	3.1%	65.4%	3.6%	−61.9%	0.05	▼ متأخر
شبكة الإنارة	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
شبكة المياه المعالجة	2.6%	19.7%	0.0%	−19.7%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الري	2.2%	4.2%	0.0%	−4.2%	0.00	▼ لم يبدأ
كاميرات المراقبة (CCTV)	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
شبكة الجهد المتوسط	1.3%	23.9%	0.0%	−23.9%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الاتصالات	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
التأثيث	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**36.4%**	**21.1%**	**−15.2%**	**0.58**	▼ متأخر

المخطط من الخطة الأساسية الأصلية. ومقابل خطة الاستعادة (34.8% حتى تاريخه) يبلغ مؤشر الأداء الزمني 0.61. وجاءت ساعات العمل المكتسبة هذا الأسبوع (406 ساعات) من الطرق (+260) والصرف الصحي (+146)، ولم يتغير السور ومباني المرافق وتصريف السيول. ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026) عدد 1,065 نشاطاً: 302 مكتملة و28 قيد التنفيذ و735 لم تبدأ.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الكلية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية، من ورقة الكميات الرئيسية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026. ويقارن عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بتقرير 26-أكتوبر-2026: لم تُحدَّث الورقة، لذا تظهر جميع البنود صفراً.

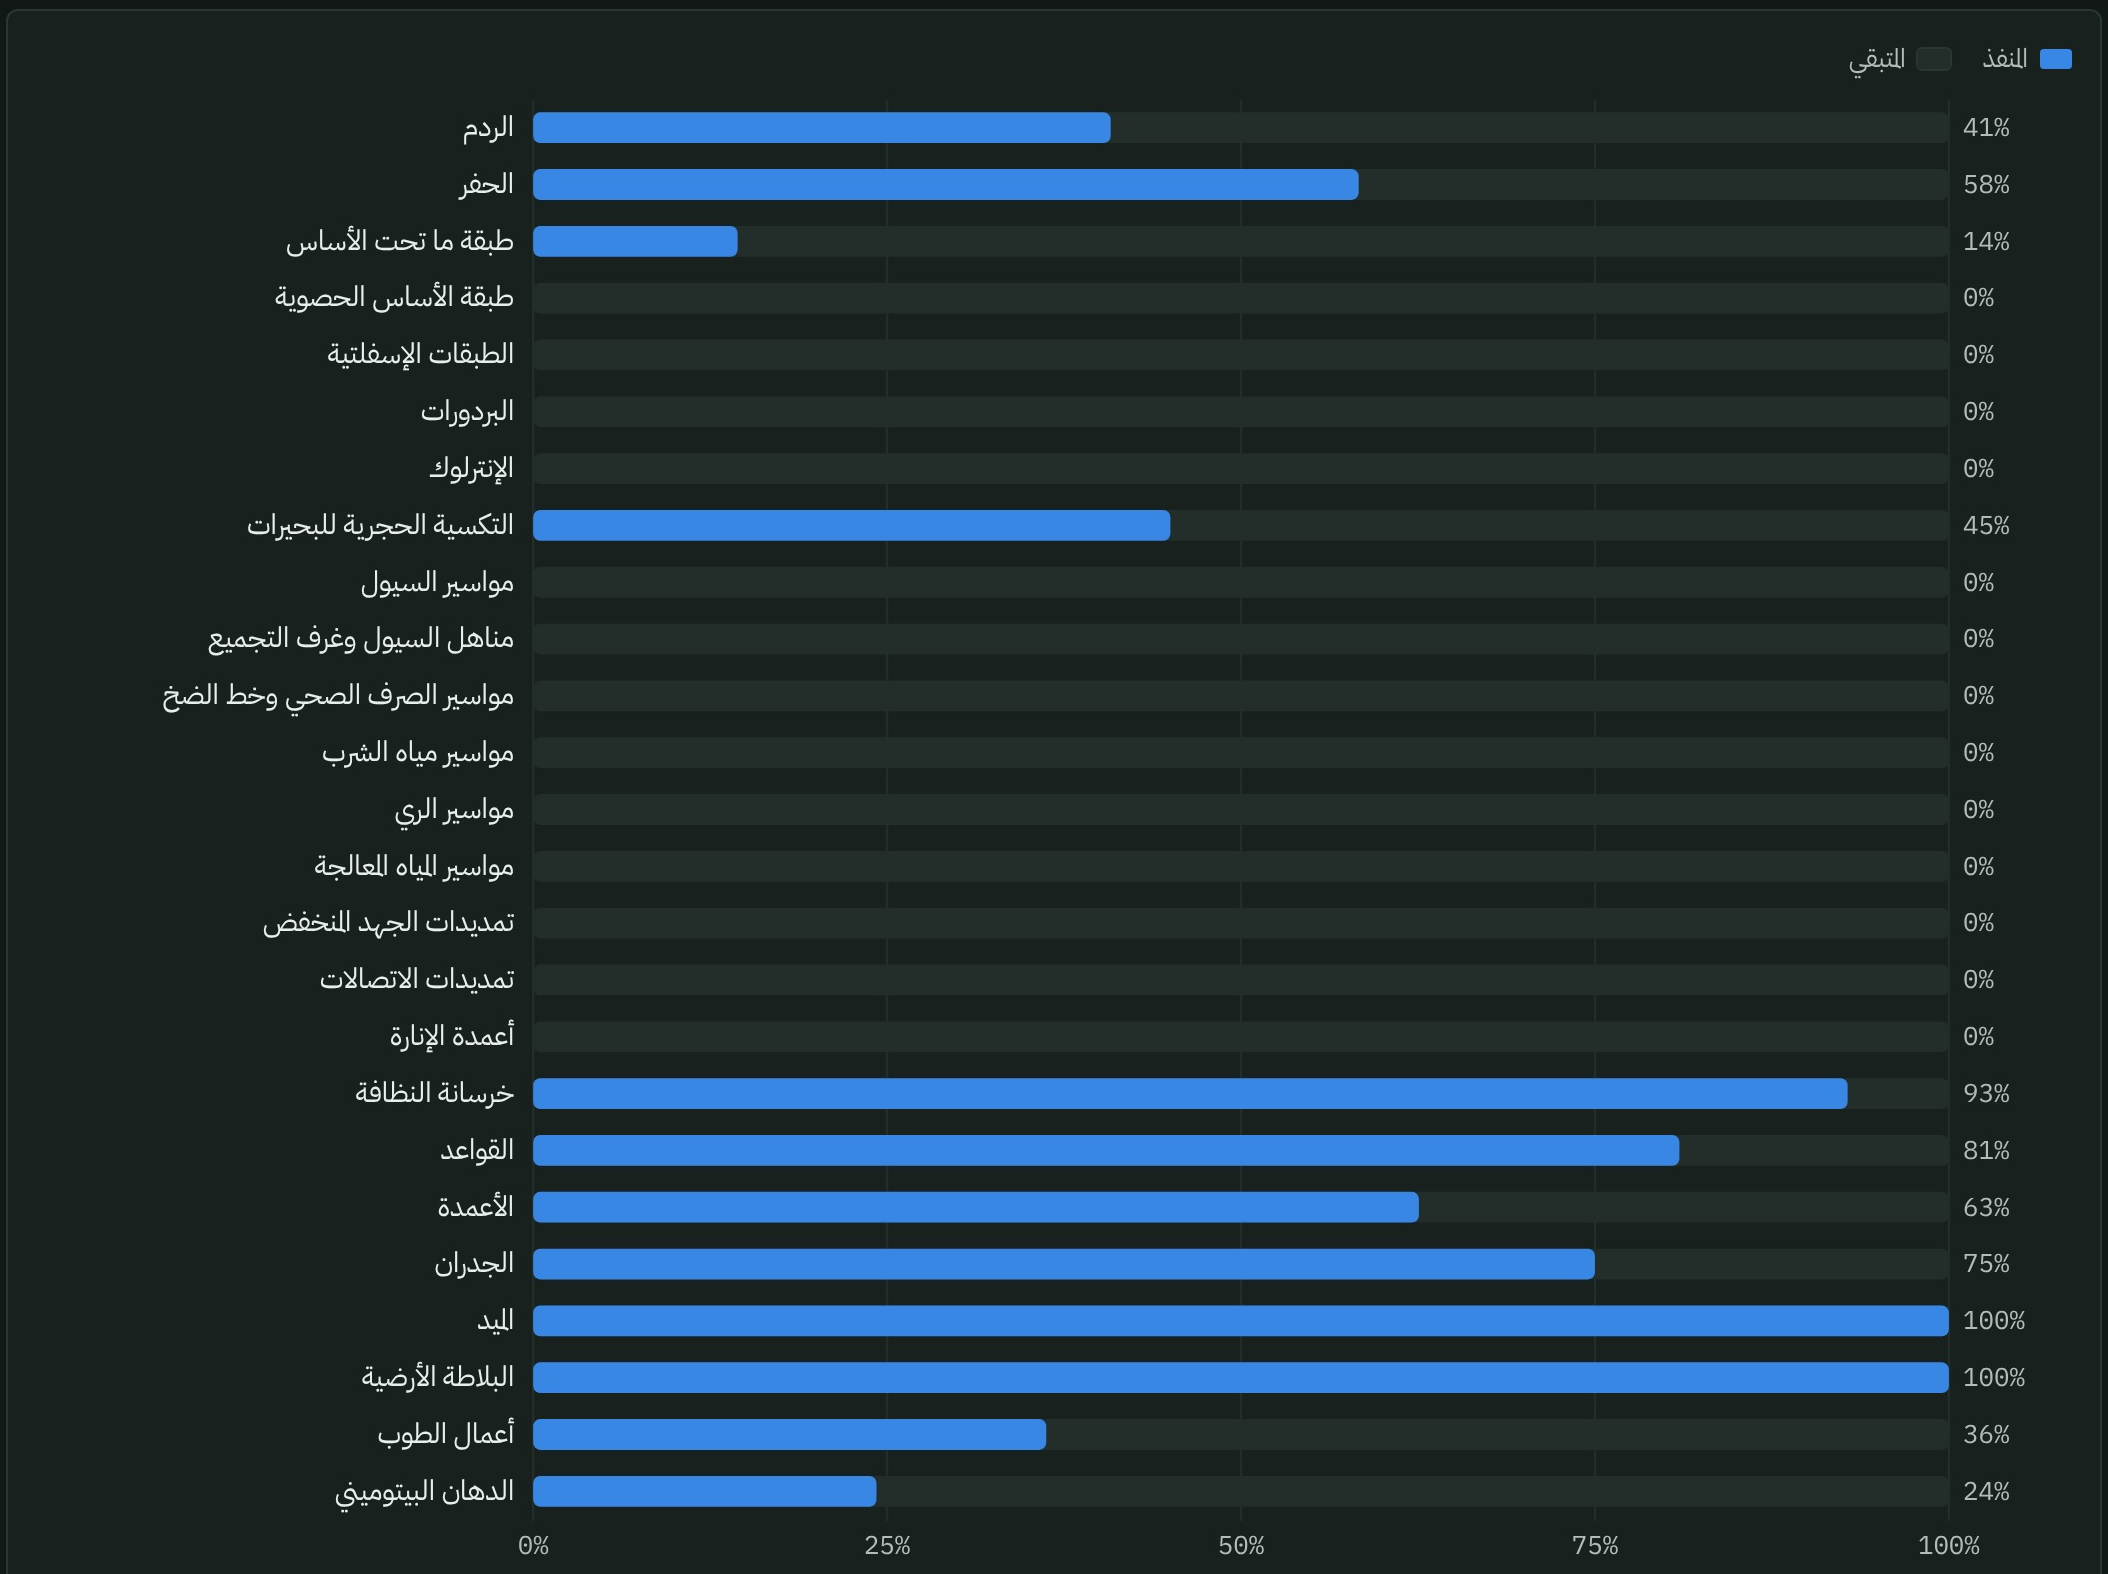

بند النطاق	الموقع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
الردم	الموقع العام	م³	1,050,000	428,344	0	621,656	40.8%
الحفر	الموقع العام	م³	61,715	35,987	0	25,728	58.3%
طبقة ما تحت الأساس	الطرق	م³	45,731	6,605	0	39,126	14.4%
طبقة الأساس الحصوية	الطرق	م³	22,866	0	0	22,866	0.0%
الطبقات الإسفلتية	الطرق	م³	15,254	0	0	15,254	0.0%
البردورات	الطرق	م.ط	46,423	0	0	46,423	0.0%
الإنترلوك	الطرق	م²	90,979	0	0	90,979	0.0%
التكسية الحجرية للبحيرات	بحيرات السيول	م²	7,985	3,594	0	4,391	45.0%
مواسير السيول	الشبكات	م.ط	7,221	0	0	7,221	0.0%
مناهل السيول وغرف التجميع	الشبكات	عدد	283	0	0	283	0.0%
مواسير الصرف الصحي وخط الضخ	الشبكات	م.ط	3,897	0	0	3,897	0.0%
مواسير مياه الشرب	الشبكات	م.ط	4,183	0	0	4,183	0.0%
مواسير الري	الشبكات	م.ط	8,954	0	0	8,954	0.0%

بند النطاق	الموقع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
مواسير المياه المعالجة	الشبكات	م.ط	5,421	0	0	5,421	0.0%
تمديدات الجهد المنخفض	الشبكات	م.ط	13,353	0	0	13,353	0.0%
تمديدات الاتصالات	الشبكات	م.ط	5,770	0	0	5,770	0.0%
أعمدة الإنارة	الشبكات	عدد	139	0	0	139	0.0%
خرسانة النظافة	السور وغرفة الحارس	م³	1,933	1,914	0	19	99.0%
	مباني المرافق	م³	248	111	0	137	44.8%
الإجمالي		م³	**2,181**	**2,025**	**0**	**156**	**92.8%**
القواعد	السور وغرفة الحارس	م³	2,119	2,102	0	17	99.2%
	مباني المرافق	م³	781	246	0	535	31.5%
الإجمالي		م³	**2,900**	**2,348**	**0**	**552**	**81.0%**
الأعمدة	السور وغرفة الحارس	م³	440	328	0	112	74.5%
	مباني المرافق	م³	137	33	0	104	24.1%
الإجمالي		م³	**577**	**361**	**0**	**216**	**62.6%**
الجدران	السور وغرفة الحارس	م³	1,328	996	0	332	75.0%
الميد	مباني المرافق	م³	460	460	0	0	100.0%
البلاطة الأرضية	مباني المرافق	م³	119	119	0	0	100.0%
أعمال الطوب	السور وغرفة الحارس	م²	11,754	4,260	0	7,494	36.2%
الدهان البيتوميني	السور وغرفة الحارس	م²	51,678	12,532	0	39,146	24.3%

المباني والأعمال الترابية

اكتملت قواعد السور وغرفة الحارس تقريباً، ووصلت الجدران إلى 75%. واكتملت الميد والبلاطات الأرضية لمباني المرافق، لكن أعمدتها عند 24%. ووصل الردم إلى 41% وطبقة ما تحت الأساس إلى 14%، والتكسية الحجرية لبحيرات السيول إلى 45%.

الشبكات بالكاد بدأت

لا تزال ورقة الكميات الرئيسية لا تسجل أي مواسير أو مناهل أو تمديدات مركّبة، مقابل 5,698 م من مواسير السيول و1,768 م من مواسير الصرف الصحي مخططة حتى هذا التاريخ. لكن سجل طلبات الفحص لهذا الأسبوع يسجل ردم مواسير السيول بين المنهلين MH-10 وMH-06، و6 مناهل سيول، و7 غرف تجميع، وطبقة الأساس والطبقة التأسيسية على الطريقين الخارجيين 2 و3، كما تذكر ورقة الخلاصة تنفيذ 102 م من شبكة السيول.

المعالم الرئيسية

يُبقي التقرير الأسبوعي جميع المعالم على تواريخها في الخطة الأساسية، بينما يؤخر تحديث P6 معظمها من شهر ونصف إلى تسعة أشهر ونصف. يُعرض الاثنان معاً لحسم الفرق مع المقاول.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	فرق P6 عن الخطة الأساسية (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	06-Jan-2026	06-Jan-2026	06-Jan-2026 (فعلي)	0	✓ منجز
خطة التنفيذ والبرنامج الزمني الأساسي	05-Feb-2026	05-Feb-2026	05-Feb-2026 (فعلي)	0	✓ منجز
اعتماد المخططات التنفيذية والمواد	16-Feb-2026	16-Feb-2026	29-Nov-2026	+286	▼ متأخر
التجهيز والتعبئة	08-Mar-2026	08-Mar-2026	07-Mar-2026 (فعلي)	−1	✓ منجز
شبكة مياه الشرب	14-Dec-2026	14-Dec-2026	25-May-2027	+162	▼ متأخر
شبكة الري	27-Dec-2026	27-Dec-2026	25-May-2027	+149	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	07-Jan-2027	07-Jan-2027	24-Apr-2027	+107	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	11-Jan-2027	11-Jan-2027	25-May-2027	+134	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	13-Jan-2027	13-Jan-2027	24-May-2027	+131	▼ متأخر

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	فرق P6 عن الخطة الأساسية (أيام)	الحالة
شبكة الصرف الصحي	26-Jan-2027	26-Jan-2027	15-Mar-2027	+48	▼ متأخر
شبكة المياه المعالجة	26-Jan-2027	26-Jan-2027	12-Jun-2027	+137	▼ متأخر
شبكة الإنارة	09-Feb-2027	09-Feb-2027	24-May-2027	+104	▼ متأخر
أعمال الطرق	–	–	25-May-2027	–	▼ بعد التاريخ التعاقدي
بحيرات تصريف السيول	–	–	12-May-2027	–	▼ بعد التاريخ التعاقدي
محطتا ضخ الصرف الصحي والمياه	–	–	30-Jun-2027	–	▼ بعد التاريخ التعاقدي
غرفة التحكم	–	–	19-Jul-2027	–	▼ بعد التاريخ التعاقدي
انتهاء المشروع	05-Mar-2027	05-Mar-2027	22-Jul-2027	+139	▼ متأخر

يختلف التقرير الأسبوعي وتحديث P6 في جميع المعالم غير المنجزة.

يعرض التقرير الأسبوعي جميع المعالم على تواريخها الأساسية دون أي تغيير، بما فيها اعتماد المخططات التنفيذية والمواد (16-فبراير-2026) الذي لم يُنجز بعد. أما تحديث P6 فيؤخر جميع الشبكات عن تواريخها الأساسية وينقل انتهاء المشروع إلى 22-يوليو-2027، أي بعد أسبوع إلى أسبوعين من تحديث الأسبوع الماضي لكل معلم غير منجز. ولا يتضمن ملف P6 قيم الفائض الزمني، لذا لم يُعرض الفائض.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة من الإجمالي. المصدر: ملف متابعة التوريدات المرفوع مع تقرير 02-نوفمبر-2026.



الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وأنظمة المباني: لم يُورَّد شيء بعد


أعمدة الإنارة ووحداتها وتمديداتها وكاميرات المراقبة والمضخات وخزانات GLS ونظام SCADA جميعها عند 0%. والتوريد مجدول بين 25-نوفمبر و25-ديسمبر-2026، والإنارة وكاميرات المراقبة ونظام SCADA مسجلة كغير مدفوعة.

مصدران مختلفان

مناهل السيول (50 من 59) وغرف التجميع (90 من 144) مسجلة كأنها لا تزال قيد التصنيع، على أن يبدأ توريدها الأسبوع القادم. أما ورقة التوريدات في التقرير الأسبوعي فلم تتغير منذ 26-أكتوبر وتُظهر توريدات أقل بكثير، مثل مواسير السيول 634 من 4,672 م ومواسير الصرف الصحي 0 من 2,977 م.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (العمالة والموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة.

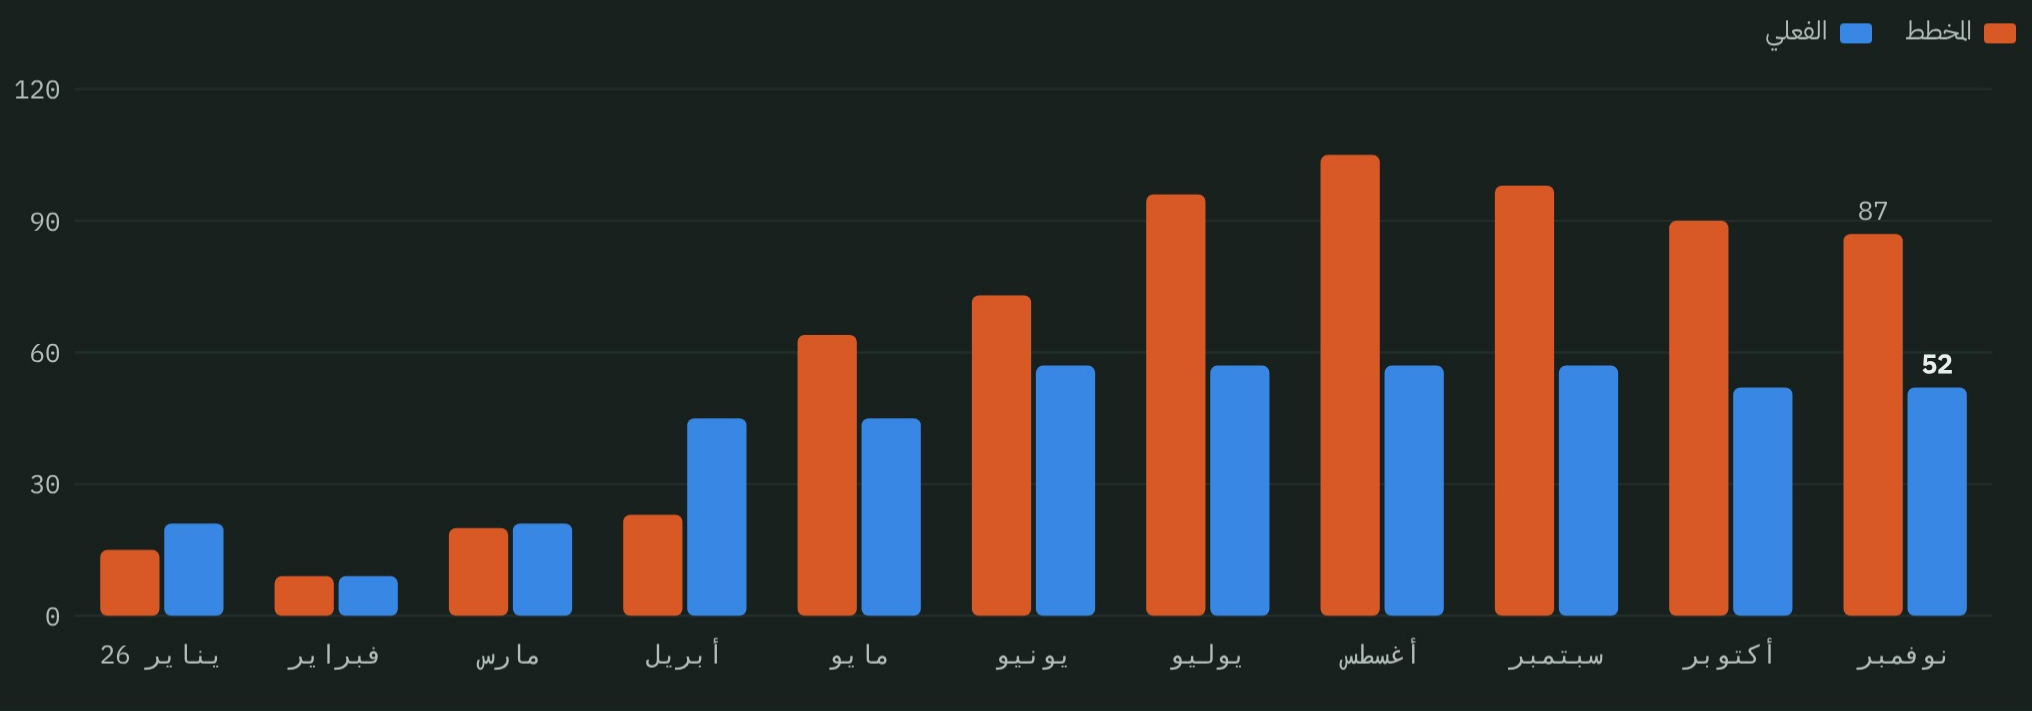

بلغ عدد العاملين في نوفمبر 52 مقابل 87 مخططاً (أقل بنسبة 40%): 30 عاملاً مقابل 78 مخططاً، و22 موظفاً مقابل 9 مخططين. وتكرر أرقام نوفمبر الفعلية أرقام أكتوبر.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	93,388,079
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0
الدفعة المقدمة (10%)	9,338,808

جميع القيم بالريال السعودي. ويذكر ملخص المشروع في الملف نفسه 93,388,697 شاملة ضريبة القيمة المضافة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	4
القيمة الإجمالية	10,524,342
المحتجزات	0
الخصومات والغرامات	165,500
الصافي	10,358,842
المعتمد من مدير المشروع / المصروف	0 / 0

بلغت المستخلصات 11.3% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 20.8%. ولم يُسجَّل أي من المستخلصات الأربعة كمعتمد من مدير المشروع أو مصروف.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.89

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	123,930
ساعات العمل هذا الأسبوع	4,800
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	10 / 29

الجودة التقييم 0.84

تقارير عدم المطابقة الصادرة / المفتوحة	4 / 4
تعليمات الموقع المفتوحة	5
طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	3 / 3
طلبات فحص المواد الصادرة	0
المخططات التنفيذية المقدمة	53
طلبات اعتماد المواد	19
طلبات اعتماد المواد لدى الاستشاري	5

ثلاثة تقارير عدم مطابقة مفتوحة منذ 31–60 يوماً. والتقييمان مأخوذان من قائمة تدقيق جودة بتاريخ 14-أبريل-2026 ومن تفتيش سلامة للفترة من 27-يناير إلى 03-فبراير-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
الدفعة المقدمة والمستخلصات	المالك	درجة الخطر 25 من 25. لا يزال تحديث P6 يُظهر استلام الدفعة المقدمة كنشاط لم يبدأ (متوقع الآن في 02-نوفمبر-2026)، ولم يُعتمد أو يُصرف أي من المستخلصات الأربعة.
اختبار الأعمال المنفذة	المقاول	درجة الخطر 20. قد يؤدي تأخر الاختبارات أو إخفاقها إلى إعادة العمل وتأخير التسليم.
الربط مع الشبكات القائمة	المالك / الاستشاري	درجة الخطر 16. قد لا تكون البنية التحتية القائمة جاهزة للربط، مما يؤخر التشغيل.
المياه الجوفية	المقاول	درجة الخطر 16. قد تحتاج الحفريات إلى نزح مستمر للمياه، مما يبطئ أعمال الخنادق والقواعد.
توريد المواد	المقاول	درجة الخطر 15. معظم مواد الشبكات لم تُورَّد بعد، في حين يُفترض حسب الخطة أن يكون التركيب قد تقدم كثيراً.

المصدر: ورقة سجل المخاطر. البندان الواردان في سجل المشكلات (المخلفات في الموقع والدفعة المقدمة) مسجلان كمغلقين. ويتضمن سجل المخاطر أيضاً فرصة: وفورات محتملة في جدول الكميات بعد إعادة حصر الكميات.

ملاحظات على البيانات

- قيم هذا الأسبوع ناتجة عن مقارنة التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026 (WPR-37) بتقرير 26-أكتوبر-2026 (WPR-36) في مجلد W05.
- تذكر ورقة المعالم أن الأسبوع التعاقدي هو 43 من 60، واعتُمد رقماً لأسبوع التقرير. أما عدد الأسابيع الكاملة من تسليم الموقع حتى تاريخ البيانات فهو 42.
- التقدم المخطط حتى تاريخه وفق الخطة الأساسية 36.4% في ملخصي الأسبوعين، أي أن الخطة لم تتقدم؛ بينما تعطي بيانات المنحنى الشهرية 34.3% لنهاية أكتوبر و48.6% لنهاية نوفمبر.
- تكرر الأعمدة الأسبوعية للتقدم الفعلي قيم الأسبوع الماضي (708 ساعات مخططة و445 مكتسبة، للسور فقط). وحُسب إنجاز هذا الأسبوع (406 ساعات، 0.31%) من الفرق في ساعات العمل المكتسبة التراكمية.
- ورقتا الكميات الرئيسية والتوريدات لم تتغيرا منذ 26-أكتوبر-2026، بينما يسجل سجل طلبات الفحص أعمال مواسير ومناهل وغرف تجميع السيول وطبقة الأساس والطبقة التأسيسية هذا الأسبوع، وتذكر ورقة الخلاصة تنفيذ 102 م من شبكة السيول.
- يعطي ملف متابعة التوريدات كميات مورّدة أعلى بكثير من ورقة التوريدات، ويستخدم رقم المشروع DHRT-02-01 ويذكر مدير مشروع مختلفاً ("م/ نواف")، كما يذكر كميات مورّدة لمناهل السيول وغرف التجميع رغم تسجيلها قيد التصنيع.
- يتوقع التقرير الأسبوعي الانتهاء في 05-مارس-2027 دون انحراف، بينما ينتهي تحديث P6 في 22-يوليو-2027 (15-يوليو-2027 في الأسبوع الماضي).
- في جدول نظرة عامة على التقدم بلوحة المعلومات، اسما صفّي الطرق وكاميرات المراقبة متبادلان؛ لذا استُخدمت ورقة التقدم بدلاً منه.
- تصف ورقة الخلاصة ولوحة المعلومات التقدم المبني على التكلفة بأنه التقدم "الفعلي"؛ ولم يُستخدم في هذا التقرير.
- عنوان ورقة الخلاصة يذكر "الدمام"، وتذكر 260,000 م³ من الأعمال الترابية مقابل 428,344 م³ في ورقة الكميات الرئيسية، وتعطي أطوالاً للشبكات تختلف عن ورقة التوريدات (مثلاً مواسير السيول 4,838 م مقابل 4,672 م).
- يذكر ملخص المستخلصات تقديم 3 مستخلصات، بينما يسرد سجل المستخلصات 4 بإجمالي 10,524,342 ريال. ويُظهر السجل أيضاً قيمة عقد معدلة 21,100,000 وتكلفة متوقعة عند الإنجاز 20,900,000، ولا تتطابقان مع هذا العقد.
- تحمل عدة أوراق أرقام مشاريع أخرى أو تواريخ قديمة: قائمة تدقيق الجودة وسجل طلبات الفحص يستخدمان المشروع DHRT-02-001، وسجل المخاطر يستخدم DAMT-01-002 (الدمام)، وتفتيش السلامة يغطي الفترة من 27-يناير إلى 03-فبراير-2026.
- يغلق سجل المشكلات مشكلة الدفعة المقدمة، بينما يُظهرها كل من تحديث P6 وسجل المخاطر كمفتوحة.
- تكرر أعداد العمالة الفعلية لنوفمبر (30 عاملاً و22 موظفاً) أعداد أكتوبر، ولا تزال لوحة الموارد في لوحة المعلومات تعرض أعداد يناير.
- لا تزال ورقة البرنامج الزمني تذكر 1,271 نشاطاً بالإحصاءات نفسها للأسبوع الماضي، بينما يحتوي ملف P6 المرفوع على 1,065.
- ملف العرض المرفوع هو دليل تقرير مدن، ولا يزال يذكر الأسبوع التعاقدي 35 من 60، ولم تُستخدم أرقامه.
