تطوير البنية التحتية بالمدينة الصناعية الأولى بجدة (1كم2)

Infrastructure Development for Industrial City 1 in Jeddah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عبدالله الجليفي	19-Nov-2025	18-Nov-2027

النطاق: أعمال الطرق وشبكات السيول والصرف الصحي ومياه الشرب والمياه المعالجة، والأعمال الكهربائية، والسور والبوابات، وجسر، وأعمال تنسيق المواقع. قيمة العقد 86.8 مليون ريال، ومدته 24 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. بنسبة إنجاز 72.6% مقابل 47.0% مخططاً، المشروع متقدم بنسبة 25.6% (مؤشر الأداء الزمني 1.55). وحقق هذا الأسبوع 0.27% مقابل 0.78% مخططاً، فتقلص التقدم قليلاً. ومع ذلك يتوقع الجدول الزمني الانتهاء بعد تاريخ العقد بـ184 يوماً.

نسبة الإنجاز الفعلي
72.6% / 47.0% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.55 +25.6%

التقدم هذا الأسبوع
+0.27% / +0.78% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.51%

المدة المنقضية من العقد
46.0% · اليوم 335 من 729
▼ الانتهاء المتوقع 20-مايو-2028

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
51.7% · 44.9 مليون ريال
7 مستخلصات في السجل، آخر فترة تنتهي في 29-سبتمبر-2026

متقدم كثيراً في الإنجاز، لكن الانتهاء المتوقع متأخر ستة أشهر.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 الانتهاء في 20-مايو-2028، أي بعد تاريخ انتهاء العقد (18-نوفمبر-2027) بـ184 يوماً، بفائض زمني كلي −157 يوماً. وكل معلم مفتوح متوقع بعد تاريخه في الخطة الأحدث بورقة المعالم بسبعة أيام. وبند الطرق والجهد المتوسط، وهو المتأخر عن الخطة (73.5% مقابل 100%)، يعتمد على شبكة الجهد المتوسط التي تنتظر الاتفاقية بين مدن والشركة السعودية للكهرباء، ولم تصدر بعد أوامر شراء تمديدات الجهد المتوسط ووحدات RMU ومحطات الإنارة.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ورقة الصور الأسبوعية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 20-أكتوبر-2026، وتحمل ختم الكاميرا من 17 إلى 19 أكتوبر 2026. تجري أعمال تمديدات الاتصالات والبردورات والإنترلوك والإنارة. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



مواسير الاتصالات، الطريق المحلي L01

مواسير ممدودة في الخندق. مختومة 19-أكتوبر-2026، 11:08.



أعمال البردورات

ماكينة البردورات والطاقم على حافة الطريق. مختومة 19-أكتوبر-2026، 08:59.



أعمال الإنترلوك

رصف البلاط على ممر المشاة. مختومة 19-أكتوبر-2026، 08:53.



ردم مواسير الاتصالات، L01

شريط تحذيري قبل الردم. مختومة 19-أكتوبر-2026، 06:55.



تركيب أعمدة الإنارة

شاحنة رافعة تركّب عموداً. ختم GPS بتاريخ 17-أكتوبر-2026، 09:05، 21° 24′ 3″ E ،39° 14′ 11″ N.



صندوق مصهرات الإنارة، الطريق المحلي 1

ختم GPS بتاريخ 19-أكتوبر-2026، 06:12، 21° 23′ 56″ E ،39° 14′ 9″ N.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data. الخطة المعدلة في الورقة مطابقة للخطة الأساسية، لذا رُسمت الخطة الأساسية فقط.



الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
الأسبوع السابق	46.20	72.35	+26.14	—	1.57
20-Oct-2026	**46.99**	**72.61**	**+25.63**	**+0.27**	**1.55**

يتوفر هذا الأسبوع والأسبوع السابق فقط، وكلاهما من تقرير 20-أكتوبر-2026 (ورقة Progress، أعمدة "الأسبوع الماضي"). ولا يذكر التقرير المنجز خلال الأسبوع السابق. والفعلي لشهر أكتوبر في المنحنى (74.0%) مأخوذ من بيانات P6 وهو أعلى من 72.6% في لوحة التقرير، انظر ملاحظات على البيانات.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. وتظهر المراحل الفرعية للتنفيذ تحت بند التنفيذ.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	2.8%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	4.7%	100.0%	98.8%	-1.2%	0.99	▼ متأخر قليلاً
التوريدات	11.5%	43.5%	78.9%	+35.4%	1.81	▲ متقدم
التنفيذ	76.3%	45.2%	71.5%	+26.4%	1.58	▲ متقدم
· أعمال الإزالة	1.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
· الطرق والجهد المتوسط	14.0%	100.0%	73.5%	-26.5%	0.73	▼ متأخر
· الشبكات العميقة	7.6%	100.0%	95.9%	-4.1%	0.96	▼ متأخر قليلاً
· الشبكات السطحية	27.8%	21.8%	77.9%	+56.2%	3.58	▲ متقدم
· الجسر	2.0%	55.1%	87.1%	+32.0%	1.58	▲ متقدم
· خارج حدود المشروع (خطوط الربط)	2.8%	49.8%	99.7%	+49.9%	2.00	▲ متقدم
· تشطيبات الطرق	9.2%	0.0%	68.4%	+68.4%	—	▲ متقدم
· السور والبوابات	6.1%	55.0%	58.2%	+3.2%	1.06	▲ في المسار
· الدوار وتنسيق المواقع	5.8%	0.0%	0.0%	0.0%	—	● لم يحن موعده

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الاختبار والتشغيل	2.8%	0.0%	53.1%	+53.1%	–	▲ متقدم
إغلاق المشروع	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**47.0%**	**72.6%**	**+25.6%**	**1.55**	▲ متقدم

يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026) عدد 1,905 نشاطاً: 1,278 مكتملاً و204 قيد التنفيذ و423 لم يبدأ. ومن الأنشطة النشطة الـ204، هناك 91 متقدمة و113 متأخرة. وانخفضت أنشطة المسار الحرج من 460 إلى 457، وارتفعت الأنشطة المتعثرة البدء من 107 إلى 113.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية لبنود جدول الكميات الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 20-أكتوبر-2026. لا يقسم التقرير الكميات حسب المنطقة، ولا يذكر كميات الردم ولا كميات الأسبوع السابق، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز —.

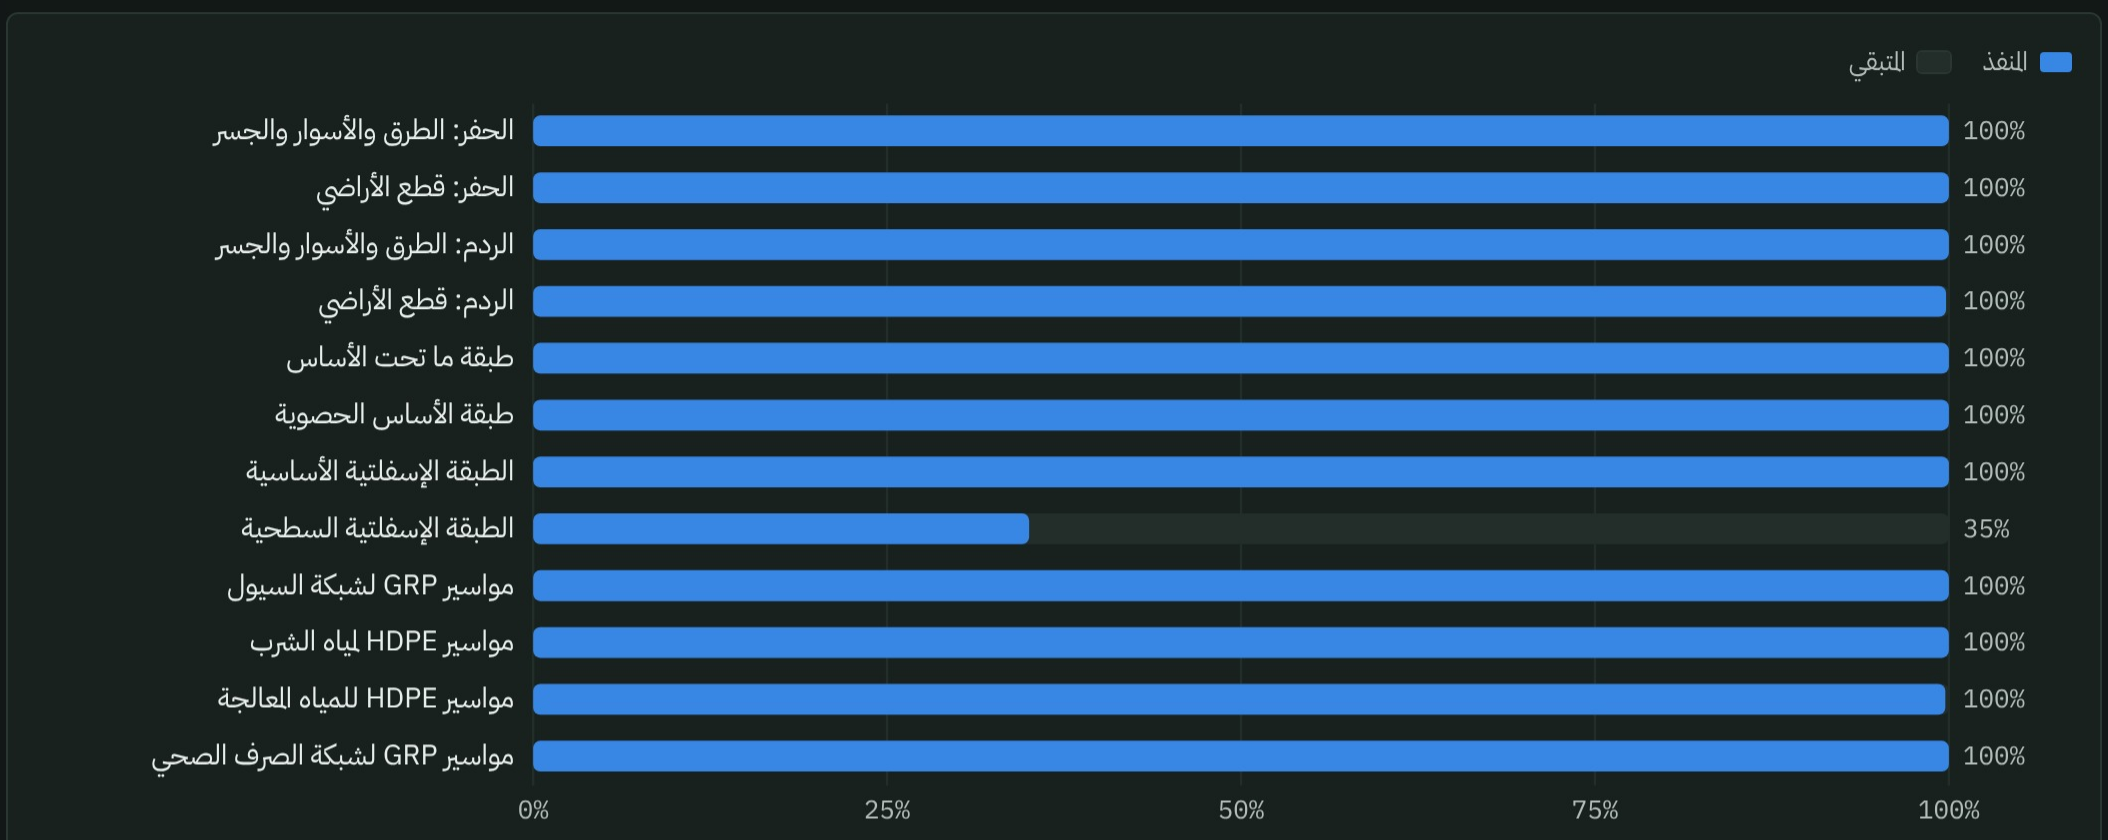

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر: الطرق والأسوار والجسر	الكل	م³	116,177	116,177	—	0	100.0%	–
الحفر: قطع الأراضي	الكل	م³	123,555	123,555	—	0	100.0%	–
الردم: الطرق والأسوار والجسر	الكل	م³	80,920	80,920	—	0	100.0%	–
الردم: قطع الأراضي	الكل	م³	94,645	94,456	—	189.3	99.8%	–
طبقة ما تحت الأساس	الكل	م³	34,694	34,694	—	0	100.0%	–
طبقة الأساس الحصوية	الكل	م³	23,129	23,129	—	0	100.0%	–
الطبقة الإسفلتية الأساسية	الكل	م³	8,290	8,290	—	0	100.0%	–
الطبقة الإسفلتية السطحية	الكل	م³	5,920	2,074	—	3,846	35.0%	–
مواسير GRP لشبكة السيول	الكل	م.ط	5,650	5,650	—	0	100.0%	–
مواسير HDPE لمياه الشرب	الكل	م.ط	12,075	12,075	—	0.3	100.0%	–
مواسير HDPE للمياه المعالجة	الكل	م.ط	8,722	8,700	—	22	99.7%	–
مواسير GRP لشبكة الصرف الصحي	الكل	م.ط	6,244	6,244	—	0	100.0%	–

التقدم حسب الشبكة (حسب القيمة)

تعرض ورقة الخلاصة نسب التنفيذ حسب الشبكة: الإزالة 100%، السيول 97.8%، الصرف الصحي 97.0%، الري 95.5%، مياه الشرب 94.7%، الطرق والمواقف 82.3%، الجسر 72.8%، الأسوار والبوابات 65.9%، الأعمال الكهربائية 56.0%، وتنسيق المواقع 0%. وهذه النسب مبنية على القيمة المكتسبة لا على ساعات العمل.

الطبقة الإسفلتية السطحية هي البند الرئيسي المتبقي في الطرق

نُفّذ 2,074 من 5,920 م³ (35.0%). وبقية بنود الأعمال الترابية وطبقات الأساس والمواسير مكتملة أو متبقٍ منها أقل من 0.3%.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتوقعات من ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي، والتوقعات والفائض الكلي من بيانات P6 في الملف نفسه.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	19-Nov-2025	19-Nov-2025	19-Nov-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
الجدول الزمني الأساسي	18-Dec-2025	18-Dec-2025	18-Dec-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
انتهاء التجهيز	18-Dec-2025	04-Mar-2026	04-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
اعتماد المخططات التنفيذية وطرق التنفيذ والمواد	19-Jan-2026	07-Nov-2026	07-Nov-2026	−55	▼ متأخر
إصدار جميع أوامر الشراء	19-Jan-2026	01-Nov-2026	01-Nov-2026	−49	▼ متأخر
اكتمال الطرق والجهد المتوسط	17-Sep-2026	18-Jan-2027	19-Jun-2027	−106	▼ متأخر
اكتمال الشبكات العميقة	18-Nov-2026	19-Jun-2027	18-Jan-2027	43	؟ يتعارض مع P6
اكتمال الشبكات السطحية	18-Mar-2027	03-Oct-2027	03-Oct-2027	−42	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال	18-Nov-2027	20-May-2028	20-May-2028	−157	▼ متأخر

المصدران يتبادلان تاريخَي معلمين.

يتوقع التقرير الأسبوعي اكتمال الطرق والجهد المتوسط في 18-يناير-2027 والشبكات العميقة في 19-يونيو-2027، بينما تعطي بيانات P6 التاريخين نفسيهما بالعكس. وتتفق بقية التوقعات. وكل توقع مفتوح يأتي بعد تاريخ الخطة الأحدث في الورقة نفسها بسبعة أيام (Days Change −7).

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من كمية جدول الكميات المعدلة. المصدر: ورقة Material Monitoring، التقرير الأسبوعي 20-أكتوبر-2026.

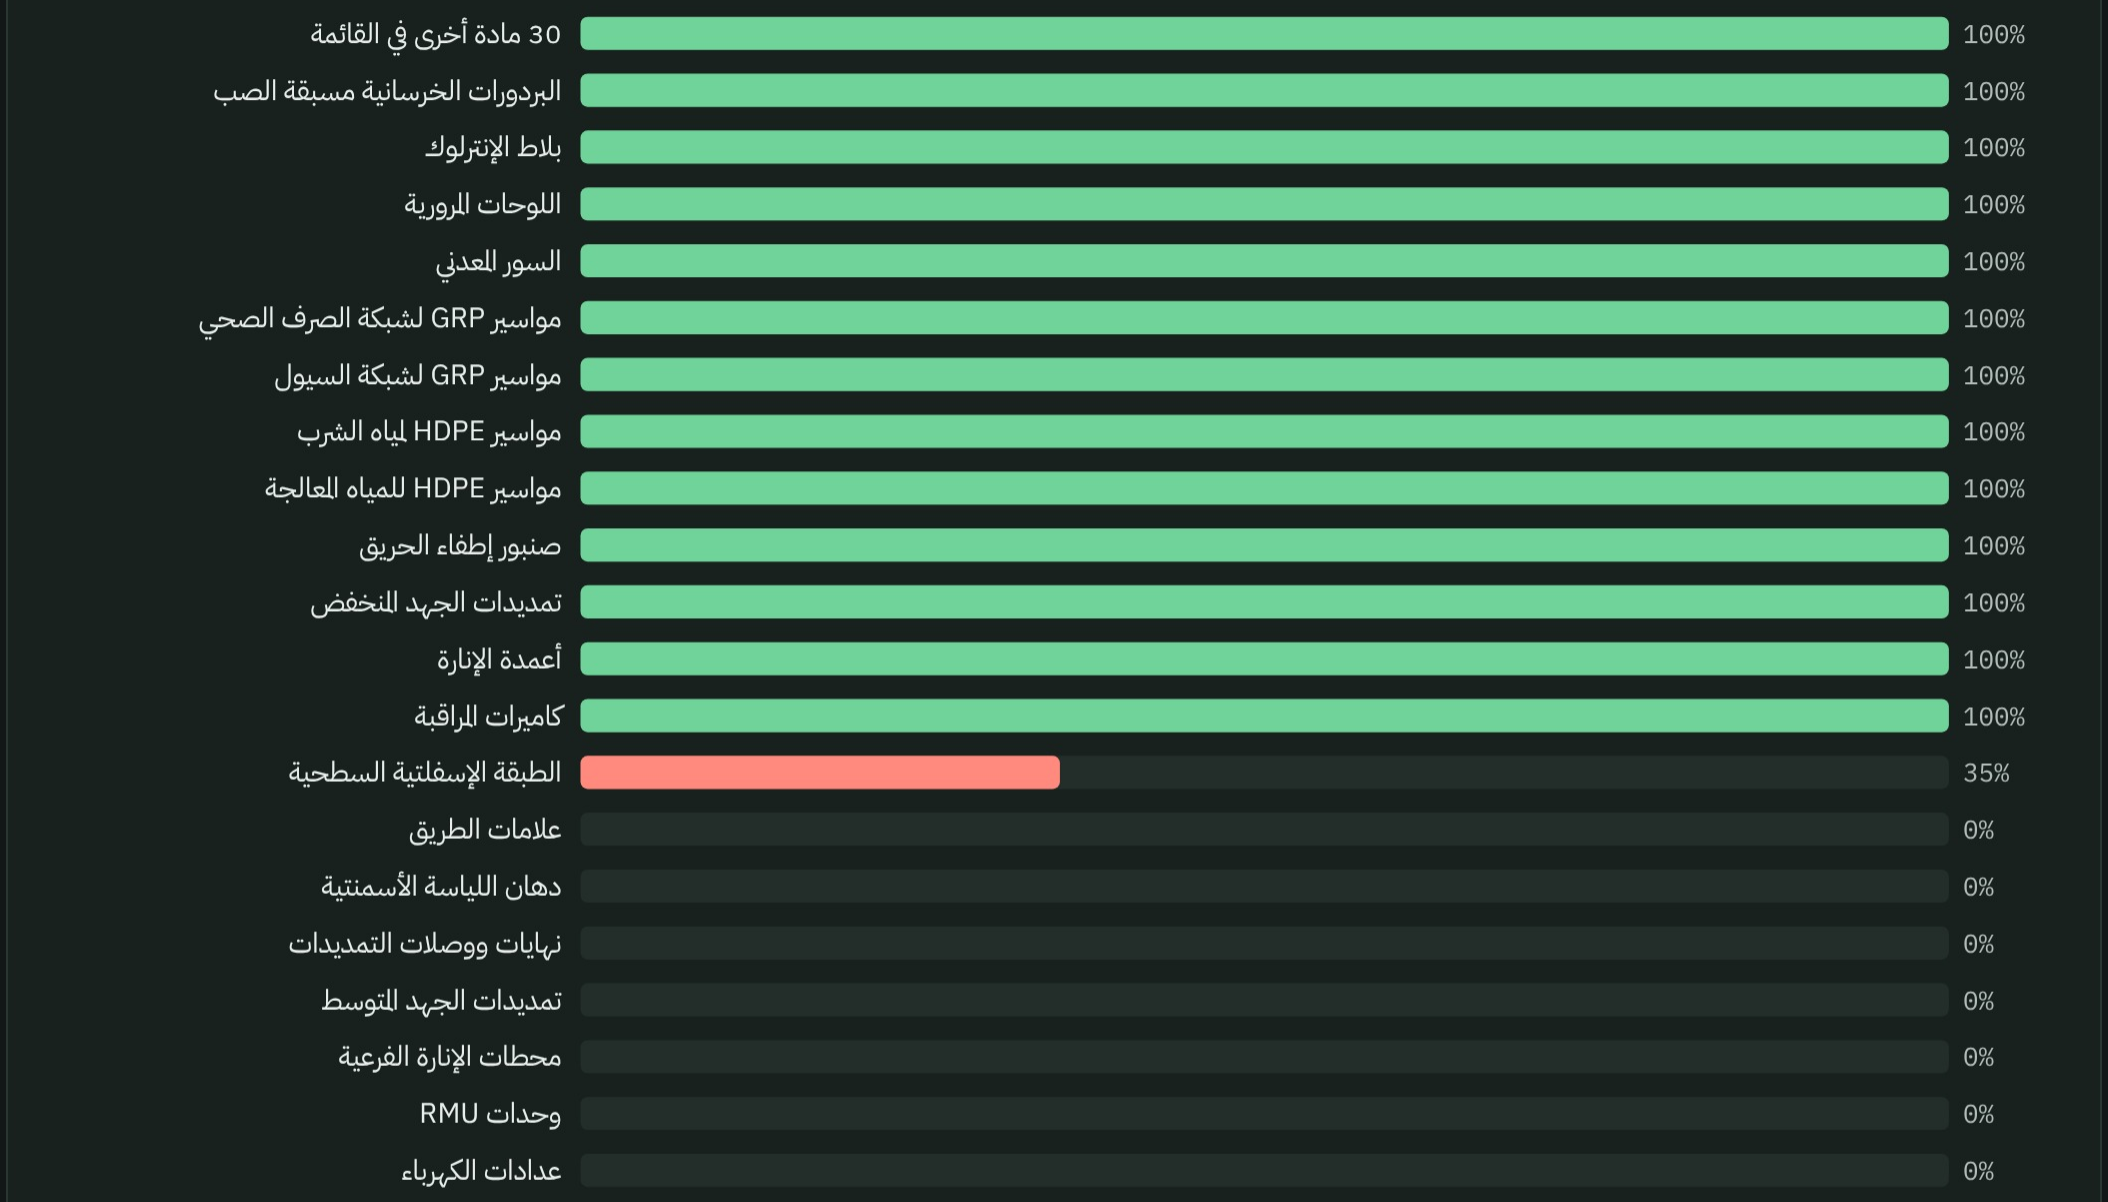

مواد الجهد المتوسط: لم يُطلب شيء


لم تُورَّد تمديدات الجهد المتوسط (14,500 م) ووحدات (4) RMU ومحطات الإنارة الفرعية (4) والعدادات (4) ونهايات التمديدات (64). ويُظهر سجل التوريدات أن أوامر تمديدات الجهد المتوسط والمحطات متوقفة حتى إنهاء اتفاقية الكهرباء بين مدن والشركة السعودية للكهرباء، والتوريد متوقع الآن في 30-نوفمبر-2026.

بنود تشطيب الطرق

الطبقة الإسفلتية السطحية: ورّد 2,074 من 5,920 م³ (35%). ولم تُورَّد بعد علامات الطريق (3,780 م²) ودهان اللياسة (4,062 م²). وإجمالاً صدر 108 من 113 أمر شراء، ووصلت 105 من 113 مادة إلى الموقع.

القوى العاملة

عدد العمالة المباشرة الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

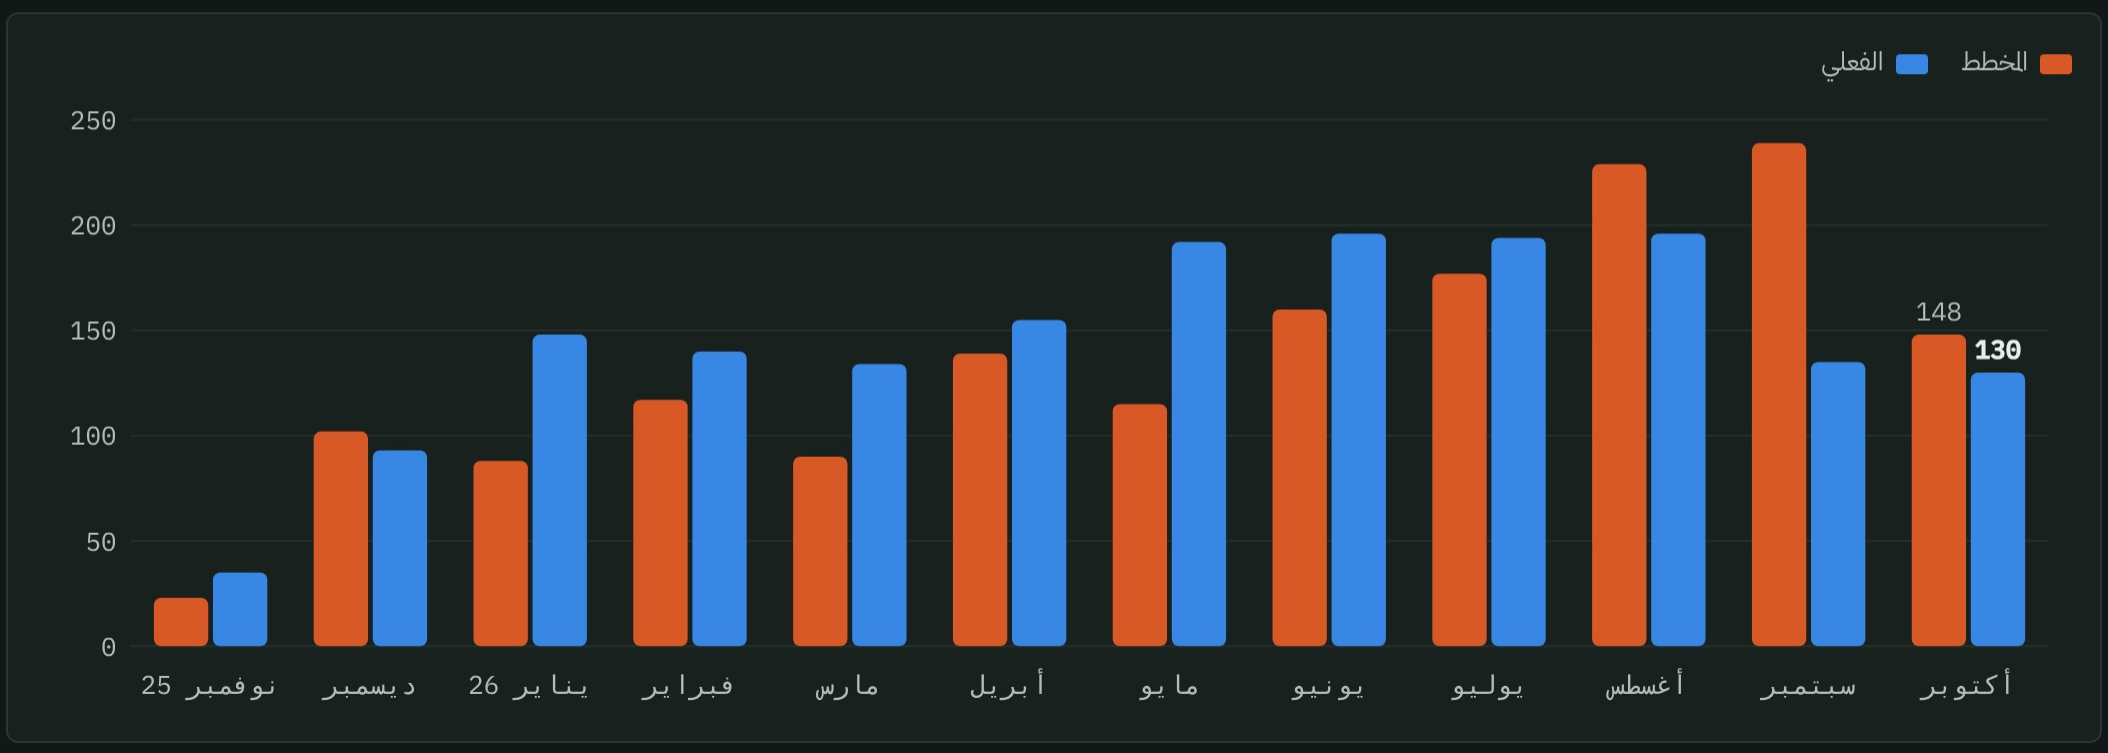

عدد العمالة المباشرة في أكتوبر 130 مقابل 148 مخططاً (−12%). والموظفون غير المباشرين 48 مقابل 22 مخططاً. والمعدات في الموقع 48 مقابل 60 مخططاً. وترتفع الخطة إلى 187 عاملاً في نوفمبر.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	86,782,345
قيمة العقد المعدلة	86,782,345
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	86,782,345
أوامر التغيير	0
القيمة المكتسبة حتى تاريخه (78.7%)	68,315,969
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه (65.9%)	57,162,747

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة (ورقة CCO).

المستخلصات

المستخلصات في السجل	7
القيمة الإجمالية	44,851,849
المعتمد من مدير المشروع (7، شامل الضريبة)	51,579,627
المدفوع (6، شامل الضريبة)	48,055,958
المحتجزات / الخصومات	0 / 0
الدفعة المقدمة	0

المفوتر الإجمالي 51.7% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 72.6%. المستخلص 7 (الفترة حتى 29-سبتمبر-2026، 3,523,669 شامل الضريبة) معتمد من مدير المشروع وأُرسل إلى الحسابات في 06-أكتوبر-2026، ولم يُدفع بعد.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.77

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	465,010
ساعات العمل هذا الأسبوع	9,216
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية (تراكمي)	88 / 63

تفتيش السلامة من مدن 20-أكتوبر-2026: 8 بنود جيدة، و13 بحاجة إلى تحسين، وبندان راسبان (التواصل واجتماعات السلامة، وجولات قيادة المشروع الميدانية).

الجودة التقييم 0.85

طلبات الفحص الميداني الصادرة / المغلقة	5,477 / 5,427
طلبات الفحص لدى الاستشاري	45
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	100 / 100
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	16 / 16
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	21 / 21
المخططات التنفيذية المعلقة	65

تقييم الجودة من الاستشاري 0.85 هذا الأسبوع، والمتوسط 0.83 لجميع عمليات التدقيق.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
اتفاقية الجهد المتوسط بين مدن والشركة السعودية للكهرباء	المسؤول	مفتوحة منذ 15-ديسمبر-2025، وكان الإغلاق المستهدف 30-ديسمبر-2025. تتابع مدن مع الشركة السعودية للكهرباء توفير مصدر الكهرباء، وينتظر المقاول الرد على الخطاب رقم 2818 بتاريخ 13-يناير-2026.
مواد الجهد المتوسط متوقفة	المالك / المقاول	تنتظر أوامر شراء تمديدات الجهد المتوسط ووحدات RMU ومحطات الإنارة الفرعية الاتفاقية. وأمر شراء وحدات RMU موسوم "متأخر"، وكان مطلوباً في الموقع بحلول 20-أكتوبر-2026.
الانتهاء المتوقع	المقاول	يتوقع الجدول الزمني الانتهاء في 20-مايو-2028 بفائض −157 يوماً، أي بعد تاريخ العقد بـ184 يوماً، رغم أن الإنجاز الفعلي متقدم على الخطة بنسبة 25.6%.

المشكلتان الأخريان في السجل مغلقتان: تصاريح خطوط الربط من الشركة السعودية للكهرباء وSTC وشركة المياه الوطنية (أُغلقت 10-فبراير-2026)، وتأهيل موردي الشد اللاحق والركائز وفواصل التمدد.

ملاحظات على البيانات

أُعدّ من ملفات الأسبوع المرفوعة بتاريخ 20-أكتوبر-2026 (W3) فقط، ولم تُستخدم الأسابيع السابقة.

- رقم الأسبوع: يذكر التقرير الأسبوع 47.86 (عدد الأسابيع الكاملة منذ تسليم الموقع: 47)، ومرجع الملف WPR-048.
- يختلف الإنجاز الفعلي بين الأوراق: تُظهر لوحة التقرير 72.6% (518,858 من 714,561 ساعة عمل)، بينما تُظهر بيانات P6 وورقة Physical-Chart Data وشهادة الإنجاز رقم 01 نسبة 74.0–74.1% (528,823 ساعة عمل).
- يذكر ملف الأعمال المنفذة خلال الأسبوع نسبة 78.72% (78.26% الأسبوع الماضي، +0.46%)، وهي قيمة مكتسبة مبنية على التكلفة لا إنجاز فعلي. كما يذكر رمز المشروع JDH3-03-011 وقيمة عقد 86,742,345 وانتهاءً متوقعاً في 30-نوفمبر-2026، وتُظهر ورقة Look Ahead التاريخ نفسه. أما لوحة التقرير وP6 فتتوقعان 20-مايو-2028.
- مدير المشروع - مدن: م. عبدالله الجليفي في ورقة المعلومات العامة، وم. رضا المنشاوي في ورقة Look Ahead وملف الأعمال المنفذة خلال الأسبوع.
- المعالم: عمود "الخطة الأساسية" في لوحة التقرير يُظهر تواريخ الخطة الأحدث (مثل انتهاء المشروع 13-مايو-2028)، وتعطي ورقة المعالم انتهاء التجهيز تاريخاً أساسياً 11-نوفمبر-2025 أي قبل بدء المشروع، واستُخدم هنا تاريخ P6 الأساسي (18-ديسمبر-2025). كما يتبادل P6 والتقرير الأسبوعي تاريخَي الطرق والجهد المتوسط والشبكات العميقة.
- المستخلصات: يذكر الملخص 6 مستخلصات مقدمة، بينما يضم السجل 7، والإجمالي 44,851,849 يشمل السابع. والمبالغ المعتمدة والمدفوعة تشمل ضريبة 15%، بينما الإجمالي المقدم بدونها، وتصف ورقة الخلاصة قيمة العقد نفسها (86,782,345) بأنها شاملة الضريبة وغير شاملة لها.
- مواسير HDPE: لا تسمّي ورقة Major Quantities الشبكة، واستُنتج أنها مياه الشرب والمياه المعالجة من الكميات. وتختلف الكميات المركّبة عن ورقة Material Monitoring (مياه الشرب 12,075 مقابل 12,045 م، والمياه المعالجة 8,700 مقابل 8,772 م)، وتوريد المياه المعالجة (8,722 م) يتجاوز كمية جدول الكميات المعدلة (8,502 م).
- الاختبارات: يُظهر ملخص ورقة Testing نسبة 60–75% للاختبارات الجارية، بينما تُظهر أنشطة P6 نسبة 40%.
- يبقى التراكمي الفعلي للمعدات عند 564 منذ يوليو رغم استمرار الأعداد الشهرية. وتُظهر عدة خلايا في لوحة التقرير أخطاء #REF! (لوحة المعالم، وتقييما السلامة والجودة في ورقة Codes).
- ورقة التوريدات: بعض تواريخ أوامر الشراء تقع بعد التوريد (مثل مناهل الألياف الزجاجية 29-ديسمبر-2026، ومواسير UPVC بتاريخ 18-ديسمبر-2026)، ويبدو أنها أخطاء في السنة.
