برنامج المصانع الجاهزة و المنتجات الجديدة الحزمة الثالثة (المحفظة الاستثمارية) - حائل 20 مصنع 900 متر

Ready-Built Factories Program, Package 3: 20 Factories of 900 m² in Hail

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	زاس السعودية للإنشاءات Saudi Zaas (Construction)	إيجيس (EGIS)	م. بدر الرويضان	04-Dec-2025	03-Dec-2026

النطاق: 20 مصنعاً جاهزاً مساحة كل منها 900 م² في خمس مجموعات (A إلى E)، مع المرافق الخارجية والطرق والمواقف وإنارة الشوارع. قيمة العقد 44,567,415.90 ريال.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. يُظهر التقرير الأسبوعي رقم 43 (تاريخ البيانات 01-نوفمبر-2026) اكتمال المشروع بنسبة 100.0% مقابل 98.8% مخطط، أي متقدم بنسبة 1.2%. وتقدّم المشروع هذا الأسبوع بنسبة 1.6% مقابل 1.0% مخطط، بإنهاء ما تبقى من الطرق والأسوار وتنسيق المواقع وتشطيبات المباني ووثائق الإغلاق.

نسبة الإنجاز الفعلي
100.0% / 98.8% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.01 +1.2%

التقدم هذا الأسبوع
+1.6% / +1.0% مخطط
▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.6%

المدة المنقضية من العقد
91.2% · اليوم 332 من 364
▲ اكتمل في 01-نوفمبر-2026

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
76.4% · 34.0 مليون ريال
10 مستخلصات، جميعها مدفوعة؛ آخر فترة تنتهي في 06-أكتوبر-2026

أُفيد باكتمال جميع الأعمال في 01-نوفمبر-2026، قبل تاريخ انتهاء العقد بـ 32 يوماً.

يسجل تحديث P6 اكتمال جميع الأنشطة البالغة 1,827 نشاطاً، إذ انتهى التنفيذ في 29-أكتوبر-2026 والاختبار والتشغيل في 31-أكتوبر-2026 والتسليم الابتدائي في 01-نوفمبر-2026. انتقل الإغلاق من 0% إلى 100% في أسبوع واحد، وأصبحت عدة أنشطة كانت مفتوحة في تحديث 26-أكتوبر-2026 تحمل تواريخ فعلية سابقة له (انظر ملاحظات على البيانات). وما زال ملخص ملف التقرير يتوقع الانتهاء في 03-ديسمبر-2026، ولا يزال 33 طلب فحص ميداني معلقاً.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ملف التقرير الأسبوعي رقم 43، بختم تاريخ من 31-أكتوبر-2026 إلى 02-نوفمبر-2026. تُظهر المباني والطرق والتشجير المكتملة وصالة مصنع منتهية. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



خزان المياه وغرفة المضخات

خزان مياه من الألواح وغرفة مضخات الحريق بجانب مجموعات المصانع. الختم 31-أكتوبر-2026.



الطريق الداخلي

الأسفلت والبردورات وإنارة الشوارع والتشجير الجديد بمحاذاة المصانع. الختم 01-نوفمبر-2026.



الأعمال الخارجية المكتملة

الجزيرة المزروعة وإنارة الشوارع أمام صف المصانع. الختم 02-نوفمبر-2026.



صالة المصنع المكتملة

الأرضية ومجاري الهواء والإنارة وواجهات المكاتب منتهية. الختم 01-نوفمبر-2026.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، التقرير الأسبوعي رقم 43.



نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
26-Oct-2026	97.8	98.4	+0.6	+1.3	1.01
01-Nov-2026	**98.8**	**100.0**	**+1.2**	**+1.6**	**1.01**

القيم الأسبوعية من ملفي التقرير رقم 42 ورقم 43، وكلاهما على أساس 116,776 ساعة عمل مخططة. الأسابيع السابقة ليست ضمن هذا الرفع. الخطة المعدلة في الورقة مطابقة للخطة الأساسية، لذا رُسم خط تخطيط واحد.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Progress، التقرير الأسبوعي رقم 43.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	0.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	12.6%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	23.5%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التنفيذ	59.1%	97.7%	100.0%	+2.3	1.02	✓ مكتمل
الاختبار والتشغيل	3.4%	84.6%	100.0%	+15.4	1.18	✓ مكتمل
إغلاق المشروع	0.5%	40.1%	100.0%	+59.9	2.49	✓ مكتمل
الإجمالي	100%	**98.8%**	**100.0%**	**+1.2**	**1.01**	✓ مكتمل

الأوزان هي حصة كل مرحلة من 116,776 ساعة عمل مخططة. الأرقام المخططة للتنفيذ والاختبار والإغلاق لم تتغير عن ملف الأسبوع الماضي. وضمن التنفيذ تتجاوز الساعات المخططة للأعمال الكهربائية (6,655) ميزانيتها (6,304). ويُظهر تحديث P6 جميع الأنشطة البالغة 1,827 نشاطاً مكتملة.

نطاق العمل: الكميات

الكميات الست عشرة المتابعة في ورقة Major Quantities من التقرير الأسبوعي رقم 43. عمود "هذا الأسبوع" هو التغير منذ ملف التقرير رقم 42.

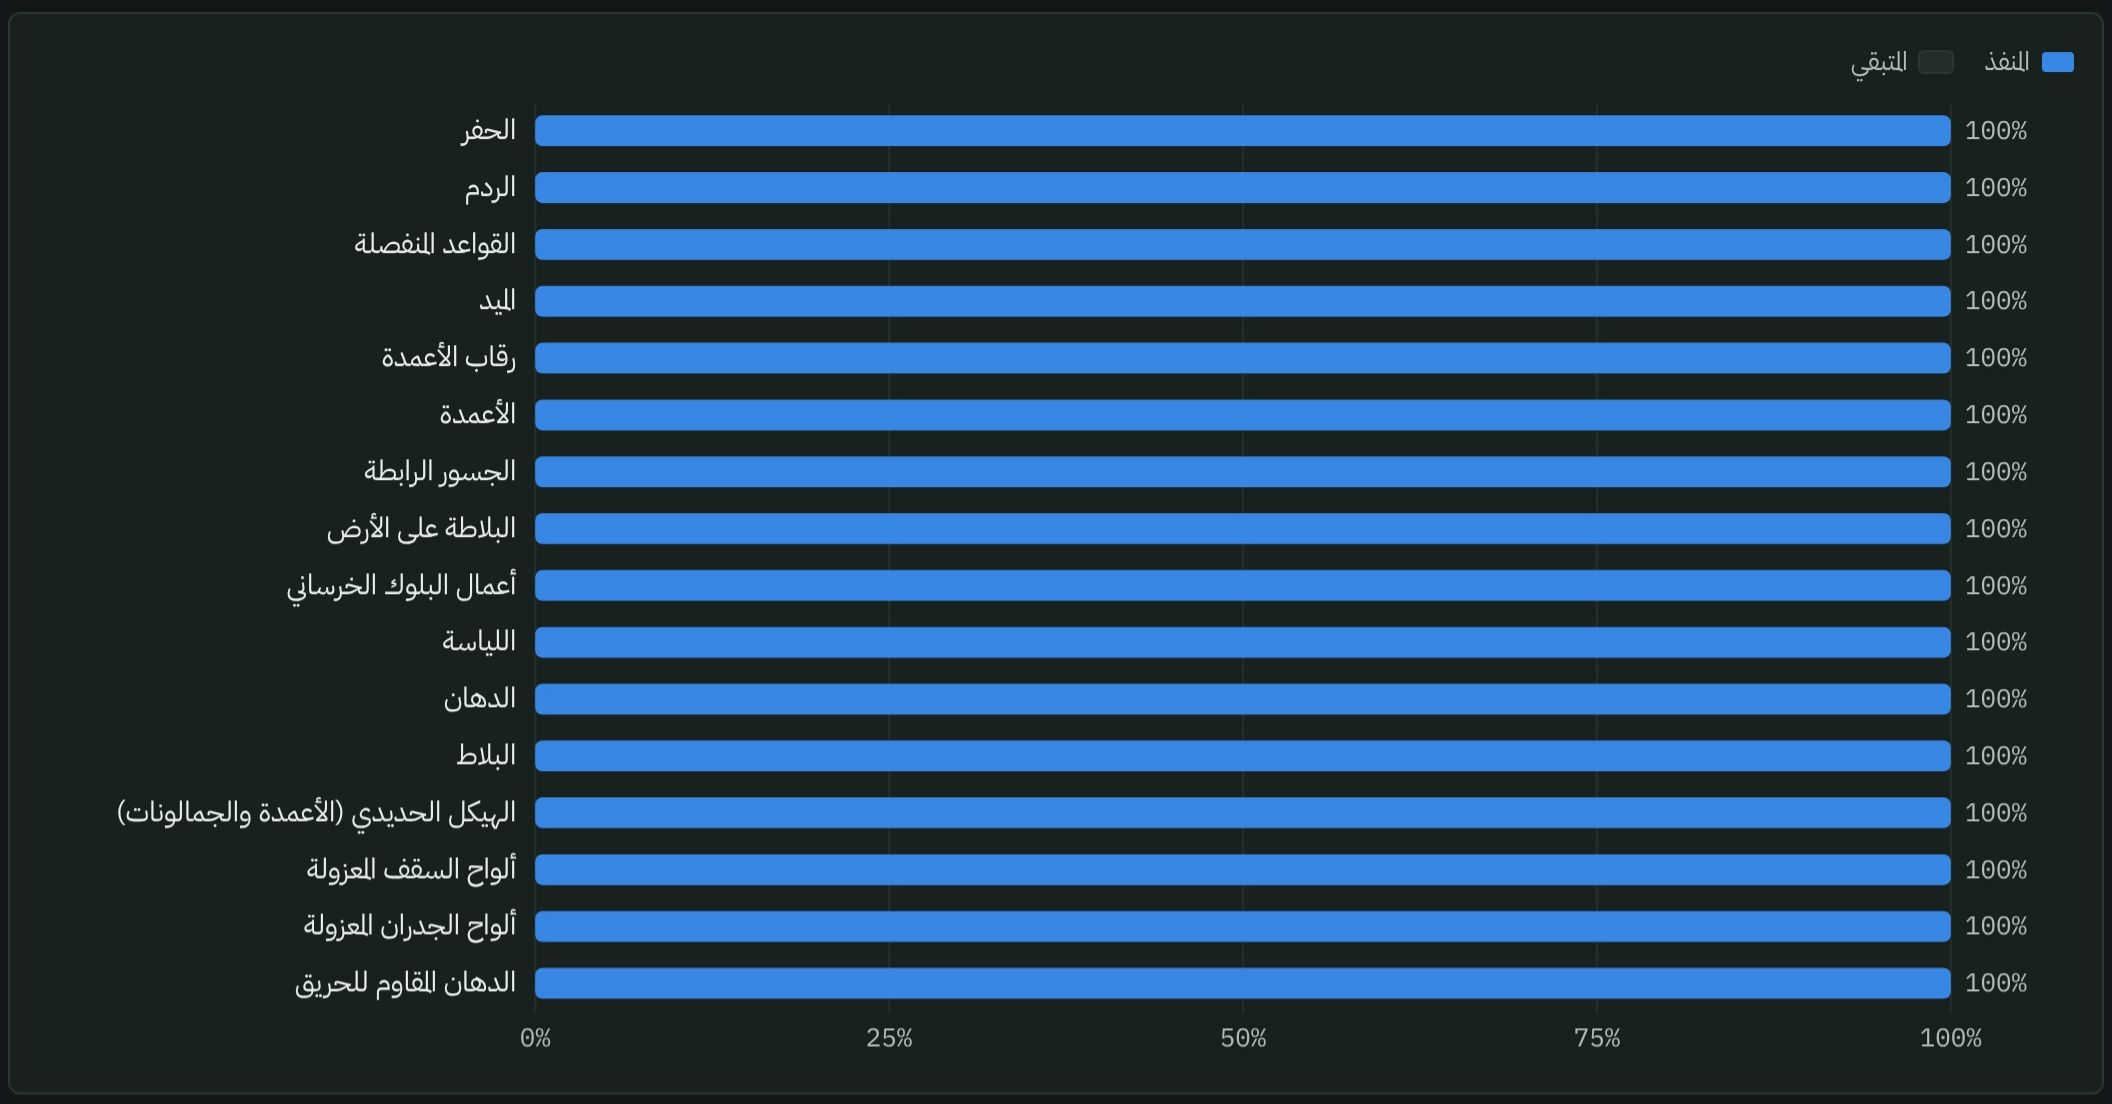

بند النطاق	بند جدول الكميات	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
الحفر	2.1.1	م³	26,030	26,030	0	0	100.0%
الردم	2.1.8	م³	11,950	11,950	0	0	100.0%
القواعد المنفصلة	3.2.1	م³	1,315	1,315	0	0	100.0%
الميد	3.2.2	م³	250	250	0	0	100.0%
رقاب الأعمدة	3.2.4	م³	220	220	0	0	100.0%
الأعمدة	3.2.5	م³	185	185	0	0	100.0%
الجسور الرابطة	3.2.6	م³	75	75	0	0	100.0%
البلاطة على الأرض	3.2.10	م³	3,235	3,235	0	0	100.0%
أعمال البلوك الخرساني	4.1	م²	4,930	4,930	0	0	100.0%
اللياسة	9.2.1	م²	5,355	5,355	0	0	100.0%
الدهان	9.2.2	م²	5,355	5,355	535.5+	0	100.0%
البلاط	9.2.3	م²	2,600	2,600	0	0	100.0%
الهيكل الحديدي (الأعمدة والجمالونات)	11.1.1	عدد	5	5	0	0	100.0%
ألواح السقف المعزولة	11.1.1	عدد	5	5	0	0	100.0%
ألواح الجدران المعزولة	11.1.1	عدد	5	5	0	0	100.0%
الدهان المقاوم للحريق	11.1.5	عدد	5	5	0	0	100.0%

اكتملت جميع الكميات المتابعة.

كان الدهان آخر بند مفتوح: نُفذ هذا الأسبوع 535.5 م² ليرتفع من 4,819.5 م² إلى كامل الكمية 5,355 م². تتابع الورقة بنود المباني فقط، ولا يوجد جدول كميات للطرق والأسوار وتنسيق المواقع والشبكات.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية والتوقع من ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي رقم 43، مع التواريخ الفعلية في تحديث P6.
تحققت جميع المعالم.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	تحديث P6	الحالة
ترسية العقد	09-Nov-2025	09-Nov-2025	–	✓ منجز
توقيع العقد	01-Dec-2025	01-Dec-2025	–	✓ منجز
تسليم الموقع	04-Dec-2025	04-Dec-2025	04-Dec-2025 (فعلي)	✓ منجز
مسح الوضع القائم والتقارير النهائية	04-Jan-2026	04-Jan-2026	04-Dec-2025 (فعلي)	✓ منجز
اكتمال التجهيز	13-Jan-2026	05-Jan-2026 (مبكر 8 أيام)	05-Jan-2026 (فعلي)	✓ منجز
اعتماد المقدمات وطلب المواد طويلة المهلة	14-Apr-2026	28-Jun-2026 (متأخر 75 يوماً)	–	✓ منجز متأخراً
اكتمال الأعمال الترابية	12-Sep-2026	12-Oct-2026 (متأخر 30 يوماً)	–	✓ منجز متأخراً
توريد جميع المعدات والمواد	03-Oct-2026	15-Oct-2026 (متأخر 12 يوماً)	19-Oct-2026 (فعلي)	✓ منجز متأخراً
اكتمال الأعمال المدنية	02-Nov-2026	26-Aug-2026 (مبكر 68 يوماً)	26-Aug-2026 (فعلي)	✓ منجز
اكتمال الأعمال الميكانيكية	28-Oct-2026	08-Oct-2026 (مبكر 20 يوماً)	08-Oct-2026 (فعلي)	✓ منجز
اكتمال الأعمال الكهربائية	19-Sep-2026	31-Oct-2026 (متأخر 42 يوماً)	31-Oct-2026 (فعلي)	✓ منجز متأخراً
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	03-Dec-2026	01-Nov-2026 (مبكر 32 يوماً)	01-Nov-2026 (فعلي)	✓ منجز
اكتمال تسريح الموقع	03-Dec-2026	01-Nov-2026 (مبكر 32 يوماً)	29-Oct-2026 (فعلي)	✓ منجز

تواريخ الخطة الأساسية للمعالم في ملف التقرير لا تطابق الخطة الأساسية في P6.

يذكر ملف التقرير 02-نوفمبر-2026 للأعمال المدنية و28-أكتوبر-2026 للأعمال الميكانيكية و19-سبتمبر-2026 للأعمال الكهربائية، بينما تذكر الخطة الأساسية في P6 التواريخ 14-يوليو-2026 و01-أكتوبر-2026 و26-نوفمبر-2026. ومقارنةً بالخطة الأساسية في P6 انتهت الأعمال المدنية متأخرة 43 يوماً والكهربائية مبكرة 26 يوماً. وتاريخ "المواد" المعروض من P6 هو معلم "اكتمال التصميم الهندسي والمواد".

توريد المواد الرئيسية

بنود المواد المورّدة إلى الموقع حسب التخصص. المصدر: ملخص التوريدات، التقرير الأسبوعي رقم 43.




79 من 81 بند مواد في الموقع.

صدرت أوامر الشراء الـ 81 جميعها. البندان المدنيان دون تاريخ توريد هما مصدات المواقف الخرسانية ودهانات العلامات الأرضية، رغم أن P6 يُظهر تركيب الخطوط المرورية ومصدات العجلات في 28–29 أكتوبر وتوريد دهانات العلامات الأرضية في 15-أكتوبر-2026.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (عمال وموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower، التقرير الأسبوعي رقم 43.

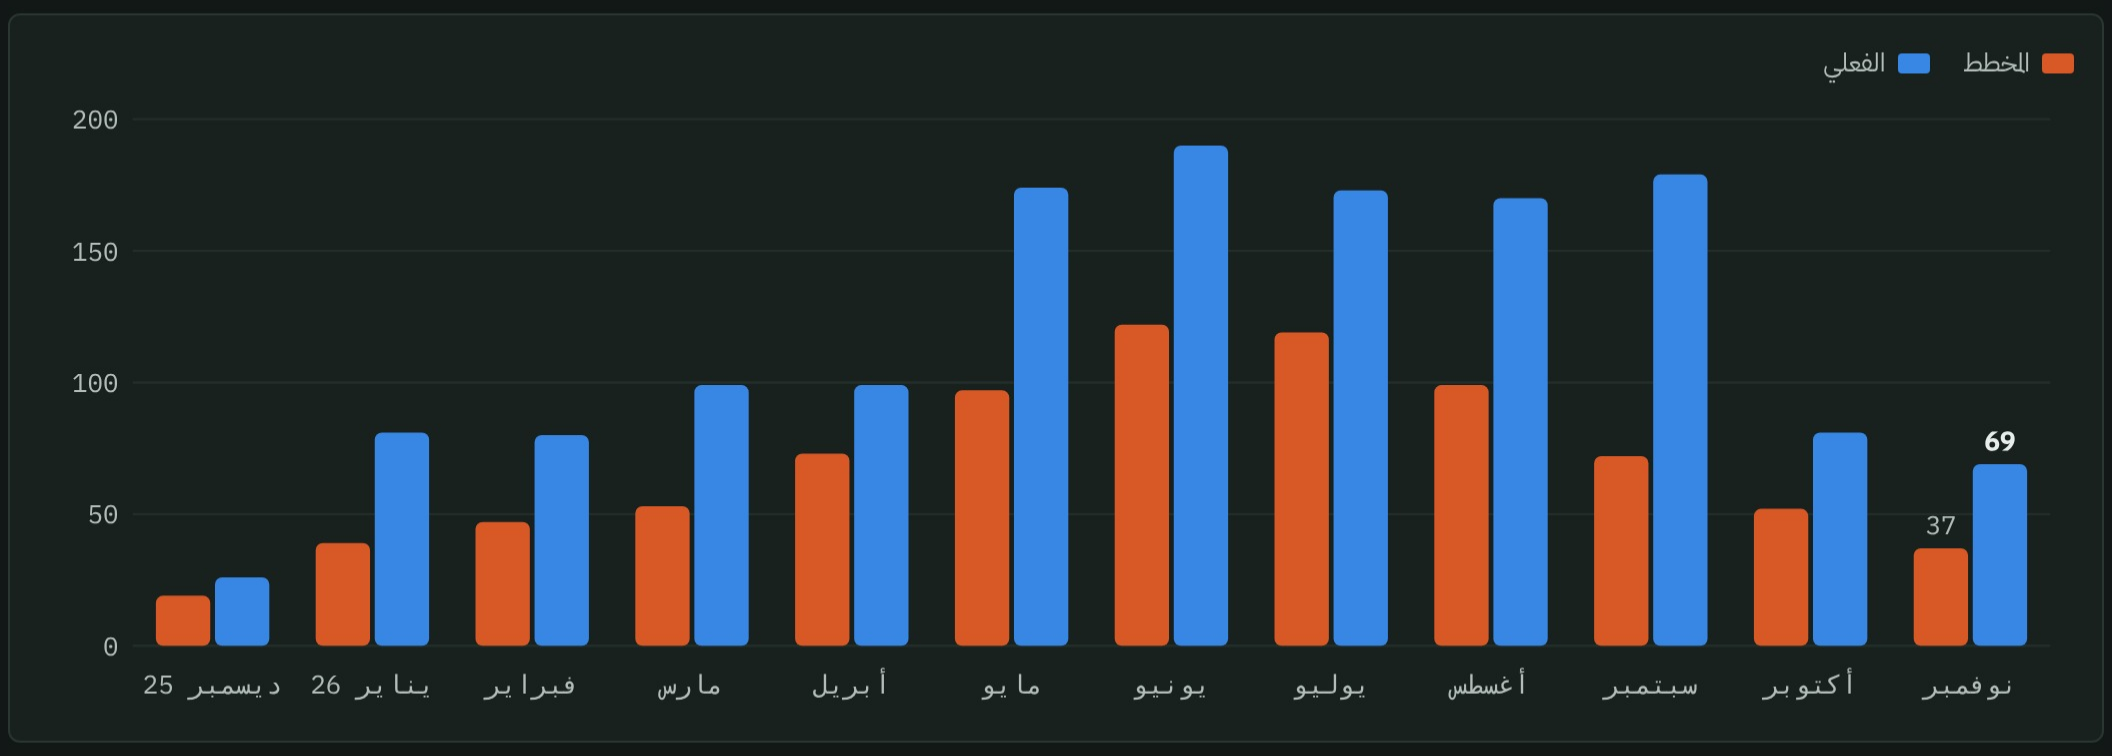

عدد العاملين في نوفمبر 69 مقابل 37 مخطط (17 موظفاً مقابل 7، و52 عاملاً مقابل 30)، بانخفاض عن 81 في أكتوبر. المعدات في الموقع: 11 مقابل 2 مخطط، منها 7 متوقفة. وبلغت الذروة 190 في يونيو 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	44,567,415.90
قيمة العقد المعدلة	44,567,415.90
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0
غير مفوتر بعد	10,523,669.03

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة / المعتمدة / المدفوعة	10 / 10 / 10
القيمة الإجمالية	34,043,746.87
استرداد الدفعة المقدمة	−3,404,374.69
الخصومات والغرامات	−10,000.00
المحتجزات	0
المدفوع حتى تاريخه	30,629,372.18

دُفع المستخلص رقم 10 (من 08-سبتمبر إلى 06-أكتوبر-2026، صافي 7,083,278.97) في 01-نوفمبر-2026. تبلغ نسبة الفوتر 76.4% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 100%. ويخصم السجل استرداد دفعة مقدمة بنسبة 10% رغم أنه لا يسجل أي دفعة مقدمة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.92

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	310,512
ساعات العمل هذا الأسبوع	3,844
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية (تراكمي)	1
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
جلسات التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	206 / 98

الجودة التقييم 0.95

طلبات الفحص الميداني المقدمة / المغلقة (تراكمي)	2,028 / 1,995
طلبات الفحص الميداني المعلقة	33
طلبات الفحص هذا الأسبوع: المقدمة / المغلقة	59 / 80
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	6 / 6
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	8 / 8
طلبات فحص المواد المقدمة / المغلقة	229 / 229
المخططات التنفيذية المعتمدة	166 / 166
اعتمادات المواد	120 / 120

أرقام طلبات الفحص لهذا الأسبوع بالمقارنة مع ملف التقرير رقم 42 (1,969 مقدمة، 1,915 مغلقة).

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
طلبات فحص ميداني معلقة	الاستشاري	ما زال 33 طلب فحص ميداني معلقاً، جميعها أحدث من 10 أيام، بعد الإفادة باكتمال جميع الأعمال.
الفوترة النهائية	المقاول	المفوتر 76.4% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 100%، ويتبقى 10,523,669.03 ريال لم تُفوتر بعد.
سجل التوريدات غير مغلق	المقاول	مصدات المواقف الخرسانية ودهانات العلامات الأرضية دون تاريخ توريد، رغم أنها مركّبة وفق P6.
تاريخ الانتهاء غير محدّث	المقاول	ما زال ملخص ملف التقرير يتوقع الانتهاء في 03-ديسمبر-2026 بانحراف صفري، بينما تُظهر ورقة المعالم وP6 تاريخ 01-نوفمبر-2026.
الطقس	المقاول	الخطر الوحيد المفتوح في السجل: الأمطار والعواصف الرملية، وتقييمه منخفض بعد المعالجة.

يضم سجل المشكلات مشكلة واحدة أُغلقت في 17-مايو-2026: إزالة لوحات كهربائية ووحدة RMU من قبل الشركة السعودية للكهرباء في المجموعة A (المسؤول: مدن).

ملاحظات على البيانات

- ملف التقرير الأسبوعي ليس له نسخة نصية في MD Files، فقُرئ مباشرة من الملف الأصلي (.xlsb) لهذا التقرير. وقُرئ تحديث P6 وتقرير P6 من MD Files.
- يعتمد التقدم الفعلي ومنحنى التقدم على ساعات العمل في ملف التقرير (116,776 ساعة مخططة). أما تقارير P6 المستخدمة للأسبوعين 45 و46 فكانت ميزانيتها 116,740؛ والفرق البالغ 36 ساعة في التوريدات، إذ يستخدم ملف التقرير الساعات المكتسبة كميزانية.
- الأرقام الأسبوعية للتقدم الفعلي في ملف التقرير (1,605 مخططة، 1,504 مكتسبة) مطابقة لملف التقرير رقم 42. وقد حُسب تقدم هذا الأسبوع (+1.6% فعلي، +1.0% مخطط) من الأرقام التراكمية في الملفين.
- أصبحت عدة أنشطة كانت مفتوحة في تحديث P6 بتاريخ 26-أكتوبر-2026 تحمل تواريخ فعلية في ذلك التاريخ أو قبله: السور الحديدي وألواح القاعدة (21–25 أكتوبر)، وزراعة الأشجار والشجيرات (19–26 أكتوبر)، ولوحات تغذية الإنارة (انتهت 19-أكتوبر-2026)، والطبقة الإسفلتية السطحية (انتهت 22-أكتوبر-2026).
- يعرض تقرير P6 الآن أعمدة قائمة على التكلفة فقط، ولم تُستخدم هنا. رمز ملف تحديث P6 هو HAL1-05-13 (-HAL1-05-10 في الأسبوع الماضي) ويذكر بداية مخططة في 14-مارس-2023، وتاريخ بياناته 02-نوفمبر-2026، أي بعد ملف التقرير بيوم.
- تتضمن ورقة التوريدات أخطاء في الوحدات (مثل مضخات الحريق بالمتر المربع ونظام التحكم في الدخول بالمتر المكعب).
- ما زال ملخص ملف التقرير يتوقع الانتهاء في 03-ديسمبر-2026 بانحراف صفري، بينما تُظهر ورقة المعالم وP6 الانتهاء في 01-نوفمبر-2026.
- أسبوع التقرير: تذكر ورقة المعالم "Current Contract Weeks: 47 of 52"، وهو ما يطابق 332 يوماً من تسليم الموقع (04-ديسمبر-2025). وقد ذكر ملف التقرير رقم 42 الأسبوع 47 أيضاً، أي قبل موعده بأسبوع؛ واستخدم تقرير الأسبوع الماضي الأسبوع 46.
- إحدى الصور مختومة بتاريخ 02-نوفمبر-2026، أي بعد تاريخ البيانات بيوم. ولا تحمل أي صورة ختم GPS.
