برنامج المصانع الجاهزة و المنتجات الجديدة الحزمة الثالثة (المحفظة الاستثمارية) - حائل 20 مصنع 900 متر

Ready-Built Factories Program, Package 3: 20 Factories of 900 m² in Hail

المالك	التقرير الأسبوعي	بدء المشروع	انتهاء العقد	الانتهاء المتوقع في P6	أنشطة الجدول الزمني
مدن	رقم 42	04-Dec-2025	03-Dec-2026	04-Nov-2026	1,827

النطاق: 20 مصنعاً جاهزاً مساحة كل منها 900 م² في خمس مجموعات (A إلى E)، مع أعمال الموقع والشبكات والأعمال الخارجية والطرق وتنسيق المواقع.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 98.4% مقابل 97.9% مخطط، أي متقدم بنسبة 0.6%. وتقدّم المشروع هذا الأسبوع بنسبة 1.3% مقابل 1.4% مخطط. بلغ التنفيذ 98.2% والاختبار والتشغيل 99.0%، لكن إغلاق المشروع لم يبدأ رغم أن المخطط له حتى الآن 40.1%.

نسبة الإنجاز الفعلي
98.4% / 97.9% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.01 +0.6%

التقدم هذا الأسبوع
+1.3% / +1.4% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.1%

المدة المنقضية من العقد
89.6% · اليوم 326 من 364
▲ انتهاء P6: 04-نوفمبر-2026

أنشطة الجدول المكتملة
96.3% · 1,759 من 1,827
18 قيد التنفيذ، 50 لم تبدأ

تأخر الانتهاء المتوقع يومين إلى 04-نوفمبر-2026، وما زال مبكراً بـ 29 يوماً، دون أي فائض زمني.

كان تحديث P6 للأسبوع الماضي يُنهي المشروع في 02-نوفمبر-2026. لم يُكتسب أي من ساعات العمل الـ 231 المخططة لإغلاق المشروع: المخططات كما نُفذت والضمانات المستحقة بين 26 و28 أكتوبر لم تبدأ، وفائضها صفر. ولم تتقدم الأسوار والبوابات هذا الأسبوع، وهي عند 67.1% مقابل 100% مخطط.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ملف التقرير الأسبوعي رقم 42. تحمل إحداها ختم تاريخ 24-أكتوبر-2026، ولا تحمل البقية ختم تاريخ. تستمر أعمال الأسفلت والرصف حول المصانع، ويجري تشطيب الصالات من الداخل. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



دمك الأسفلت
دحّال مطاطي على الأسفلت الجديد أمام وحدات المصانع.



داخل صالة المصنع
الأرضية منتهية، ومجاري التكييف والإنارة مركّبة.



أعمال الطرق والرصف

معدات الرصف والدحّالات بجانب مصنع، ورصف الإنترلوك في المقدمة. الختم 24-أكتوبر-2026، 08:05، العنوان المختصر HAAA4119.



ألواح الجدران الداخلية

ألواح جدران معزولة مع تمديدات مواسير الإطفاء مركّبة.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يقاس بعدد ساعات العمل المخططة (وحدات العمالة في P6).
المصدر: تقرير تحديث P6 رقم 42، تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	0.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	12.6%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	23.5%	100.1%	100.1%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التنفيذ	59.1%	97.7%	98.2%	+0.5	1.00	▲ في المسار
الاختبار والتشغيل	3.4%	84.6%	99.0%	+14.3	1.17	▲ متقدم
إغلاق المشروع وتسريح الموقع	0.5%	40.1%	0.0%	−40.1	0.00	▼ لم يبدأ
الإجمالي	100%	**97.9%**	**98.4%**	**+0.6**	**1.01**	▲ في المسار

الأوزان هي حصة كل مرحلة من 116,740 ساعة عمل مخططة. تسميات هيكل تجزئة العمل في الجدول تذكر أوزاناً مختلفة (التصميم 3%، التوريدات 27%، التنفيذ 60%، الاختبار والتشغيل 10%). في الأسبوع الماضي كان المشروع عند 97.2% مقابل 96.5% مخطط. يضم تحديث P6 عدد 1,827 نشاطاً: 1,759 مكتمل و18 قيد التنفيذ و50 لم تبدأ.

نطاق العمل: مجموعات المصانع

ساعات العمل المخططة والمكتسبة لكل مجموعة مصانع وللبنية التحتية للموقع حسب التخصص، من تقرير تحديث P6 رقم 42. لم تُرفع جداول كميات. عمود "هذا الأسبوع" هو ساعات العمل المكتسبة منذ تقرير P6 بتاريخ 19-أكتوبر-2026.

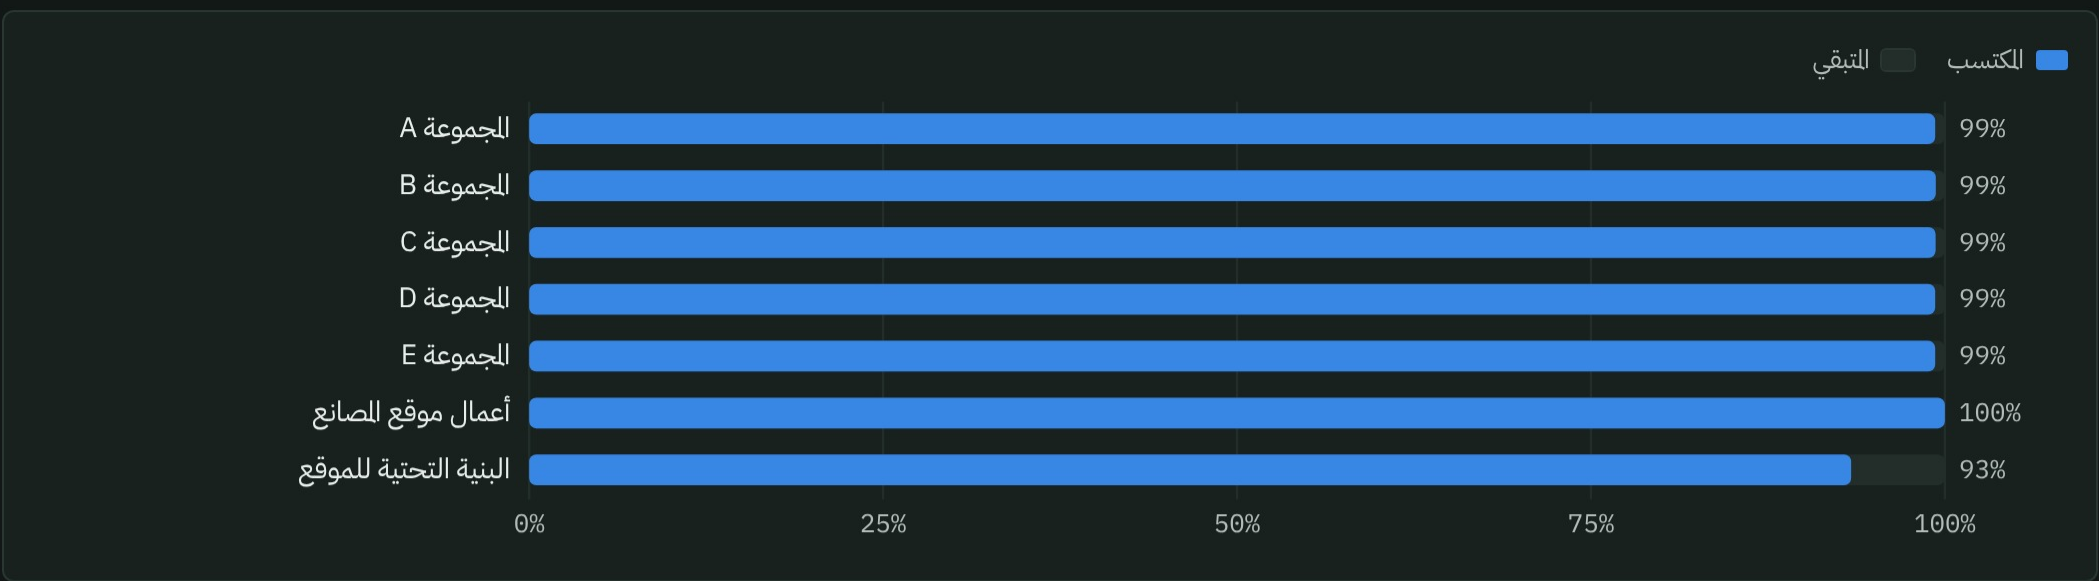

بند النطاق	التخصص	الوحدة	المخطط	المكتسب	هذا الأسبوع	المتبقي	% الإنجاز
المجموعة A	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	3,008	3,008	0	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	0	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,928	2,880	171+	48	98.4%
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	0	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,264	1,238	33+	26	97.9%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,800**	**10,726**	**204+**	**74**	**99.3%**
المجموعة B	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	3,072	3,072	0	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	0	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,992	2,944	171+	48	98.4%
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	0	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,248	1,226	16+	22	98.2%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,912**	**10,842**	**187+**	**70**	**99.4%**
المجموعة C	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	2,960	2,960	0	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	0	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,896	2,848	171+	48	98.3%
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	0	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,248	1,226	13+	22	98.2%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,704**	**10,634**	**184+**	**70**	**99.3%**
المجموعة D	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	3,008	3,008	0	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	0	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,928	2,880	171+	48	98.4%
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	0	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,264	1,238	17+	26	97.9%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,800**	**10,726**	**188+**	**74**	**99.3%**
المجموعة E	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	3,040	3,040	0	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	0	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,896	2,848	171+	48	98.3%

بند النطاق	التخصص	الوحدة	المخطط	المكتسب	هذا الأسبوع	المتبقي	% الإنجاز
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	0	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,280	1,254	34+	26	98.0%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,816**	**10,742**	**205+**	**74**	**99.3%**
أعمال موقع المصانع	الكل	ساعة عمل	1,808	1,808	0	0	100.0%
البنية التحتية للموقع	أعمال الموقع	ساعة عمل	1,376	1,376	0	0	100.0%
	الشبكات	ساعة عمل	4,960	4,960	0	0	100.0%
	الأعمال الخارجية: ميكانيكية	ساعة عمل	2,384	2,384	0	0	100.0%
	الأعمال الخارجية: كهربائية	ساعة عمل	624	600	16+	24	96.2%
	الأعمال الكهربائية الخارجية	ساعة عمل	1,136	1,032	24+	104	90.8%
	الأسوار والبوابات	ساعة عمل	1,360	912	0	448	67.1%
	أعمال الطرق	ساعة عمل	1,136	1,032	250+	104	90.8%
	تنسيق المواقع	ساعة عمل	192	0	0	192	0.0%
	الإجمالي	ساعة عمل	**13,168**	**12,296**	**290+**	**872**	**93.4%**

المجموعات: منجزة بنسبة 99.3–99.4%

اكتملت الأعمال المعدنية وتشطيبات الجدران في كل المجموعات. الأعمال المعمارية عند 98.3–98.4%: لم تبدأ لوحات التعريف في أي مجموعة، والأعمال الخاصة عند 70–75%. الأعمال الكهربائية عند 97.9–98.2%، ونظام التحكم في الدخول عند 80% ووحدات مراقبة إنذار الحريق عند 70% في كل مجموعة.

البنية التحتية للموقع: 93.4%

اكتسبت أعمال الطرق 250 ساعة عمل هذا الأسبوع وبلغت 90.8%، متقدمة على 77.3% مخطط؛ ولم يتبقَّ للبدء سوى الخطوط المرورية ومصدات العجلات. لم تتقدم الأسوار والبوابات (67.1% مقابل 100% مخطط). ولم يبدأ تنسيق المواقع (الأشجار والشجيرات) رغم أن المخطط 40.6%.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية وتوقعات P6 من تقرير تحديث P6 رقم 42، والفائض الكلي من ملف تحديث P6 (XER).
لا تتوفر نسخة نصية من ملف التقرير الأسبوعي، لذا لم يمكن مقارنة توقعاته.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع تحديث P6	التغير (أيام)	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	04-Dec-2025	04-Dec-2025 (فعلي)	0	–	✓ منجز
بدء التنفيذ	24-Dec-2025	28-Dec-2025 (فعلي)	+4	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	04-Jan-2026	05-Jan-2026 (فعلي)	+1	–	✓ منجز
تسوية الموقع والطرق المحلية والمواقف	07-Jan-2026	05-Jan-2026 (فعلي)	−2	–	✓ منجز
بدء الشبكات	03-Jun-2026	05-May-2026 (فعلي)	−29	–	✓ منجز
اكتمال التصميم الهندسي والمواد	09-Apr-2026	19-Oct-2026 (فعلي)	+193	–	✓ منجز
اكتمال الأعمال المدنية	14-Jul-2026	26-Aug-2026 (فعلي)	+43	–	✓ منجز
اكتمال الأعمال البيئية	11-Oct-2026	19-Sep-2026 (فعلي)	−22	–	✓ منجز
اكتمال الأعمال الميكانيكية	01-Oct-2026	08-Oct-2026 (فعلي)	+7	–	✓ منجز
اكتمال الاختبار والتشغيل	25-Oct-2026	27-Oct-2026	+2	7.5	▼ متأخر
اكتمال الأعمال المعمارية	04-Oct-2026	28-Oct-2026	+24	4.0	▼ متأخر
اكتمال الأعمال الكهربائية	26-Nov-2026	28-Oct-2026	−29	4.0	● في الموعد
اكتمال التنفيذ	09-Nov-2026	28-Oct-2026	−12	6.7	● في الموعد
اكتمال الأعمال الخارجية	09-Nov-2026	28-Oct-2026	−12	4.7	● في الموعد
انتهاء المشروع	03-Dec-2026	04-Nov-2026	−29	0	● فائض صفري

يُتوقع انتهاء التنفيذ في 28-أكتوبر-2026، ويمر المسار الحرج الآن بأعمال الإغلاق والتسليم.

أُغلقت معالم التصميم الهندسي والمواد والأعمال المدنية والميكانيكية والبيئية بتواريخ فعلية. ما زالت الأعمال المعمارية متأخرة 24 يوماً عن الخطة الأساسية، والاختبار والتشغيل يومين. انتقل انتهاء المشروع من 02-نوفمبر-2026 إلى 04-نوفمبر-2026 دون فائض زمني: فالمخططات كما نُفذت والضمانات والأدلة ومعالجة الملاحظات والتسليم الابتدائي كلها على المسار الحرج.

توريد المواد الرئيسية

نسبة ساعات عمل التوريدات المكتسبة إلى المخططة لكل حزمة مواد. المصدر: تقرير تحديث P6 رقم 42.



تم توريد جميع حزم المواد.

لكل حزم المواد طويلة وقصيرة المهلة تاريخ انتهاء فعلي للتوريد إلى الموقع. آخر الحزم، مواد الأعمال الخارجية، انتهت في 15-أكتوبر-2026. تُظهر المواد الميكانيكية قصيرة المهلة 8,272 ساعة عمل مكتسبة مقابل 8,236 مخططة.

المشكلات والمخاطر القائمة

مستخلصة من الأنشطة المفتوحة في تحديث P6. سجل المشكلات الخاص بالتقرير الأسبوعي موجود في ملف لا تتوفر له نسخة نصية.

المشكلة	المجال	التفاصيل
الإغلاق لم يبدأ	إغلاق المشروع	0 من 576 ساعة عمل مكتسبة مقابل 231 مخططة (40.1%). المخططات كما نُفذت (الإعداد والمراجعة) والضمانات المستحقة بين 26 و28 أكتوبر لم تبدأ وفائضها صفر. يليها التدريب والأدلة ومعالجة الملاحظات والتسليم الابتدائي من 29-أكتوبر-2026 إلى 04-نوفمبر-2026، بفائض من 0 إلى 0.5 يوم.
توقف الأسوار والبوابات	البنية التحتية للموقع	لا تقدم هذا الأسبوع: 912 من 1,360 ساعة عمل (67.1%) مقابل 100% مخطط. لم يبدأ تركيب ألواح القاعدة والعناصر الحديدية والسور الحديدي والبوابات، بفائض يوم واحد، وتنتهي في 02-نوفمبر-2026.
الأعمال الكهربائية الخارجية	البنية التحتية للموقع	90.8% مقابل 100% مخطط. التأريض عند 50%، ولوحات تغذية الإنارة وعدادات الكهرباء عند 0%، بفائض 0.5 يوم.
تنسيق المواقع لم يبدأ	البنية التحتية للموقع	كان من المقرر بدء زراعة الأشجار والشجيرات في 26-أكتوبر-2026 (المخطط 40.6%، المكتسب 0%)، بفائض يوم واحد.
تشطيبات المباني	المجموعات A إلى E	لم تبدأ لوحات التعريف في أي مجموعة. ونظام التحكم في الدخول (80%) ووحدات مراقبة إنذار الحريق (70%) ما زالت قيد التنفيذ في كل مجموعة، بفائض من 4 إلى 7 أيام.

ملاحظات على البيانات

- ملف التقرير الأسبوعي (رقم 42، بتاريخ 26-أكتوبر-2026) ليس له نسخة نصية في MD Files. لم يمكن استخدام أرقامه لمنحنى التقدم والقوى العاملة والتكلفة والمستخلصات والصحة والسلامة والجودة، لذا حُذفت هذه الأقسام. لا يذكر أي ملف نصي اسم المقاول أو الاستشاري أو مدير المشروع. استُخدمت صوره فقط.
- التقدم الفعلي هو وحدات العمالة المكتسبة في P6 مقسومة على وحدات العمالة المخططة، من تقرير تحديث P6: 116,740 ساعة عمل للمشروع، و114,247 مخططة حتى تاريخه، و114,925 مكتسبة. ويُحسب تقدم هذا الأسبوع بالمقارنة مع تقرير 19-أكتوبر-2026 (112,642 مخططة، 113,420 مكتسبة).

- يسجل تحديث P6 الآن اكتمال الأعمال المدنية في 26-أغسطس-2026 والأعمال الميكانيكية في 08-أكتوبر-2026، رغم أن تحديث الأسبوع الماضي كان ما زال يتوقعهما في 19-أكتوبر-2026 و24-أكتوبر-2026، أي أن التواريخ الفعلية أُدخلت بأثر رجعي.
- أسماء الملفات تستخدم رمز المشروع HAL1-05-009، بينما رمز ملف تحديث P6 هو HAL1-05-10.
- يذكر ملف تحديث P6 بداية مخططة في 14-مارس-2023، بينما بدأ المشروع في 04-ديسمبر-2025. وتواريخ البدء والانتهاء للأنشطة المكتملة فيه لاحقة لتواريخها الفعلية (مثلاً بدء المشروع 29-ديسمبر-2025 مقابل 04-ديسمبر-2025 فعلياً).
- ساعات العمل المكتسبة والمخططة للتوريدات (27,496) تتجاوز الميزانية (27,460)، لأن أوامر شراء المواد الميكانيكية قصيرة المهلة تُظهر 2,480 مكتسبة مقابل 2,444 مخططة.
- تظهر الطبقة الإسفلتية السطحية وطبقة اللصق مكتملتين 100% منذ أسبوعين، لكنهما ما زالتا قيد التنفيذ دون تاريخ انتهاء فعلي.
- أسبوع التقرير: لا تذكر الملفات أسبوع العقد، لذا فالأسبوع 46 هو عدد الأسابيع الكاملة من بدء المشروع (04-ديسمبر-2025) إلى تاريخ البيانات (326 يوماً). "رقم 42" هو الرقم التسلسلي للتقرير الأسبوعي وليس رقم الأسبوع.
- تحمل صورة واحدة فقط ختم تاريخ (24-أكتوبر-2026 مع رمز العنوان المختصر)، ولا تحمل أي صورة ختم GPS.
