تطوير شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بسدير المرحلة الثالثة

Infrastructure Network Development, Sudair City for Industry and Business

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة تطوير التقنية للمقاولات (TDC)	إيجيس (EGIS)	م. زياد الشبات	06-Jan-2026	05-Jul-2027

النطاق: أعمال الطرق والرصف، وشبكات مياه الشرب والمياه المعالجة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والري وتنسيق المواقع، والشبكة الكهربائية (الجهد المتوسط والاتصالات وإنارة الطرق) وكاميرات المراقبة في المنطقتين A وG، خلال 18 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في 26-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 46.4% مقابل 42.2% مخططاً، أي أن المشروع متقدم بنسبة 4.3% (مؤشر الأداء الزمني 1.10). وأنجز هذا الأسبوع 0.99% مقابل 1.49% مخططاً، فتقلص التقدم من 4.8% إلى 4.3%، وهو التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي. أعمال الطرق وشبكتا السيول والصرف الصحي متقدمة، بينما التوريدات والتصميم الهندسي والأعمال الكهربائية وكاميرات المراقبة متأخرة.

نسبة الإنجاز الفعلي
46.4% / 42.2% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.10 +4.3%

التقدم هذا الأسبوع
+0.99% / +1.49%
مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.50%

المدة المنقضية من العقد
53.8% · اليوم 293 من 545
● انتهاء P6: 05-يوليو-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
14.6% · 24.6 مليون ريال
4 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

المشروع متقدم إجمالاً، لكن التقدم يتقلص والتوريدات لا تزال متأخرة.

جاء تقدم هذا الأسبوع (0.99%) مرة أخرى أقل من الخطة الأسبوعية (1.49%). التوريدات عند 60.4% مقابل 99.4% مخططاً (مؤشر الأداء 0.61): لم تُورَّد بعد تمديدات الجهد المتوسط (0 من 51,500 م) ولا المحطات الفرعية ولا أعمدة الإنارة ولا لوحات الإنارة، ولا يزال الموقع النهائي للمحطة الفرعية بانتظار التأكيد بين المالك والشركة السعودية للكهرباء. ولا يزال تحديث P6 يُنهي المشروع في تاريخ العقد 05-يوليو-2027 بفائض زمني صفر، لكن الفائض الزمني لمعلمي الجهد المتوسط والطرق انخفض 6 أيام هذا الأسبوع.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ورقة "Weekly Progress Photos" في التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026، ولا تحمل أي منها ختم تاريخ ظاهراً. غلبت أعمال الطرق في المنطقة A على هذا الأسبوع: طبقة الأساس الإسفلتية على MC20، وتسوية طبقة الأساس ودمكها ورش الطبقة التمهيدية على MC10، وتسوية طبقة ما تحت الأساس على MCG0. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



طبقة الأساس الإسفلتية، MC20 المنطقة A

فرش الطبقة الإسفلتية الأولى لطبقة الأساس.



دمك الأسفلت، MC20 المنطقة A

دحّالات تدمك الطبقة الإسفلتية الأولى لطبقة الأساس.



تسوية طبقة الأساس، MC10 المنطقة A

فرش طبقة الأساس وتسويتها على الطريق الشرياني.



دمك طبقة الأساس، MC10 المنطقة A

دمك طبقة الأساس.



الطبقة التمهيدية (MC1)، MC10 المنطقة A

رش MC1 على طبقة الأساس.




تسوية طبقة ما تحت الأساس، MCG0 المنطقة A

جريدر يسوّي طبقة ما تحت الأساس.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، بنقاط شهرية مؤرخة في اليوم السادس من كل شهر.
المصدر: ورقة Physical-Chart Data. لا توجد خطة معدلة.

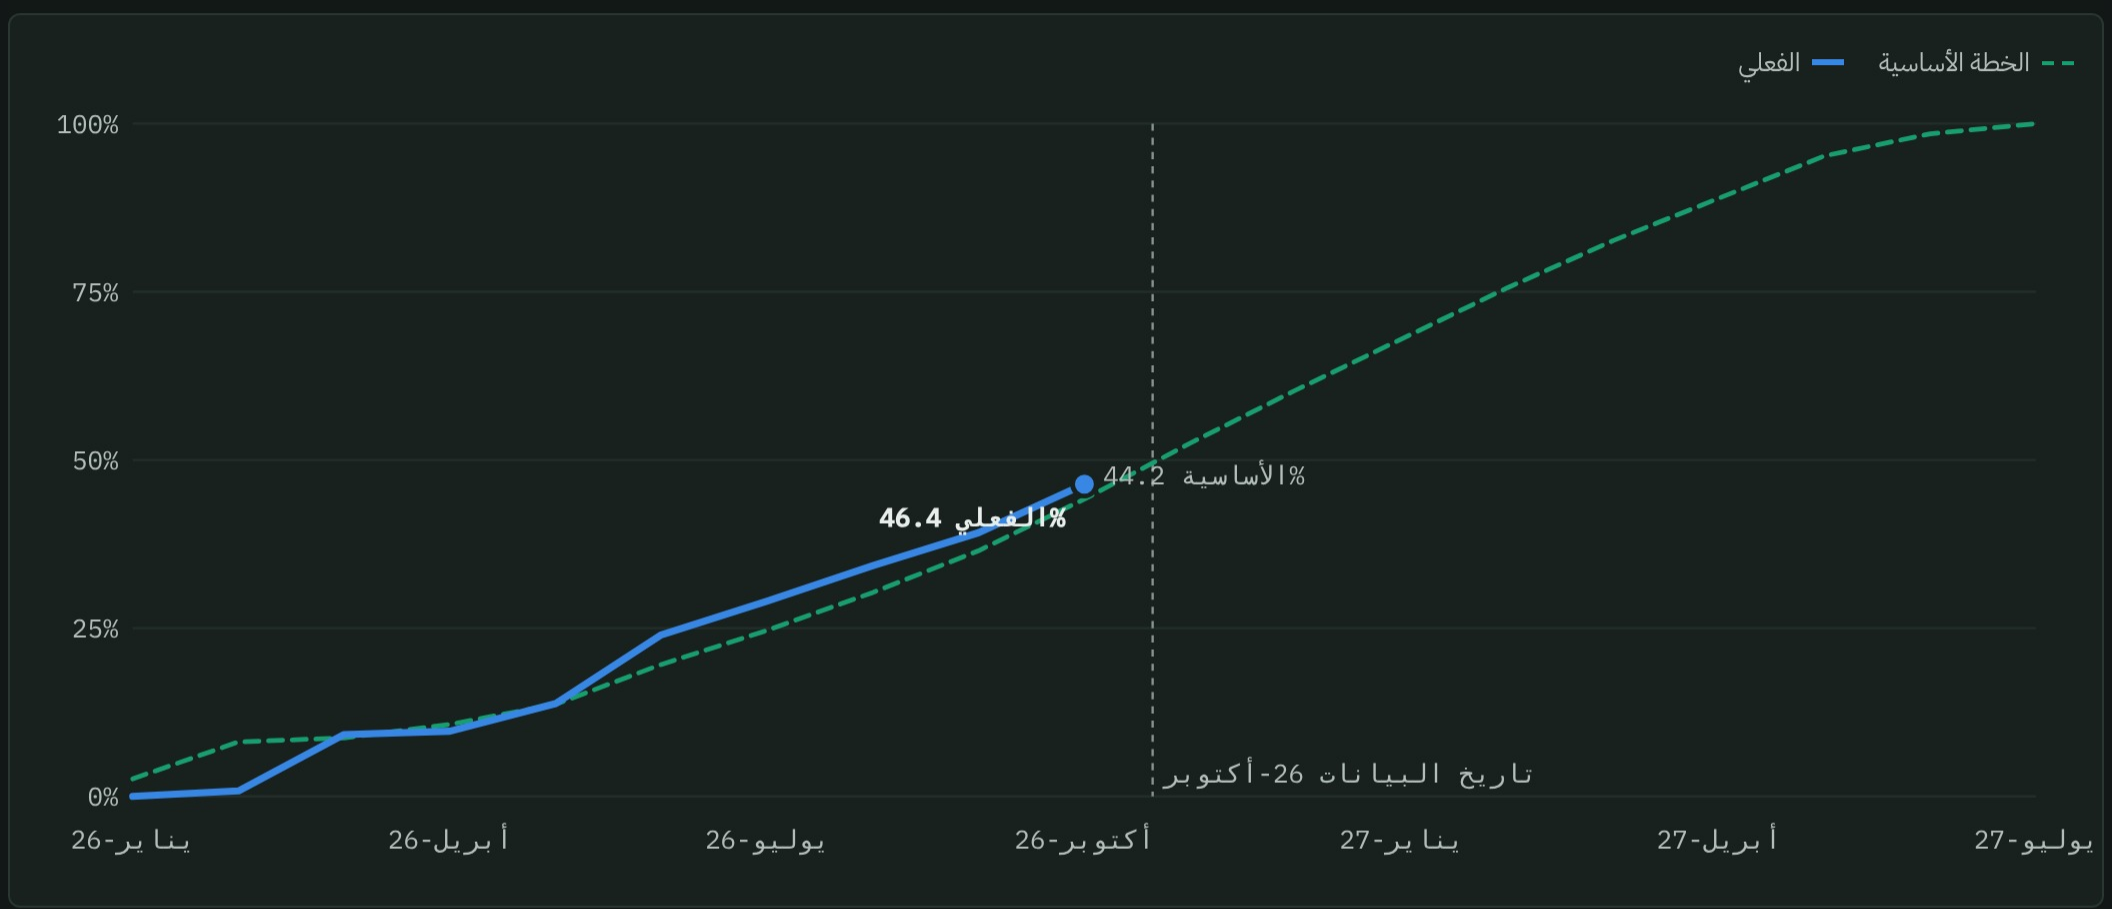

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
12-Oct-2026	39.10	44.79	+5.69	–	1.15
19-Oct-2026	40.66	45.43	+4.77	+0.64	1.12
26-Oct-2026	**42.15**	**46.41**	**+4.26**	**+0.99**	**1.10**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 19 و26 أكتوبر 2026. صف 12-أكتوبر-2026 هو قيمة الأسبوع السابق الواردة في تقرير 19 أكتوبر، ولا يُذكر المنجز الأسبوعي له. نقطة أكتوبر في المنحنى (44.2% مخطط) مؤرخة 06-أكتوبر، بينما يخطط التقرير الأسبوعي 42.2% حتى 26-أكتوبر؛ انظر ملاحظات على البيانات.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. صفوف الشبكات جزء من التنفيذ، وأوزانها حصص من المشروع كاملاً. المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5%	100.0%	93.4%	−6.6%	0.93	▼ متأخر
التوريدات	13%	99.4%	60.4%	−39.0%	0.61	▼ متأخر
التنفيذ	75%	28.3%	41.2%	+12.9%	1.45	▲ متقدم
· أعمال الطرق	16.4%	74.7%	81.7%	+6.9%	1.09	▲ متقدم
· تصريف مياه الأمطار	16.5%	22.0%	46.4%	+24.4%	2.11	▲ متقدم
· الصرف الصحي	5.5%	9.2%	72.7%	+63.5%	7.92	▲ متقدم
· المياه المعالجة	7.7%	0.0%	6.6%	+6.6%	–	▲ بدأ مبكراً
· مياه الشرب	12.3%	0.0%	15.0%	+15.0%	–	▲ بدأ مبكراً
· الأعمال الكهربائية	8.7%	50.9%	35.7%	−15.2%	0.70	▼ متأخر
· تنسيق المواقع والري	6.8%	0.0%	4.7%	+4.7%	–	▲ بدأ مبكراً
· كاميرات المراقبة	1.2%	36.9%	12.2%	−24.7%	0.33	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإغلاق	2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**42.2%**	**46.4%**	**+4.3%**	**1.10**	▲ متقدم

يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026) عدد 2,115 نشاطاً: 792 مكتملاً و343 قيد التنفيذ و980 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 05-يوليو-2027، وهو تاريخ انتهاء العقد.

نطاق العمل: الكميات

الكمية المنفذة في الموقع للبنود الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026.
ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير منذ تقرير 19-أكتوبر-2026. لا يقسّم التقرير الكميات حسب المنطقة.
جدول النطاق في صفحة الملخص يُظهر 0 منفذاً لكل الشبكات ولم يُستخدم.

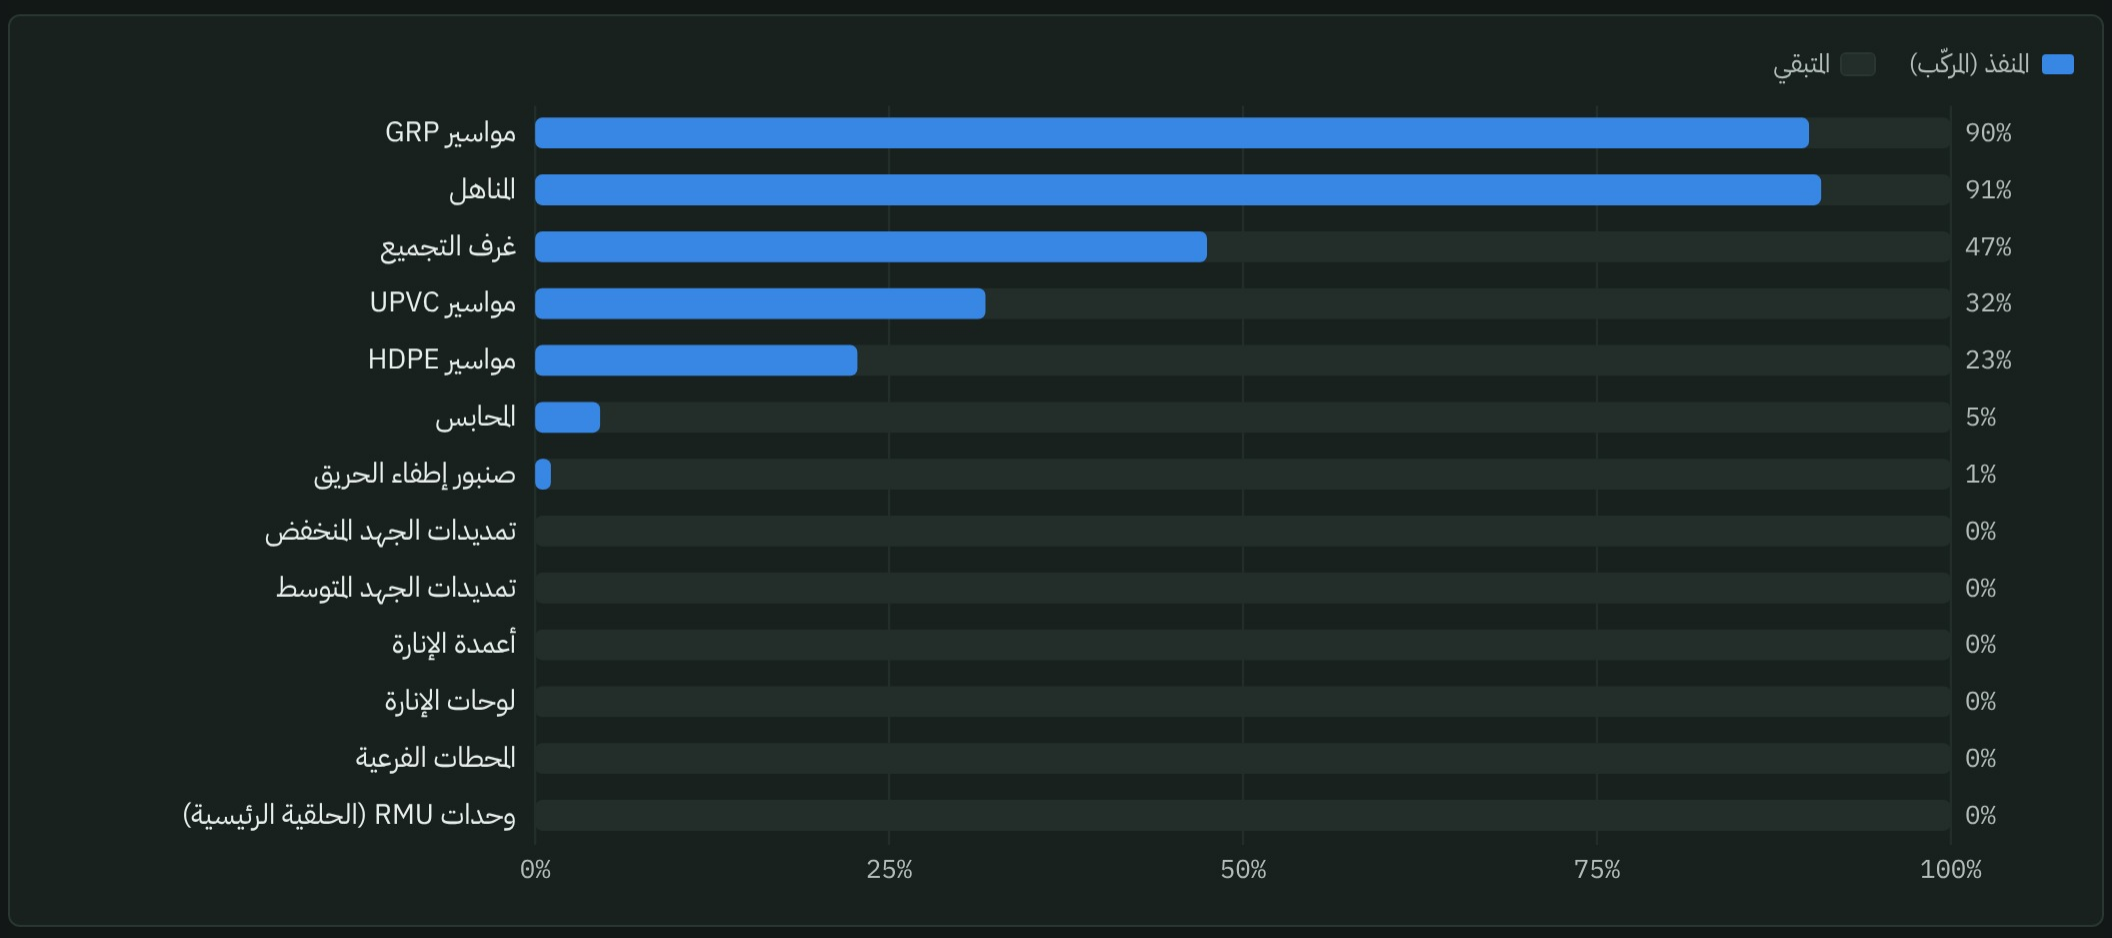

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
مواسير GRP	جميع المناطق	م	18,337	16,500	0	1,837	90.0%	–
المناهل	جميع المناطق	عدد	251	228	3+	23	90.8%	–
غرف التجميع	جميع المناطق	عدد	295	140	20+	155	47.5%	–
مواسير UPVC	جميع المناطق	م	4,716	1,500	300+	3,216	31.8%	–
مواسير HDPE	جميع المناطق	م	28,557	6,500	500+	22,057	22.8%	–
المحابس	جميع المناطق	عدد	218	10	0	208	4.6%	–
صنبور إطفاء الحريق	جميع المناطق	عدد	90	1	0	89	1.1%	–
تمديدات الجهد المنخفض	جميع المناطق	م	68,400	0	0	68,400	0.0%	–
تمديدات الجهد المتوسط	جميع المناطق	م	51,500	0	0	51,500	0.0%	–
أعمدة الإنارة	جميع المناطق	عدد	592	0	0	592	0.0%	–
لوحات الإنارة	جميع المناطق	عدد	52	0	0	52	0.0%	–
المحطات الفرعية	جميع المناطق	عدد	5	0	0	5	0.0%	–
وحدات RMU (الحلقية الرئيسية)	جميع المناطق	عدد	11	0	0	11	0.0%	–

الشبكات الرطبة متقدمة، مع إضافات محدودة هذا الأسبوع

مواسير GRP مركّبة بنسبة 90% (16,500 من 18,337 م، دون تغيير هذا الأسبوع) والمناهل 91% (228 من 251، منها 3 هذا الأسبوع). وأُضيف هذا الأسبوع أيضاً 20 غرفة تجميع (الآن 47%) و300 م من مواسير UPVC (32%) و500 م من مواسير HDPE (23%).

لم تبدأ أو بالكاد بدأت

صنبور إطفاء الحريق (1 من 90) والمحابس (10 من 218) بالكاد بدأت. لم يُركّب بعد أي من تمديدات الجهد المنخفض أو المتوسط أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإنارة أو المحطات الفرعية أو وحدات RMU.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث جدول P6 تواريخ مختلفة لعدة معالم. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول.
تواريخ الخطة الأساسية لآخر أربعة معالم تعاقدية مأخوذة من الجدول الأساسي المعتمد المرفوع مع الأسبوع السابق.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	06-Jan-2026	06-Jan-2026	06-Jan-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
انتهاء التجهيز	05-Feb-2026	05-Feb-2026	06-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم الخطة الأساسية	05-Feb-2026	06-Apr-2026 (+60 يوماً)	06-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
مختبر الجودة	05-Feb-2026	16-Feb-2026 (+11 يوماً)	–	–	✓ منجز
RBF	05-Feb-2026	16-Feb-2026 (+11 يوماً)	–	–	✓ منجز
التقديمات الفنية (المخططات والمواد)	05-Mar-2026	16-Aug-2026 (+164 يوماً)	25-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
انتهاء مرحلة التصميم الهندسي	05-Mar-2026	28-Sep-2026 (+207 يوماً)	26-Oct-2026	77	▼ متأخر
انتهاء مرحلة التوريدات	23-Jan-2027	17-Jan-2027	29-Dec-2026	30	● في المسار
اكتمال أعمال الجهد المتوسط	21-Jan-2027	–	27-Feb-2027	21	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع أعمال الشبكات	04-May-2027	–	21-Apr-2027	59	● في المسار
اكتمال أعمال الطرق	14-Apr-2027	–	24-Apr-2027	12	▼ معرّض للتأخير
اكتمال أعمال التشطيبات	05-Jul-2027	–	29-Jun-2027	5.7	● في المسار
انتهاء المشروع (جميع الأعمال)	05-Jul-2027	05-Jul-2027	05-Jul-2027	0	● في الموعد

يختلف التقرير الأسبوعي وتحديث P6 في تواريخ أربعة معالم.

انتهى التجهيز في 05-فبراير-2026 حسب التقرير الأسبوعي، وفي 06-أبريل-2026 حسب P6. وانتهت التقديمات الفنية في 16-أغسطس-2026 حسب التقرير الأسبوعي، وفي 25-يوليو-2026 حسب P6. ويتوقع التقرير الأسبوعي انتهاء مرحلة التصميم الهندسي في 28-سبتمبر-2026، بينما لا تزال مفتوحة في P6 حتى 26-أكتوبر-2026. وتنتهي التوريدات في 17-يناير-2027 حسب التقرير الأسبوعي، وفي 29-ديسمبر-2026 حسب P6. وفي تحديث P6 لهذا الأسبوع تأخر اكتمال أعمال الجهد المتوسط 9 أيام ليصبح بعد خطته الأساسية بـ37 يوماً (الفائض 21 يوماً بعد أن كان 27)، وتأخر اكتمال أعمال الطرق 7 أيام ليصبح بعد خطته الأساسية بـ10 أيام (الفائض 12 يوماً بعد أن كان 18). ولم يبقَ أي فائض زمني لانتهاء المشروع.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ورقة Major Quantities؛ والأسفلت والإنترلوك والبردورات من نسبة الإنجاز في ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 26-أكتوبر-2026.



تمديدات الجهد المتوسط: لم يُورَّد شيء


0 من 51,500 م. تُظهر ورقة Procurement أن اعتماد المادة لم يُقدَّم، وأن الموعد المطلوب لوصولها إلى الموقع 31-مايو-2026. ويذكر سجل المخاطر أن التمديدات تم شراؤها، وأن الموقع النهائي للمحطة الفرعية لا يزال بانتظار التأكيد بين المالك والشركة السعودية للكهرباء.

الإنارة والمحطات الفرعية ومواد الرصف

أعمدة الإنارة الموّردة 1 من 592، ولوحات الإنارة 0 من 52، والمحطات الفرعية 0 من 5 (لم يُقدَّم الاعتماد). وارتفعت هذا الأسبوع نسبة توريد البردورات إلى 15% (من 3.4%)، والإنترلوك إلى 15% (من 5.5%)، والخلطة الإسفلتية إلى 40% (من 30%)، واكتمل توريد أغطية المناهل وغرف التجميع وصناديق المحابس.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمالة الميدانية وغير الميدانية)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

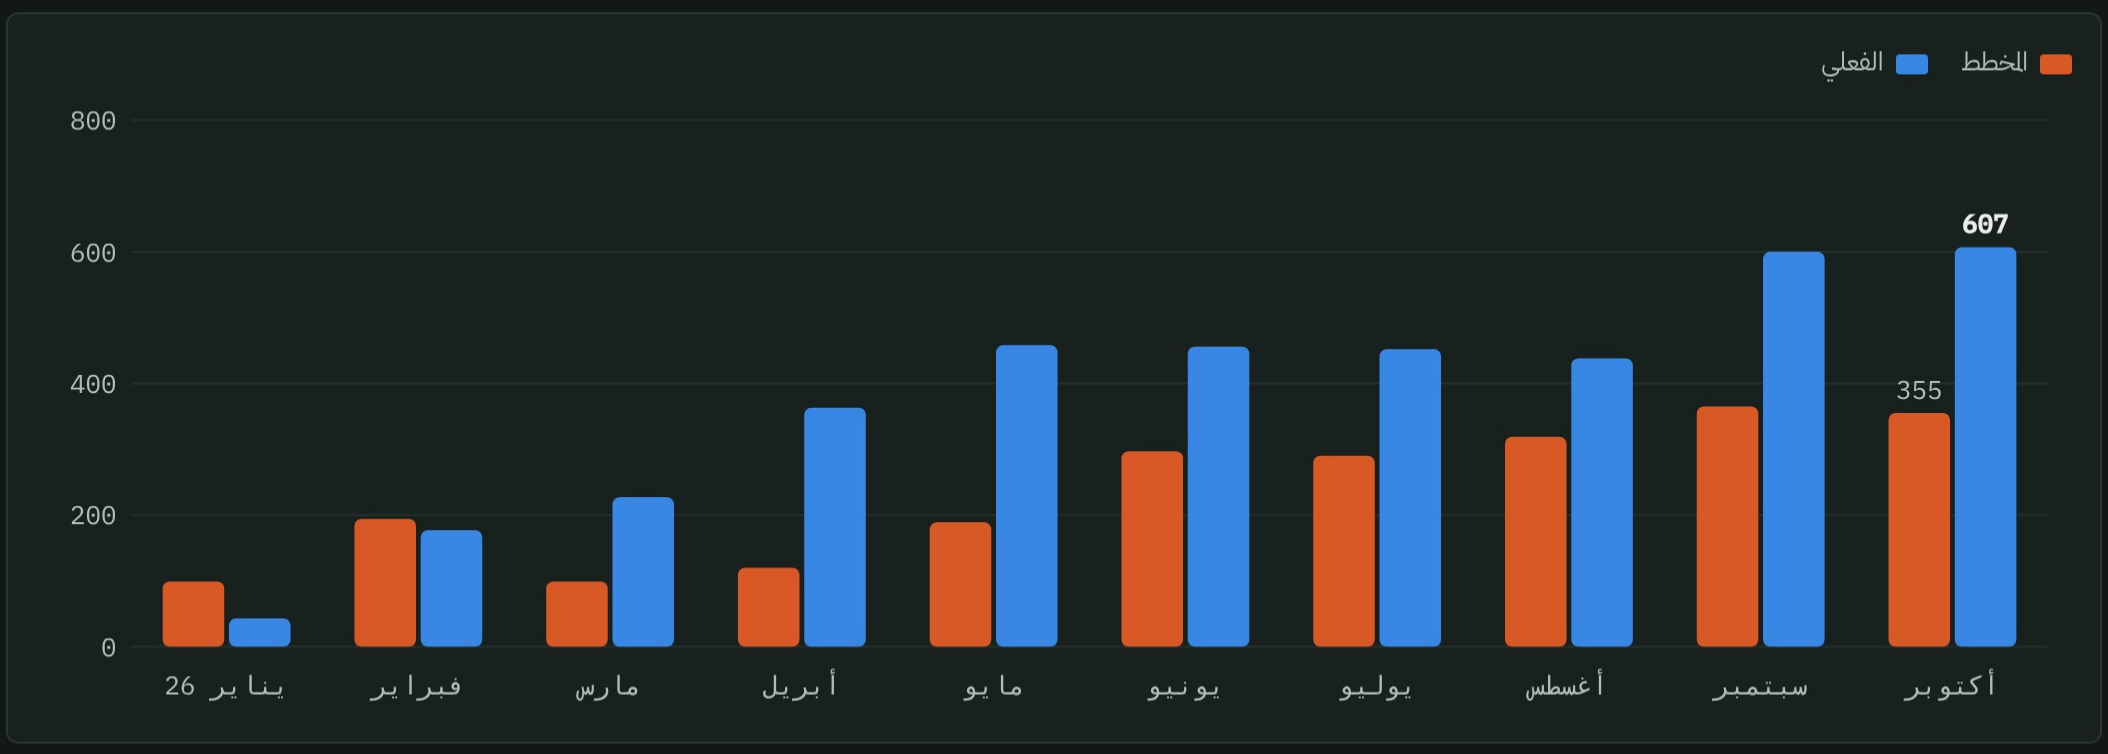

عدد العمالة في أكتوبر 607 (540 ميدانية و67 غير ميدانية) مقابل 355 مخططاً (+71%)، ويكرر تقرير 26 أكتوبر أرقام تقرير 19 أكتوبر. العدد الفعلي أعلى من المخطط كل شهر منذ فبراير. ويوجد في الموقع أيضاً 332 معدة مقابل 200 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الطرق	88,002,863
شبكة تصريف مياه الأمطار	25,405,198
الأعمال الكهربائية	20,082,302
أعمال كاميرات المراقبة	9,305,708
شبكة مياه الشرب	7,779,405
شبكة الصرف الصحي	7,071,027
تنسيق المواقع والري	6,835,461
شبكة المياه المعالجة	4,147,557
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**168,629,520**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	193,923,948
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	4
القيمة الإجمالية	24,575,402
استرداد الدفعة المقدمة (10%)	−2,457,540
المحتجزات	0
الخصومات والغرامات	−34,000
ضريبة القيمة المضافة	3,317,679
الصافي شاملاً الضريبة	25,401,542
معتمد من مدير المشروع / مدفوع	0 / 0
الدفعة المقدمة (10%)	16,862,952

المفوتر 14.6% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 45.4%. يُظهر سجل المستخلصات أن أياً من المستخلصات الأربعة لم يُعتمد من مدير المشروع ولم يُدفع بعد؛ ويغطي أولها الأعمال حتى 28-يونيو-2026.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 81.8%

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	936,956
ساعات العمل هذا الأسبوع	36,420
ساعات العمل هذا الشهر	134,500
التدريبات الداخلية (تراكمي)	56
اجتماعات التوعية (تراكمي)	42
تقييم تفتيش السلامة من الاستشاري	80.7%
ملاحظات السلامة المسجلة / المغلقة	15 / 15

جميع ساعات العمل مسجلة كساعات آمنة. لا يذكر التقرير أعداد الحوادث بوضوح.

الجودة التقييم 81.3%

تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة / المفتوحة	22 / 17 / 5
تعليمات الموقع الصادرة / المفتوحة	7 / 1
طلبات فحص المواد الصادرة / المفتوحة	243 / 4
طلبات الفحص الميداني الصادرة / المفتوحة	4,008 / 68
المخططات التنفيذية المقدمة / المعالجة	420 / 360
مخططات تنفيذية معلقة لدى الاستشاري	0
اعتمادات المواد المعالجة	62 من 65

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
موقع المحطة الفرعية (الجهد المتوسط)	المالك / الشركة السعودية للكهرباء	لا يزال الموقع النهائي للمحطة الفرعية بانتظار التأكيد بين المالك والشركة السعودية للكهرباء. حُسم مقاس تمديدات الجهد المتوسط بطلب استيضاح (أُجيب في 09-فبراير-2026)، وينفذ المقاول مجاري عبور الطرق لتمديدات الجهد المتوسط على مسؤوليته. قد يؤثر استمرار التأخير على الاختبار والتشغيل والتسليم. التصنيف: مرتفع (5 × 5).
اعتماد مقترح تنسيق المواقع	المالك	مقترح تنسيق المواقع (RFI-0036، 23-أغسطس-2026) بانتظار اعتماد المالك، وهو مطلوب لإنهاء المخططات التنفيذية لتنسيق المواقع وتوريد المواد. التصنيف: متوسط.
التوريدات متأخرة عن الخطة	المقاول	التوريدات عند 60.4% مقابل 99.4% مخططاً. ولا يزال اعتماد تمديدات الجهد المتوسط والمحطات الفرعية وعدادات الكهرباء وسياج الأعمال الكهربائية وتخطيط الطرق غير مقدَّم.
تراجع الفائض الزمني لأعمال الجهد المتوسط والطرق	المقاول	أخّر تحديث P6 اكتمال أعمال الجهد المتوسط إلى 27-فبراير-2027 (الفائض 21 يوماً بعد أن كان 27) واكتمال أعمال الطرق إلى 24-أبريل-2027 (الفائض 12 يوماً بعد أن كان 18). والأعمال الكهربائية عند 35.7% مقابل 50.9% مخططاً، وكاميرات المراقبة عند 12.2% مقابل 36.9%.
التصميم الهندسي لم يُغلق	المقاول	التصميم الهندسي عند 93.4% مقابل 100% مخططاً دون تغيير هذا الأسبوع، ولا تزال مرحلة التصميم مفتوحة في P6. ولا تزال 5 تقارير عدم مطابقة مفتوحة، ولا توجد مخططات تنفيذية معلقة لدى الاستشاري.

جميع ملاحظات السلامة الـ15 في سجل المشكلات (من 08-سبتمبر إلى 25-أكتوبر-2026) و18 من أصل 20 خطراً في السجل مغلقة.

ملاحظات على البيانات

- تسمي الملفات المرفوعة المشروع "المرحلة الثانية – الجزء الثاني" (SUD1-02-011)، بينما يسميه مجلد المستودع وسجل المشاريع المرحلة الثالثة.
- تسمّي ورقة الملخص التقدم المحسوب على أساس التكلفة "المخطط" و"الفعلي". يستخدم هذا التقرير التقدم الفعلي فقط (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة): 42.15% مخططاً و46.41% فعلياً.
- تخطط ورقة Physical-Chart Data نسبة 44.2% عند نقطة أكتوبر (06-أكتوبر)، وهي أعلى من 42.15% المخططة حتى 26-أكتوبر في الورقة الرئيسية، كما تضع الفعلي في 26-أكتوبر (46.41%) على نقطة 06-أكتوبر.
- تترك الورقة الرئيسية التقدم الفعلي للأعمال الكهربائية وتنسيق المواقع وكاميرات المراقبة فارغاً، فاستُخدمت ساعات العمل في ورقة Progress. كما تُظهر قيم جدول الكميات لكاميرات المراقبة في المنطقتين A وG مبلغ 46,056 و2 ريال بدلاً من 6,513,996 و2,791,854.
- يتفق الآن تحديث P6 ولوحة الجدول في التقرير الأسبوعي (792 مكتملاً و343 قيد التنفيذ و980 لم يبدأ)، لكن الورقة الرئيسية لا تزال تُظهر 144 قيد التنفيذ.
- يضع التقرير الأسبوعي تاريخ الخطة الأساسية لانتهاء التوريدات في 23-يناير-2027، بينما يحدده الجدول الأساسي المعتمد (المرفوع مع الأسبوع السابق) في 21-نوفمبر-2026.
- يُظهر جدول النطاق في صفحة الملخص 0 منفذاً لكل الشبكات، وتختلف إجمالياته عن ورقة Conclusion المخفية (مثلاً الطرق 15,234 م مقابل 18,252 م). والمناهل موسومة بالمتر في ورقة Major Quantities لكنها معدودة بالوحدة.
- تختلف أرقام التوريدات: أعمدة الإنارة 590 وحدة بنسبة 10% في ورقة Procurement، لكنها 592 وحدة وُرِّد منها 1 في Major Quantities؛ وتمديدات الجهد المنخفض 29,700 م مقابل 68,400 م. وتمديدات الجهد المتوسط "لم تُقدَّم" في التوريدات، بينما يذكر سجل المخاطر أنه تم شراؤها.
- تكرر ورقة القوى العاملة أرقام 19 أكتوبر. وعدد العمالة المخطط لأكتوبر 355 في الجدول الشهري (327 ميدانية و28 غير ميدانية)، لكنه 335 في لوحة العمالة (300 ميدانية و35 غير ميدانية).
- تُظهر عدة خلايا أخطاء #REF! (التكلفة المتوقعة عند الإنجاز، وتقييمات المخاطر، وتقييم السلامة في تقييم الحالة). ويحمل خطر المحطة الفرعية قيمة 6,835,460.61 ريال، وهي قيمة تنسيق المواقع في جدول الكميات.
- لا تزال عدة أوراق (Major Quantities وMilestones وPhysical-Chart Data وTesting وCCO وRisk Register) تحمل تاريخ 19-أكتوبر-2026، رغم أن تاريخ بيانات التقرير 26-أكتوبر-2026 وأن محتواها حُدِّث. كميات هذا الأسبوع هي الفرق عن تقرير 19 أكتوبر. رقم أسبوع التقرير هو أسبوع العقد الذي يذكره التقرير (42 من 78)؛ وعدد الأسابيع الكاملة منذ تسليم الموقع 41.
