سور للمدينة الصناعية - الدمام الثالثة

Dammam 3rd Industrial City Gates and Fence

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الديري للمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عفات م. العنزي	06-May-2026	05-Aug-2026

النطاق: السور الخارجي من النوعين 1 و2، والبوابات الرئيسية وبوابات الشبك، وغرف الحراسة مع خزانات المياه، وأعمالها الميكانيكية والكهربائية (الإنارة، وحواجز البوابات، وأنظمة كشف التسلل). مدة العقد 91 يوماً، وقيمته 16,500,001.96 ريال.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (25,284 ساعة عمل إجمالاً). في 27-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 97.9% مقابل 100% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 2.1%، بعد إنجاز 0.30% (76 ساعة عمل) هذا الأسبوع. وقد مضى 83 يوماً على تاريخ انتهاء العقد في 05-أغسطس-2026.


نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
97.9% / 100% مخطط	**+0.30%** / 0.00% مخطط	**191%** · اليوم 174 من 91	**59.3%** · 9.78 مليون ريال
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.98 · −2.1%	▼ 2.1% لم تُنجز بعد موعد الانتهاء المخطط	انتهاء P6: 02-نوفمبر-2026 ▼	5 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 26-سبتمبر-2026

تجاوز المشروع تاريخ انتهاء العقد بـ 83 يوماً، ويتوقع تحديث P6 الآن التسليم في 02-نوفمبر-2026.

يجدول تحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) التسليم الابتدائي في 02-نوفمبر-2026، أي بعد 89 يوماً من التاريخ التعاقدي 05-أغسطس-2026، بفائض زمني سالب بين −70.5 و−75 يوماً في الأنشطة الـ 21 المفتوحة. ولا يزال التقرير الأسبوعي يذكر 05-أغسطس-2026 تاريخاً متوقعاً للانتهاء. بلغ التنفيذ 99.9%، ومعظم الأعمال المتبقية في الاختبار والتشغيل (84.4%) والتسليم (10.5%). وطُبّقت خصومات وغرامات بقيمة 1,501,000 ريال على المستخلص 5.


صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ورقة الصور الأسبوعية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026. لا تحمل الصور ختم تاريخ أو GPS. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.

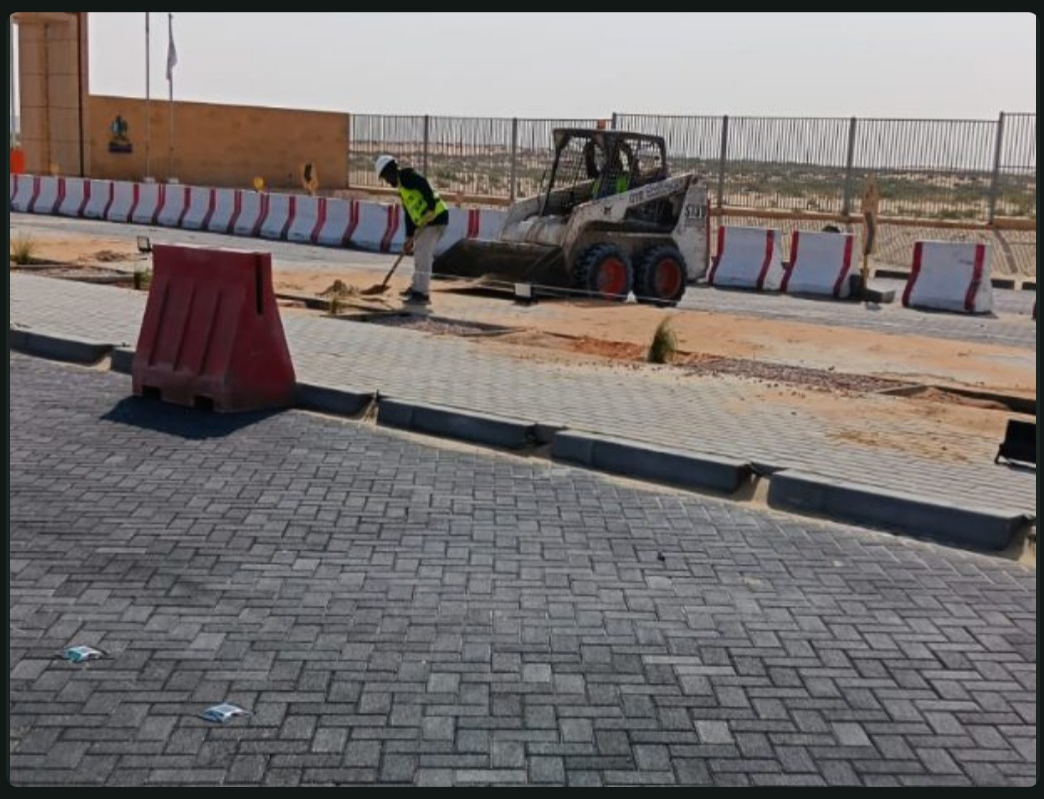

أعمال تنسيق المواقع

تجهيز شريط الزراعة بجانب رصف الإنترلوك، باستخدام لودر صغير.

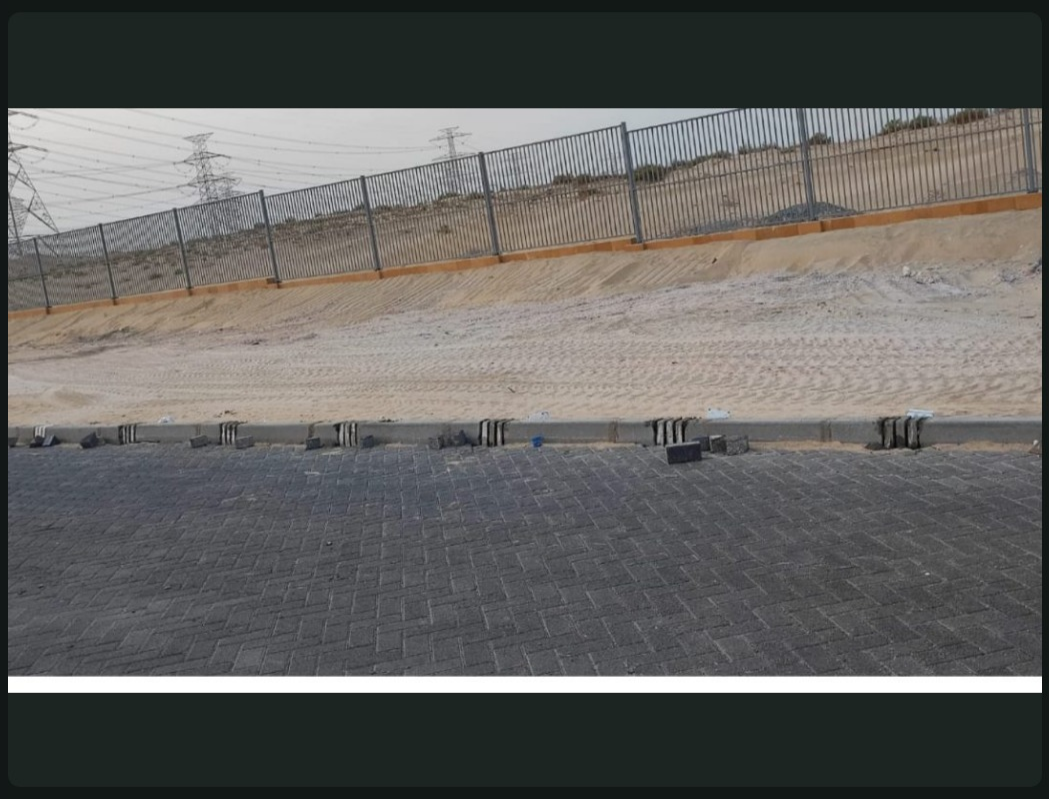


السور والرصف

السور الحديدي المركّب أعلى رصف الإنترلوك وخط البردورات. مُعنونة في التقرير "أعمال كهربائية".



أعمال تنسيق المواقع

حفرة زراعة بطبقة حصى بجانب الرصيف.

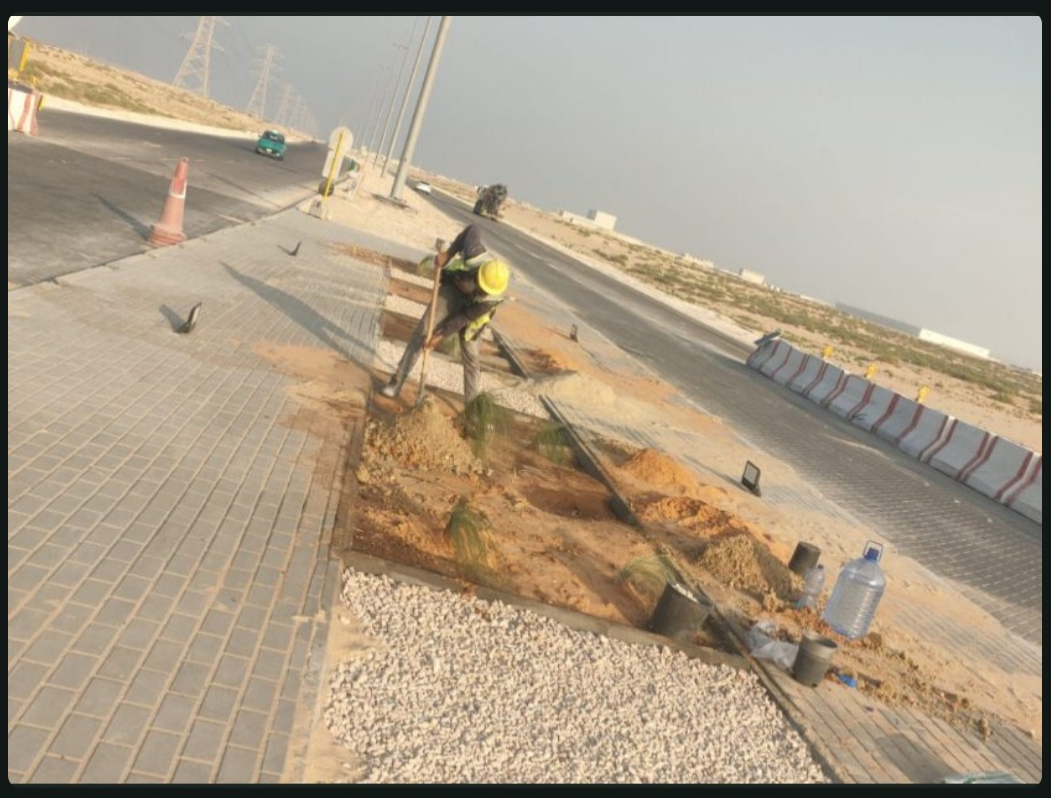


أعمال تنسيق المواقع

شجيرات مزروعة في الشريط بين الرصيف والطريق.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

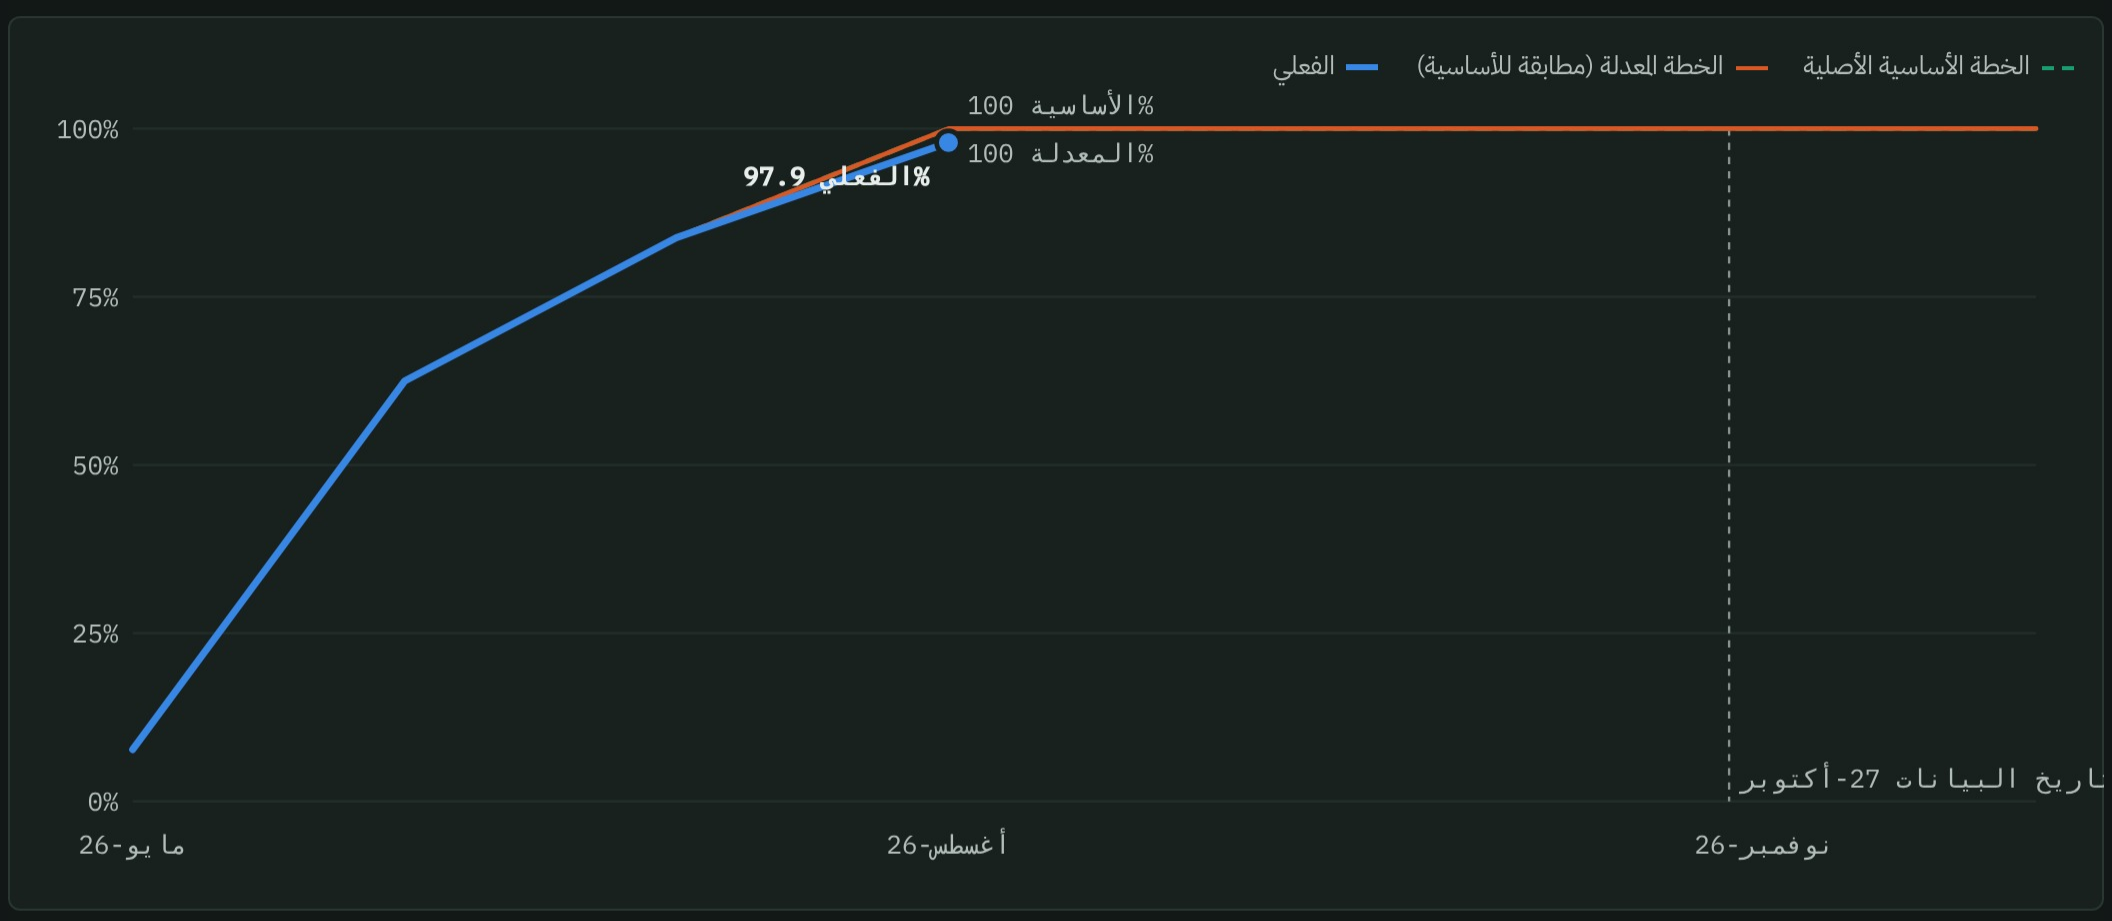

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
20-Oct-2026	100.0	97.6	-2.4%	–	0.98
27-Oct-2026	**100.0**	**97.9**	**-2.1%**	**+0.30%**	**0.98**

الصفّان مأخوذان من ورقة Progress في التقرير الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026، التي تذكر ساعات العمل المكتسبة لهذا الأسبوع والأسبوع السابق (24,757 و24,681 من 25,284). لم يُرفع تقرير أسبوعي سابق. وتسجّل ورقة المنحنى كل التقدم المنجز بعد يوليو في شهر أغسطس، لذا ينتهي خط الفعلي عنده عند 97.9%.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	1.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التقديمات الأولية	0.2%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	26.5%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	26.4%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التنفيذ	43.5%	100.0%	99.9%	-0.1%	1.00	▼ في مرحلة الإنهاء
الاختبار والتشغيل	0.3%	100.0%	84.4%	-15.6%	0.84	▼ متأخر
التسليم	2.2%	100.0%	10.5%	-89.5%	0.11	▼ متأخر
الإجمالي	100%	**100.0%**	**97.9%**	**-2.1%**	**0.98**	▼ متأخر

ضمن التنفيذ، بلغ السور الحديدي من النوع 2 نسبة 99.5% والأعمال الكهربائية 99.7%، واكتملت بقية الأعمال. يضم تحديث P6 عدد 391 نشاطاً: 370 مكتملاً و21 قيد التنفيذ ولا يوجد نشاط لم يبدأ. وتاريخ الانتهاء المجدول 02-نوفمبر-2026، أي بعد 89 يوماً من التاريخ التعاقدي.

المعالم الرئيسية

المعالم التعاقدية في جدول P6. تستخدم ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي تواريخ مختلفة ولا تتوقع أي تأخير؛ ويُعرض المصدران معاً لمعالجة الفرق مع المقاول.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	06-May-2026	30-Apr-2026	–	–	✓ منجز
التقديمات الأولية	25-May-2026	01-Aug-2026 (فعلي)	–	–	✓ منجز متأخراً
التجهيز	31-May-2026	02-Aug-2026 (فعلي)	20-May-2026	–	✓ منجز متأخراً
المخططات التنفيذية	22-Jun-2026	24-Aug-2026 (فعلي)	–	–	✓ منجز متأخراً
تقديم المواد واعتمادها	18-Jul-2026	19-Sep-2026 (فعلي)	–	–	✓ منجز متأخراً
التصنيع والتوريد	04-Aug-2026	12-Aug-2026 (فعلي)	–	–	✓ منجز متأخراً
التنفيذ	05-Aug-2026	16-سبتمبر-2026 (مسجّل كمنجز)	25-Aug-2026	-73.7	؟ أعمال لا تزال مفتوحة
انتهاء المشروع	05-Aug-2026	02-Nov-2026	05-Aug-2026	-75	▼ متأخر

يختلف التقرير الأسبوعي وتحديث P6 في تاريخ الانتهاء.

يذكر التقرير الأسبوعي 05-أغسطس-2026 تاريخاً متوقعاً للانتهاء (ورقة المعلومات العامة) و30-أغسطس-2026 في ورقة المعالم، وكلاهما دون تأخير. بينما ينهي تحديث P6 المشروع في 02-نوفمبر-2026. ويسجّل P6 معلمي التنفيذ وانتهاء المشروع منجزين في 16-سبتمبر-2026، مع أن أربعة أنشطة تنفيذ لا تزال مفتوحة: بوابة الشبك، وتركيبات الإنارة، وحاجز البوابة الكهربائي، وكواشف الدخان والحرارة.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (موظفون وعمالة)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

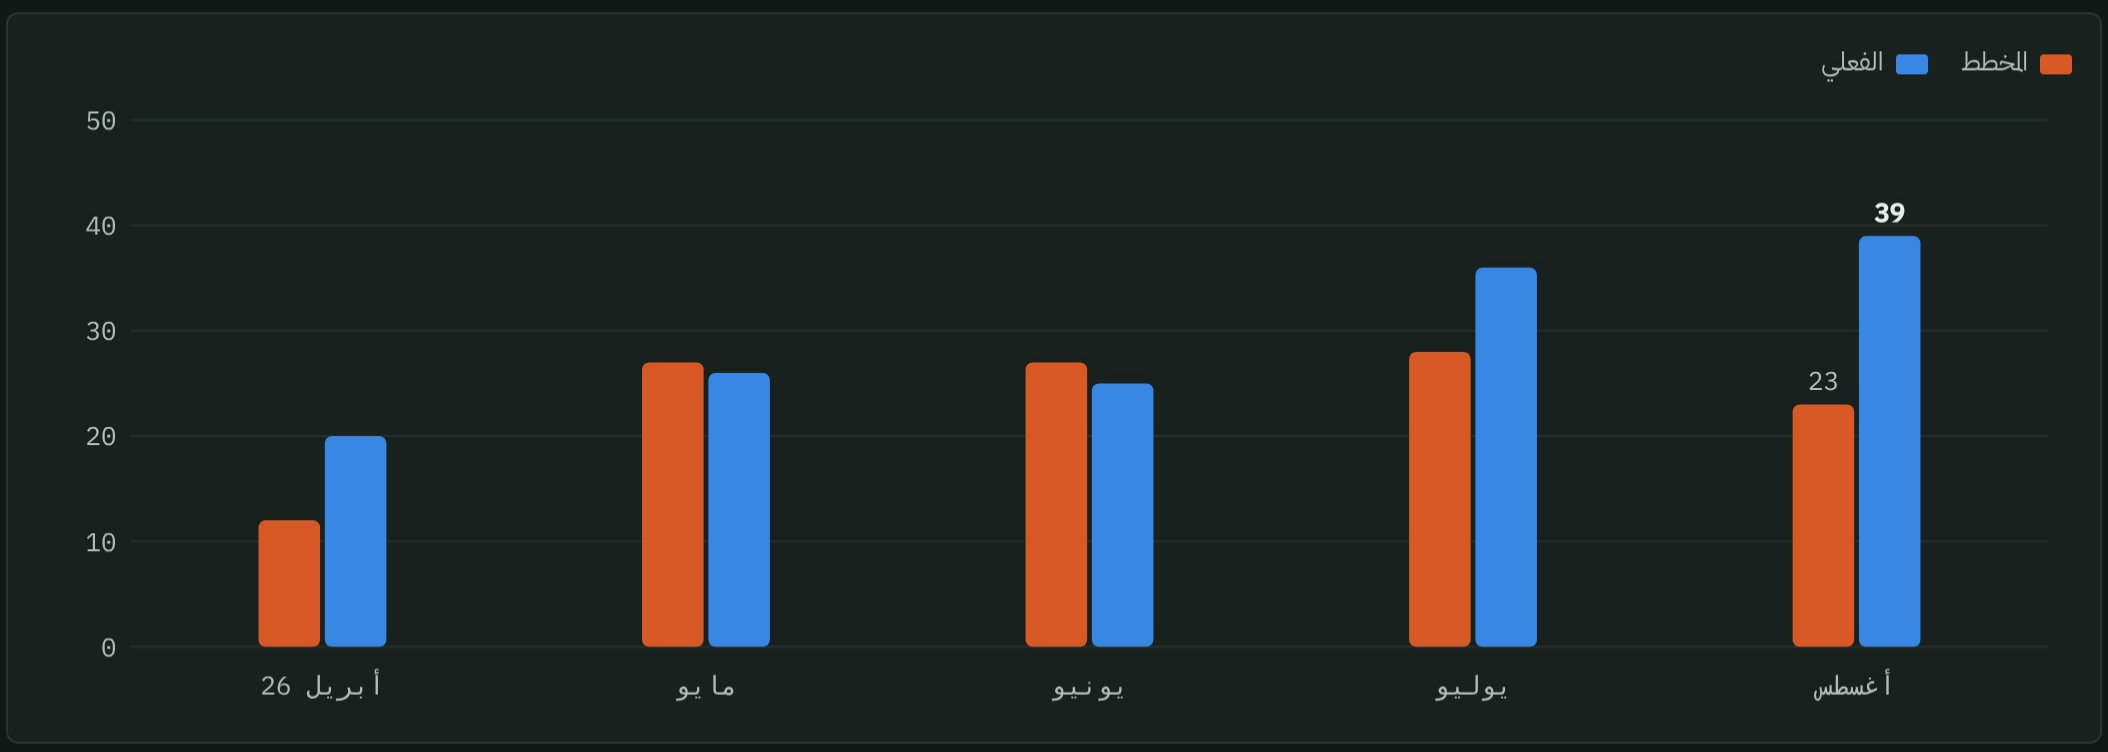

لا تتضمن ورقة القوى العاملة أرقاماً بعد أغسطس 2026. ويكرر ملخص التقرير الأسبوعي عدد أغسطس: 39 فعلياً (11 موظفاً و28 عاملاً) مقابل 23 مخططاً.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	16,500,001.96
قيمة العقد المعدلة	16,500,001.96
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة. ويُظهر سجل المستخلصات أيضاً قيمة معدلة قدرها 21,100,000 وتغييرات محتملة بقيمة 200,000؛ انظر ملاحظات على البيانات.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	5
القيمة الإجمالية	9,780,875.90
المعتمدة من الاستشاري	5
المعتمدة من مدير المشروع في مدن / المدفوعة	0 / 0
الخصومات والغرامات	1,501,000
الصافي شاملاً الضريبة	9,747,007.29
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	10,232,434.64

بلغت الفوترة 59.3% من قيمة العقد مقابل نسبة إنجاز فعلي 97.9%. ويتضمن المستخلص 5 (من 06-أغسطس إلى 26-سبتمبر-2026) خصماً بقيمة 1,500,000.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.80

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	13,577
ساعات العمل هذا الأسبوع	2,208
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	40 / 124

تفتيش السلامة الميداني رقم 30 بتاريخ 26-أكتوبر-2026.

الجودة التقييم 0.88

طلبات الفحص: صادرة / مغلقة / معلقة	848 / 829 / 19
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	90 / 88 / 2
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة	4 / 4
تعليمات الموقع: صادرة / مغلقة	4 / 4
المخططات التنفيذية المعتمدة	72 من 75
اعتمادات المواد	101 من 113

ملاحظة مراقبة الجودة رقم 25، 11-أكتوبر-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
بنود التنفيذ المتبقية	المقاول	بوابة الشبك وتركيبات الإنارة (التركيب النهائي) وحاجز البوابة الكهربائي وكواشف الدخان والحرارة لا تزال مفتوحة في P6، ومستحقة في 28-أكتوبر-2026، بفائض زمني سالب بين −70.5 و−73.7 يوماً.
الاختبار والتشغيل	المقاول	الأنظمة الكهربائية والميكانيكية منجزة بنسبة 85%، ومستحقة في 29-أكتوبر و01-نوفمبر-2026.
مستندات الإغلاق	المقاول / الاستشاري	المخططات حسب التنفيذ معدّة بنسبة 50%؛ قطع الغيار التشغيلية مقدمة بنسبة 50% ومقبولة بنسبة 33%؛ ولم تُقدَّم الضمانات والأدلة والتدريب بعد.
قائمة الملاحظات والتسليم الابتدائي	المقاول / مدن	لم يتقدم إصلاح قائمة الملاحظات وتسريح الموقع والتسليم الابتدائي؛ ويجدول P6 التسليم في 02-نوفمبر-2026.
اعتماد المستخلصات	مدن	اعتمد الاستشاري المستخلصات الخمسة جميعها، لكن لم يُعتمد أي منها من مدير المشروع في مدن ولم يُصرف. وطُبّقت خصومات وغرامات بقيمة 1,501,000 ريال.

جميع البنود الأحد عشر في سجلي المخاطر والمشكلات مسجلة كمغلقة، وآخرها في 15-أكتوبر-2026: نقص ملحقات السور من النوع 2، ووجود كابل جهد متوسط على مسار السور من النوع 2، وتعثر أعمال الطريق الترابي بسبب الردم والمعدات والدفعات، وتأخر توريد مواد الإنارة، وتغيير عرض البوابات (RFI-0009).

ملاحظات على البيانات

- نسبة الإنجاز الفعلي مأخوذة من ورقة Progress في التقرير الأسبوعي (ساعات العمل المكتسبة مقابل المخططة). أما عمود "Actual %" في ملفات P6 بصيغة PDF وخلايا القيمة المكتسبة في التقرير الأسبوعي فهي مبنية على التكلفة، لذا لم تُستخدم.
- لم يُرفع تقرير أسبوعي سابق لهذا المشروع. والمنجز هذا الأسبوع مأخوذ من أعمدة الأسبوع السابق في ورقة Progress نفسها؛ ولا تتوفر كميات هذا الأسبوع.
- تتعارض التواريخ داخل التقرير الأسبوعي: تذكر ورقة المعلومات العامة تسليم الموقع في 06-مايو-2026 والانتهاء في 05-أغسطس-2026 (كما في جدول P6 الأساسي)، بينما تذكر ورقة المعالم الترسية في 16-أبريل-2026 والتسليم في 30-أبريل-2026 والانتهاء في 30-أغسطس-2026. والجدول السفلي في ورقة المعالم يعود لمشروع سور آخر (SUD1-05-015).
- لا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع الانتهاء في 05-أغسطس-2026 بانحراف صفري رغم مرور هذا التاريخ؛ بينما يتوقع P6 تاريخ 02-نوفمبر-2026.
- في تحديث P6، سُجّل معلما التنفيذ وانتهاء المشروع منجزين في 16-سبتمبر-2026 بينما لا يزال 21 نشاطاً قيد التنفيذ. وتبدأ التواريخ الفعلية في 13-يوليو-2026 (بداية المشروع)، أي بعد شهرين من تسليم الموقع؛ ويظهر لحاجز البوابة الكهربائي تاريخ بدء فعلي 12-أبريل-2026، قبل ترسية العقد.
- ورقة الكميات الرئيسية غير صالحة للاستخدام: الكميات الفعلية أجزاء من وحدة واحدة (مثل 0.25 م.ط من 18,500 م.ط من سور الشبك) وجدول الموارد فيها من مشروع آخر. لذا حُذف قسم نطاق العمل.
- تحمل ورقة التوريدات رمز مشروع آخر ولا تتضمن بيانات توريد إلا لعدد قليل من البنود الثانوية، لذا حُذف قسم التوريدات.
- يُظهر سجل المستخلصات قيمة عقد معدلة قدرها 21,100,000 وتقديراً عند الإنجاز قدره 20,900,000 وتغييرات محتملة بقيمة 200,000، مقابل 16,500,001.96 و0 في ورقتي المعلومات العامة والتقرير الأسبوعي.
- لا تزال مرحلة المشروع "Mobilization" (التجهيز) في التقرير الأسبوعي، وحقل مدير المشروع في مدن فارغ؛ وأُخذ اسم مدير المشروع من ورقة تفتيش السلامة. وتذكر قائمة فحص الجودة المقاول (HMA) بصفته الاستشاري.
- يسجّل سجلا المخاطر والمشكلات جميع البنود مغلقة بينما يذكر عمود "الحالة الحالية" "In Progress" (قيد التنفيذ)، ولوحة أهم 5 مشكلات فارغة. وتظهر في عدة لوحات ملخصة أخطاء #REF! أو #N/A.
- لا تحمل الصور الأربع ختم تاريخ أو GPS. وتُظهر ثلاث منها أعمال زراعة، مع أن نشاط الزراعة في P6 اكتمل في 07-أكتوبر-2026.
