تطوير البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة

New Infrastructure Development of the Second Phase, Third Industrial City, Jeddah

المالك	المقاول	مدير المشروع - مدن	بداية العقد	انتهاء العقد
مدن	شركة الرواف للمقاولات	أحمد كتبي	16-Mar-2025	15-Mar-2028

النطاق: شبكات البنية التحتية (الطرق والصرف الصحي وتصريف السيول ومياه الشرب والمياه المعالجة والري والكهرباء والإنارة والاتصالات)، ومحطتا ضخ مياه الشرب والمياه المعالجة، وثلاث محطات رفع، ومسجد، والطريق الرابط بين المنطقة CMZ وطريق جدة-جازان، والنطاق المضاف بجدول الكميات المعدل رقم 03 (المنطقة 5). قيمة العقد 560 مليون ريال دون الضريبة.

ملخص تقدم المشروع

تُقاس نسبة الإنجاز بالإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة (وحدات العمالة في تحديث البرنامج الزمني P6). لا يتضمن ملف التقرير الأسبوعي المرفوع هذا الأسبوع سوى تحديث P6، لذا حُسبت الأرقام التالية منه: 52.75% فعلي مقابل 52.76% مخطط وفق الخطة الأساسية المعدلة، بمؤشر أداء 1.00. ويخفي الإجمالي تبايناً: شبكات البنية التحتية متأخرة بنسبة 10.3% عن خطتها، ويعوّض ذلك تقدم محطات الضخ والنطاق المضاف في المنطقة 5.

نسبة الإنجاز الفعلي
52.75% / 52.76%
مخطط
مؤشر الأداء الزمني 1.00 −0.02%

التقدم هذا الأسبوع
—
لا يوجد أسبوع سابق مرفوع للمقارنة

المدة المنقضية من العقد
53.8% · اليوم 589 من 1,095
انتهاء P6: 19-مارس-2028 ▼

المستخلصات (حتى 15-يونيو-2026)
48.7% · 272.6 مليون ريال
ورقة Info في متتبع التوريدات، لم تُحدَّث منذ يونيو

تحديث P6 يُنهي المشروع بعد التاريخ التعاقدي بأربعة أيام، وقد تكون الأعمال متوقفة.

يُجدوِل التحديث انتهاء المشروع في 19-مارس-2028 مقابل تاريخ الانتهاء التعاقدي 15-مارس-2028، والمسار الحرج تقوده محطة ضخ المياه المعالجة: 134 نشاطاً مفتوحاً بلا فائض زمني، منها 93 في محطة ضخ المياه المعالجة و40 في الشبكات. وأصبح متوقعاً أن تنتهي شبكات المياه المعالجة والصرف الصحي والسيول في نوفمبر 2026 بدلاً من 11 و17 و25 أكتوبر 2026 في الخطة الأساسية. ويسجل سجل المخاطر، في قيد بتاريخ 26-أكتوبر-2026، عدم استئناف الأعمال في المشروع لحين استكمال متطلبات الأمن والسلامة، ولا يسجل تحديث P6 بدء أو انتهاء أي نشاط بعد 19-أكتوبر-2026.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست من الصور الثماني المرفوعة لهذا الأسبوع. الصور المختومة بالتاريخ مؤرخة في 17-أكتوبر-2026، أي في الأسبوع السابق. وتُظهر فرش طبقة الأساس الإسفلتية في المنطقة اللوجستية وعلى الطريق R66-04، وقاع طريق موبكو، وبلاطات حماية التمديدات في الأعمال الكهربائية. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



طبقة الأساس الإسفلتية، المنطقة اللوجستية

دحّال مطاطي على الطبقة الجديدة. مختومة بتاريخ 17-أكتوبر-2026، 09:16.




فرش الأسفلت، المنطقة اللوجستية

فرّادة تفرش طبقة الأساس. مختومة بتاريخ 17-أكتوبر-2026، 09:16.




طبقة الأساس الإسفلتية، الطريق R66-04

فرّادة ودحّال عند الشروق. مختومة بتاريخ 17-أكتوبر-2026، 06:47.

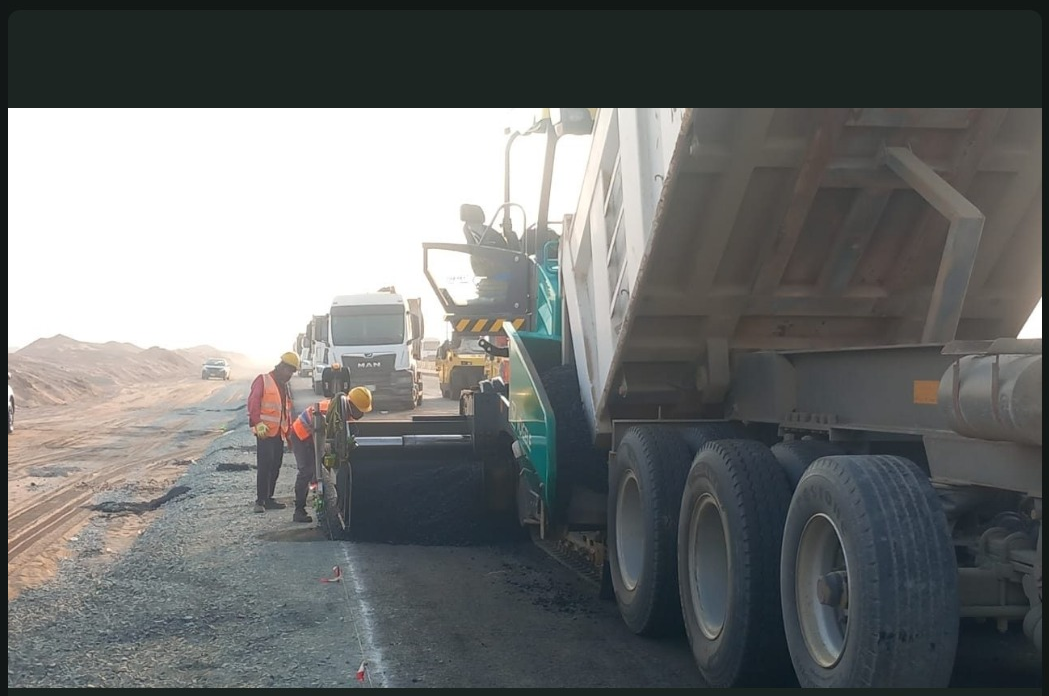

فرش الأسفلت، الطريق R66-04

شاحنة قلّابة تغذي الفرّادة، والطاقم بجانبها.

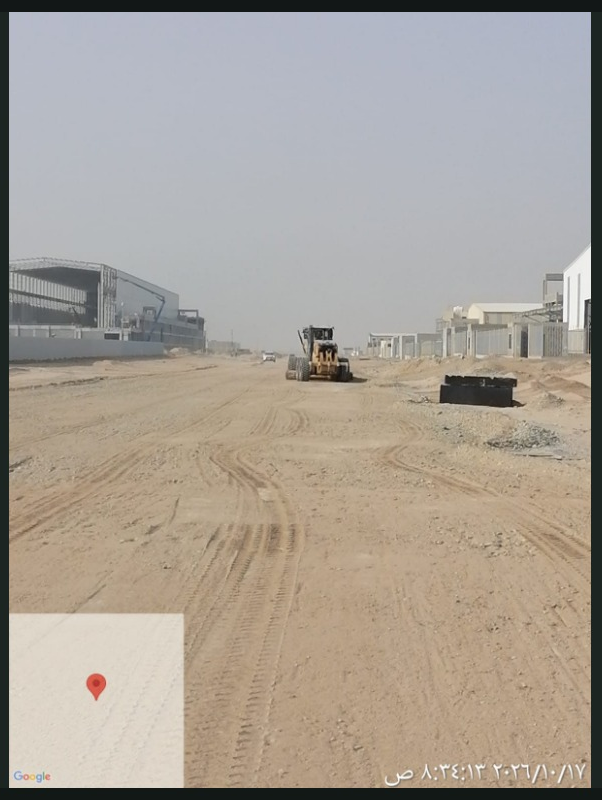

أعمال طريق موبكو

جريدر على قاع الطريق بجانب المصانع. مختومة بتاريخ 17-أكتوبر-2026، 08:34.




الأعمال الكهربائية

بلاطات حماية التمديدات في الخندق. إحداثيات GPS 21.15281N 39.3528E.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة) في نهاية كل شهر. المصدر: تحديث P6 رقم 009-wpr78-26-10-2026 والخطة الأساسية المعدلة 009-1-RVSD03-REV02.

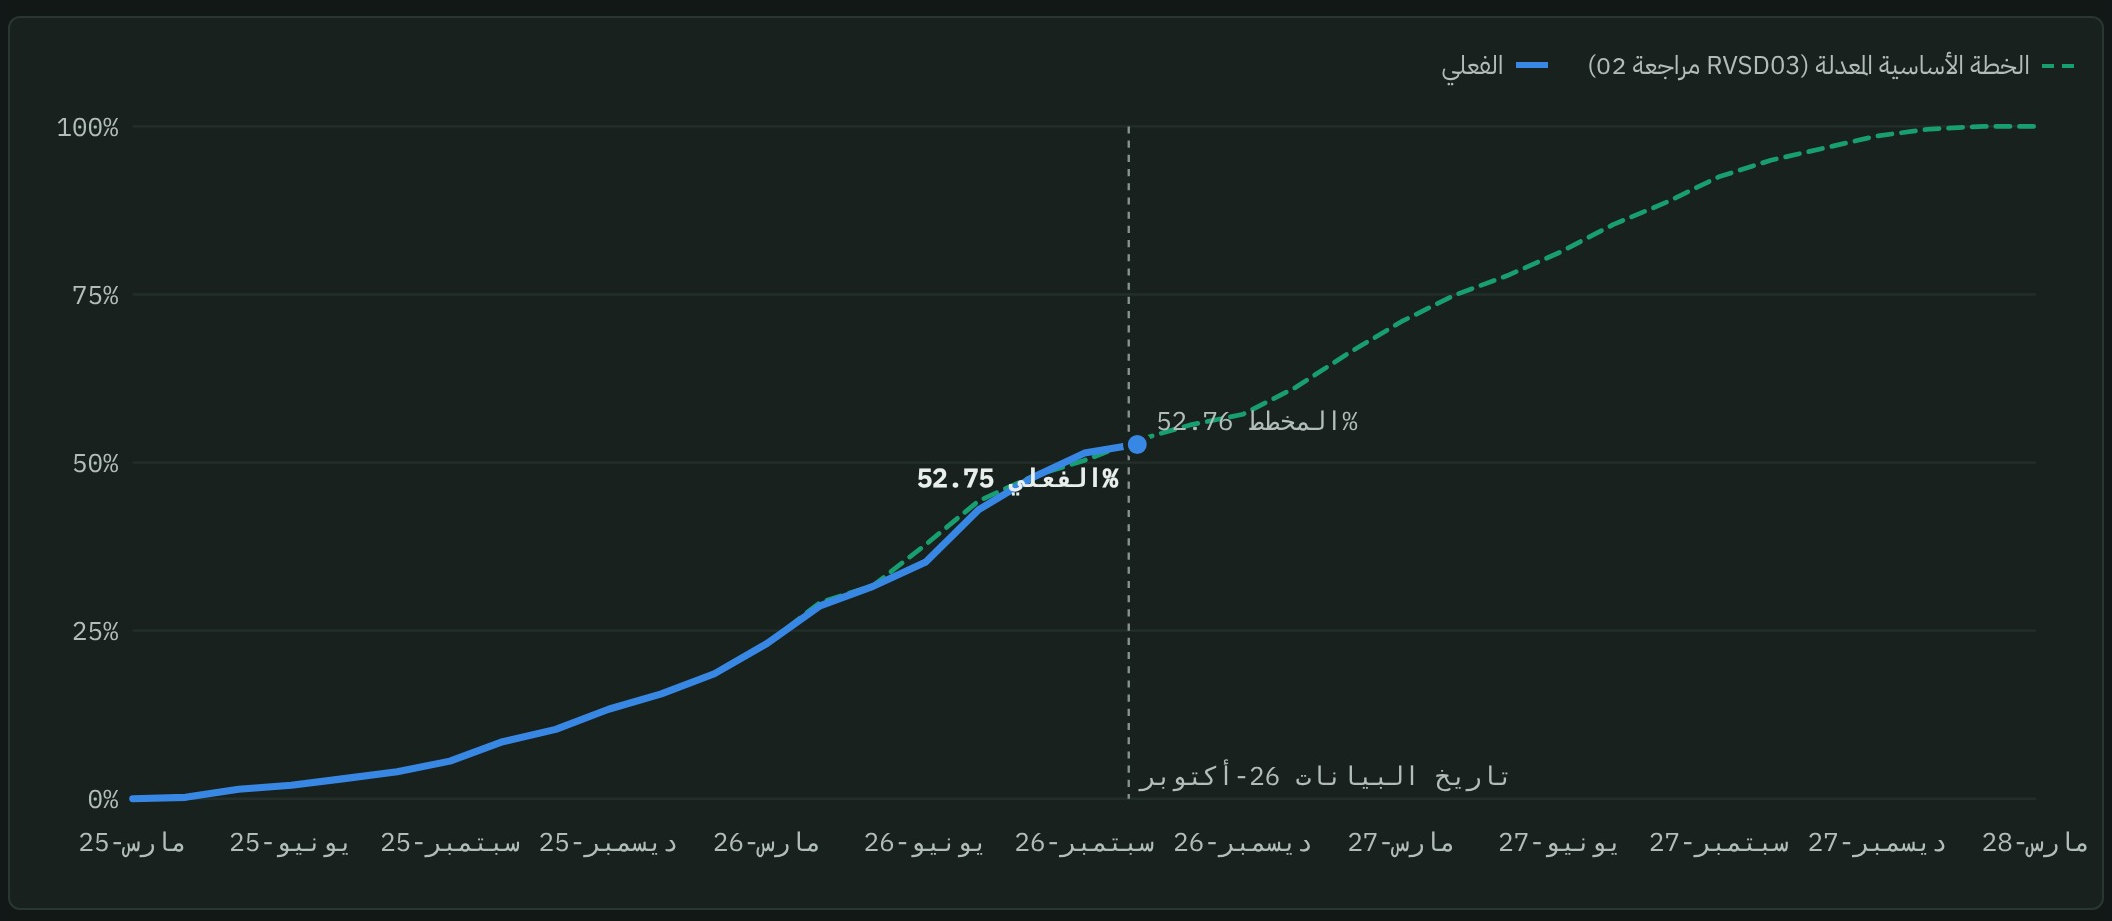

تاريخ البيانات	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
26-Oct-2026	52.76	52.75	-0.02%	—	1.00

طريقة الحساب: يُوزن كل نشاط بوحدات العمالة المخططة له في تحديث P6. ويوزّع التقدم المخطط هذه الوحدات بالتساوي بين تاريخي بداية النشاط ونهايته في الخطة الأساسية المعدلة، ويعتمد التقدم الفعلي على نسبة الإنجاز الفعلي لكل نشاط. أما القيم الشهرية الفعلية السابقة لتاريخ البيانات فتوزّع العمل المنجز بالتساوي بين تاريخي البدء والانتهاء الفعليين، لذا فهي تقريبية. ولا تحمل أنشطة التصميم والتوريدات والإغلاق وحدات عمالة، لذا يغطي المقياس أعمال التنفيذ. ولم يُرفع أسبوع سابق، لذا يتعذر حساب المنجز خلال الأسبوع.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب المستوى الأعلى من هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. لا يُعرض مؤشر الأداء حيث يقل المخطط عن 5%.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
شبكات البنية التحتية	54.8%	75.8%	65.5%	−10.3%	0.86	▼ متأخر
محطة ضخ مياه الشرب	16.7%	21.3%	40.9%	+19.6%	1.92	▲ متقدم
النطاق المضاف بجدول الكميات المعدل رقم 03 (المنطقة 5، رابط CMZ، البحيرة 5)	10.8%	1.9%	26.1%	+24.2%	–	▲ متقدم
محطة ضخ المياه المعالجة	5.3%	2.4%	14.3%	+11.9%	–	▲ متقدم، على المسار الحرج
الطرق الجديدة	3.9%	87.3%	59.0%	−28.3%	0.68	▼ متأخر
الطريق الرابط بين CMZ وطريق جدة-جازان	2.4%	100.0%	77.1%	−22.9%	0.77	▼ متأخر
محطة الرفع 02	1.5%	13.7%	30.6%	+16.9%	2.23	▲ متقدم
محطة الرفع 01	1.4%	0.3%	27.4%	+27.1%	–	▲ متقدم
المسجد	1.2%	53.6%	68.2%	+14.6%	1.27	▲ متقدم
طريق مصنع الخريف	1.1%	62.8%	59.6%	−3.2%	0.95	▼ متأخر قليلاً
محطة الرفع 03	1.0%	1.2%	0.8%	−0.4%	–	▼ متأخر قليلاً
الإجمالي	100%	**52.76%**	**52.75%**	**−0.02%**	**1.00**	● وفق الخطة

يضم تحديث P6 (wpr78-26-10-2026-009، تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026) 16,623 نشاطاً: 9,117 مكتملاً و364 قيد التنفيذ و7,142 لم تبدأ. ويُنهي المشروع في 19-مارس-2028، أي بعد التاريخ التعاقدي بأربعة أيام.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية المعدلة (RVSD03 مراجعة 02) مقابل تحديث P6 بتاريخ 26-أكتوبر-2026. لم يُرفع تقرير أسبوعي يتضمن توقعاته الخاصة للمعالم.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع تحديث P6	الانحراف (أيام)	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بداية المشروع	16-Mar-2025	16-Mar-2025 (فعلي)	0	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	08-May-2025	08-May-2025 (فعلي)	0	–	✓ منجز
تقديم المخططات التنفيذية واعتمادات المواد	29-Jun-2025	29-Jun-2025 (فعلي)	0	–	✓ منجز
انتهاء شبكة المياه المعالجة	11-Oct-2026	21-Nov-2026	+41	401	▼ متأخر
انتهاء شبكة الصرف الصحي	17-Oct-2026	12-Nov-2026	+26	408	▼ متأخر
انتهاء شبكة تصريف السيول	25-Oct-2026	08-Nov-2026	+14	412	▼ متأخر
انتهاء طريق CMZ	14-Nov-2026	10-Feb-2027	+88	331	▼ متأخر
إنهاء شبكة الجهد المتوسط (تعاقدي)	19-Apr-2027	17-Dec-2026	−123	378	▲ مبكر
إنهاء جميع الشبكات (تعاقدي)	15-Jun-2027	14-Feb-2027	−121	328	▲ مبكر
انتهاء الطرق الجديدة	18-Feb-2027	20-Mar-2027	+30	365	▼ متأخر
إنهاء أعمال الطرق (تعاقدي)	20-Apr-2027	18-Jul-2027	+89	204	▼ متأخر
إنهاء الشبكات الأعمق (تعاقدي)	17-Aug-2027	12-Jun-2027	−66	235	▲ مبكر
انتهاء المنطقة 5	13-Mar-2028	17-Nov-2027	−117	100	▲ مبكر
انتهاء محطة ضخ مياه الشرب	08-Mar-2028	02-Mar-2028	−6	14	● فائض محدود
انتهاء محطة ضخ المياه المعالجة	15-Mar-2028	19-Mar-2028	+4	0	▼ متأخر
انتهاء المشروع	15-Mar-2028	19-Mar-2028	+4	0	▼ متأخر

المعالم المتأخرة لا تزال تُظهر فائضاً كبيراً، لأن الفائض يُحسب حتى انتهاء المشروع فقط.

كان مقرراً إنهاء شبكات المياه المعالجة والصرف الصحي والسيول بحلول 25-أكتوبر-2026 في الخطة الأساسية، وأصبح متوقعاً إنهاؤها في نوفمبر 2026، كما انتقل المعلم التعاقدي لأعمال الطرق من 20-أبريل-2027 إلى 18-يوليو-2027، ومع ذلك يُظهر P6 فائضاً بين 200 و400 يوم عليها. ويُجدوَل معلم الشبكات "Finish of Road Works" في 27-مارس-2027، وهو لا يطابق المعلم التعاقدي لأعمال الطرق في 18-يوليو-2027.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموردة إلى الموقع من كمية جدول الكميات المعدل. المصدر: ورقة Procurement في متتبع التوريدات بتاريخ 27-أكتوبر-2026 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026).



الإنترلوك والبردورات: توريدات شبه معدومة

الإنترلوك: لم يُورَّد شيء من 166,014 م²، وقد صدر أمر الشراء. البردورات: وُرِّد 29,512 م.ط من أربعة أنواع، ويكرر المتتبع كمية 160,860 م.ط لكل نوع، لذا فإن إجمالي الكمية المطلوبة غير واضح.

المحطات والمنطقة 5

من أصل 1,464 بنداً في المتتبع: 753 مورّدة، و44 مورّدة جزئياً، و8 متوفرة، و530 صدر لها أمر شراء، و29 صدر لها طلب شراء، و100 لم يُتخذ بشأنها إجراء بعد، وأغلبها بنود إنذار الحريق والمراقبة التلفزيونية والتحكم في الدخول لمباني المحطات. مضخات المحطات: وُرِّد 3 من 7؛ ولوحات المحطات: 12 من 44؛ والرافعات العلوية لا تزال في مرحلة طلب الشراء. وصدرت أوامر شراء أعمدة الإنارة وكشافاتها في المنطقة 5 (191 لكل منها) دون توريد أي منها.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد (دون الضريبة)	560,000,000
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	644,000,000

جميع القيم بالريال، من ورقة Info في متتبع التوريدات. ويذكر سجل المخاطر والمشكلات قيمة العقد نفسها. ولا تتضمن الملفات المرفوعة أي أوامر تغيير.

المستخلصات

المستخلصات حتى تاريخه	272,564,241
النسبة من قيمة العقد	48.67%

ورقة Info مؤرخة في 15-يونيو-2026 ولم تُحدَّث منذ ذلك الحين، لذا فإن المستخلصات بعد منتصف يونيو غير معروفة. ولا يُذكر عدد المستخلصات ولا المبالغ المدفوعة.

الصحة والسلامة والجودة

لم تُرفع هذا الأسبوع إحصاءات السلامة (ساعات العمل والحوادث) ولا أعداد طلبات الفحص. وتاريخ القطع لسجلات الاعتماد أدناه هو 26-أكتوبر-2026، أما مشكلات السلامة والجودة القائمة فمدرجة ضمن المشكلات والمخاطر القائمة.

المخططات التنفيذية

المخططات المسجلة	3,502
معتمدة، الرمز A	1,178
معتمدة مع ملاحظات، الرمز B	2,281
تُعدَّل ويعاد تقديمها، الرمز C	15
قيد المراجعة	24
المتبقي (محطة ضخ مياه الشرب)	4

اعتمادات المواد

المخطط حتى تاريخه	120
المقدمة	110
متأخرة لم تُقدَّم بعد	10
معتمدة، الرمز A / الرمز B	94 / 16
طلبات التأهيل المسبق المقدمة	240
التأهيل المسبق A / B / C / D	9 / 19 / 193 / 17

الاعتمادات المتأخرة العشرة: 4 مدنية و1 كهربائية و5 معمارية (وتُحتسب أيضاً ضمن البنية التحتية والمحطات).

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
عدم استئناف الأعمال	المقاول	قيد في سجل المخاطر بتاريخ 26-أكتوبر-2026: عدم استئناف الأعمال قد يؤخر المشروع عن الانتهاء في مدته التعاقدية. المعالجة: استكمال متطلبات الأمن والسلامة واستئناف الأعمال.
ضعف إجراءات الأمن والسلامة والبيئة (حرج)	المقاول	مخالفات السلامة. الإجراء: رفع إجراءات الأمن والسلامة في الأعمال.
انخفاض القوى العاملة والمعدات	المقاول	انخفاض الإنتاجية، وبخاصة لدى طواقم المقاول الذاتية. الإجراء: زيادة القوى العاملة ورفع الإنتاجية.
تكرار تقارير عدم المطابقة	المقاول	إعادة تنفيذ الأعمال بسبب مشكلات الجودة. الإجراء: تحسين جودة الأعمال ومعالجة الملاحظات.
تكرار ملاحظات الصحة والسلامة والبيئة	المقاول	مخالفات السلامة. الإجراء: تحسين مستوى السلامة في الأعمال ومعالجة الملاحظات.
تغيّر النطاق (خطر مرتفع)	مدن	تغيّر أولويات المدينة واحتياجاتها: تخفيض الكميات وإضافة نطاق جديد. المعالجة: دراسة احتياجات المدينة لتحديد النطاق النهائي.
تأخر المشتريات (خطر مرتفع)	المقاول	التأخر في إصدار أوامر الشراء وتوريد المواد طويلة التوريد، كما ترتبط المشتريات بالتدفقات النقدية (خطر متوسط). المعالجة: متابعة حالة أوامر الشراء والتسليم.

المصدر: سجل المخاطر والمشكلات. ويتضمن سجل المخاطر أيضاً قسوة الظروف المناخية في الموقع (حرارة ورمال وأمطار غزيرة)، بتصنيف متوسط.

ملاحظات على البيانات

- لا يحتوي ملف التقرير الأسبوعي wpr78-26-10-2026.rar-009 إلا على تحديث P6 (XER). ولم يُرفع ملف التقرير الأسبوعي ولا عرض التقدم ولا أوراق الكميات والقوى العاملة والسلامة، لذا حُذف قسما كميات نطاق العمل والقوى العاملة.

- حُسبت نسبة الإنجاز الفعلي من تحديث P6 بالطريقة المبيّنة تحت منحنى التقدم. أما ورقة Info في المتتبع وبرنامج الأسابيع الثلاثة فتعرض تقدماً قائماً على التكلفة (القيمة المخططة والمكتسبة)، ولم يُستخدم هنا.
- لم يُرفع أي أسبوع سابق لهذا المشروع، لذا تظهر قيم هذا الأسبوع والمنجز خلال الأسبوع بالرمز "—".
- تاريخ بيانات تحديث P6 هو 26-أكتوبر-2026، لكن لا يوجد نشاط له بداية أو نهاية فعلية بعد 19-أكتوبر-2026، ولا بين 06 و12-أكتوبر-2026. وقد لا يعكس التحديث الأسبوع الأخير من الأعمال.
- الصور المختومة بالتاريخ مؤرخة في 17-أكتوبر-2026، أي في الأسبوع السابق.
- ورقة Info في متتبع التوريدات (تواريخ العقد وقيمته والمستخلصات ومدير المشروع) مؤرخة في 15-يونيو-2026 ولم تُحدَّث.
- تُظهر عدة أوراق تلخيصية في متتبع التوريدات (Zone 5 PO وLong Lead % وPV QTY) أخطاء #REF!. وتتجاوز بعض الكميات الموّردة كمية جدول الكميات المعدل، ومنها مواسير GRP بكمية 86,378 م.ط مقابل 85,790 م.ط، وقواعد أعمدة الإنارة الخرسانية 1,158 مقابل 1,063.
- تكرر بنود البردورات الكمية نفسها (160,860 م.ط) لأربعة أنواع، ويلزم تأكيد إجمالي الكمية المطلوبة.

- المشكلة ID#04 في سجل المشكلات مسجلة تحت العقد JDH3-02-010 مع اسم هذا المشروع. ولا تتبع درجات المخاطر والمشكلات قاعدة السجل نفسه (الدرجة = الاحتمال × الأثر)؛ فمثلاً الخطر ID#02 هو 4 × 4 لكن درجته 4.
- يُحسب الفائض الزمني للمعالم في P6 حتى انتهاء المشروع فقط، لذا تُظهر المعالم المرحلية المتأخرة فائضاً بمئات الأيام. ولا تذكر الملفات المرفوعة اسم الاستشاري.

أُعدّ في 01-نوفمبر-2026 من الملفات المرفوعة للأسبوع W04 (22-أكتوبر-2026): تحديث P6 رقم wpr78-26-10-2026-009، ومتتبع التوريدات بتاريخ 27-أكتوبر-2026، وسجلي المخططات التنفيذية واعتمادات المواد، وسجل المخاطر والمشكلات، وصور الموقع.
