# تطوير شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام المرحلة الثانية الجزء الثاني - المنطقة J

## Development of Infrastructure Networks, 3rd Industrial City in Dammam, Phase 2 Part 2, Zone J

| المالك | المقاول | الاستشاري | مدير المشروع - مدن | تسليم الموقع | انتهاء العقد |
|---|---|---|---|---|---|
| مدن | شركة أنساب للمقاولات العامة | إيجيس (EGIS) | المهندس محمد العيسى | 12-Jan-2025 | 11-Jan-2027 |

النطاق: الطرق التجميعية والمحلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والجهد المتوسط وإنارة الشوارع والاتصالات، ومحطة رفع للصرف الصحي وبحيرات لتصريف السيول في البلوك J. قيمة العقد 117.4 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 24 شهراً.

---

## ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026 بلغ الإنجاز 55.0% مقابل 89.4% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 34.4% (مؤشر الأداء الزمني 0.62). ولم يُنجز منذ التقرير السابق سوى 0.17% مقابل 4.07% مخططاً، فاتسعت الفجوة بنسبة 3.9%.

نسبة الإنجاز الفعلي
**55.0%** / 89.4% مخطط
مؤشر الأداء الزمني 0.62 ▼ −34.4%

التقدم هذا الأسبوع
**+0.17%** / 4.07% مخطط
أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 3.9% ▼

المدة المنقضية من العقد
**89.6%** · اليوم 653 من 729
الانتهاء المتوقع 07-سبتمبر-2027 ▼

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
**43.1%** · 50.6 مليون ريال
20 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

**من المتوقع أن ينتهي المشروع متأخراً نحو ثمانية أشهر، والتقدم شبه متوقف.**

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) الانتهاء في 07-سبتمبر-2027، أي بعد تاريخ انتهاء العقد (11-يناير-2027) بـ239 يوماً، وبعد التاريخ الوارد في التقرير 92 بـ7 أيام. ويبلغ الفائض الزمني لمعلم انتهاء المشروع في 195.5– P6 يوماً. وبعد انقضاء 89.6% من مدة العقد، يتبقى 45.0% من الأعمال، وجميع معالم اكتمال الشبكات في P6 بفائض سالب بين 134 و212 يوماً.

## صور الموقع هذا الأسبوع

الصور الست الجديدة المرفوعة مع التقرير 94، ولا يظهر عليها ختم تاريخ. تُظهر دمك قاع الطرق، وأعمال العزل على الجدران الخرسانية لمحطة الرفع، ومناولة مواد الردم. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



**تجهيز قاع الطريق**

قاع طريق مدموك، والدحّال يعمل في الأمام.



**دمك قاع الطريق**

دحّالات تعمل على امتداد القاع المدموك.



**عزل جدران محطة الرفع**

غشاء الحماية مثبت على الجدار المصبوب، وأشاير التسليح أعلاه.



**جدران محطة الرفع**

مقطع جدار معزول وحديد التسليح جاهز للصبة التالية.



**جلبة ماسورة في الجدار**

جلبة ماسورة GRP مصبوبة في الجدار المعزول.




**مناولة مواد الردم**

لودر ينقل مواد الردم.

## منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

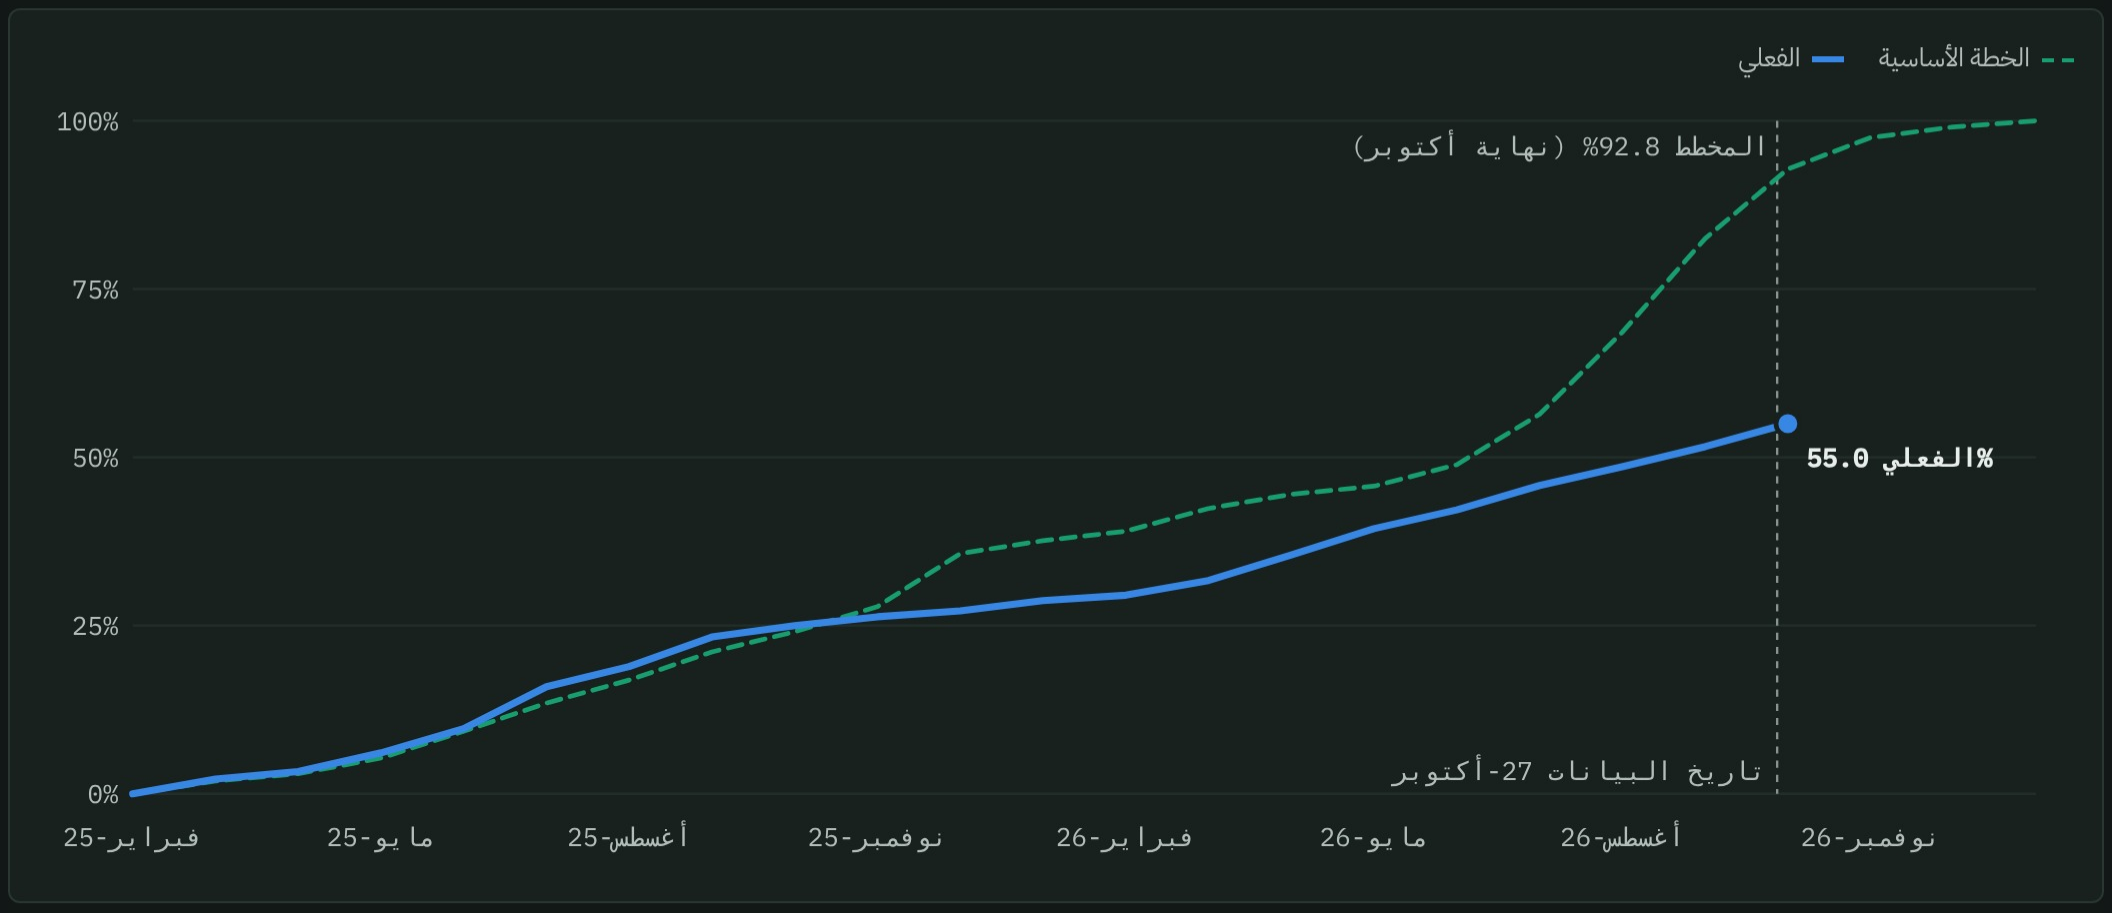


| نهاية الفترة | المخطط % | الفعلي % | الانحراف | المنجز خلال الفترة | مؤشر الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| يونيو-2026 | 48.9 | 42.3 | −6.6 | +2.9 | 0.86 |
| يوليو-2026 | 56.4 | 45.8 | −10.6 | +3.6 | 0.81 |
| أغسطس-2026 | 68.6 | 48.6 | −20.0 | +2.8 | 0.71 |
| سبتمبر-2026 | 82.5 | 51.6 | −30.9 | +3.0 | 0.63 |
| 13-Oct-2026 | 85.3* | 54.8 | −30.5 | +3.2 | 0.64 |
| **27-Oct-2026** | **89.4*** | **55.0** | **−34.4** | **+0.2** | **0.62** |

قيم نهاية الشهر من ورقة Physical-Chart Data، ثم تاريخا البيانات في التقرير 92 (الرفع السابق) والتقرير 94. لم يُرفع التقرير 93. * القيمة المخططة في تاريخ البيانات من غلاف التقرير، والمخطط لنهاية أكتوبر 92.8%. بلغ متوسط الإنجاز نحو 3% شهرياً من يونيو إلى منتصف أكتوبر، ثم توقف تقريباً: 0.2% خلال آخر 14 يوماً مقابل 4.1% مخططاً.

## التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Progress.

| المرحلة | الوزن | المخطط | الفعلي | الانحراف | مؤشر الأداء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شبكة الأعمال الترابية | 8.3% | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 1.00 | ✓ مكتمل |
| شبكة الري | 3.5% | 98.7% | 21.4% | -77.3 | 0.22 | ▼ متأخر |
| شبكة مياه الشرب | 4.1% | 92.2% | 33.8% | -58.4 | 0.37 | ▼ متأخر |
| شبكة الجهد المتوسط | 3.6% | 98.7% | 76.8% | -21.9 | 0.78 | ▼ متأخر |
| شبكة إنارة الشوارع | 12.5% | 100.0% | 26.3% | -73.7 | 0.26 | ▼ متأخر |
| شبكة الاتصالات | 2.2% | 100.0% | 54.6% | -45.4 | 0.55 | ▼ متأخر |
| شبكة الطرق | 33.2% | 77.0% | 53.7% | -23.3 | 0.70 | ▼ متأخر |
| شبكة الصرف الصحي | 17.6% | 90.4% | 54.9% | -35.5 | 0.61 | ▼ متأخر |
| شبكة تصريف السيول | 15.1% | 94.3% | 65.3% | -29.0 | 0.69 | ▼ متأخر |
| **الإجمالي** | 100% | **89.4%** | **55.0%** | **-34.4** | **0.62** | ▼ متأخر |

لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات والاختبار ساعات عمل في قياس التقدم الفعلي لذا لم تُدرج. وخلال آخر 14 يوماً لم تحقق تقدماً سوى الطرق (72 ساعة عمل) وتصريف السيول (2) والجهد المتوسط (1)، مقابل 1,772 ساعة عمل مخططة. يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) عدد 1,921 نشاطاً: 1,227 مكتملاً و64 قيد التنفيذ و630 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 07-سبتمبر-2027، أي بعد تاريخ العقد بـ239 يوماً.

## نطاق العمل: الكميات

الأطوال الإجمالية والمنفذة والمتبقية لكل شبكة، من ملخص التنفيذ في ورقة ملخص سير الأعمال. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير منذ الورقة نفسها في الرفع السابق (التقرير 92، 13-أكتوبر-2026)، أي أنه يغطي 14 يوماً.

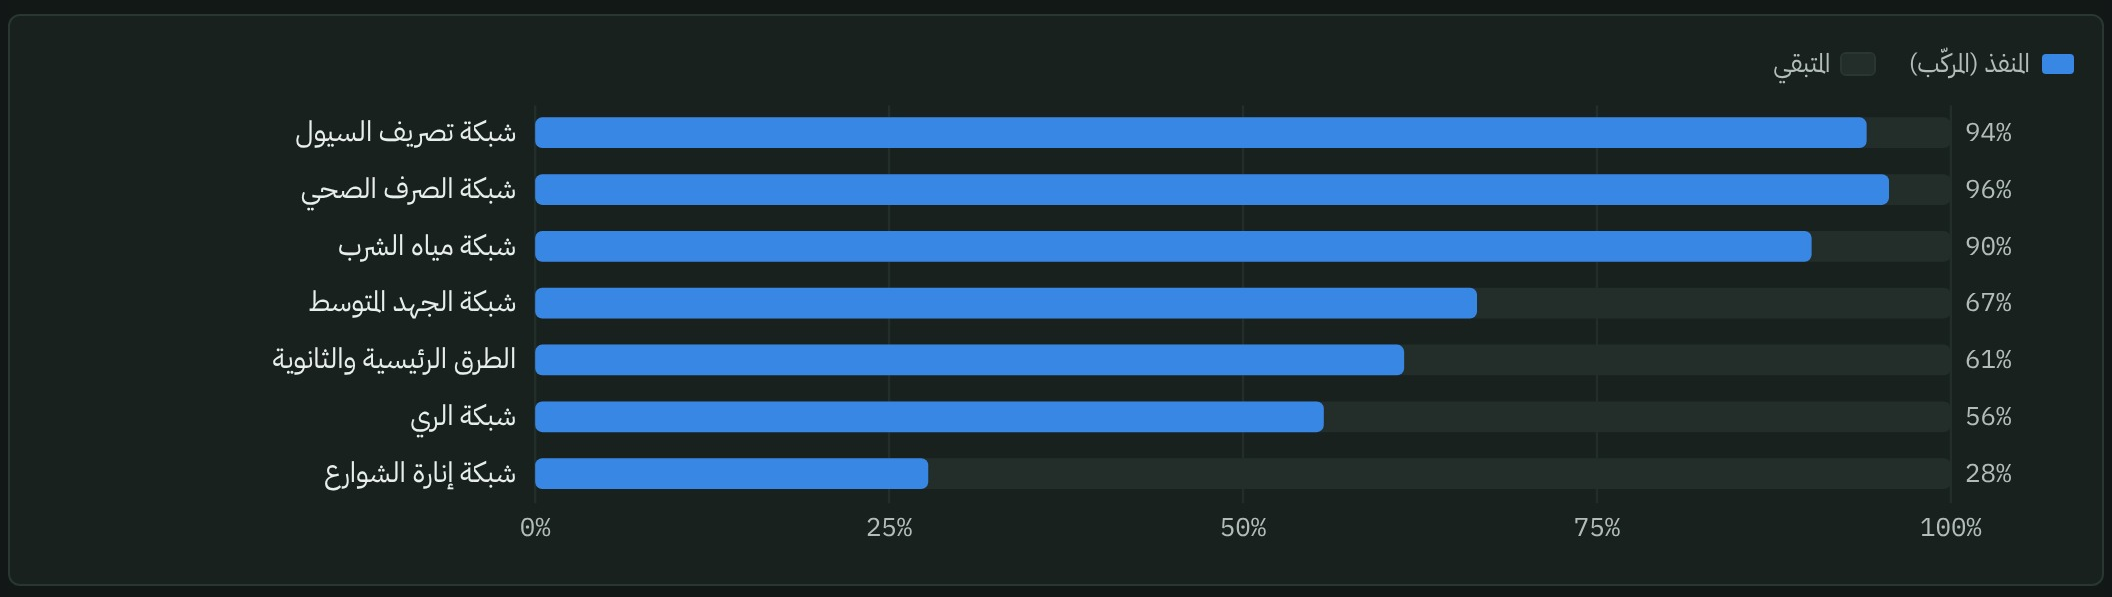


| بند النطاق | المنطقة | الوحدة | الإجمالي | المنفذ | المنفذ هذا الأسبوع | المتبقي | % المنفذ | الردم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **شبكة تصريف السيول** | البلوك J | م.ط | 18,554 | 17,450 | 0 | 1,104 | 94.0% | – |
| **شبكة الصرف الصحي** | البلوك J | م.ط | 9,152 | 8,752 | 0 | 400 | 95.6% | – |
| **شبكة مياه الشرب** | البلوك J | م.ط | 12,200 | 11,000 | 200+ | 1,200 | 90.2% | – |
| **شبكة الجهد المتوسط** | البلوك J | م.ط | 17,328 | 11,528 | 200+ | 5,800 | 66.5% | – |
| **الطرق الرئيسية والثانوية** | البلوك J | م.ط | 8,146 | 5,000 | 0 | 3,146 | 61.4% | – |
| **شبكة الري** | البلوك J | م.ط | 14,494 | 8,074 | 0 | 6,420 | 55.7% | – |
| **شبكة إنارة الشوارع** | البلوك J | م.ط | 12,786 | 3,550 | 0 | 9,236 | 27.8% | – |

## الأعمال المنفذة هذا الأسبوع

| الشبكة | النشاط | الوحدة | المنفذ هذا الأسبوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| مياه الشرب | المنفذ من الشبكة (10,800 ← 11,000) | م.ط | 200 | ورقة الملخص |
| الجهد المتوسط | المنفذ من الشبكة (11,328 ← 11,528) | م.ط | 200 | ورقة الملخص |
| الطرق | التقدم الفعلي المكتسب | ساعات عمل | 72 | ورقة Progress |
| تصريف السيول | التقدم الفعلي المكتسب | ساعات عمل | 2 | ورقة Progress |
| الجهد المتوسط | التقدم الفعلي المكتسب | ساعات عمل | 1 | ورقة Progress |
| محطة رفع الصرف الصحي | صب الجدران | – | – | ورقة أنشطة الأسبوع |

تكرر ورقة أنشطة الأسبوع قائمة أنشطة التقرير 92، وجدول كمياتها فارغ هذه المرة. المخطط لاحقاً: استكمال خط المياه 630 مم وخط الري 500 مم وخط 800 مم، ونحو 1,000 م من تمديدات الجهد المتوسط في الشارع 9، وأعمال الطرق في الشارع 10، وأسفلت الطريق 14.

**الأكثر تأخراً**

نُفذ 27.8% من إنارة الشوارع (3,550 من 12,786 م.ط)، ولم تُركّب أي وحدات إنارة LED أو تأريض أو تمديدات عبور الطرق أو غرف السحب. ونسبة المنفذ في الري 55.7% وفي الطرق 61.4%. ولم تبدأ أعمال الدهانات المرورية واللوحات وصنبور إطفاء الحريق (0 من 55).

**قريبة من الاكتمال**

نُفذ 95.6% من أطوال الصرف الصحي و94.1% من تصريف السيول و90.2% من مياه الشرب. واكتملت العبارة الصندوقية لتصريف السيول (2,051 م). ولا تزال مصائد الأمطار عند 207 من 505، وبحيرات تصريف السيول ومحطة رفع الصرف الصحي قيد الإنشاء.

## المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتواريخ المتوقعة من جدول المعالم في التقرير الأسبوعي، مقابل تحديث P6 بتاريخ 27-أكتوبر-2026. الأيام بين القوسين هي التأخير عن الخطة الأساسية كما يذكره التقرير الأسبوعي.


| المعلم | الخطة الأساسية | توقع التقرير الأسبوعي | توقع تحديث P6 | الفائض في P6 (أيام) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| تسليم الموقع | 12-Jan-2025 | 12-Jan-2025 | 12-Jan-2025 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| اكتمال التجهيز | 12-Mar-2025 | 12-Mar-2025 | 09-Mar-2025 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| اعتماد المخططات التنفيذية والمواد | 10-Feb-2025 | 11-Feb-2025 | 24-May-2025 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| شبكة الأعمال الترابية | 24-May-2026 | 31-May-2025 | – | – | ✓ منجز |
| شبكة الاتصالات | 28-Sep-2026 | 19-Apr-2027 (+203 يوماً) | 18-Mar-2027 | -165 | ▼ متأخر |
| شبكة الري | 23-Aug-2026 | 11-May-2027 (+261 يوماً) | 11-May-2027 | -163 | ▼ متأخر |
| شبكة مياه الشرب | 05-Oct-2026 | 11-Jul-2027 (+279 يوماً) | 27-Jun-2027 | -180 | ▼ متأخر |
| شبكة الصرف الصحي | 06-Oct-2026 | 05-Jul-2027 (+272 يوماً) | 21-Jun-2027 | -184 | ▼ متأخر |
| شبكة الجهد المتوسط | 17-Oct-2026 | 28-Apr-2027 (+193 يوماً) | 07-Apr-2027 | -134 | ▼ متأخر |
| أعمال الطرق | 21-Oct-2026 | 24-Aug-2027 (+307 يوماً) | 24-Aug-2027 | -195.5 | ▼ متأخر |
| شبكة إنارة الشوارع | 20-Dec-2026 | 21-Jul-2027 (+213 يوماً) | 30-Jun-2027 | -212 | ▼ متأخر |
| شبكة تصريف السيول | – | 19-Jul-2027 | 11-Jul-2027 | -172 | ▼ متأخر |
| بحيرات تصريف السيول | – | – | 02-May-2027 | -110 | ▼ متأخر |
| محطة رفع الصرف الصحي | – | – | 30-May-2027 | -129 | ▼ متأخر |
| الربط بالشبكات القائمة | – | – | 24-Aug-2027 | -192.5 | ▼ متأخر |
| انتهاء المشروع | 11-Jan-2027 | 07-Sep-2027 (+239 يوماً) | 07-Sep-2027 | -195.5 | ▼ متأخر |

**يتفق التوقعان على تاريخ الانتهاء لكنهما يختلفان في معالم الشبكات.**

كلاهما يحدد 07-سبتمبر-2027 لانتهاء المشروع ونفس التواريخ للري وأعمال الطرق. أما الاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي والجهد المتوسط وإنارة الشوارع وتصريف السيول فتحديث P6 أبكر من التقرير الأسبوعي بـ8 إلى 32 يوماً. وتأخرت جميع التواريخ المتوقعة بين 6 و12 يوماً منذ التقرير 92. وشهادة عدم الممانعة من المالك لشبكة الجهد المتوسط هي المعلم الرقابي الوحيد الذي لم يتحقق بعد، ويجدولها P6 الآن في 22-ديسمبر-2026 بفائض −46 يوماً.

## توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الكمية المطلوبة. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026، دون تغيير منذ التقرير 92. جميع المواد المدرجة معتمدة.

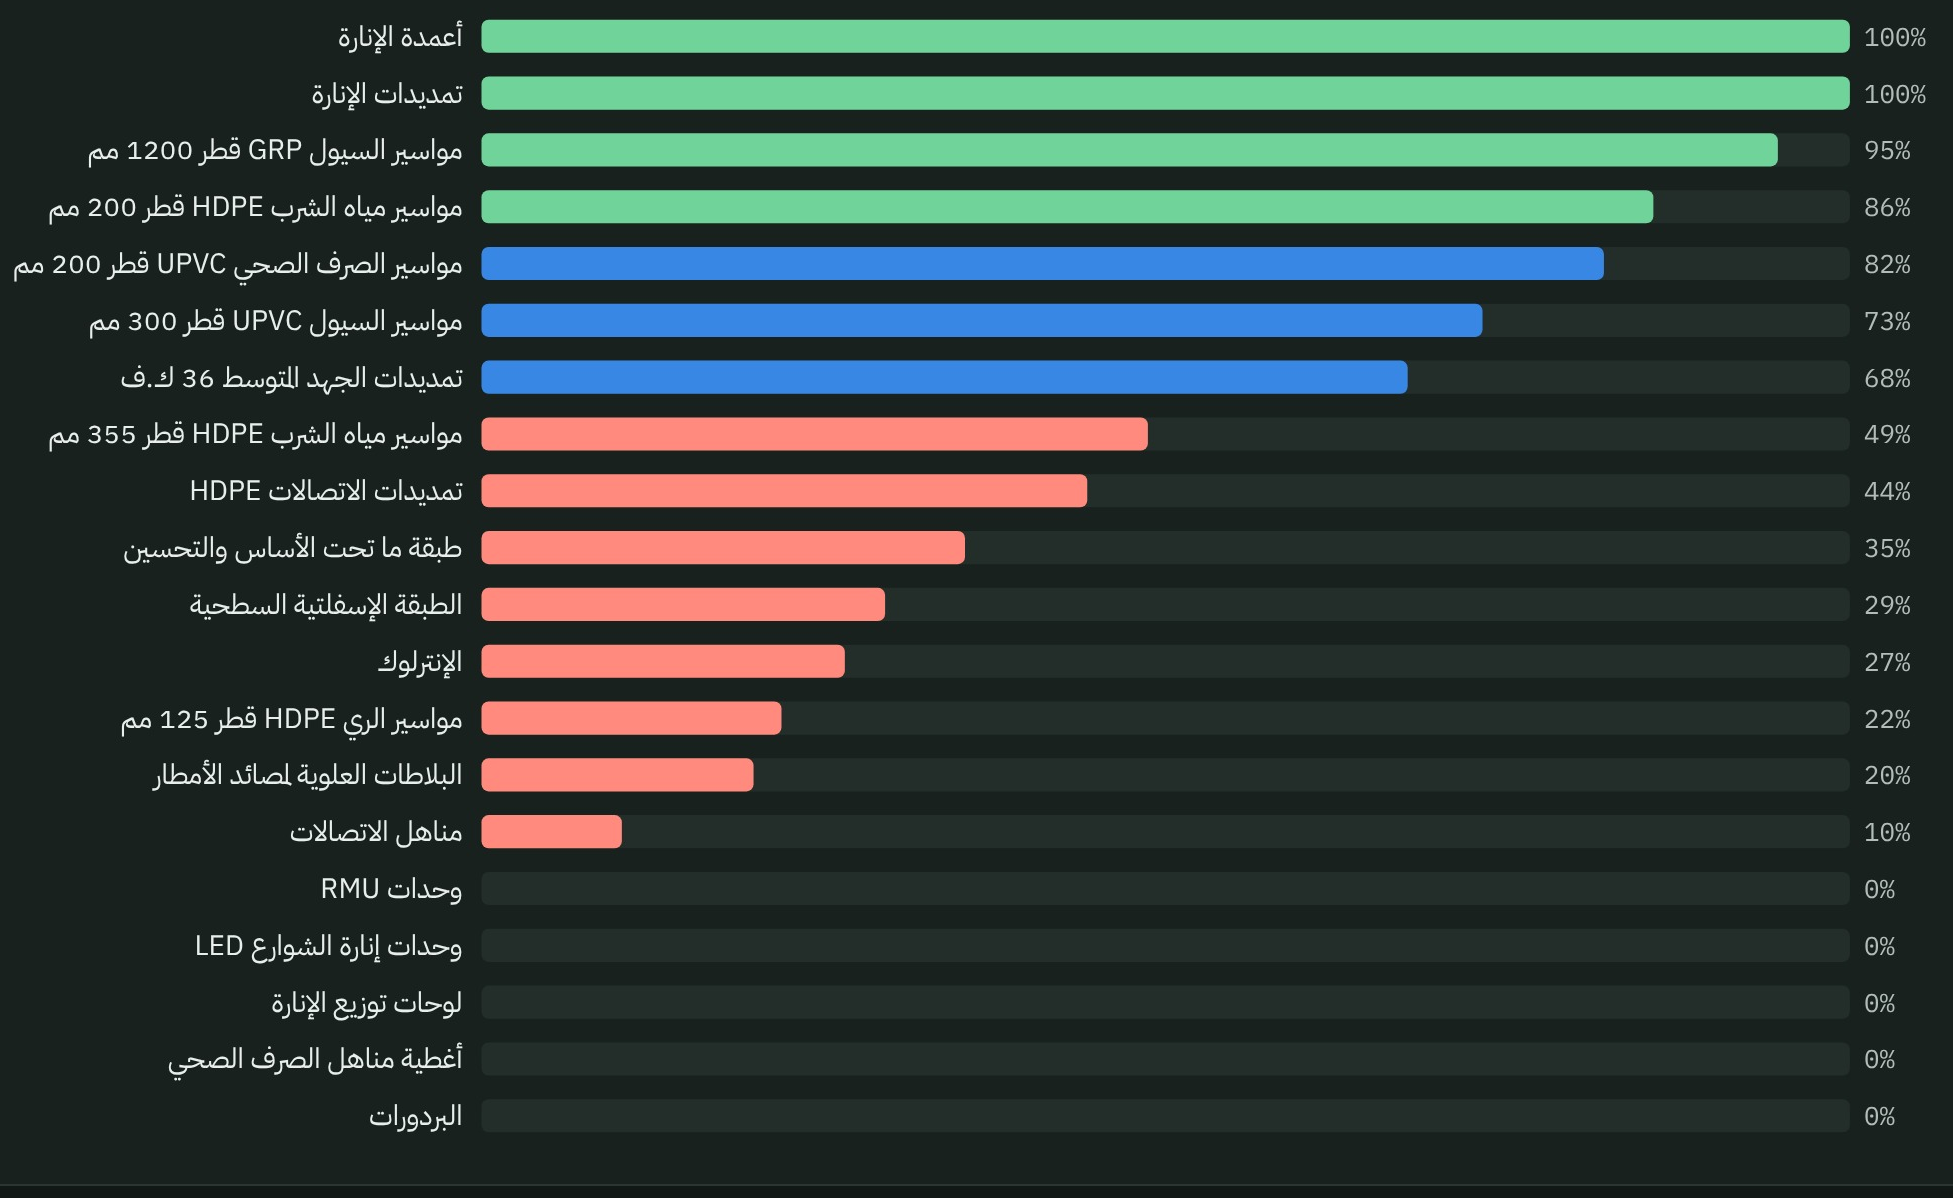


**لم يُورّد شيء بعد لعدة بنود في الشبكات الحرجة**


وحدات RMU (0 من 9)، ووحدات إنارة الشوارع LED (0 من 363)، ولوحات توزيع الإنارة (0 من 6)، والبردورات (0 من 42,552 قطعة)، وأغطية مناهل الصرف الصحي (0 من 129)، وأغطية وشبكات السيول. ويصنف سجل المخاطر تأخر المواد طويلة الأجل كخطر مرتفع.

**تأخر مواد الاتصالات والري وطبقات الطرق**

ورُد 44% من تمديدات الاتصالات و8 من 78 من مناهل الاتصالات. وورُد 22% من مواسير الري 125 مم، و20% من البلاطات العلوية لمصائد الأمطار، و17–35% من مواد طبقات الطرق (طبقة التحسين وما تحت الأساس والأساس والأسفلت والإنترلوك). وتمديدات الجهد المتوسط عند 8,378 من 12,378 م.

## القوى العاملة

عدد العمالة في الموقع هذا الشهر حسب المهنة، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower. لا يتضمن التقرير سجلاً شهرياً.

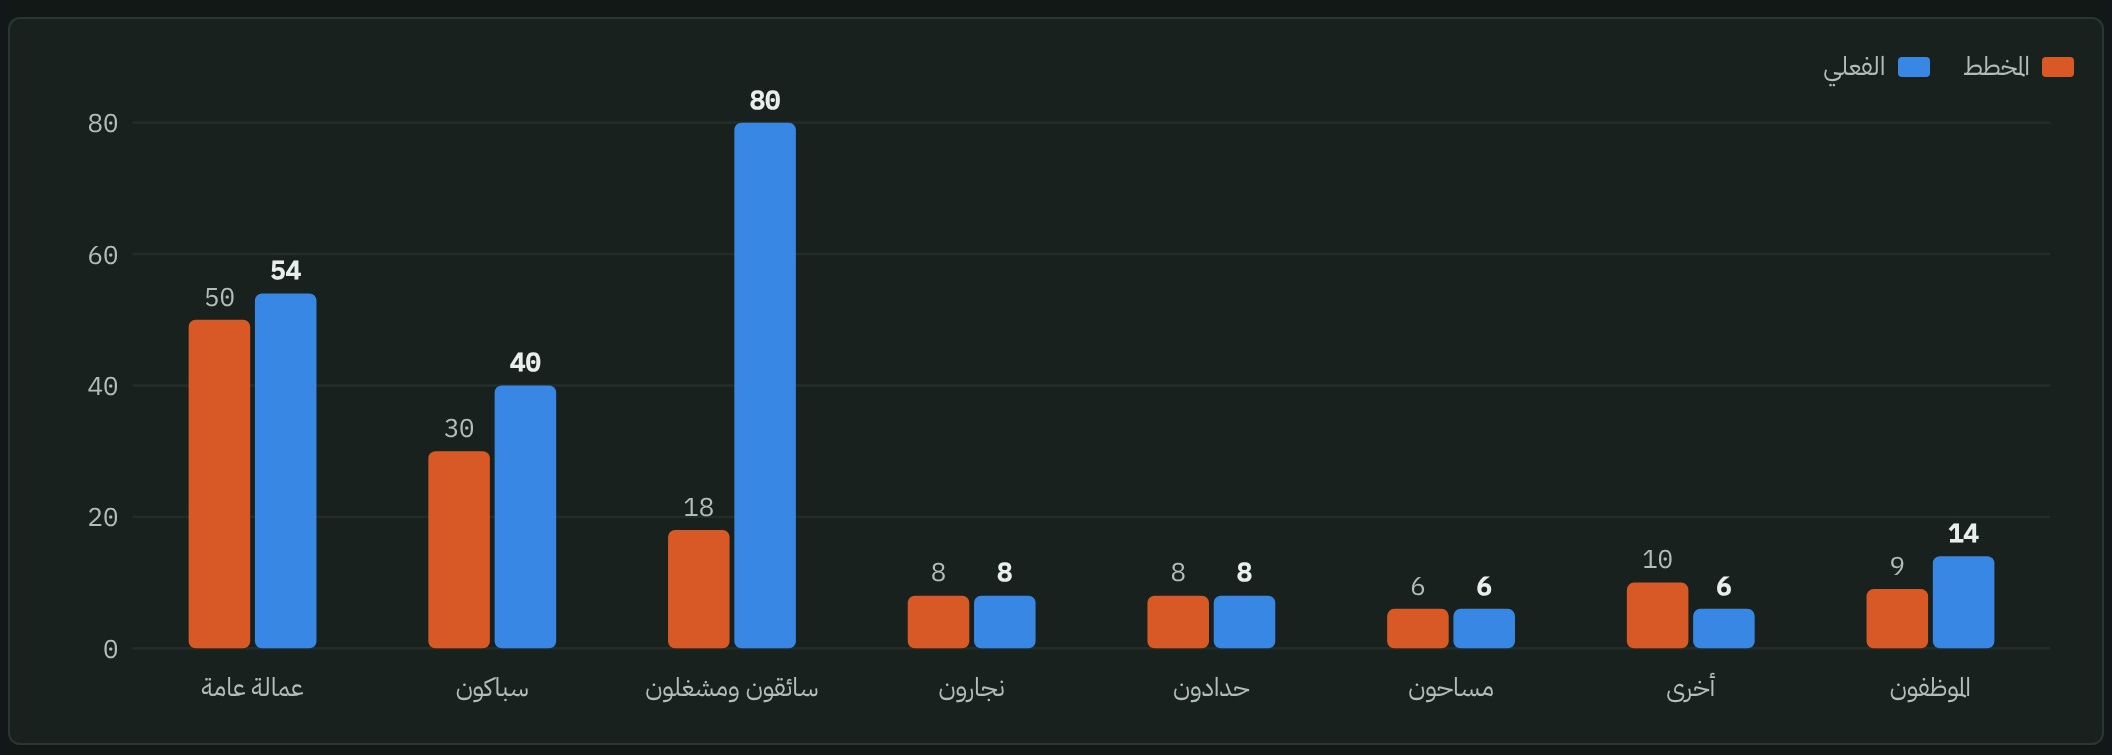

إجمالي العمالة 214 مقابل 139 مخططاً: 200 عامل مقابل 130، و14 موظفاً مقابل 9. أصبح عدد النجارين والحدادين مطابقاً لخطة مخفّضة (8 لكل منهما، بعد أن كانت الخطة 18 و15 في التقرير 92)، والسائقون والمشغلون أعلى منها بكثير (80 مقابل 18). والمعدات في الموقع 100 وحدة مقابل 11 مخططة. ورغم ذلك لم يتحقق تقدم فعلي يُذكر.

## التكلفة والمستخلصات

### قيمة العقد

| | |
|---|---|
| الطرق والرصف | 31,308,119 |
| تصريف مياه الأمطار | 33,717,595 |
| الصرف الصحي ومحطات الرفع | 24,177,287 |
| مياه الشرب | 10,220,942 |
| الري | 6,738,491 |
| إنارة الشوارع والاتصالات | 6,440,353 |
| الجهد المتوسط | 4,788,987 |
| **إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)** | **117,391,774** |
| قيمة العقد شاملة ضريبة 15% | 135,000,540 |
| أوامر التغيير | 0 |

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. سجل أوامر التغيير فارغ، ويذكر التقرير تغييراً محتملاً واحداً.

### المستخلصات

| | |
|---|---|
| الدفعة المقدمة (10%) | 11,739,177 |
| المستخلصات الجارية المقدمة | 20 |
| القيمة الإجمالية | 50,649,221 |
| استرداد الدفعة المقدمة | 5,064,922 |
| المحتجزات / الغرامات | 0 / 0 |
| المعتمد من مدير المشروع - مدن | 50,649,221 |
| المدفوع (18 مستخلصاً) | 40,094,952 |

المفوتر 43.1% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 55.0%. أُضيف هذا الأسبوع المستخلص 20 (من 01-سبتمبر إلى 30-سبتمبر-2026، بقيمة إجمالية 7,234,753 ريال). والمستخلصان 19 و20 معتمدان وبانتظار الدفع.

## الصحة والسلامة والجودة

### السلامة التقييم 0.82

| | |
|---|---|
| ساعات العمل الآمنة (تراكمي) | 398,698 |
| ساعات العمل هذا الأسبوع | 9,600 |
| إصابات مضيعة للوقت | 0 |
| الوفيات | 0 |
| حالات الإسعافات الأولية | 5 |
| حوادث وشيكة | 1 |
| أضرار المتلكات | 0 |
| التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية | 96 / 320 |

أرقام تراكمية. هذا الأسبوع: جلستا تعريف بالسلامة و6 اجتماعات توعية.

### الجودة التقييم 0.90

| | |
|---|---|
| طلبات الفحص الميداني الصادرة (تراكمي) | 1,881 |
| طلبات الفحص المغلقة | 1,791 |
| طلبات الفحص المعلقة (0–10 أيام) | 90 |
| تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة | 21 / 21 |
| تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة | 13 / 12 |
| طلبات فحص المواد الصادرة | 0 |
| المخططات التنفيذية المقدمة (جميعها بالرمز B) | 23 |
| اعتمادات المواد (A / B / C / D) | 1 / 72 / 2 / 1 |

تُغلق تقارير عدم المطابقة خلال 7 أيام في المتوسط. ولا يزال 7 من طلبات اعتماد المواد بانتظار الاعتماد.

## المشكلات والمخاطر القائمة

| المشكلة | المسؤول | التفاصيل |
|---|---|---|
| التأخر في الجدول الزمني | المقاول | الانتهاء المتوقع 07-سبتمبر-2027، بتأخير 239 يوماً. ولم يُنجز خلال 14 يوماً سوى 0.17% مقابل 4.07% مخططاً. ويُظهر التقرير 418 نشاطاً متعثر البدء (406 في التقرير 92) و674 نشاطاً على المسار الحرج (669). ولا يوجد تسجيل لاعتماد جدول تعافٍ. |
| المواد طويلة الأجل | المقاول | الخطر 05، مرتفع وقائم: قد يؤدي تأخر توريد المواد طويلة الأجل إلى توقف العمل. المعالجة: متابعة الموردين والحصول على موافقة مدن على مصادر بديلة. الموعد المستهدف 20-نوفمبر-2026. |
| الربط بالشبكات القائمة | المقاول / مدن | الخطر 01، منخفض وقائم: قد لا تكون البنية التحتية القائمة جاهزة للربط، مما يؤخر التشغيل والتسليم. معلم الربط في P6 بتاريخ 24-أغسطس-2027 بفائض −192.5 يوماً. |
| الاختبار والتشغيل | المقاول | كان مخططاً بدء الاختبارات في 12-أكتوبر-2026 (الاتصالات) و18-أكتوبر-2026 (الري) و26-أكتوبر-2026 (إنارة الشوارع والجهد المتوسط). لم يبدأ أي منها، وتمتد تواريخ البدء المتوقعة من 12-نوفمبر-2026 إلى 04-يناير-2027. |
| شهادة عدم الممانعة لشبكة الجهد المتوسط | المقاول | شهادة عدم الممانعة من المالك لشبكة الجهد المتوسط لم تصدر بعد (P6: 22-ديسمبر-2026، بفائض −46 يوماً). |

المغلق في السجلات: المياه الجوفية ونزحها (مرتفع)، وتأخر أو فشل الاختبارات، والمشكلتان المسجلتان (نقطة توصيل الري، وخط الضخ لمحطة الرفع). وسُجلت وفورات إعادة قياس جدول الكميات كفرصة متحققة.

---

## ملاحظات على البيانات

أُعدّ من رفع W04 (التقرير 94)، واستُخدم الرفع السابق (التقرير 92) فقط لحساب تغيرات هذا الأسبوع.

- لم يُرفع التقرير 93. يضم الرفع السابق التقرير 92 (13-أكتوبر-2026)، لذا تغطي أرقام "هذا الأسبوع" (0.17% فعلي، و200 م لكل من المياه والجهد المتوسط) 14 يوماً، بينما يصفها الغلاف بأنها أسبوعية.
- الأسبوع 93 هو أسبوع العقد المذكور في ورقة المعالم بالتقرير ("93 من 104")، ويطابق المدة من 12-يناير-2025 إلى 27-أكتوبر-2026 = 653 يوماً. أما ملف التقرير نفسه فرقمه 94.
- في غلاف التقرير، لا يزال التقدم الفعلي حسب هيكل العمل مزاحاً بصف واحد (تظهر للأعمال الترابية ساعات عمل الري وهكذا). أُخذت الأرقام من ورقة Progress.
- تعرض ورقة الملخص العربية أرقاماً مبنية على التكلفة بوصفها "نسبة الإنجاز" المخططة والفعلية. يعتمد هذا التقرير التقدم الفعلي فقط (بعدد ساعات العمل): 89.38% مخطط و54.98% فعلي.
- في ورقة Physical-Chart Data أصبح رقم أكتوبر المكتسب 75 ساعة عمل (كان 1,493 في التقرير 92)، أي أن قيمة الشهر استُبدلت بقيمة الفترة الأخيرة. أما الفعلي التراكمي (54.98%) فمتسق.
- لا يزال التوقع الفعلي في بيانات المنحنى يصل إلى 100% في يناير 2027، وهذا يتعارض مع الانتهاء المتوقع في 07-سبتمبر-2027. ولا تزال ورقة "Last week vs this week" مبنية على تحديثات P6 لشهر أبريل 2026.
- تُظهر ورقة الملخص زيادة 200 م في شبكتي مياه الشرب والجهد المتوسط، بينما ورقة Major Quantities وسجل التوريدات مطابقان للتقرير 92. ولا تزال إجماليات الشبكات في الملخص لا تطابق ورقة Major Quantities (مثلاً مياه الشرب 12,200 م.ط مقابل 9,720 م من المواسير).
- تكرر ورقة أنشطة الأسبوع قائمة أنشطة التقرير 92 حرفياً، وجدول كميات هذا الأسبوع فيها فارغ.
- القوى العاملة: انخفضت الخطة اليدوية من 165 إلى 130 بينما ارتفع الفعلي من 152 إلى 200. ويبلغ إجمالي جدول المهن 202، وإجمالي المهن في الغلاف 122 (دون السائقين والمشغلين). ولا يزال توقع الشهر القادم 1,148 عاملاً.
- الصحة والسلامة: تقدمت الإحصائيات بأسبوع واحد فقط (9,600 ساعة) خلال الـ14 يوماً منذ التقرير 92، ولا تزال ورقة التفتيش تغطي الفترة من 26-أغسطس إلى 01-سبتمبر-2026.
- تذكر ورقة الملخص تاريخ استلام الموقع 12-فبراير-2025 (12-يناير-2025 في التقرير الأسبوعي)، وتختلف تواريخ المعالم فيها عن الخطة الأساسية في التقرير الأسبوعي.
- لا يزال سجل التوريدات يتضمن كميات موّردة أعلى من المطلوبة (مواسير GRP للصرف الصحي 400 مم SN5000 بكمية 1,060 من 261 م، ووصلات الري 110 مم 322 من 58) وأخطاء في الوحدات ("m132" و"m133").
- رمز المشروع في ملف P6 هو MOD3-J-1 (وكان MOD3-J-2 في تحديث 20-أكتوبر-2026). ولا يزال اسم قائمة الأنشطة متعثرة البدء يحمل تاريخ 20-10-2026 رغم تغير محتواها.
- قيمة تصريف السيول 33,717,565 ريال في ورقة الملخص و33,717,595 ريال في المستخلص؛ وتاريخ معلم الأعمال الترابية في الخطة الأساسية (24-مايو-2026) لاحق لتاريخ انتهائه الفعلي (31-مايو-2025)؛ وورقة الخطة قصيرة المدى لم تتغير ولا تزال تذكر 22-فبراير-2026 تاريخاً متوقعاً للانتهاء.
- تُظهر عدة حقول في الغلاف الخطأ !REF# (التكلفة المتوقعة عند الإنجاز، وأهم المشكلات)، ولا يزال سجل المستخلصات يحتوي على القيم الشاذة 21,100,000 و20,900,000.
- الصور: أُعيد رفع الصور العشر من التقرير 92 ولم يُعَد استخدامها، والصور الست الجديدة لا يظهر عليها ختم تاريخ.

---

أُعدّ في 01-نوفمبر-2026 من رفع W04: التقرير الأسبوعي 94 وتحديث P6، وكلاهما بتاريخ بيانات 27-أكتوبر-2026.
