تطوير البنية التحتية بالمدينة الصناعية الأولى بجدة (1كم2)

Infrastructure Development for Industrial City 1 in Jeddah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عبدالله الجليفي	19-Nov-2025	18-Nov-2027

النطاق: أعمال الطرق وشبكات السيول والصرف الصحي ومياه الشرب والمياه المعالجة، والأعمال الكهربائية، والسور والبوابات، وجسر، وأعمال تنسيق المواقع. قيمة العقد 86.8 مليون ريال، ومدته 24 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. بنسبة إنجاز 73.4% مقابل 48.0% مخططاً، المشروع متقدم بنسبة 25.4% (مؤشر الأداء الزمني 1.53). وحقق هذا الأسبوع 0.77% مقابل 1.00% مخططاً، فتقلص التقدم قليلاً. ومع ذلك يتوقع الجدول الزمني الآن الانتهاء بعد تاريخ العقد بـ191 يوماً، أي بعد توقع الأسبوع الماضي بأسبوع.

نسبة الإنجاز الفعلي
73.4% / 48.0% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.53 +25.4%

التقدم هذا الأسبوع
+0.77% / +1.00% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.23%

المدة المنقضية من العقد
46.9% · اليوم 342 من 729
▼ الانتهاء المتوقع 27-مايو-2028

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
51.7% · 44.9 مليون ريال
7 مستخلصات في السجل، آخر فترة تنتهي في 29-سبتمبر-2026

متقدم كثيراً في الإنجاز، لكن الانتهاء المتوقع متأخر ستة أشهر.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 الانتهاء في 27-مايو-2028، أي بعد تاريخ انتهاء العقد (18-نوفمبر-2027) بـ191 يوماً، بفائض زمني كلي −163 يوماً (−157 الأسبوع الماضي). وتأخر كل معلم مفتوح سبعة أيام أخرى هذا الأسبوع. وبند الطرق والجهد المتوسط، وهو المتأخر عن الخطة (73.5% مقابل 100% دون تغيير هذا الأسبوع)، يعتمد على شبكة الجهد المتوسط التي تنتظر الاتفاقية بين مدن والشركة السعودية للكهرباء، ولم تصدر بعد أوامر شراء تمديدات الجهد المتوسط ووحدات RMU ومحطات الإنارة.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ورقة الصور الأسبوعية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026، وتحمل ختم الكاميرا 25 و26 أكتوبر 2026 حيث يظهر الختم. تجري أعمال الطبقة الإسفلتية السطحية وتمديدات الاتصالات والإنترلوك وقواعد اللوحات. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



مواسير الاتصالات، الطريق المحلي L01

مواسير ممدودة على طول الخندق. مختومة 26-أكتوبر-2026، 10:07.



الطبقة الإسفلتية السطحية

شاحنة قلابة تغذي الفرّادة. بدون ختم تاريخ.



مواسير الاتصالات في الخندق، L01

مواسير موضوعة في الخندق. مختومة 26-أكتوبر-2026، 06:25.




أعمال الإنترلوك

طاقم يرصف البلاط على ممر المشاة. بدون ختم تاريخ.



أعمال الطبقة الإسفلتية السطحية

دحّال على السطح الجديد. مختومة 25-أكتوبر-2026، 08:52.

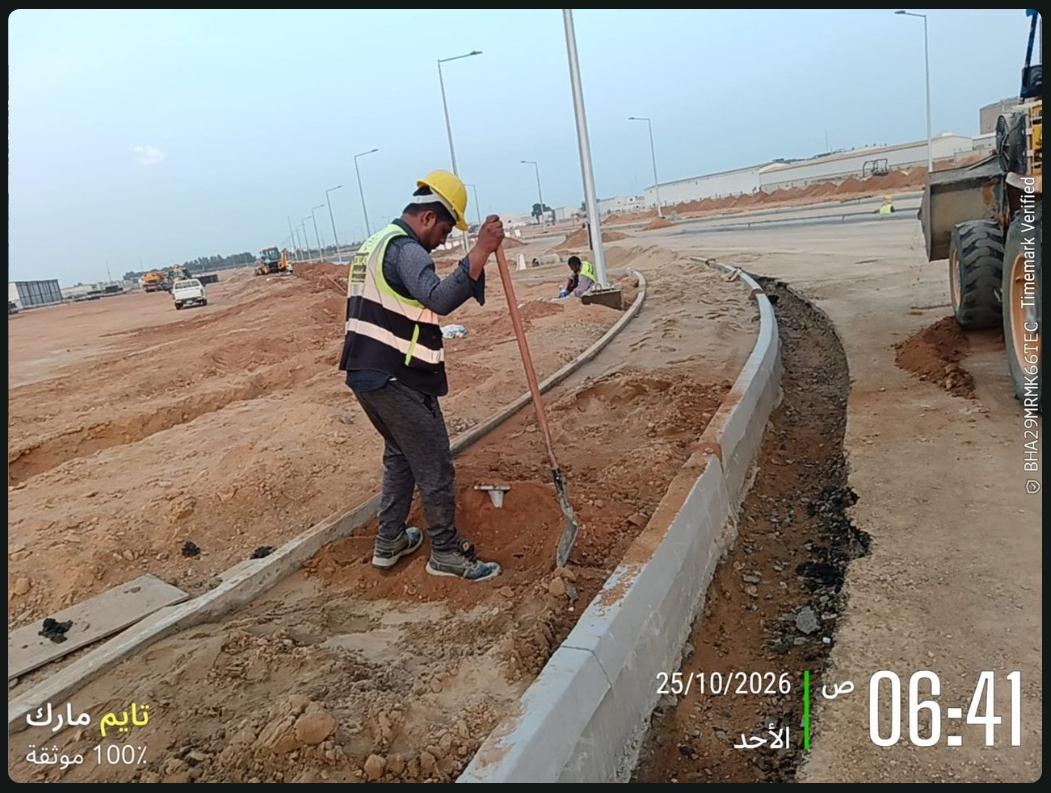

قواعد اللوحات

حفر قاعدة لوحة بجانب البردورة. مختومة 25-أكتوبر-2026، 06:41.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data. الخطة المعدلة في الورقة مطابقة للخطة الأساسية، لذا رُسمت الخطة الأساسية فقط.



الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
الأسبوع قبل الماضي	46.20	72.35	+26.14	—	1.57
20-Oct-2026	46.99	72.61	+25.63	+0.27	1.55
27-Oct-2026	**47.99**	**73.38**	**+25.40**	**+0.77**	**1.53**

صفا 20 و27 أكتوبر مأخوذان من التقريرين الأسبوعيين بهذين التاريخين، والصف الأول من عمود "الأسبوع الماضي" في تقرير 20 أكتوبر ولا يُذكر المنجز فيه. والفعلي لشهر أكتوبر في المنحنى (74.8%) مأخوذ من بيانات P6 وهو أعلى من 73.4% في لوحة التقرير، انظر ملاحظات على البيانات.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. وتظهر المراحل الفرعية للتنفيذ تحت بند التنفيذ.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	2.8%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	4.7%	100.0%	98.8%	-1.2%	0.99	▼ متأخر قليلاً
التوريدات	11.5%	43.5%	78.9%	+35.4%	1.81	▲ متقدم
التنفيذ	76.3%	46.5%	72.6%	+26.1%	1.56	▲ متقدم
· أعمال الإزالة	1.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
· الطرق والجهد المتوسط	14.0%	100.0%	73.5%	-26.5%	0.73	▼ متأخر
· الشبكات العميقة	7.6%	100.0%	95.9%	-4.1%	0.96	▼ متأخر قليلاً
· الشبكات السطحية	27.8%	25.1%	78.2%	+53.2%	3.12	▲ متقدم
· الجسر	2.0%	56.3%	87.1%	+30.8%	1.55	▲ متقدم
· خارج حدود المشروع (خطوط الربط)	2.8%	52.0%	99.7%	+47.6%	1.92	▲ متقدم
· تشطيبات الطرق	9.2%	0.0%	75.9%	+75.9%	–	▲ متقدم
· السور والبوابات	6.1%	55.0%	58.2%	+3.2%	1.06	▲ في المسار

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
٠ الدوار وتنسيق المواقع	5.8%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الاختبار والتشغيل	2.8%	0.0%	53.1%	+53.1%	–	▲ متقدم
إغلاق المشروع	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**48.0%**	**73.4%**	**+25.4%**	**1.53**	▲ متقدم

تذكر إحصائيات تحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) عدد 1,905 أنشطة: 1,278 مكتملاً و198 قيد التنفيذ و419 لم يبدأ. ومن الأنشطة الجارية الـ198 هناك 93 متقدمة و105 متأخرة. وانخفضت أنشطة المسار الحرج من 457 إلى 448، والأنشطة المتعثرة البدء من 113 إلى 105.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية لبنود جدول الكميات الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" الفرق عن تقرير 20-أكتوبر-2026. ولا يقسم التقرير الكميات حسب المنطقة ولا يذكر كميات الردم.

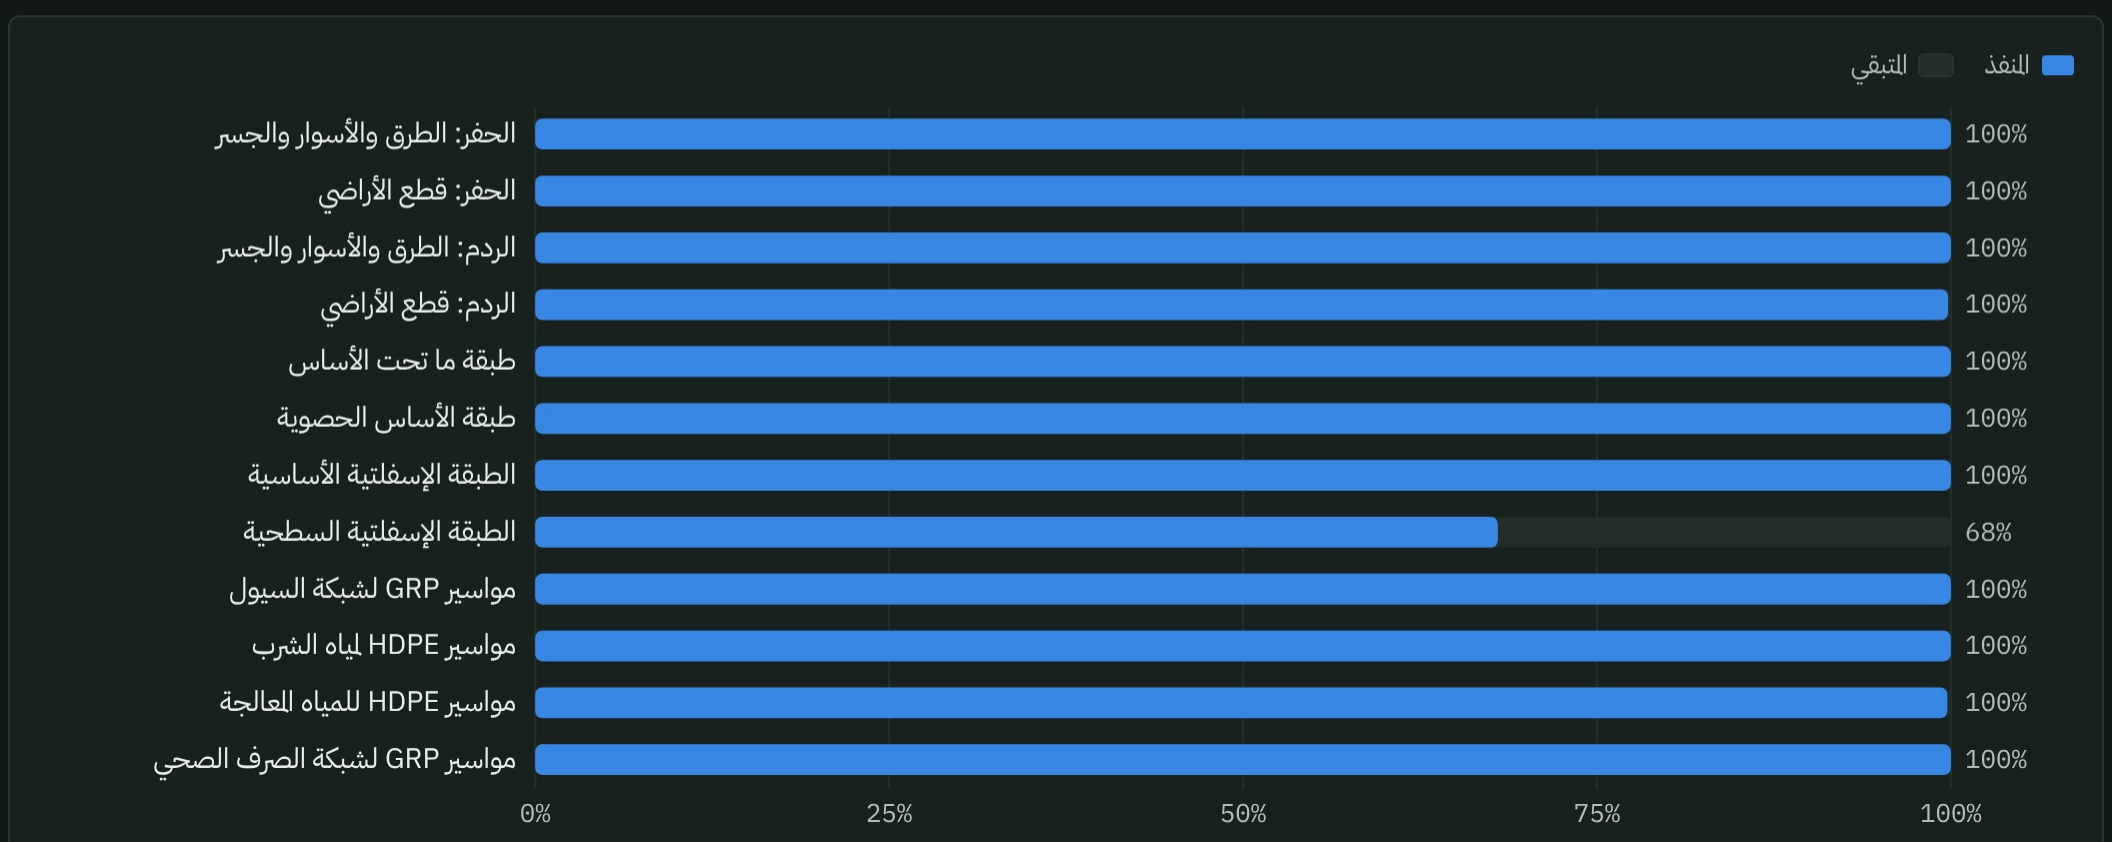

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر: الطرق والأسوار والجسر	الكل	م³	116,177	116,177	0	0	100.0%	–
الحفر: قطع الأراضي	الكل	م³	123,555	123,555	0	0	100.0%	–
الردم: الطرق والأسوار والجسر	الكل	م³	80,920	80,920	0	0	100.0%	–
الردم: قطع الأراضي	الكل	م³	94,645	94,456	0	189.3	99.8%	–
طبقة ما تحت الأساس	الكل	م³	34,694	34,694	0	0	100.0%	–
طبقة الأساس الحصوية	الكل	م³	23,129	23,129	0	0	100.0%	–
الطبقة الإسفلتية الأساسية	الكل	م³	8,290	8,290	0	0	100.0%	–
الطبقة الإسفلتية السطحية	الكل	م³	5,920	4,026	1,952+	1,894	68.0%	–
مواسير GRP لشبكة السيول	الكل	م.ط	5,650	5,650	0	0	100.0%	–
مواسير HDPE لمياه الشرب	الكل	م.ط	12,075	12,075	0	0.3	100.0%	–
مواسير HDPE للمياه المعالجة	الكل	م.ط	8,722	8,700	0	22	99.7%	–
مواسير GRP لشبكة الصرف الصحي	الكل	م.ط	6,244	6,244	0	0	100.0%	–

الطبقة الإسفلتية السطحية هي البند الوحيد الذي تقدّم

نُفّذ 1,951.6 م³ هذا الأسبوع ليصل الإجمالي إلى 4,025.6 من 5,920 م³ (68.0%). وبقية بنود الأعمال الترابية وطبقات الأساس والمواسير دون تغيير، وهي مكتملة أو متبقٍ منها أقل من 0.3%.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتوقعات من ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي، والتوقعات والفائض الكلي من بيانات P6 في الملف نفسه.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	19-Nov-2025	19-Nov-2025	19-Nov-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
الجدول الزمني الأساسي	18-Dec-2025	18-Dec-2025	18-Dec-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
انتهاء التجهيز	18-Dec-2025	04-Mar-2026	04-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
اعتماد المخططات التنفيذية وطرق التنفيذ والمواد	19-Jan-2026	14-Nov-2026	14-Nov-2026	−61	▼ متأخر
إصدار جميع أوامر الشراء	19-Jan-2026	08-Nov-2026	08-Nov-2026	−55	▼ متأخر
اكتمال الطرق والجهد المتوسط	17-Sep-2026	25-Jan-2027	26-Jun-2027	−111	▼ متأخر
اكتمال الشبكات العميقة	18-Nov-2026	26-Jun-2027	25-Jan-2027	39	؟ يتعارض مع P6
اكتمال الشبكات السطحية	18-Mar-2027	10-Oct-2027	10-Oct-2027	−40	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال	18-Nov-2027	27-May-2028	27-May-2028	−163	▼ متأخر

المصدران يتبادلان تاريخَي معلمين.

يتوقع التقرير الأسبوعي اكتمال الطرق والجهد المتوسط في 25-يناير-2027 والشبكات العميقة في 26-يونيو-2027، بينما تعطي بيانات P6 التاريخين نفسيهما بالعكس. وتتفق بقية التوقعات. وتأخر كل توقع مفتوح سبعة أيام عن تقرير 20 أكتوبر، فأصبح معلما الاعتمادات وأوامر الشراء (07 نوفمبر و01 نوفمبر الأسبوع الماضي) مستحقين في 14 نوفمبر و08-نوفمبر-2026.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من كمية جدول الكميات المعدلة. المصدر: ورقة Material Monitoring، التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026.



مواد الجهد المتوسط: لم يُطلب شيء


لم تُورَّد تمديدات الجهد المتوسط (14,500 م) ووحدات (4) RMU ومحطات الإنارة الفرعية (4) والعدادات (4) ونهايات التمديدات (64). ويُظهر سجل التوريدات أن أوامر تمديدات الجهد المتوسط والمحطات متوقفة حتى إنهاء اتفاقية الكهرباء بين مدن والشركة السعودية للكهرباء، والتوريد متوقع الآن في 30-نوفمبر-2026.

بنود تشطيب الطرق

الطبقة الإسفلتية السطحية: ورّد 4,025.6 من 5,920 م³ (68% بعد أن كانت 35%). ولم تُورَّد بعد علامات الطريق (3,780 م²) ودهان اللياسة (4,062 م²). وإجمالاً صدر 108 من 113 أمر شراء، ووصلت 105 من 113 مادة إلى الموقع.

القوى العاملة

عدد العمالة المباشرة الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

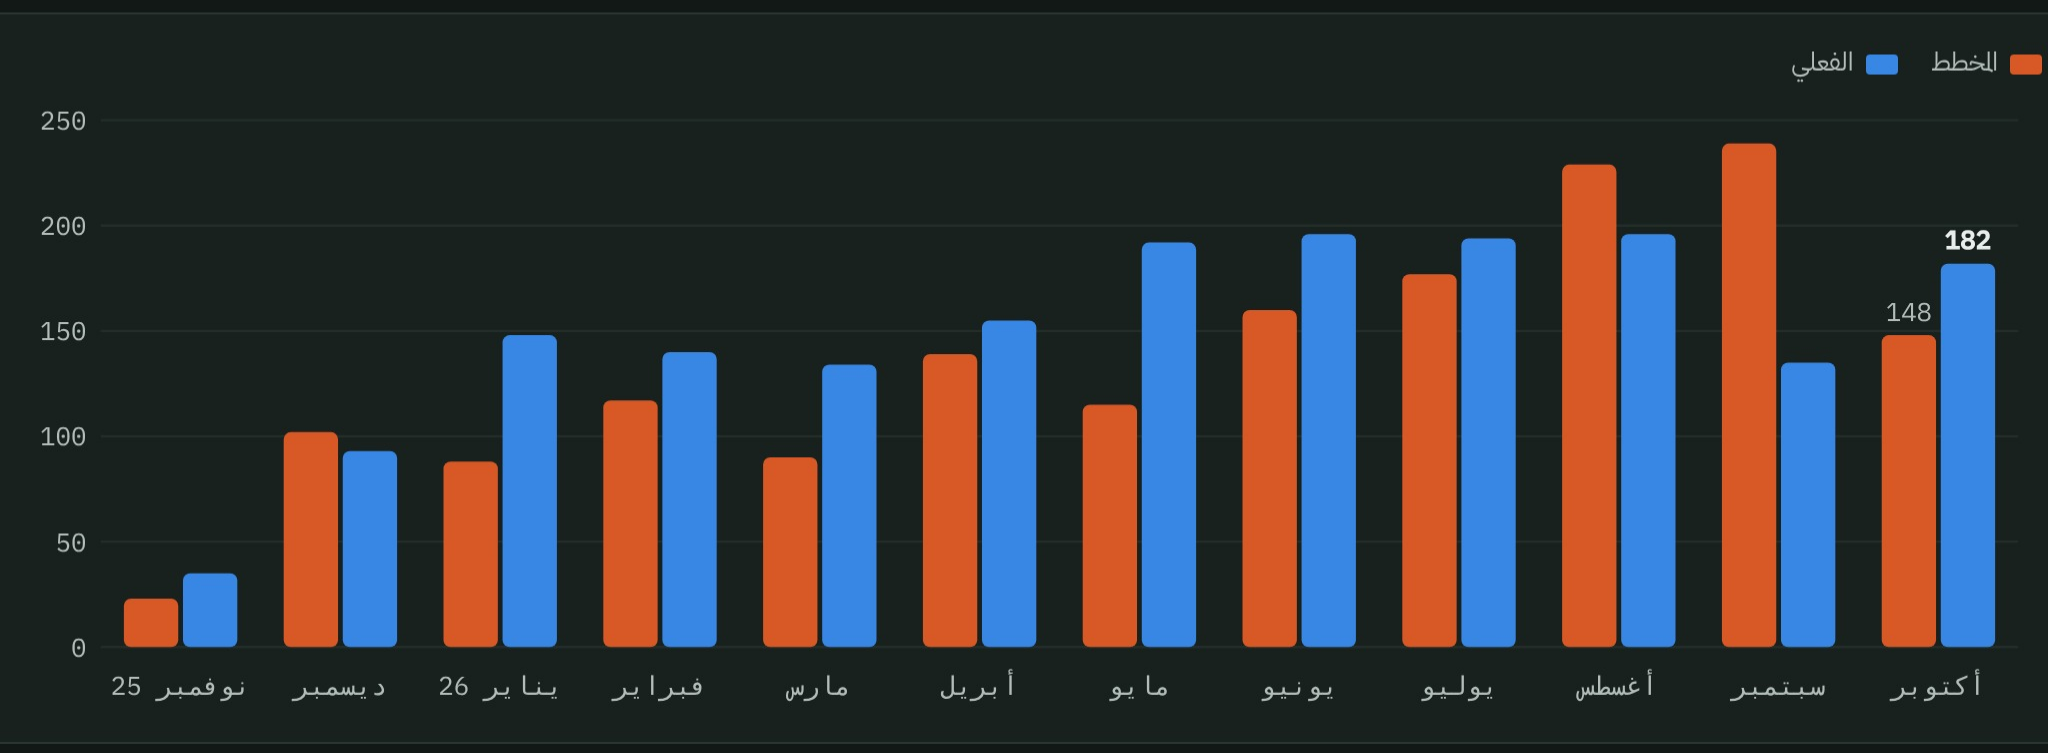

يرفع تقرير 27 أكتوبر عدد العمالة المباشرة لشهر أكتوبر إلى 182 مقابل 148 مخططاً (+23%، وكان تقرير 20 أكتوبر قد ذكر 130). والموظفون غير المباشرين 48 مقابل 22 مخططاً. والمعدات في الموقع 75 مقابل 60 مخططاً. وترتفع الخطة إلى 187 عاملاً في نوفمبر.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	86,782,345
قيمة العقد المعدلة	86,782,345
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	86,782,345
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة (ورقة CCO).

المستخلصات

المستخلصات في السجل	7
القيمة الإجمالية	44,851,849
المعتمد من مدير المشروع (7، شامل الضريبة)	51,579,627
المدفوع (6، شامل الضريبة)	48,055,958
المحتجزات / الخصومات	0 / 0
الدفعة المقدمة	0

المفوتر الإجمالي 51.7% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 72.6%. المستخلص 7 (الفترة حتى 29-سبتمبر-2026، 3,523,669 شامل الضريبة) معتمد من مدير المشروع وأُرسل إلى الحسابات في 06-أكتوبر-2026، ولم يُدفع بعد.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.73

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	474,226
ساعات العمل هذا الأسبوع	9,216
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية (تراكمي)	90 / 64

تفتيش السلامة من مدن 27-أكتوبر-2026: 7 بنود جيدة، و13 بحاجة إلى تحسين، و3 بنود راسبة (إدارة مخلفات الموقع، والتواصل واجتماعات السلامة، وجولات قيادة المشروع الميدانية).

الجودة التقييم 0.85

طلبات الفحص الميداني الصادرة / المغلقة	5,541 / 5,461
طلبات الفحص لدى الاستشاري	59
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	105 / 105
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	17 / 16
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	21 / 21
المخططات التنفيذية المعلقة	3

تقييم الجودة من الاستشاري 0.85 هذا الأسبوع، والمتوسط 0.83 لجميع عمليات التدقيق.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
اتفاقية الجهد المتوسط بين مدن والشركة السعودية للكهرباء	المسؤول	مفتوحة منذ 15-ديسمبر-2025، وكان الإغلاق المستهدف 30-ديسمبر-2025. تتابع مدن مع الشركة السعودية للكهرباء توفير مصدر الكهرباء، وينتظر المقاول الرد على الخطاب رقم 2818 بتاريخ 13-يناير-2026.
مواد الجهد المتوسط متوقفة	المالك / المقاول	تنتظر أوامر شراء تمديدات الجهد المتوسط ووحدات RMU ومحطات الإنارة الفرعية الاتفاقية. وأمر شراء وحدات RMU موسوم "متأخر"، وكان مطلوباً في الموقع بحلول 20-أكتوبر-2026 ولم يصدر بعد.
الانتهاء المتوقع	المقاول	يتوقع الجدول الزمني الانتهاء في 27-مايو-2028 بفائض −163 يوماً، أي بعد تاريخ العقد بـ191 يوماً، رغم أن الإنجاز الفعلي متقدم على الخطة بنسبة 25.4%. وتأخر التوقع سبعة أيام في كل من التقريرين الأخيرين.

المشكلتان الأخريان في السجل مغلقتان: تصاريح خطوط الربط من الشركة السعودية للكهرباء وSTC وشركة المياه الوطنية (أُغلقت 10-فبراير-2026)، وتأهيل موردي الشد اللاحق والركائز وفواصل التمدد.

ملاحظات على البيانات

أُعدّ من ملفات الأسبوع المرفوعة بتاريخ 27-أكتوبر-2026 (W04)، مع ملفات 20-أكتوبر-2026 (W03) لحساب تغيرات هذا الأسبوع.

- رقم الأسبوع: يذكر التقرير الأسبوع 48.86 (عدد الأسابيع الكاملة منذ تسليم الموقع: 48)، ومرجع الملف WPR-049.
- يختلف الإنجاز الفعلي بين الأوراق: تُظهر لوحة التقرير 73.4% (524,368 من 714,561 ساعة عمل)، بينما تُظهر بيانات P6 وورقة Physical-Chart Data نسبة 74.8% (534,438 ساعة عمل).
- يصف ملف الأعمال المنفذة خلال الأسبوع وورقتا Look Ahead والخلاصة التقدمَ المبني على التكلفة بأنه "الفعلي"، بينما يعتمد هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي بساعات العمل فقط. كما يذكر ملف الأعمال المنفذة رمز المشروع JDH3-03-011 وقيمة عقد 86,742,345 وانتهاءً متوقعاً في 30-نوفمبر-2026، وكذلك ورقة Look Ahead، أما لوحة التقرير وP6 فتتوقعان 27-مايو-2028.
- مدير المشروع - مدن: م. عبدالله الجليفي في ورقة المعلومات العامة، وم. رضا المنشاوي في ورقة Look Ahead وملف الأعمال المنفذة خلال الأسبوع.
- المعالم: ما زال P6 والتقرير الأسبوعي يتبادلان تاريخَي الطرق والجهد المتوسط والشبكات العميقة، ويُظهر عمود "الخطة الأساسية" في لوحة التقرير تواريخ الخطة الأحدث.
- الطبقة الإسفلتية السطحية: تُظهر ورقة Major Quantities تنفيذ 4,025.6 م³، وتُظهر ورقة Material Monitoring توريد 4,025.6 م³، لكن عمود "المركّب" فيها ما زال 2,074 م³. كما انخفضت الكمية المركّبة لبند تمديدات الجهد المنخفض (6,115 م) من 2,063 م إلى 230 م.
- إحصائيات الجدول غير متسقة: 1,278 مكتملاً + 198 قيد التنفيذ + 419 لم يبدأ = 1,895 وليس 1,905. كما يذكر عمود "الأسبوع الماضي" 107 أنشطة متعثرة البدء، بينما ذكر تقرير 20 أكتوبر 113 لذلك الأسبوع.
- عُدّل عدد العمالة الفعلي لشهر أكتوبر من 130 إلى 182 بين التقريرين. وتكرر ورقة السلامة 9,216 ساعة عمل لهذا الأسبوع، وهو رقم الأسبوع الماضي نفسه.
- سجل التوريدات لم يتغير عن ملفات 20 أكتوبر (ملف مطابق). ولم تُرفع شهادة الإنجاز ولا ملف PDF لخطة الأسابيع الثلاثة القادمة هذا الأسبوع.
- المستخلصات: يذكر الملخص 6 مستخلصات مقدمة، بينما يضم السجل 7، والإجمالي 44,851,849 يشمل السابع. والمبالغ المعتمدة والمدفوعة تشمل ضريبة 15%، بينما الإجمالي المقدم بدونها.
- مواسير HDPE: لا تسمّي ورقة Major Quantities الشبكة، واستُنتج أنها مياه الشرب والمياه المعالجة من الكميات، وتختلف الكميات المركّبة عن ورقة Material Monitoring.
- يبقى التراكمي الفعلي للمعدات عند 564 منذ يوليو رغم استمرار الأعداد الشهرية. وتُظهر عدة خلايا في لوحة التقرير أخطاء #REF!.
