تطوير اضافي و استكمال شبكات في تبوك

Additional Development and Network Completion, Tabuk Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية	إيجيس (EGIS)	م. يزيد	04-Sep-2025	03-Sep-2027

النطاق: الطرق، وبحيرة تصريف السيول A، وشبكات السيول والصرف الصحي ومياه الشرب ومكافحة الحريق والري بالمياه المعالجة وإنارة الطرق والاتصالات والمراقبة التلفزيونية (CCTV) في ثلاث مناطق بالمدينة الصناعية بتبوك. قيمة العقد 140.5 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. بلغ الإنجاز 50.7% مقابل 35.2% مخططاً وفق الخطة المعدلة، أي أن المشروع متقدم بنسبة 15.5% (مؤشر الأداء الزمني 1.44)، بعد إنجاز 0.8% خلال الأسبوع مقابل 0.6% مخططاً.

نسبة الإنجاز الفعلي
50.7% / 35.2% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.44 +15.5%

التقدم هذا الأسبوع
+0.8% / +0.6% مخطط
▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.2%

المدة المنقضية من العقد
56.2% · اليوم 410 من 729
▼ الانتهاء المتوقع 07-أكتوبر-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
32.9% · 46.2 مليون ريال
14 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 15-أكتوبر-2026

متقدم كثيراً على الخطة المعدلة، لكن الانتهاء المتوقع بعد تاريخ العقد بـ34 يوماً.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (تاريخ البيانات 19-أكتوبر-2026) تسليم المشروع في 07-أكتوبر-2027، أي بعد تاريخ انتهاء العقد (03-سبتمبر-2027) بـ34 يوماً. ولانتهاء المشروع في P6 فائض زمني −29.3 يوماً، ويوجد 220 نشاطاً مفتوحاً بفائض سالب، معظمها في أعمال الكهرباء (82) والمراقبة التلفزيونية (61) والاتصالات (43). ومقارنة بالخطة الأساسية الأصلية التي كانت تستهدف 64.2% بنهاية أكتوبر، المشروع متأخر.

صور الموقع هذا الأسبوع

صورتا الموقع الصالحتان للعرض من التقرير الأسبوعي بتاريخ 19-أكتوبر-2026، ولا تحملان ختم تاريخ أو GPS. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



طبقة الأساس الحصوية

فرش طبقة الأساس الحصوية على قاع الطريق، مع تجهيز المسار المجاور. التقرير الأسبوعي 19-أكتوبر-2026.




اختبار المناهل

منهل من الألياف الزجاجية قيد الاختبار، مع تهوية قسرية بمروحة تعمل بمولد.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، التقرير الأسبوعي 19-أكتوبر-2026.

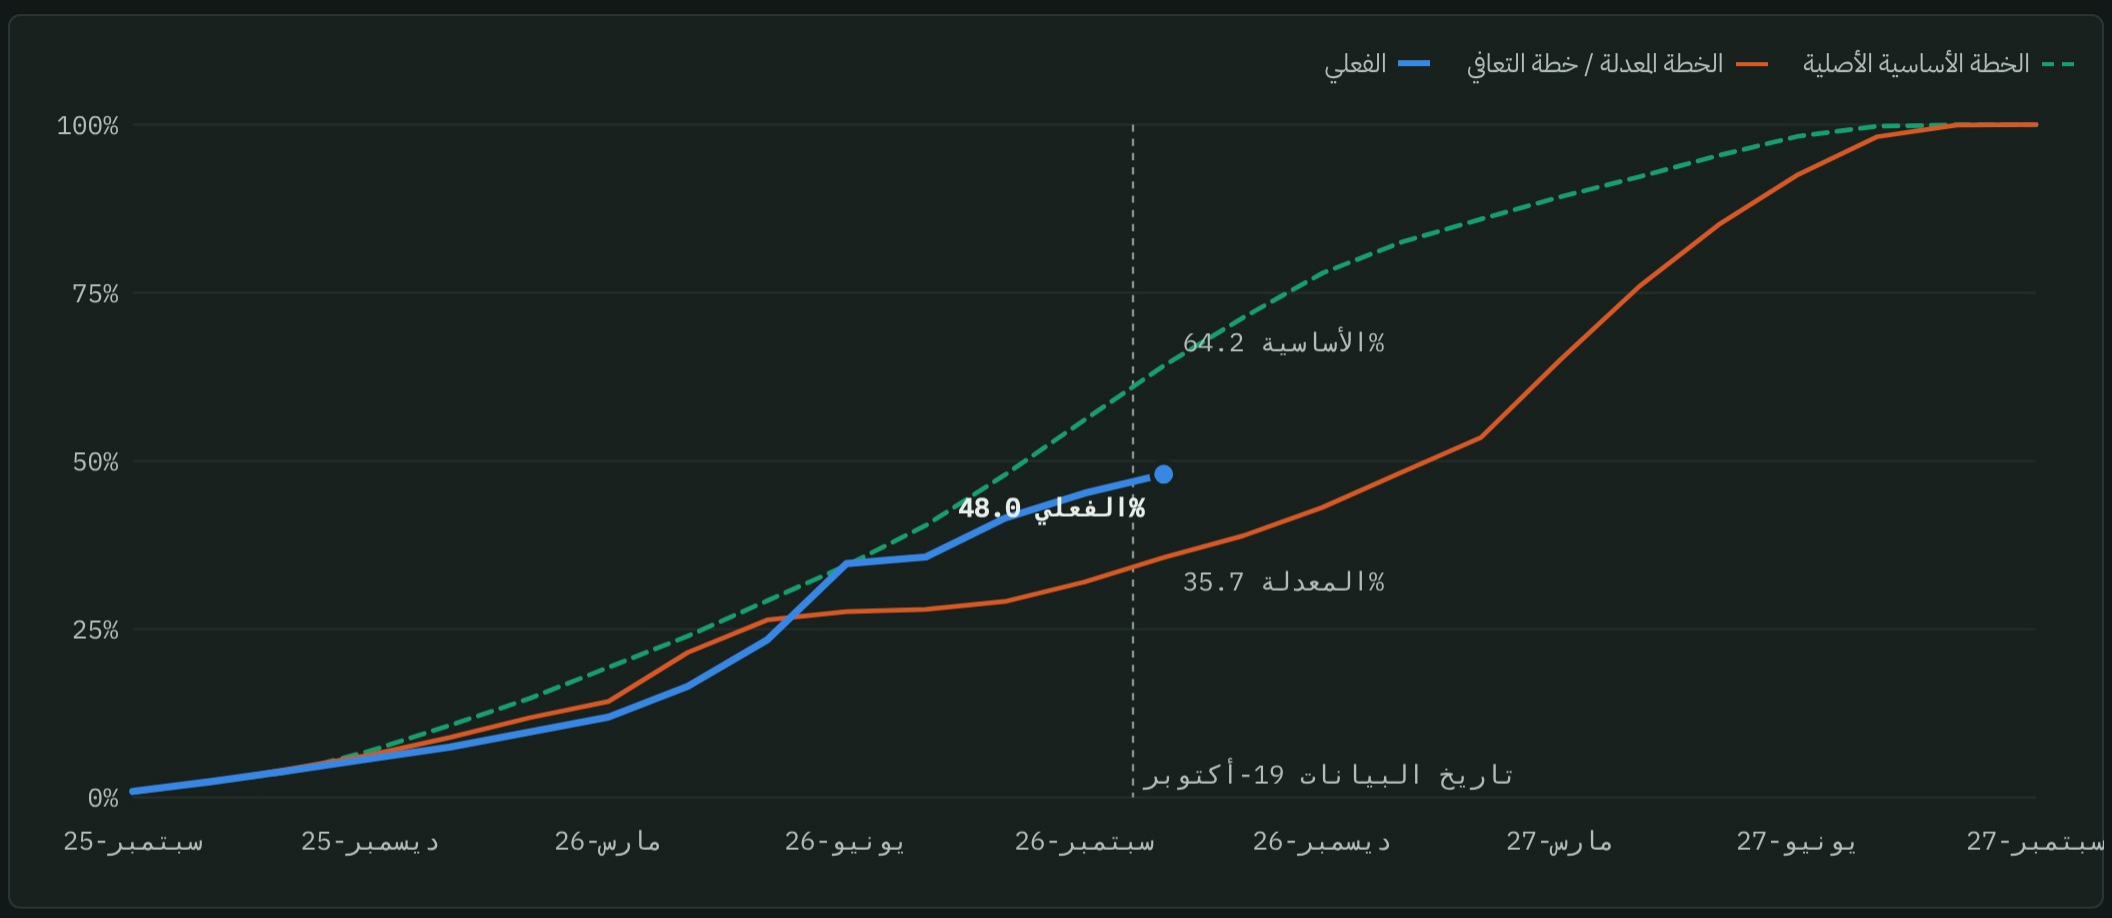

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
12-Oct-2026	34.6	49.9	+15.3	—	1.44
19-Oct-2026	**35.2**	**50.7**	**+15.5**	**+0.8**	**1.44**

يعطي التقرير الأخير هذا الأسبوع والأسبوع السابق فقط (ورقة Progress، عمودا "هذا الأسبوع" و"الأسبوع الماضي")، لذا لا تظهر الأسابيع السابقة. يستخدم جدوله الأسبوعي 354,339 ساعة عمل مخططة، بينما تستخدم ورقة منحنى S وشهادة الإنجاز من P6 عدد 373,967 ساعة وتُظهران إنجازاً فعلياً 48.0% في التاريخ نفسه.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	0.5%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
أعمال التنفيذ	98.0%	35.5%	51.3%	+15.8	1.45	▲ متقدم
المنطقة 1	21.1%	39.6%	58.2%	+18.6	1.47	▲ متقدم
المنطقة 2	25.3%	46.6%	71.4%	+24.8	1.53	▲ متقدم
المنطقة 3	51.6%	28.3%	38.5%	+10.2	1.36	▲ متقدم
الإغلاق والتسليم	1.6%	0.0%	0.0%	0.0	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**35.2%**	**50.7%**	**+15.5**	**1.44**	▲ متقدم

لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات ساعات عمل في هذا المقياس، لذا لا تظهر في الجدول. يضم تحديث P6 عدد 1,492 نشاطاً: 587 مكتملاً و203 قيد التنفيذ و702 لم يبدأ.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 19-أكتوبر-2026. تعطي الورقة إجماليات المشروع فقط، دون توزيع حسب المنطقة ودون أرقام الأسبوع السابق أو الردم، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بعلامة —.

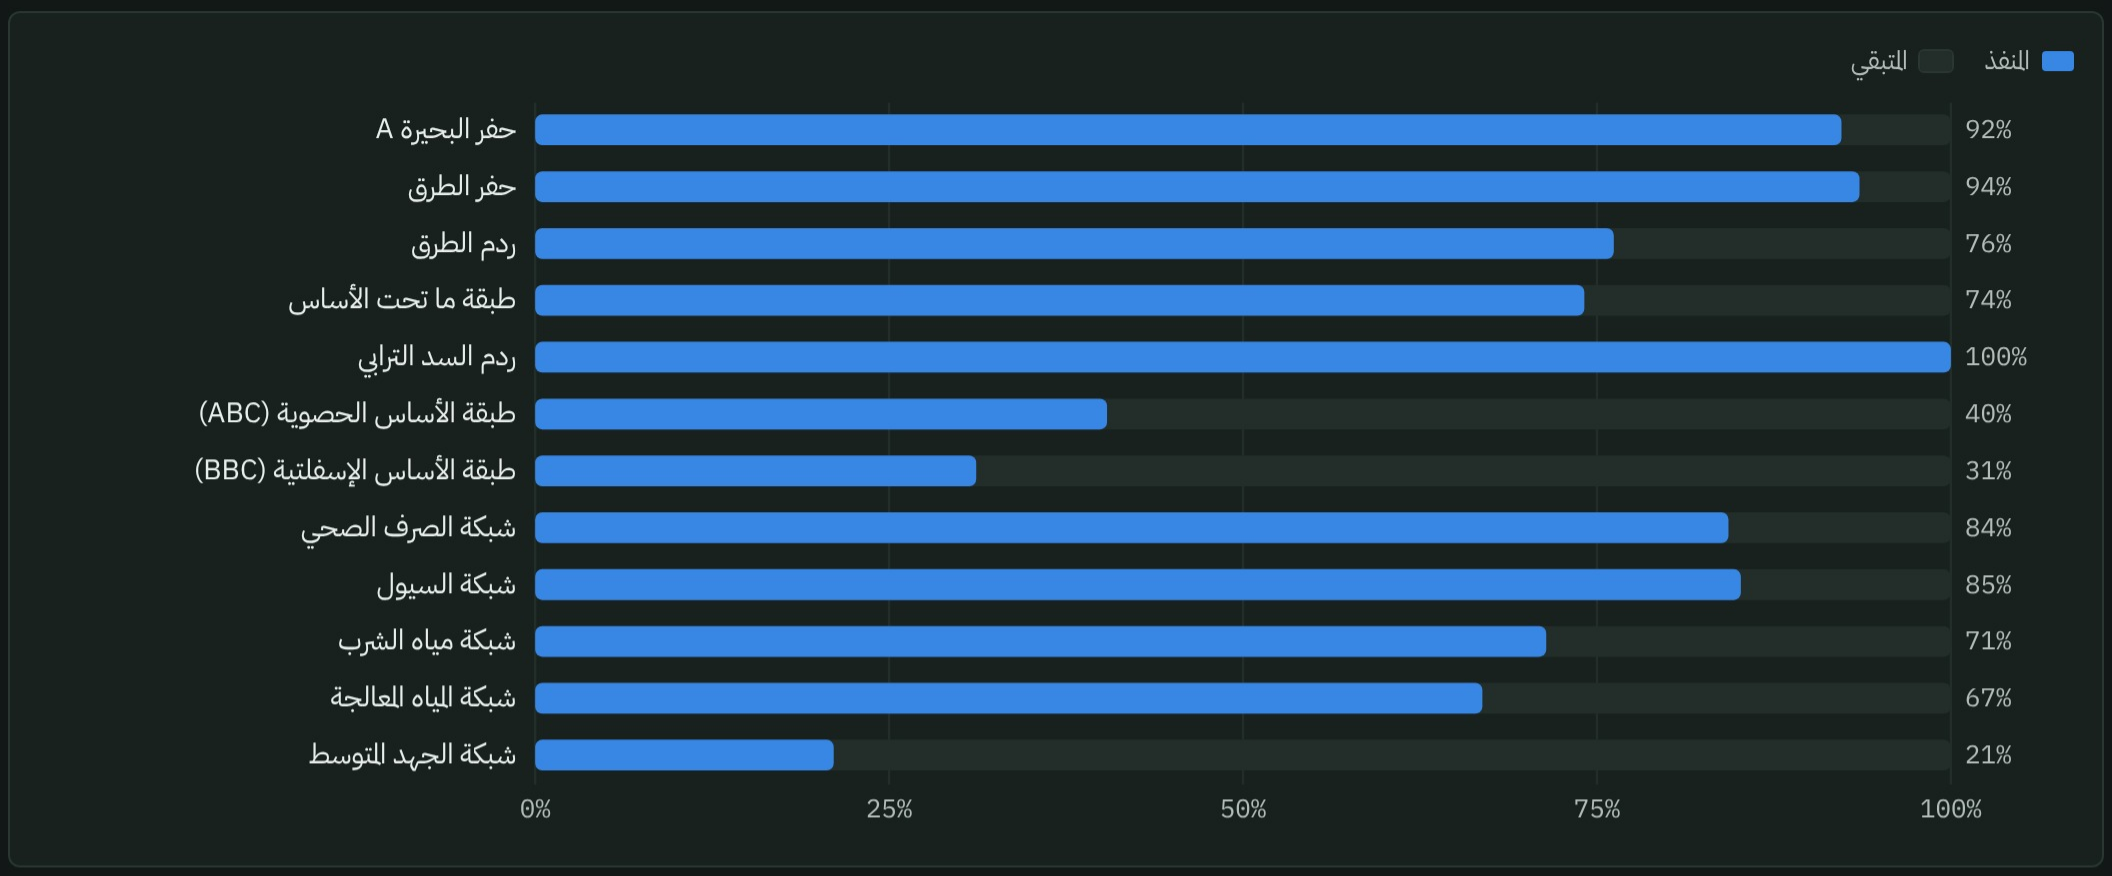

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
حفر البحيرة A	جميع المناطق	م³	321,070	296,255	—	24,815	92.3%	–
حفر الطرق	جميع المناطق	م³	99,925	93,475	—	6,450	93.5%	–
ردم الطرق	جميع المناطق	م³	107,100	81,600	—	25,500	76.2%	–
طبقة ما تحت الأساس	جميع المناطق	م³	72,730	53,900	—	18,830	74.1%	–
ردم السد الترابي	جميع المناطق	م³	3,865	3,865	—	0	100.0%	–
طبقة الأساس الحصوية (ABC)	جميع المناطق	م³	48,485	19,586	—	28,899	40.4%	–
طبقة الأساس الإسفلتية (BBC)	جميع المناطق	م³	27,310	8,508	—	18,802	31.2%	–
شبكة الصرف الصحي	جميع المناطق	م.ط	8,370	7,055	—	1,315	84.3%	–
شبكة السيول	جميع المناطق	م.ط	15,638	13,318	—	2,320	85.2%	–
شبكة مياه الشرب	جميع المناطق	م.ط	13,221	9,442	—	3,779	71.4%	–
شبكة المياه المعالجة	جميع المناطق	م.ط	12,223	8,178	—	4,045	66.9%	–
شبكة الجهد المتوسط	جميع المناطق	م.ط	23,700	4,998	—	18,702	21.1%	–

الشبكات الرطبة متقدمة

نُفذ 84% من شبكة الصرف الصحي و85% من السيول و71% من مياه الشرب و67% من المياه المعالجة. ونُفذ 92% من حفر البحيرة A، واكتمل ردم السد الترابي.

طبقات الطرق والجهد المتوسط متأخرة

طبقة الأساس الحصوية عند 40% وطبقة الأساس الإسفلتية عند 31%. وشبكة الجهد المتوسط عند 21%، ولا يزال ربطها بالمحطة مشكلة قائمة.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية والتوقع من ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي، وتوقع P6 والفائض الكلي من تحديث P6 (تاريخ البيانات 19-أكتوبر-2026). بالنسبة لانتهاء الشبكات، الخطة الأساسية هي خطة P6 الأساسية من متتبع التقدم، ولا يعطي التقرير الأسبوعي توقعاً لها.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	04-Sep-2025	04-Sep-2025	04-Sep-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التقديمات الأولية	06-Dec-2025	17-Nov-2026 (+346 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال المنطقة 1	09-Feb-2027	04-Oct-2027 (+237 يوماً)	30-Jun-2027	+56.9	؟ يتعارض مع P6
اكتمال المنطقة 2	02-Aug-2027	30-Aug-2027 (+28 يوماً)	24-Jul-2027	+11.8	؟ يتعارض مع P6
اكتمال المنطقة 3	02-Aug-2027	29-Sep-2027 (+58 يوماً)	05-Jun-2027	+78.0	؟ يتعارض مع P6
شبكة الصرف الصحي	14-Aug-2027	–	27-Mar-2027	+138.7	● يوجد فائض زمني
شبكة مياه الشرب	21-Aug-2027	–	10-Jun-2027	+73.0	● يوجد فائض زمني
شبكة المياه المعالجة	21-Jul-2027	–	16-Jun-2027	+68.6	● يوجد فائض زمني
شبكة السيول	14-Aug-2027	–	12-Aug-2027	+20.0	● يوجد فائض زمني
شبكة الاتصالات	16-Aug-2027	–	08-Sep-2027	−4.3	▼ معرّض للتأخير
شبكة المراقبة التلفزيونية (CCTV)	03-Sep-2027	–	18-Sep-2027	−12.6	▼ متأخر
أعمال الطرق	02-Sep-2027	–	04-Oct-2027	−26.1	▼ متأخر
الأعمال الكهربائية	03-Sep-2027	–	04-Oct-2027	−26.8	▼ متأخر
اكتمال توريد جميع المواد	03-Aug-2027	04-Oct-2027 (+62 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	10-Aug-2027	19-Sep-2027 (+40 يوماً)	–	–	▼ متأخر
تسليم المشروع	03-Sep-2027	07-Oct-2027 (+34 يوماً)	07-Oct-2027	−29.3	▼ متأخر

يختلف التقرير الأسبوعي وP6 على تواريخ اكتمال المناطق.

يتوقع التقرير الأسبوعي انتهاء المناطق 1 و2 و3 بين 30-أغسطس-2027 و04-أكتوبر-2027، بينما يُنهيها تحديث P6 بين 05-يونيو-2027 و24-يوليو-2027 بفائض موجب. ويتفقان على تسليم المشروع في 07-أكتوبر-2027. والبنود المتأخرة في P6 هي أعمال الطرق والكهرباء والمراقبة التلفزيونية والاتصالات.

توريد المواد الرئيسية

نسبة اكتمال التوريدات لكل مادة. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 19-أكتوبر-2026.

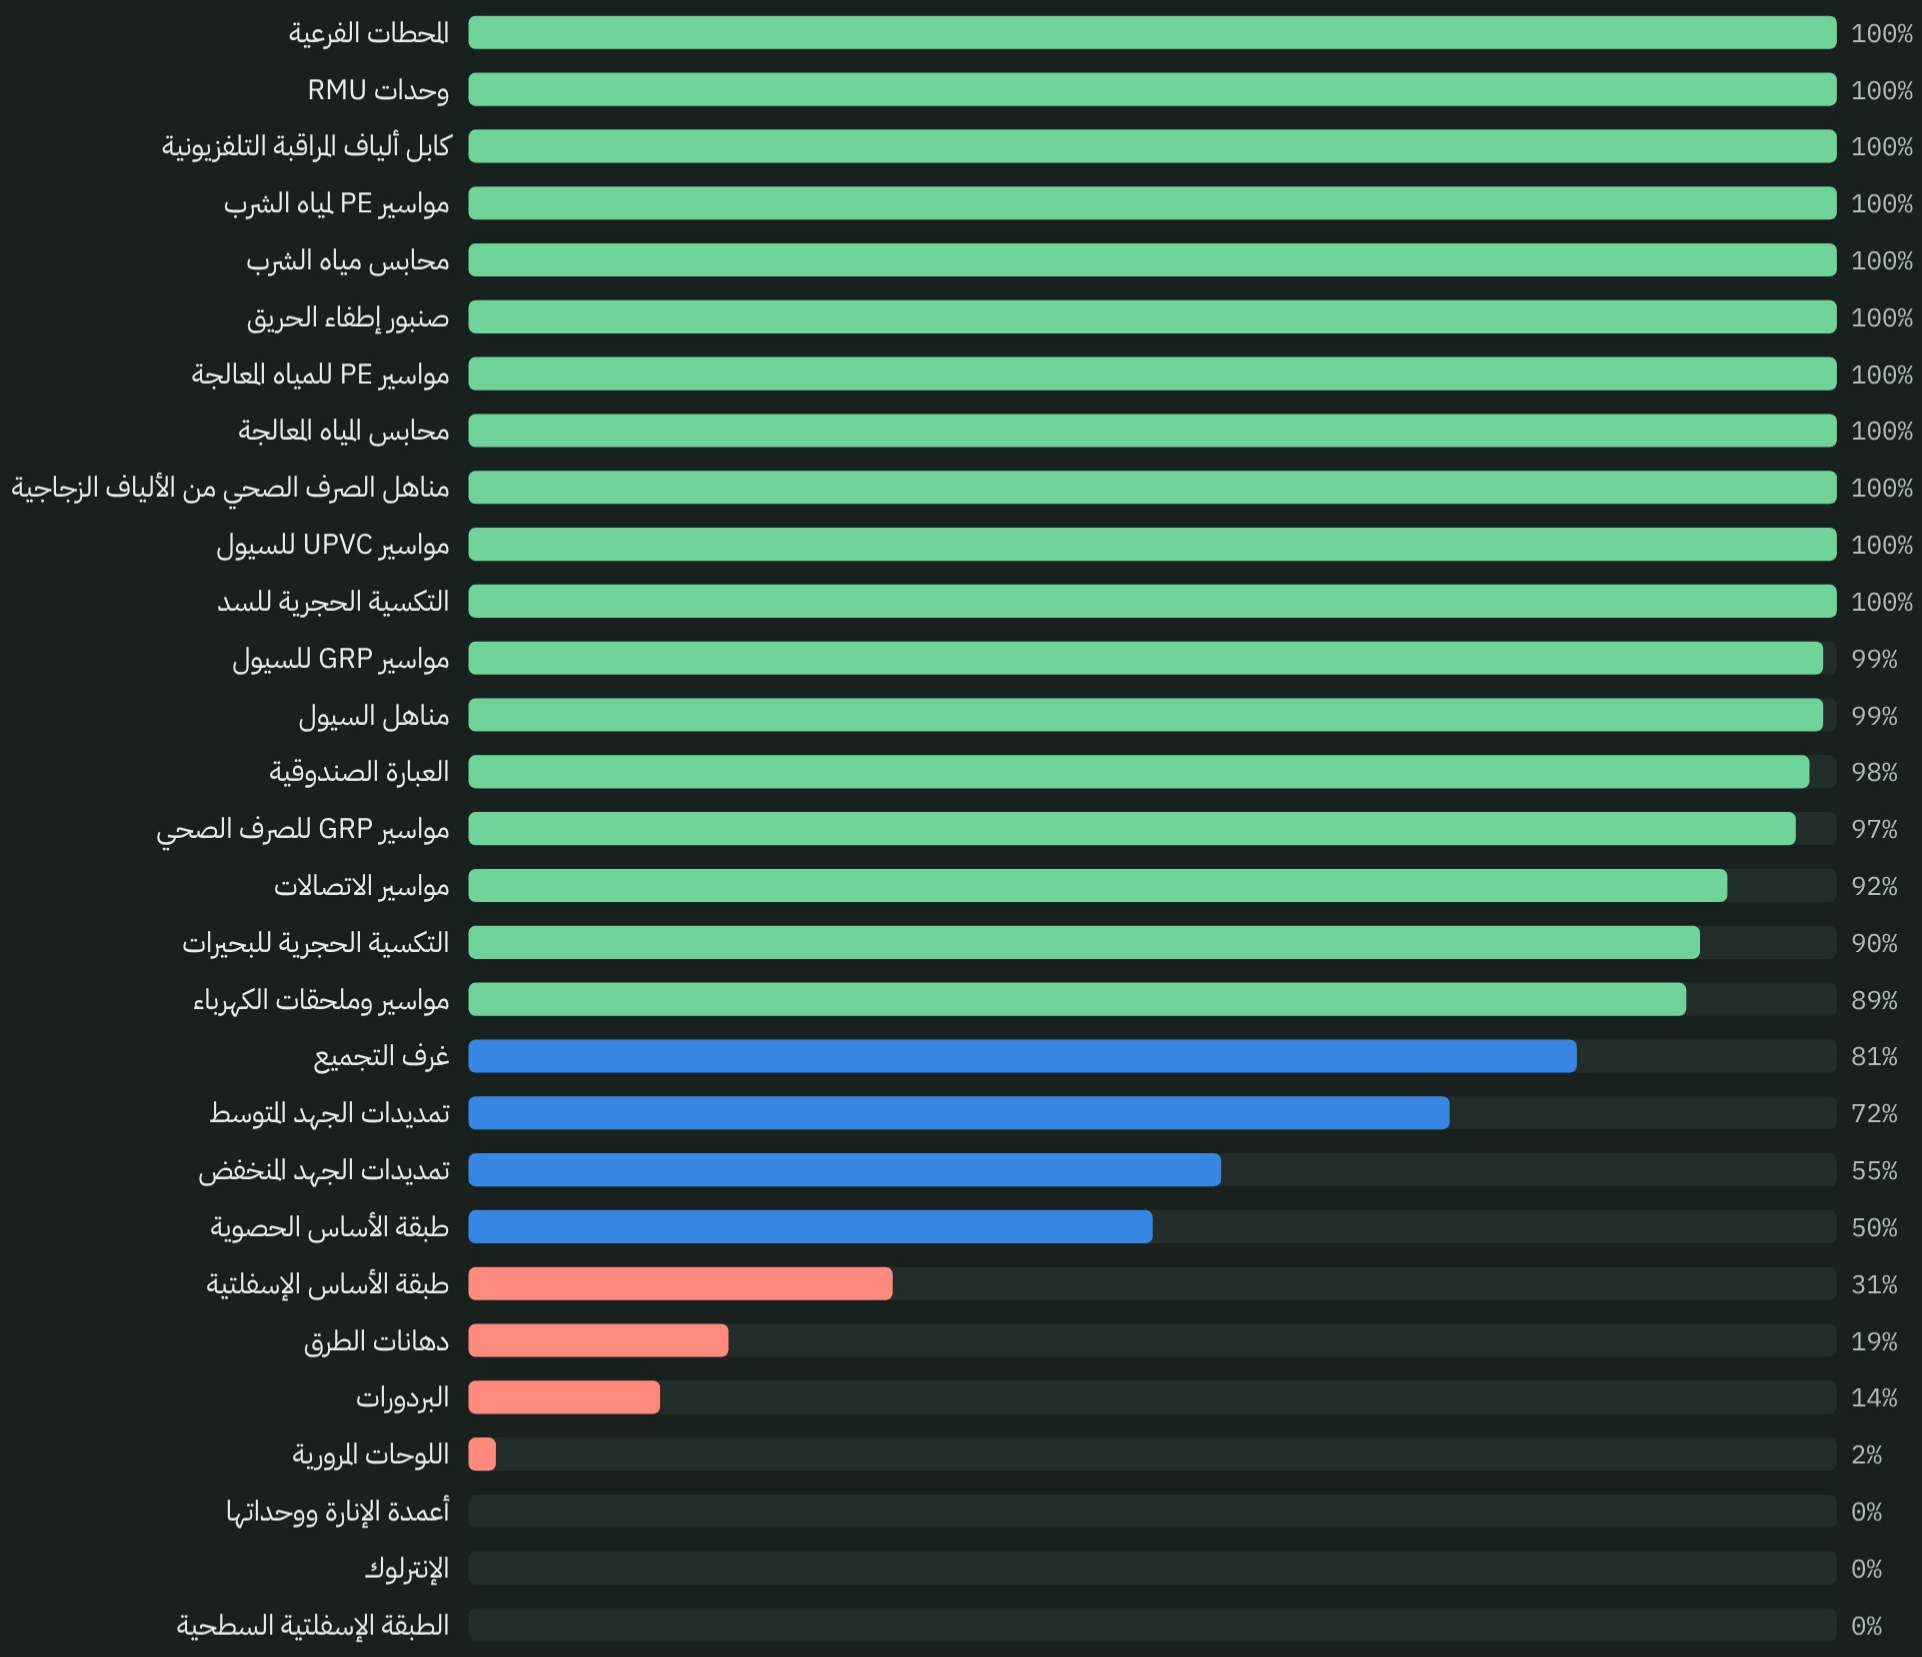

لم يُورَّد شيء بعد من أعمدة الإنارة والإنترلوك والطبقة الإسفلتية السطحية


صدرت أوامر الشراء لـ957 عمود إنارة مع وحداتها (08-سبتمبر-2026) و62,075 م² من الإنترلوك (05-يوليو-2026) وقواعد الأعمدة وكاميرات المراقبة، لكن لم يُسجَّل أي توريد. والبردورات عند 14% واللوحات المرورية عند 2%.

تمديدات الكهرباء موزّدة جزئياً

تمديدات الجهد المتوسط عند 72% من 115,400 م وتمديدات الجهد المنخفض عند 55%. والمحطات الفرعية ووحدات RMU موزّدة بالكامل. ومواسير ومحابس وصنبور إطفاء الحريق ومناهل الشبكات الرطبة مكتملة أو شبه مكتملة.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (يدوية وغير يدوية)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

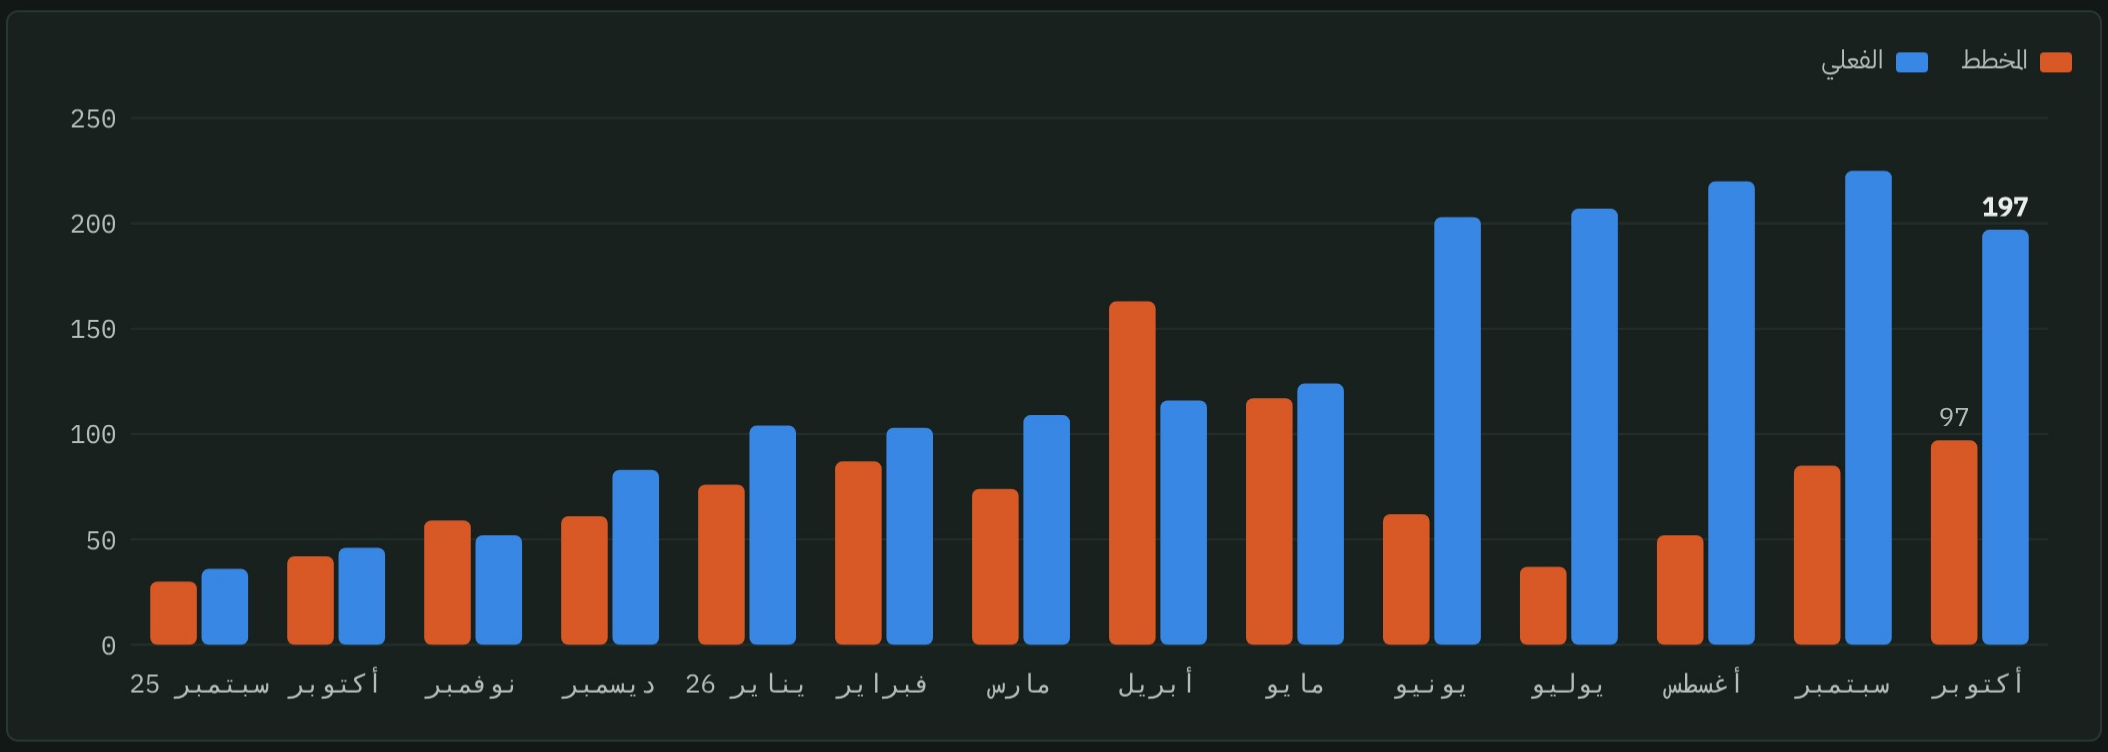

عدد العمالة في أكتوبر 197 (35 غير يدوية و162 يدوية) مقابل 97 مخططاً، بانخفاض من 225 في سبتمبر. وترتفع الخطة إلى ذروة 229 في مارس 2027. المعدات في الموقع في أكتوبر: 59 مقابل 32 مخططاً.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الطرق	55,700,828
شبكة تصريف السيول	42,542,241
الكهرباء	21,956,853
شبكة مياه الشرب	7,176,559
شبكة المياه المعالجة	6,656,378
شبكة الصرف الصحي	6,435,003
قيمة العقد (بدون الضريبة)	**140,467,862**
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال، من ملخص جدول الكميات في التقرير الأسبوعي. مجموع البنود يساوي قيمة العقد. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات في السجل	14
القيمة الإجمالية المقدمة	46,212,660
المعتمد من مدير المشروع (13 مستخلصاً)	43,497,867
المدفوع شاملاً الضريبة (13 مستخلصاً)	50,080,548
الخصومات والغرامات	76,000
الدفعة المقدمة (10%)	14,046,786
المحتجزات	0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	53,952,272

المفوتر 32.9% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 50.7%. المستخلص 14 (1–15 أكتوبر 2026) بانتظار اعتماد مدير المشروع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.95

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	381,284
ساعات العمل هذا الأسبوع	9,660
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	8 / 36

الجودة التقييم 0.93

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	137 / 7,068
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	2 / 242
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	11 / 11
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	20 / 20
تقديمات المخططات التنفيذية	428
اعتمادات المواد المعتمدة	52 / 48

تراكمي حتى 19-أكتوبر-2026. سجّل تدقيق الاستشاري الأسبوعي في 17-أكتوبر-2026 تقييم جودة 0.98 وسلامة 0.95.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
ربط الجهد المتوسط بالمحطة	مدن	قائمة منذ 15-يونيو-2026. بدء ربط شبكة الجهد المتوسط بالمحطة بانتظار رد المحطة، والموعد المستهدف 30-أكتوبر-2026.
ترقية المخططات التنفيذية إلى كود A	المقاول	قائمة منذ 29-يونيو-2026. يجري تقديم المخططات لترقيتها إلى كود A، والموعد المستهدف 30-أكتوبر-2026.
سياج يعيق الأعمال الكهربائية	مدن	قائمة منذ 06-يوليو-2026. سياج شركة Shinko يعيق الأعمال الكهربائية، وأُحيل الأمر إلى الاستشاري، والموعد المستهدف 26-أكتوبر-2026.
زيادة مناهل الاتصالات	المقاول	قائمة منذ 05-أكتوبر-2026. زاد عدد مناهل شبكة الاتصالات، وبانتظار المخطط التنفيذي، والموعد المستهدف 26-أكتوبر-2026.
الحفر العميق	المقاول	خطر سلامة قائم: انهيار جوانب الحفر. وُضعت حواجز ولوحات تحذيرية وتُبعد المعدات عن حواف الحفر.

التحديات المذكورة في ملخص مدن لهذا الأسبوع هي اعتماد ترقية المخططات إلى كود A وربط الجهد المتوسط بالمحطة.

ملاحظات على البيانات

- يظهر التقدم الفعلي بقيمتين: ملخص التقرير الأسبوعي وورقة Progress يعطيان 50.69% (179,604 من 354,339 ساعة عمل مخططة)، بينما تعطي ورقة Physical-Chart Data وشهادة الإنجاز من P6 نسبة 48.03% (من 373,967). يعتمد الرقم الرئيسي على ملخص التقرير نفسه.
- يصنّف ملف ملخص مدن الأسبوعي ومتتبع التقدم في P6 التقدم الموزون بالتكلفة على أنه "فعلي" و"مخطط". يعتمد هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي (بعدد ساعات العمل المخططة) فقط.
- يختلف رقم المشروع بين الملفات: TAB1-02-003 في التقرير الأسبوعي، وTAB1-01-009 في ملف ملخص مدن وورقة التوريدات القديمة، ومن TAB1-02-005 إلى TAB1-02-008 في سجل المخاطر.
- أسبوع التقرير: تذكر ورقة Milestones أسبوع العقد 59 من 108، وتسمّي تدقيقات الاستشاري يوم 17-أكتوبر-2026 بالأسبوع 59. وحساب الأسابيع الكاملة من تسليم الموقع يعطي 58. يعتمد التقرير الأسبوع المذكور 59.
- تختلف معالم المناطق بثلاث طرق: الخطة الأساسية في التقرير الأسبوعي (المنطقة 1: 09-فبراير-2027)، وخطة P6 الأساسية في متتبع التقدم (المنطقة 1: 05-يونيو-2027)، والتوقعات في التقرير الأسبوعي وP6؛ انظر قسم المعالم الرئيسية. كما أن خطة معلم "اكتمال التجهيز" الأساسية 10-أغسطس-2027، ويبدو ذلك خطأً.
- انتهاء المشروع في P6 بتاريخ 07-أكتوبر-2027 يأتي بعد تاريخ العقد بـ34 يوماً تقويمياً، لكن فائضه الكلي −29.3 يوماً.
- يضم سجل المستخلصات 14 مستخلصاً بإجمالي 46,212,660 ريالاً، بينما يذكر ملخصه 13 مستخلصاً مقدماً و14 معتمداً من الاستشاري.
- جدول "الموارد في الموقع" (28/32 غير يدوية و57/192 يدوية) يعرض أرقام سبتمبر وليس أكتوبر (28/35 و69/162). كما بقي العدد التراكمي الفعلي للمعدات عند 269 منذ مارس 2026.
- يُظهر جدول الملخص 6,360 ساعة عمل آمنة هذا الأسبوع، بينما تُظهر ورقة إحصاءات السلامة 9,660.
- يحتوي الملف على ورقتي توريدات. "Procurement (2)" نسخة أقدم بنسب أقل (مثلاً طبقة الأساس الحصوية 32% مقابل 50%)، ويعتمد التقرير ورقة "Procurement". وبعض البنود بلا كمية أو نسبة توريد.
- جميع بنود سجل المخاطر الـ14 مصنفة "مفتوحة"، رغم إغلاق المعالجة في 10 منها.
- كميات النطاق بلا توزيع حسب المنطقة وبلا قيم الأسبوع السابق، لذا عمود المنفذ هذا الأسبوع فارغ. وصورتان فقط في التقرير بحجم كافٍ للاستخدام، والأخريان بعرض 382 و546 بكسل.
