إنشاء 44 مصنع جاهز (900 متر مربع) في المدينة الصناعية بالدمام الثالثة

44 Ready-Built Factories (900 m²), Dammam 3rd Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	زاس السعودية للإنشاءات	إيجيس (EGIS)	م. عفات م. العنزي	07-Jan-2026	06-Mar-2027

النطاق: 44 مصنعاً جاهزاً مساحة كل منها 900 م² في 11 مبنى (B1–B11)، مع المرافق الخارجية والطرق ومواقف السيارات والإنارة.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة (225,761 ساعة عمل إجمالاً). في تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026 بلغ الإنجاز 80.0% مقابل 79.2% مخطط، أي متقدم بنسبة 0.8%. ويأتي التقدم من أعمال الاختبار والتشغيل والأعمال الخارجية؛ أما تنفيذ مباني المصانع فمتأخر بنسبة 1.0%، والمبنيان B4 وB5 متأخران بنسبة 23% تقريباً لكل منهما عن خطتهما.

نسبة الإنجاز الفعلي
80.0% / 79.2% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.01 +0.8%

التقدم هذا الأسبوع
— لا يوجد أسبوع سابق
لم يُرفع تقرير أسبوعي سابق للمقارنة

المدة المنقضية من العقد
69.3% · اليوم 293 من 423
● انتهاء P6 في 03-مارس-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
42.9% · 41.2 مليون ريال
6 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

المشروع ضمن الخطة إجمالاً، لكن لم يتبقَّ تقريباً أي فائض زمني عند الانتهاء.

يُنهي تحديث P6 المشروع في 03-مارس-2027، قبل تاريخ الانتهاء التعاقدي 06-مارس-2027 بثلاثة أيام، بفائض صفري على تاريخ انتهاء المشروع. ومن بين 99 نشاطاً جارياً يعدّ التقرير الأسبوعي 98 نشاطاً متأخرة عن الجدول، وارتفعت الأنشطة التي فاتها موعد البدء من 205 إلى 270 هذا الأسبوع. وبلغ إنجاز التنفيذ 73.6% مقابل 74.6% مخطط.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ملفات هذا الأسبوع، مؤرخة 25-أكتوبر-2026 في أسماء ملفاتها، وعناوينها من ورقة الصور في التقرير الأسبوعي. اختر صورة لعرضها مكبّرة، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




أعمال مضخات الحريق

مضخات الحريق والمجمعات مركّبة بجوار خزان المياه. 25-أكتوبر-2026.



تركيب مجاري التكييف، المبنى 11

مجاري الهواء معلّقة من الهيكل الحديدي للسقف بجوار مواسير مكافحة الحريق والإنارة.

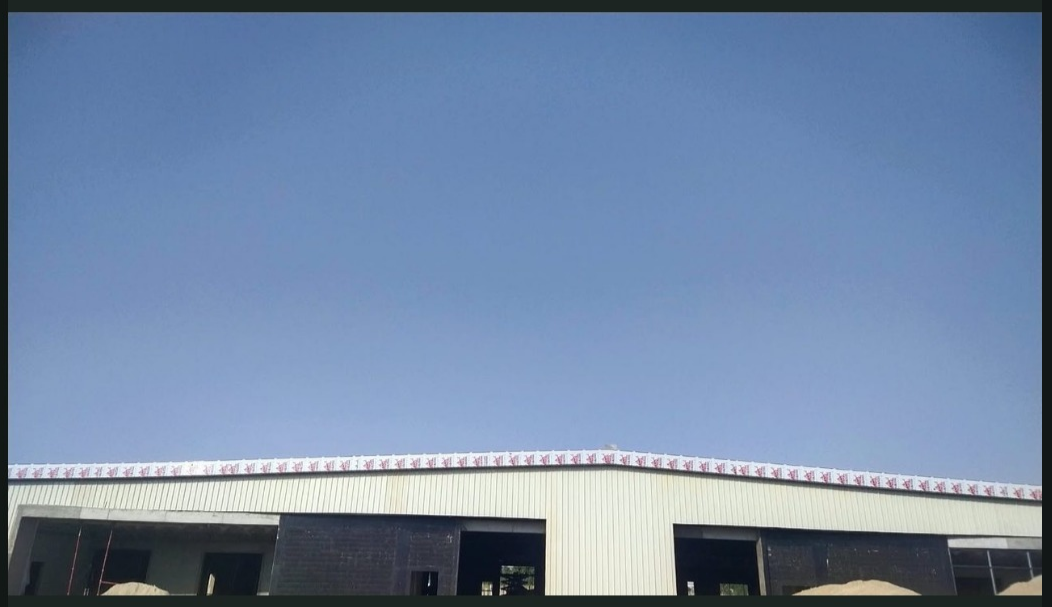

الكسوة، المبنى 6

ألواح الجدران والسقف على واجهة المصنع.



خزانة خرطوم الحريق والجدار الفاصل

الخزانة مركّبة؛ والجدار الفاصل من البلوك قيد التنفيذ.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.



نهاية الفترة	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الفترة	مؤشر الأداء
30-Jun-2026	40.1	36.1	−4.0%	+18.6	0.90
31-Jul-2026	47.8	43.6	−4.2%	+7.5	0.91
31-Aug-2026	57.2	52.5	−4.7%	+8.9	0.92
30-Sep-2026	69.1	70.5	+1.4%	+18.0	1.02
27-Oct-2026	**79.2**	**80.0**	**+0.8%**	**+9.5***	**1.01**

قيم نهاية الشهر من ورقة Physical-Chart Data؛ وصف 27-أكتوبر-2026 من جدول التقدم في التقرير الأسبوعي. الخطة الأساسية والخطة المعدلة في الملف متطابقتان، لذا يظهر خط خطة واحد. * المنجز من 01 إلى 27 أكتوبر؛ أما منجز هذا الأسبوع وحده فغير متاح لعدم رفع تقرير أسبوعي سابق.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	0.4%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5.4%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	25.5%	99.7%	100.0%	+0.3%	1.00	✓ مكتمل
التنفيذ	63.4%	74.6%	73.6%	−1.0%	0.99	▼ متأخر قليلاً
الاختبار والتشغيل	5.1%	13.6%	40.6%	+27.0%	2.99	؟ يحتاج تحقق
إغلاق المشروع	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**79.2%**	**80.0%**	**+0.8%**	**1.01**	▲ في المسار

يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) 2,517 نشاطاً: 1,753 مكتملاً و99 جارياً و665 لم تبدأ. وتاريخ انتهائه المجدول 03-مارس-2027، قبل التاريخ التعاقدي بثلاثة أيام. وانخفضت أنشطة المسار الحرج من 131 إلى 85 هذا الأسبوع.

نطاق العمل: الكميات


التقدم الفعلي لكل مبنى من مباني المصانع وللأعمال الخارجية، ثم الكميات الرئيسية المتابعة في التقرير الأسبوعي.
المصدر: التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026، جدول التقدم وورقة Major Quantities.

التقدم الفعلي حسب المبنى

المبنى	ساعات العمل	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	المكتسب هذا الأسبوع (ساعات عمل)
المبنى B1	11,840	73.2%	72.7%	−0.6%	0.99	1,087
المبنى B2	11,584	75.7%	73.9%	−1.8%	0.98	1,114
المبنى B3	11,824	76.3%	73.3%	−3.0%	0.96	364
المبنى B4	11,824	98.1%	75.4%	−22.8%	0.77	96
المبنى B5	11,728	99.0%	75.6%	−23.5%	0.76	96
المبنى B6	11,824	91.9%	3.7%*	−88.2%	0.04	0
المبنى B7	11,840	77.4%	80.5%	+3.1%	1.04	99
المبنى B8	11,840	70.7%	79.2%	+8.5%	1.12	88
المبنى B9	11,840	69.5%	79.3%	+9.8%	1.14	169
المبنى B10	11,840	68.2%	76.8%	+8.6%	1.13	117
المبنى B11	11,840	67.0%	75.9%	+8.8%	1.13	333
الأعمال الخارجية	13,232	33.4%	49.0%	+15.6%	1.47	382
إجمالي التنفيذ	**143,056**	**74.6%**	**73.6%**	**−1.0%**	**0.99**	**4,354**

* سُجّل للمبنى B6 437 ساعة عمل مكتسبة من 11,824، بينما تُظهر ورقة متابعة التقدم اكتمال الهيكل والجدران وأعمال التمديدات الأولى فيه، وتُظهر صور هذا الأسبوع الكسوة فيه. والرقم على الأرجح خطأ إدخال؛ انظر ملاحظات على البيانات.

الكميات الرئيسية

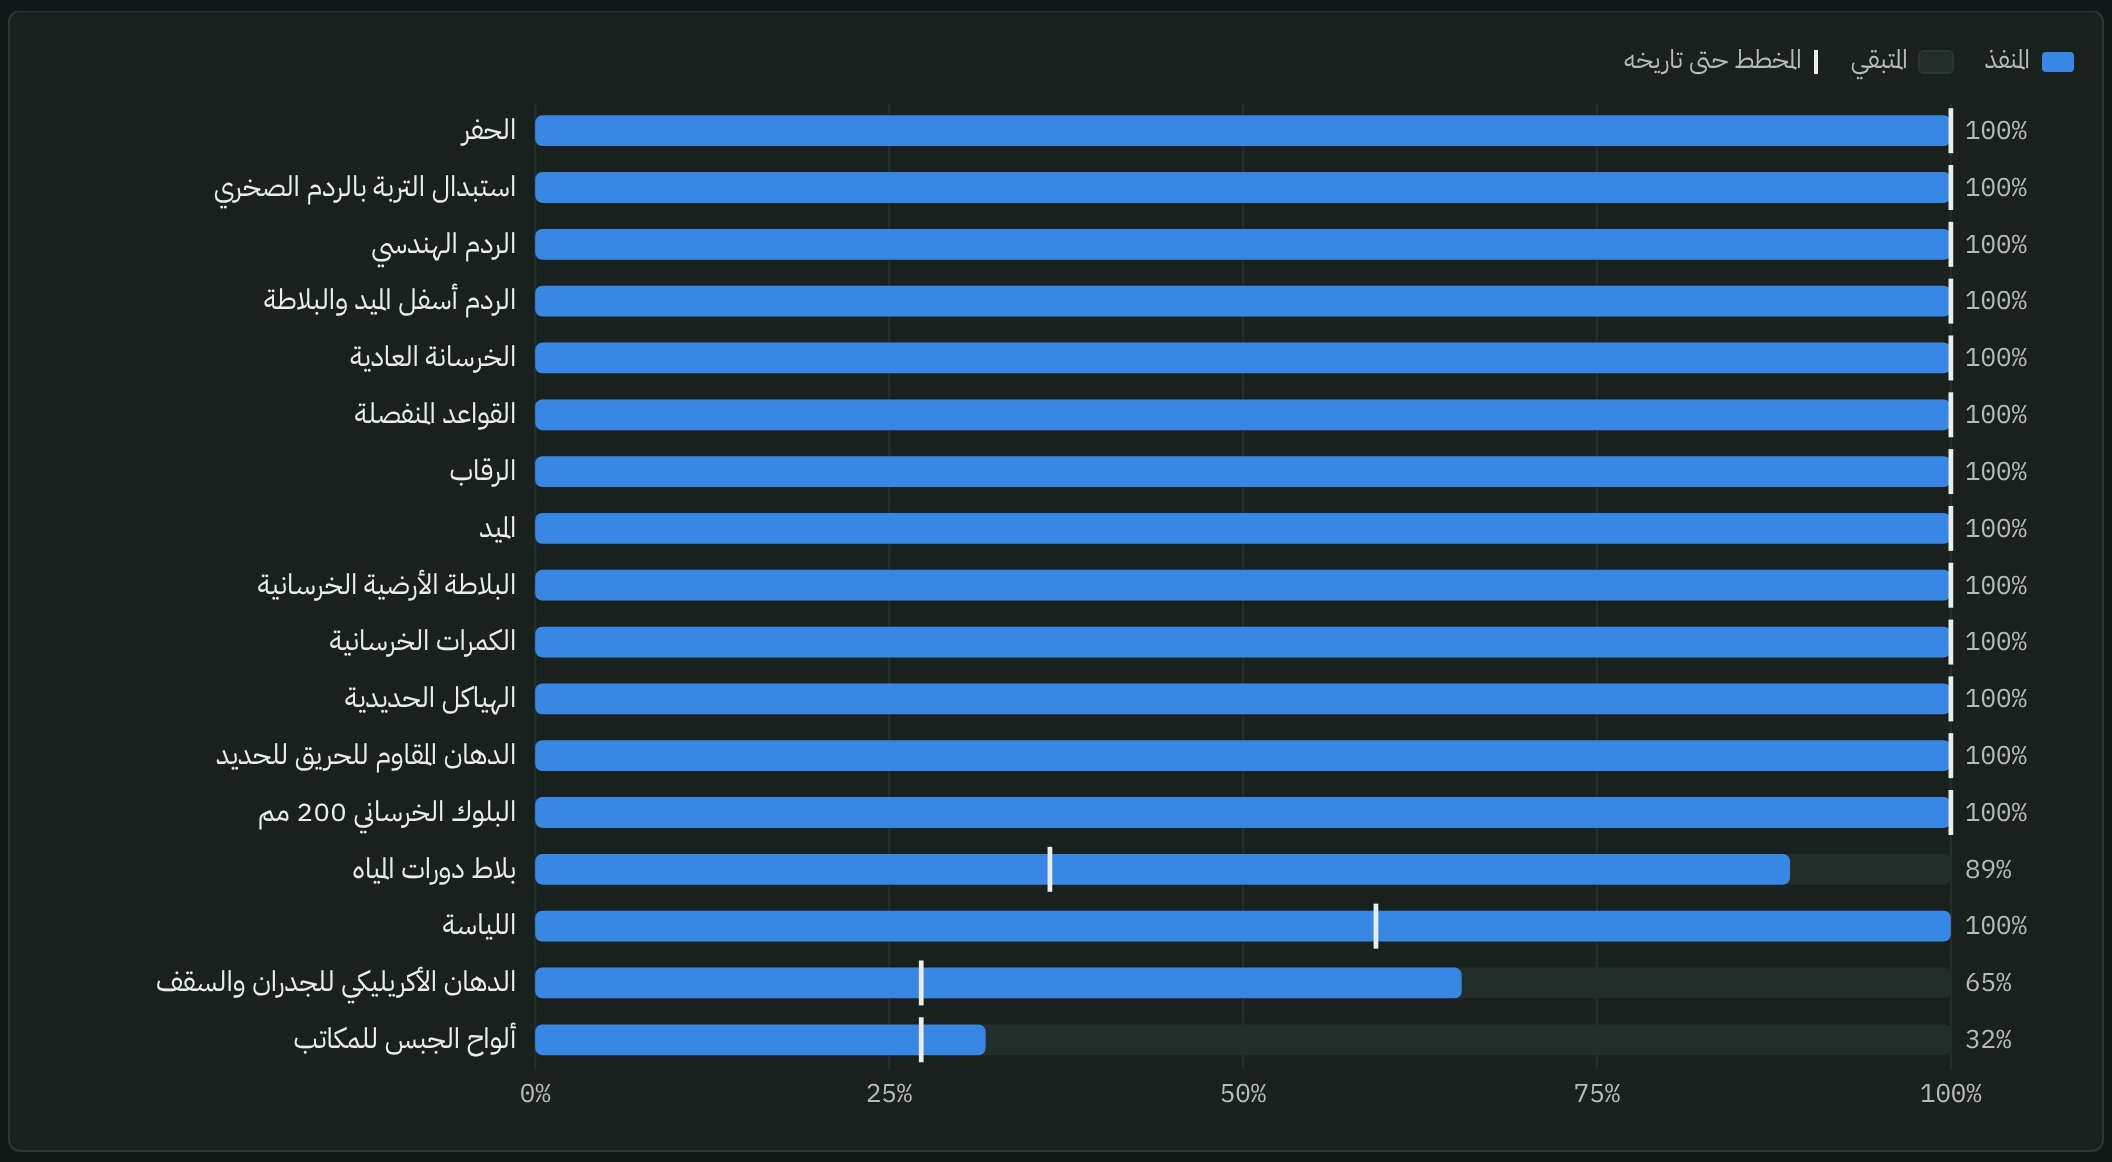

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	المخطط حتى تاريخه
الحفر	جميع المباني	م³	40,940	40,940	–	0	100.0%	100.0%
استبدال التربة بالردم الصخري	جميع المباني	م³	48,560	48,560	–	0	100.0%	100.0%
الردم الهندسي	جميع المباني	م³	12,727	12,727	–	0	100.0%	100.0%
الردم أسفل الميد والبلاطة	جميع المباني	م³	11,559	11,559	–	0	100.0%	100.0%
الخرسانة العادية	جميع المباني	م²	8,010	8,010	–	0	100.0%	100.0%
القواعد المنفصلة	جميع المباني	م³	2,807	2,807	–	0	100.0%	100.0%
الرقاب	جميع المباني	م³	395	395	–	0	100.0%	100.0%
الميد	جميع المباني	م³	540	540	–	0	100.0%	100.0%
البلاطة الأرضية الخرسانية	جميع المباني	م³	7,260	7,260	–	0	100.0%	100.0%
الكمرات الخرسانية	جميع المباني	م³	255	255	–	0	100.0%	100.0%
الهياكل الحديدية	جميع المباني	عدد	11	11	–	0	100.0%	100.0%
الدهان المقاوم للحريق للحديد	جميع المباني	بند	11	11	–	0	100.0%	100.0%
البلوك الخرساني 200 مم	جميع المباني	م²	9,630	9,630	–	0	100.0%	100.0%
بلاط دورات المياه	جميع المباني	م²	726.9	820	–	93.1	88.6%	36.4%
اللياسة	جميع المباني	م²	16,770	16,770	–	0	100.0%	59.4%
الدهان الأكريليكي للجدران والسقف	جميع المباني	م²	10,976	16,770	–	5,794	65.5%	27.3%
ألواح الجبس للمكاتب	جميع المباني	م²	1,408	4,425	–	3,017	31.8%	27.3%

اكتمال الأعمال تحت الأرض والهيكل الحديدي والبلوك

أُفيد باكتمال الحفر واستبدال التربة بالردم الصخري والردم الهندسي والقواعد والرقاب والميد والبلاطة الأرضية والهياكل الحديدية الأحد عشر مع الدهان المقاوم للحريق و9,630 م² من البلوك بنسبة 100%. واكتملت اللياسة أيضاً (16,770 م²).

التشطيبات الجارية

الدهان الأكريليكي منفذ بنسبة 65.4% (المتبقي 5,794 م²)، وألواح الجبس للمكاتب 31.8% (المتبقي 3,017 م²)، وبلاط دورات المياه 88.6% (المتبقي 93 م²). ويظهر عمود «المنفذ هذا الأسبوع» بالرمز «–» لعدم رفع أسبوع سابق.

المعالم الرئيسية

المعالم من التقرير الأسبوعي، مع توقع تحديث P6 والفائض الزمني. وحيث لا يتضمن التقرير الأسبوعي المعلم، تظهر الخطة الأساسية في P6 مع الإشارة (P6).

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	07-Jan-2026	07-Jan-2026	07-Jan-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
مسح الوضع القائم والتقارير النهائية	14-Jan-2026	14-Jan-2026	12-Feb-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	16-Feb-2026	16-Feb-2026	18-Jan-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
التقديمات وطلبات المواد طويلة التوريد	14-May-2026	22-Mar-2026 (−53 يوماً)	05-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
توريد جميع المعدات والمواد	07-Nov-2026	27-Sep-2026 (−41 يوماً)	–	–	✓ منجز
تسوية الموقع والطرق الداخلية ومواقف السيارات	12-Feb-2026 (P6)	–	27-Oct-2026	9	▼ متأخر
الأعمال المدنية	21-Feb-2027	21-Feb-2027	21-Nov-2026	43	? اختلاف الخطط الأساسية
الاختبار والتشغيل	06-Feb-2027 (P6)	–	24-Dec-2026	58	● يوجد فائض زمني
الأعمال الميكانيكية	27-Jan-2027	27-Jan-2027	21-Dec-2026	56	● يوجد فائض زمني
الأعمال الترابية	01-Feb-2027	21-Jan-2027 (−11 يوماً)	–	–	● في الموعد
الأعمال الكهربائية	18-Feb-2027	13-Feb-2027 (−5 أيام)	02-Feb-2027	19	● يوجد فائض زمني
اكتمال التنفيذ	21-Feb-2027 (P6)	–	23-Feb-2027	7	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم	06-Mar-2027	03-Mar-2027 (−3 أيام)	03-Mar-2027	0	● في الموعد، بلا فائض

يستخدم التقرير الأسبوعي وتحديث P6 خططاً أساسية مختلفة لمعالم التخصصات.

للأعمال المدنية، الخطة الأساسية في التقرير الأسبوعي 21-فبراير-2027، بينما الخطة الأساسية في P6 هي 01-أكتوبر-2026 والتوقع في P6 هو 21-نوفمبر-2026، أي بعد خطته الأساسية بـ51 يوماً. ويتوقع P6 انتهاء الأعمال الكهربائية والمعمارية في 02-فبراير-2027، بعد خطتها الأساسية 21-ديسمبر-2026 بـ43 يوماً. أما المعلم التعاقدي لتسوية الموقع والطرق الداخلية ومواقف السيارات (وخطته الأساسية في P6 هي 12-فبراير-2026) فلم يبدأ بعد، وتوقعه هو تاريخ البيانات نفسه.

توريد المواد الرئيسية

نسبة المواد الموّردة إلى الموقع حسب التخصص. المصدر: ملخص التقرير الأسبوعي، 27-أكتوبر-2026.



جميع المواد الـ83 معتمدة ومطلوبة وموجودة في الموقع


يسجّل التقرير الأسبوعي اعتماد 83 من 83 مادة، وإصدار 83 أمر شراء، وتوريد 83 مادة، واكتمال التوريدات في 13-أكتوبر-2026. بينما تذكر ورقة المعالم فيه تاريخ 27-سبتمبر-2026 للحدث نفسه.

التركيب جارٍ الآن

وُرّدت مجاري التكييف والمحابس المدفونة مباشرة وبدأ تركيبها (سجل المخاطر والمشكلات، 27-أكتوبر-2026). ويُظهر متتبع التوريدات حالة أمر الشراء «ISSUED» لـ20 بنداً فقط من أصل 83.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (الموظفون والعمالة)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة.

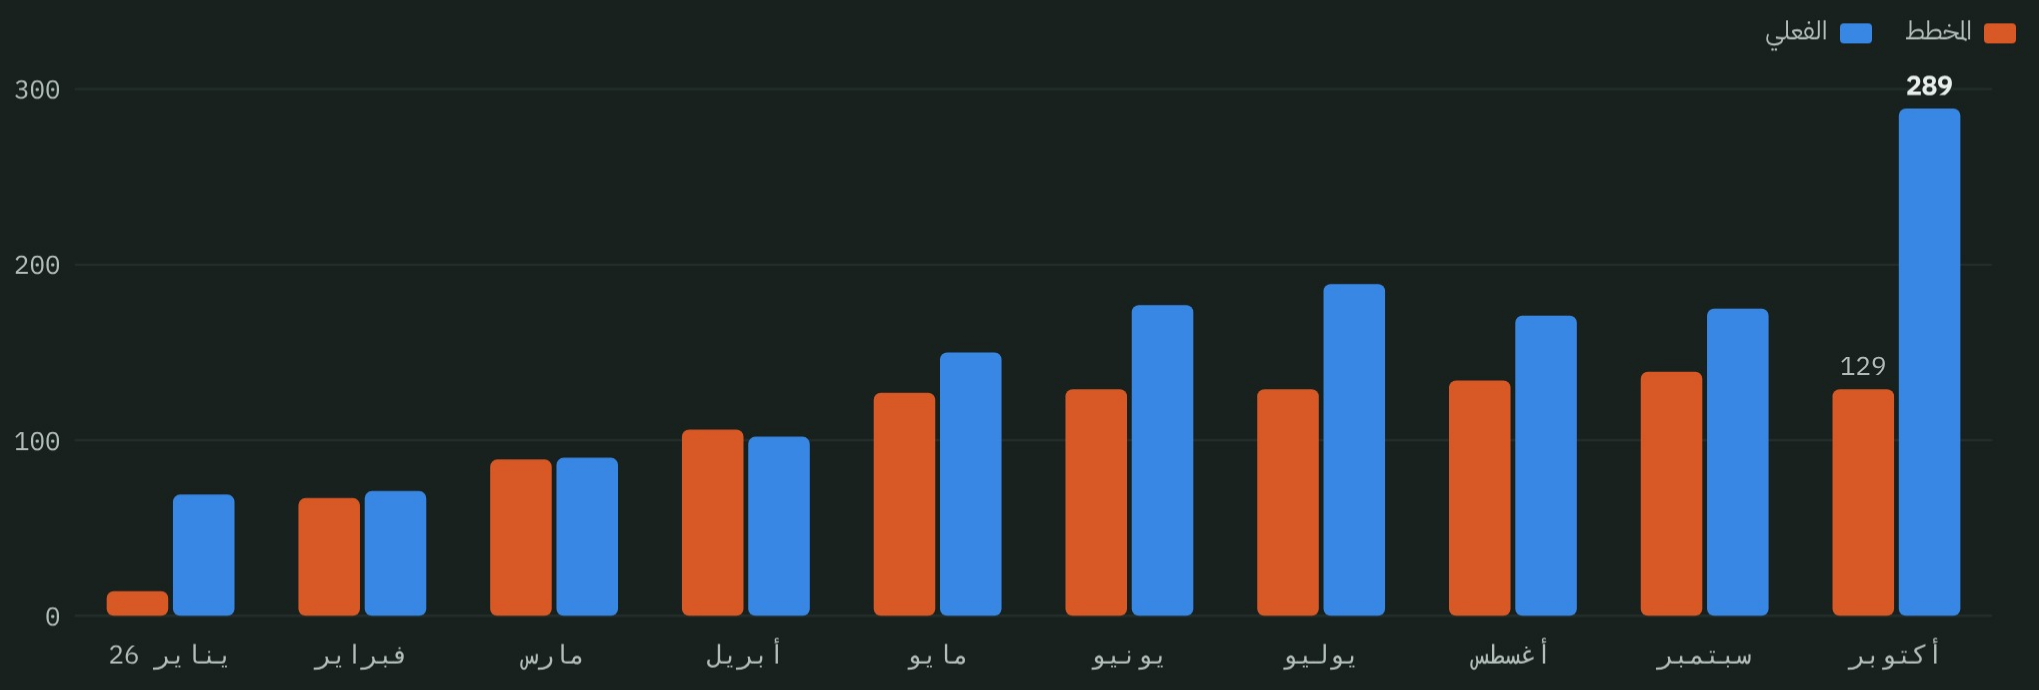

بلغ عدد العاملين في أكتوبر 289 مقابل 129 مخطط: 267 عاملاً مقابل 125، و22 موظفاً مقابل 4. والمعدات في الموقع 20 مقابل 7 مخطط. وتنخفض الخطة إلى 99 في نوفمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	95,996,525
قيمة العقد المعدلة	95,996,525
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	95,996,525
التغييرات المحتملة	0
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ.

المستخلصات

المستخلصات المعتمدة من مدير المشروع	6
القيمة الإجمالية	41,195,808
استرداد الدفعة المقدمة (10%)	4,119,581
القيمة الصافية	37,076,227
المستخلصات المدفوعة	5
المبلغ المدفوع	28,782,457

بلغت المستخلصات 42.9% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 80.0%. واعتُمد المستخلص 6 (سبتمبر، 9,215,300 إجمالي) في 13-أكتوبر-2026 ولم يُدفع بعد.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.87

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	288,540
ساعات العمل هذا الأسبوع	16,440
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية (تراكمي)	1
حوادث وشيكة (تراكمي)	1
أضرار المتلكات	0
جلسات التعريف بالسلامة / التوعية (تراكمي)	78 / 93

الجودة التقييم 0.93

طلبات الفحص: صادرة / مغلقة / معلقة	972 / 964 / 8
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	92 / 77 / 15
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / معلقة	24 / 22 / 2
تعليمات الموقع	0
المخططات التنفيذية المعتمدة	158 من 158
اعتمادات المواد	83 من 83

تراكمي حتى 27-أكتوبر-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
المنصة الخارجية (عالية)	المقاول	المنصة الخارجية متأخرة عن جدول أنشطتها. وإن لم يُستدرك التأخير فقد يؤخر إكمال المنطقة وتسليمها.
خزائن خراطيم الحريق (خطر عالٍ)	المقاول	بدأ التركيب؛ وأي تأخير سيؤخر اختبار وفحص أنظمة الحماية من الحريق.
المبنيان B4 وB5	المقاول	إنجاز B4 بنسبة 75.4% مقابل 98.1% مخطط، وB5 بنسبة 75.6% مقابل 99.0%، وكل منهما متأخر بنسبة 23% تقريباً.
حفريات الري (خطر متوسط)	المقاول	لم تبدأ حفريات مواسير الري HDPE؛ ويلزم تأكيد تاريخي البدء والانتهاء.
المحابس المدفونة	المقاول	وُرّدت المواد وبدأ التركيب؛ وتُتابع حتى الاكتمال.
الفائض الزمني عند الانتهاء	المقاول	فائض صفري على انتهاء المشروع، و98 من 99 نشاطاً جارياً متأخرة عن الجدول.

مخاطر منخفضة أخرى قائمة في السجل: ألواح الجبس للأسقف، وألواح الألمنيوم المركبة، ومحطة الطاقة الشمسية، وحفريات تغذية المياه. وأُغلقت هذا الأسبوع: ألواح الساندويتش للجدران، واللياسة، وتوريد مجاري التكييف.

ملاحظات على البيانات

- ملف التقرير الأسبوعي (WPR #36، بصيغة xlsb.) ليس له نسخة نصية في MD Files، لذا قُرئت أرقامه من الملف الأصلي في All Files.
- لم يُرفع أسبوع سابق لهذا المشروع، لذا يظهر تقدم هذا الأسبوع وكميات «هذا الأسبوع» والمنجز الأسبوعي بالرمز «—».
- أرقام التقدم الفعلي الأسبوعية في الملف غير متسقة: ورقة Progress تذكر 3,981 ساعة عمل مخططة و5,797 مكتسبة هذا الأسبوع، وصفحة التقرير 4,323 و4,538، ومجموع صفوف هيكل تجزئة العمل 4,019 و4,354، ومجموع صفوف المباني 3,945 مكتسبة. ولم يُستخدم أي منها لمعدل الأسبوع.
- يُظهر المبنى B6 437 ساعة عمل مكتسبة من 11,824 (3.7%) مقابل 91.9% مخطط، بينما تُظهر ورقة متابعة التقدم اكتمال الهيكل والجدران وأعمال التمديدات الأولى فيه، وتُظهر إحدى الصور الكسوة فيه. وهذا يخفض أيضاً إجمالي التنفيذ.
- سُجّل الاختبار والتشغيل بنسبة 40.6% مكتسب مقابل 13.6% مخطط، بينما تُظهر ورقة Testing اكتمال الاختبارات الميكانيكية بنسبة 8% وعدم بدء اختبارات الكهرباء والحريق.
- قيم المخطط والمكتسب الرئيسية في صفحة التقرير، ونماذج P6، وسجل المخاطر والمشكلات («Planned progress ... Actual progress ...») مبنية على التكلفة؛ ويصف السجل هذه النسبة المبنية على التكلفة بأنها التقدم الفعلي. ويعتمد هذا التقرير أرقام الإنجاز الفعلي (ساعات العمل) فقط.
- تذكر ورقة المعلومات العامة في التقرير الأسبوعي تاريخ انتهاء متوقعاً 06-مارس-2027 (دون انحراف)، بينما تذكر ورقة المعالم فيه وتحديث P6 تاريخ 03-مارس-2027.
- تختلف الخطط الأساسية لمعالم التخصصات في التقرير الأسبوعي عن الخطة الأساسية في P6 (مثلاً الأعمال المدنية 21-فبراير-2027 مقابل 01-أكتوبر-2026). ويظهر معلم المسح منجزاً في 14-يناير-2026 في التقرير الأسبوعي وفي 12-فبراير-2026 في P6.
- اكتمال توريد المواد 13-أكتوبر-2026 في ملخص التقرير و27-سبتمبر-2026 في ورقة المعالم. وتحمل أوراق التوريدات رقم المشروع DAM-05-009 بدلاً من DAM3-05-11، ولا يُظهر المتتبع إلا 20 أمر شراء صادراً من 83.
- رمز المشروع في ملف P6 هو DAM3-02-3 وتاريخ البدء المخطط 14-مارس-2023، ولا يطابقان هذا المشروع.
- يُظهر ملخص المستخلصات 0 مستخلصات مقدمة رغم إدراج ستة مستخلصات معتمدة.
- يذكر سجل المخاطر والمشكلات م. حمدي مديراً للمشروع في مدن، بينما يذكر التقرير الأسبوعي م. عفات م. العنزي. وتُظهر لوحة السجل 245 خطراً قائماً و130 مشكلة قائمة، مقابل 6 مخاطر قائمة ومشكلتين قائمتين في السجلات.
- لا تزال ورقة المعلومات العامة تذكر مرحلة المشروع «Mobilization» (التجهيز). وفي ورقة Major Quantities كُتبت وحدة الردم «m4» (تظهر هنا م³)، واستُخدم بند جدول الكميات 2.1.4 لبندين.
