# تطوير المناطق التقنية - الدمام

## Development of the Technology City in Dammam

| المالك | المقاول | الاستشاري | مدير المشروع - مدن | تسليم الموقع | انتهاء العقد |
|---|---|---|---|---|---|
| مدن | شركة أنساب للمقاولات العامة | إيجيس (EGIS) | م. Afat Elanzey | 23-ديسمبر-2025 | 22-فبراير-2027 |

النطاق: الطرق التجميعية والمحلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والمياه المعالجة والجهد المتوسط وإنارة الشوارع والاتصالات، ومحطة ضخ الصرف الصحي، وبحيرات تصريف السيول، والسور وغرفة الحارس، ومباني المرافق، في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

---

## ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. يذكر التقرير الأسبوعي (WPR-38) إنجازاً فعلياً 32.47% مقابل 68.43% مخطط في الخطة الأساسية الأصلية و50.23% في الخطة المعدلة. وأضاف هذا الأسبوع 2.66% مقابل 3.68% مخطط.

نسبة الإنجاز الفعلي
**32.47%** / 68.43%
مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.47 متأخر بنسبة 35.96% · الخطة المعدلة 50.23%، مؤشر الأداء 0.65

التقدم هذا الأسبوع
**+2.66%** / 3.68%
مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 1.02%

المدة المنقضية من العقد
**72.8%** · اليوم 310 من 426
▼ الانتهاء المتوقع 08-يونيو-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
**11.2%** · 7.6 مليون ريال
آخر فترة مستخلص تنتهي في 05-أكتوبر-2026

**من المتوقع أن ينتهي المشروع متأخراً 106 أيام.**

يتوقع التقرير الأسبوعي وتحديث P6 كلاهما الانتهاء في 08-يونيو-2027 مقابل التاريخ التعاقدي 22-فبراير-2027، ولَعلم الانتهاء فائض زمني سالب قدره 80 يوماً في P6. معظم الشبكات بالكاد بدأت: الصرف الصحي عند 0.6% ومياه الشرب 5.5% وتصريف السيول 23.4% من ساعات عملها، بينما يتركز العمل في السور وغرفة الحارس ومباني المرافق. وللانتهاء في 22-فبراير-2027 يجب إنجاز النسبة المتبقية 67.53% خلال 16 أسبوعاً، أي نحو 4.22% أسبوعياً، مقابل 2.66% هذا الأسبوع.

---

## صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ملفات التقرير WPR-38. لا تحمل الصور ختم تاريخ أو GPS. اضغط على أي صورة لعرضها مكبّرة، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



**جدار السور الخارجي**
جدار بلوك مع الطلاء البيتوميني على امتداد حدود الموقع.



**أعمدة خرسانية داخل الشدات**
طاقم يعمل على السقالات حول أعمدة خرسانية مسلحة مرتفعة.



**الهيكل الخرساني لمبنى المرافق**

هيكل خرساني مع شدات السقف، وبجانبه رافعة متحركة وحفار.



**تسليح بلاطة الأساس**

حديد التسليح مركّب داخل شدات مدعّمة وجاهز للصب.



**بحيرة تصريف السيول**

تكسية حجرية مثبتة بالمونة على ميول البحيرة، مع منشأ المدخل.





**طبقة التغطية للطريق**

قاع طريق مدموك بين أكوام الرمل.

## منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data في التقرير WPR-38.

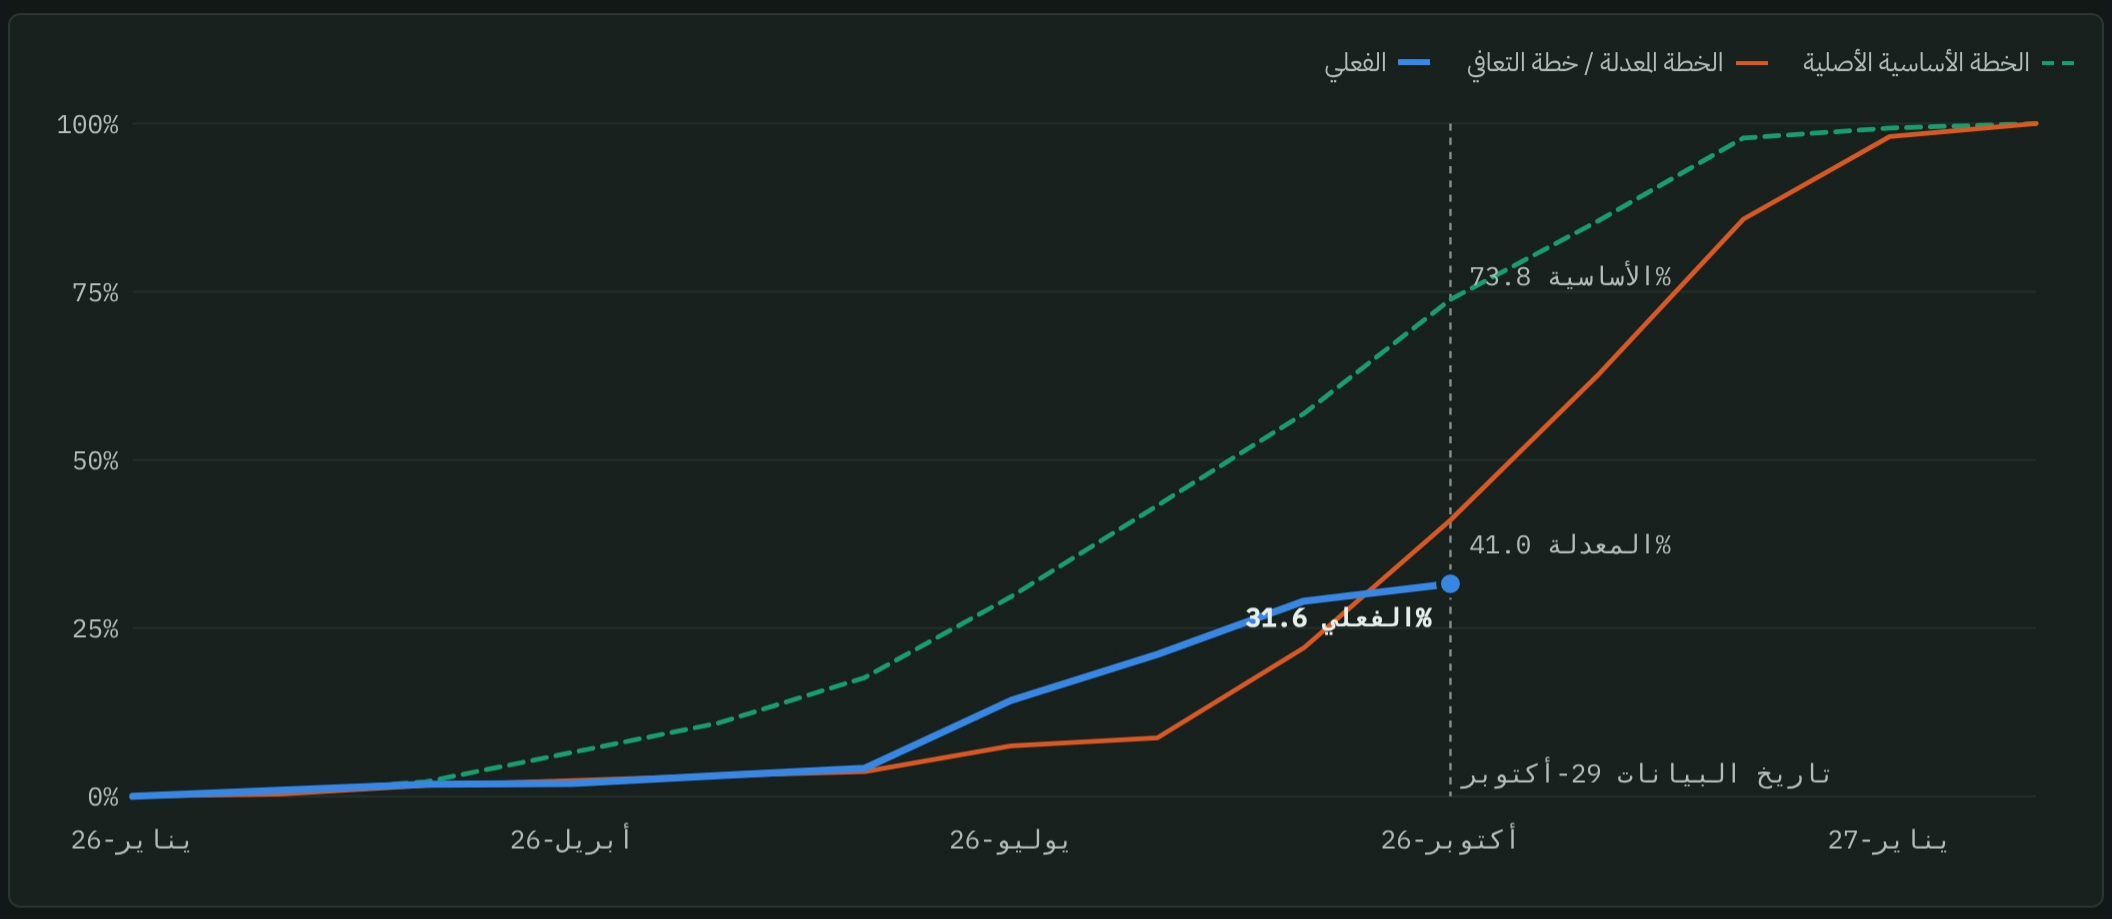


| الشهر | المخطط % | الفعلي % | الانحراف | المنجز خلال الشهر | مؤشر الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| مايو-2026 | 10.9 | 3.1 | -7.8% | +1.2% | 0.28 |
| يونيو-2026 | 17.6 | 4.2 | -13.5% | +1.1% | 0.24 |
| يوليو-2026 | 29.7 | 14.3 | -15.4% | +10.1% | 0.48 |
| أغسطس-2026 | 43.3 | 21.1 | -22.2% | +6.8% | 0.49 |
| سبتمبر-2026 | 56.9 | 29.0 | -27.9% | +7.9% | 0.51 |
| **أكتوبر-2026** | **73.8** | **31.6** | **-42.3%** | **+2.6%** | **0.43** |

المخطط هو الخطة الأساسية الأصلية في نهاية الشهر. تستخدم ورقة المنحنى كامل ميزانية P6 البالغة 151,920 ساعة عمل، لذا فإن الفعلي لشهر أكتوبر (31.59%) أقل من 32.47% الواردة في الورقة الرئيسية؛ انظر ملاحظات على البيانات. تبلغ الخطة المعدلة 41.0% في أكتوبر، ويصل توقع المقاول إلى 100% في فبراير 2027. لا تتوفر قيم أسبوعية للأسابيع السابقة لأن هذا أول أسبوع يُرفع للمشروع.

## التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المخطط هو الخطة المعدلة (P6) حتى تاريخه. المصدر: مستخرج P6 في ورقة Progress في التقرير WPR-38.


| المرحلة | الوزن | المخطط | الفعلي | الانحراف | مؤشر الأداء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التصميم الهندسي | 3.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 1.00 | ✓ مكتمل |
| التوريدات | 20.0% | 86.2% | 55.1% | -31.1% | 0.64 | ▼ متأخر |
| شبكة الصرف الصحي | 2.7% | 85.1% | 0.6% | -84.5% | 0.01 | ▼ متأخر |
| شبكة تصريف السيول | 6.4% | 61.0% | 23.4% | -37.6% | 0.38 | ▼ متأخر |
| شبكة مياه الشرب | 3.1% | 52.0% | 5.5% | -46.5% | 0.10 | ▼ متأخر |
| شبكة الري | 2.3% | 5.8% | 0.0% | -5.8% | 0.00 | ▼ لم يبدأ |
| شبكة المياه المعالجة | 1.2% | 5.2% | 0.0% | -5.2% | 0.00 | ▼ لم يبدأ |
| شبكة الجهد المتوسط | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | ● لم يحن موعده |
| شبكة الاتصالات | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | ● لم يحن موعده |

| المرحلة | الوزن | المخطط | الفعلي | الانحراف | مؤشر الأداء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شبكة إنارة الشوارع | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | ● لم يحن موعده |
| شبكة الطرق | 4.8% | 66.7% | 64.6% | −2.1% | 0.97 | ▼ متأخر قليلاً |
| السور وغرفة الحارس | 30.2% | 50.6% | 31.9% | −18.7% | 0.63 | ▼ متأخر |
| مباني المرافق | 11.7% | 17.9% | 26.7% | +8.8% | 1.49 | ▲ متقدم |
| الاختبار والتشغيل | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | ● لم يحن موعده |
| **الإجمالي** | 100% | **48.9%** | **31.6%** | **−17.3%** | **0.65** | ▼ متأخر |

الأوزان هي حصة كل مرحلة من 18,990 يوم عمل مخطط في P6. يضم تحديث P6 (MOD3-3147-BL0-R0-6، تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) عدد 873 نشاطاً: 331 مكتملاً و50 قيد التنفيذ و492 لم تبدأ. ارتفع عدد الأنشطة المتأخرة عن موعد بدئها من 60 إلى 77 هذا الأسبوع.

## نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود التي سُجّل لها تقدم، من ورقة Major Quantities في التقرير WPR-38. لا يمكن حساب المنفذ هذا الأسبوع لعدم رفع أي أسبوع سابق لهذا المشروع.

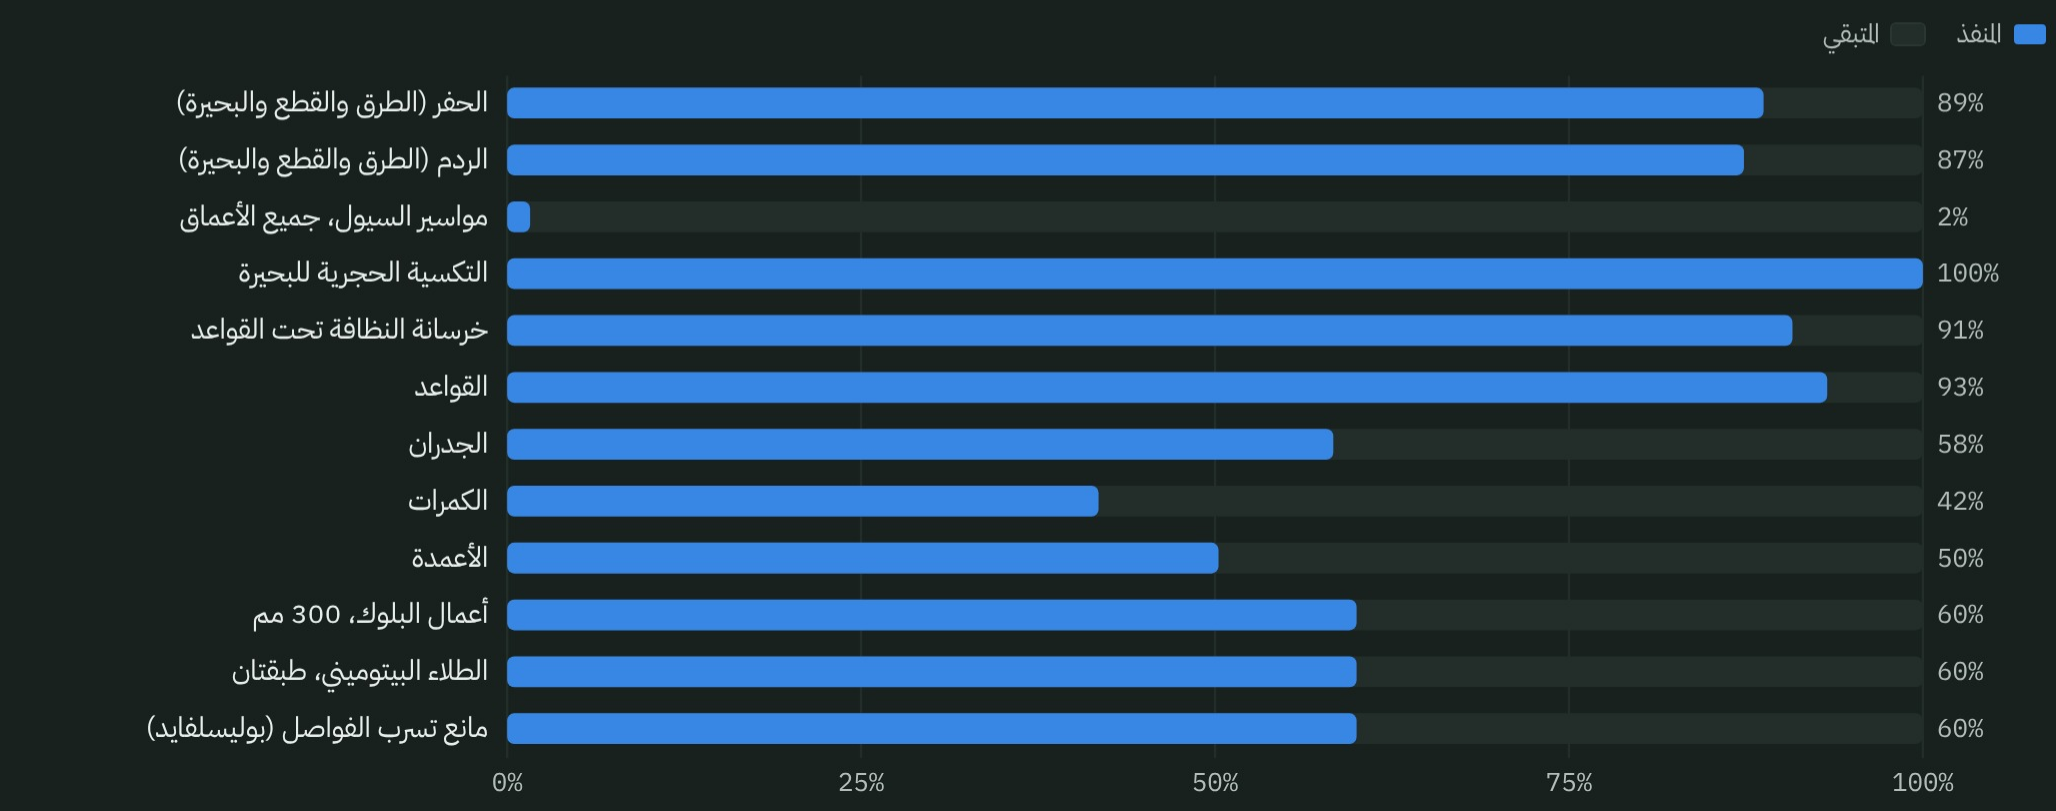


| بند النطاق | الشبكة | الوحدة | الإجمالي | المنفذ | المنفذ هذا الأسبوع | المتبقي | % المنفذ | الردم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **الحفر (الطرق والقطع والبحيرة)** | الطرق | م³ | 502,417 | 445,886 | – | 56,531 | 88.7% | – |
| **الردم (الطرق والقطع والبحيرة)** | الطرق | م³ | 314,650 | 274,878 | – | 39,772 | 87.4% | – |
| **مواسير السيول، جميع الأعماق** | تصريف السيول | م.ط | 5,560 | 90.2 | – | 5,470 | 1.6% | – |
| **التكسية الحجرية للبحيرة** | تصريف السيول | م² | 3,720 | 3,720 | – | 0 | 100.0% | – |
| **خرسانة النظافة تحت القواعد** | السور وغرفة الحارس | م³ | 1,500 | 1,362 | – | 138.2 | 90.8% | – |
| **القواعد** | السور وغرفة الحارس | م³ | 7,310 | 6,816 | – | 494 | 93.2% | – |
| **الجدران** | السور وغرفة الحارس | م³ | 1,960 | 1,144 | – | 816.3 | 58.4% | – |
| **الكمرات** | السور وغرفة الحارس | م³ | 288 | 120.3 | – | 167.7 | 41.8% | – |
| **الأعمدة** | السور وغرفة الحارس | م³ | 372 | 186.9 | – | 185.1 | 50.2% | – |
| **أعمال البلوك، 300 مم** | السور وغرفة الحارس | م² | 8,775 | 5,265 | – | 3,510 | 60.0% | – |
| **الطلاء البيتوميني، طبقتان** | السور وغرفة الحارس | م² | 39,170 | 23,502 | – | 15,668 | 60.0% | – |
| **مانع تسرب الفواصل (بوليسلفايد)** | السور وغرفة الحارس | م.ط | 415 | 249 | – | 166 | 60.0% | – |

**السور وغرفة الحارس والأعمال الترابية في المقدمة**

أُنجز 93% من قواعد السور واكتملت التكسية الحجرية للبحيرة. بلغ الحفر 88.7% والردم 87.4%. وتتراوح جدران وكمرات وأعمدة السور وغرفة الحارس بين 42% و58%.

**الشبكات: لا يوجد تركيب مقاس بعد**

تُظهر شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والري والمياه المعالجة والجهد المتوسط وإنارة الشوارع والاتصالات صفراً منفذاً. وتُظهر مواسير السيول 1.6%، لكن كل بنود السيول تحمل النسبة نفسها، فالرقم موزّع نسبياً وليس مقاساً.

## المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتوقع من التقرير الأسبوعي؛ وتواريخ التوقع والفائض الزمني من تحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026).

| المعلم | الخطة الأساسية | توقع التقرير الأسبوعي | توقع تحديث P6 | الفائض في P6 (أيام) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| تسليم الموقع | 23-ديسمبر-2025 | 23-ديسمبر-2025 | 23-ديسمبر-2025 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| خطة التنفيذ والبرنامج الزمني الأساسي | 17-مارس-2026 | 17-مارس-2026 | 18-يناير-2026 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| اعتماد المخططات التنفيذية والمواد | 13-أبريل-2026 | 13-أبريل-2026 | 21-أغسطس-2026 (فعلي) | – | ✓ منجز متأخراً |
| التجهيز وإعداد الموقع | 19-مايو-2026 | 19-مايو-2026 | 18-يناير-2026 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| شبكة تصريف السيول | 06-يناير-2027 | 27-أبريل-2027 (+111 يوماً) | 05-أبريل-2027 | −66.5 | ▼ متأخر |
| شبكة الصرف الصحي | 06-يناير-2027 | 01-مايو-2027 (+115 يوماً) | 28-أبريل-2027 | −77.2 | ▼ متأخر |
| شبكة الجهد المتوسط | 07-مارس-2027 | 23-مايو-2027 (+77 يوماً) | 26-أبريل-2027 | −74 | ▼ متأخر |
| شبكة إنارة الشوارع | 18-مارس-2027 | 26-مايو-2027 (+69 يوماً) | 29-أبريل-2027 | −64 | ▼ متأخر |
| شبكة الاتصالات | 18-مارس-2027 | 04-مايو-2027 (+47 يوماً) | 03-مايو-2027 | −80 | ▼ متأخر |
| أعمال الطرق | 18-مارس-2027 | 02-يونيو-2027 (+76 يوماً) | 26-مايو-2027 | −68.5 | ▼ متأخر |
| شبكة مياه الشرب | 22-مارس-2027 | 20-مايو-2027 (+59 يوماً) | 08-مايو-2027 | −64.5 | ▼ متأخر |
| شبكة الري | 22-مارس-2027 | 13-مايو-2027 (+52 يوماً) | 12-أبريل-2027 | −43 | ▼ متأخر |
| شبكة المياه المعالجة | 22-مارس-2027 | 05-يونيو-2027 (+75 يوماً) | 26-أبريل-2027 | −54.5 | ▼ متأخر |
| انتهاء المشروع | 22-فبراير-2027 | 08-يونيو-2027 (+106 أيام) | 08-يونيو-2027 | −80 | ▼ متأخر |

**توقعات التقرير الأسبوعي للشبكات أبعد من تحديث P6 بما بين يوم و40 يوماً.**

كلاهما يعطي 08-يونيو-2027 للانتهاء، لكن التقرير الأسبوعي يضع معالم الشبكات بعد تواريخ P6، وأكثرها شبكة المياه المعالجة (05-يونيو-2027 مقابل 26-أبريل-2027) والري (13-مايو-2027 مقابل 12-أبريل-2027) والجهد المتوسط وإنارة الشوارع (27 يوماً لكل منهما). وما زال التقرير الأسبوعي يصنّف المعالم من 2 إلى 4 كمتوقعة، رغم أن P6 يسجلها مكتملة.

## التوريدات للمواد الرئيسية

نسبة ما وُرِّد إلى الموقع من الكمية الإجمالية. المصدر: سجل متابعة التوريدات المحدّث في 27-أكتوبر-2026، ورقة ملخص البنود.




**مواد الكهرباء والاتصالات والمياه والري: 0% مورّد**


لم تصدر بعد أوامر الشراء لتمديدات الجهد المتوسط ولتمديدات ومناهل الاتصالات؛ وسيقدم المقاول طلب استيضاح (RFI) للجهد المتوسط، ويربط أوامر الاتصالات بصرف المستخلص. جميع البنود المتابعة وعددها 41 متأخرة عن تواريخ التوريد في الخطة الأساسية بما بين يوم و217 يوماً.

**اكتمل توريد مواسير وأغطية الصرف الصحي؛ وخرسانة السور عند 66%**

وُرِّدت بالكامل مواسير الصرف الصحي (1,944 م) وأغطية المناهل (42) ومواسير غرف تجميع السيول (2,686 م). وبلغت خرسانة السور 8,300 من 12,500 م³، ويُتوقع انتهاء توريدها بنهاية ديسمبر 2026.

## القوى العاملة

عدد العمالة اليدوية في الموقع هذا الأسبوع حسب المهنة، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower في التقرير WPR-38.

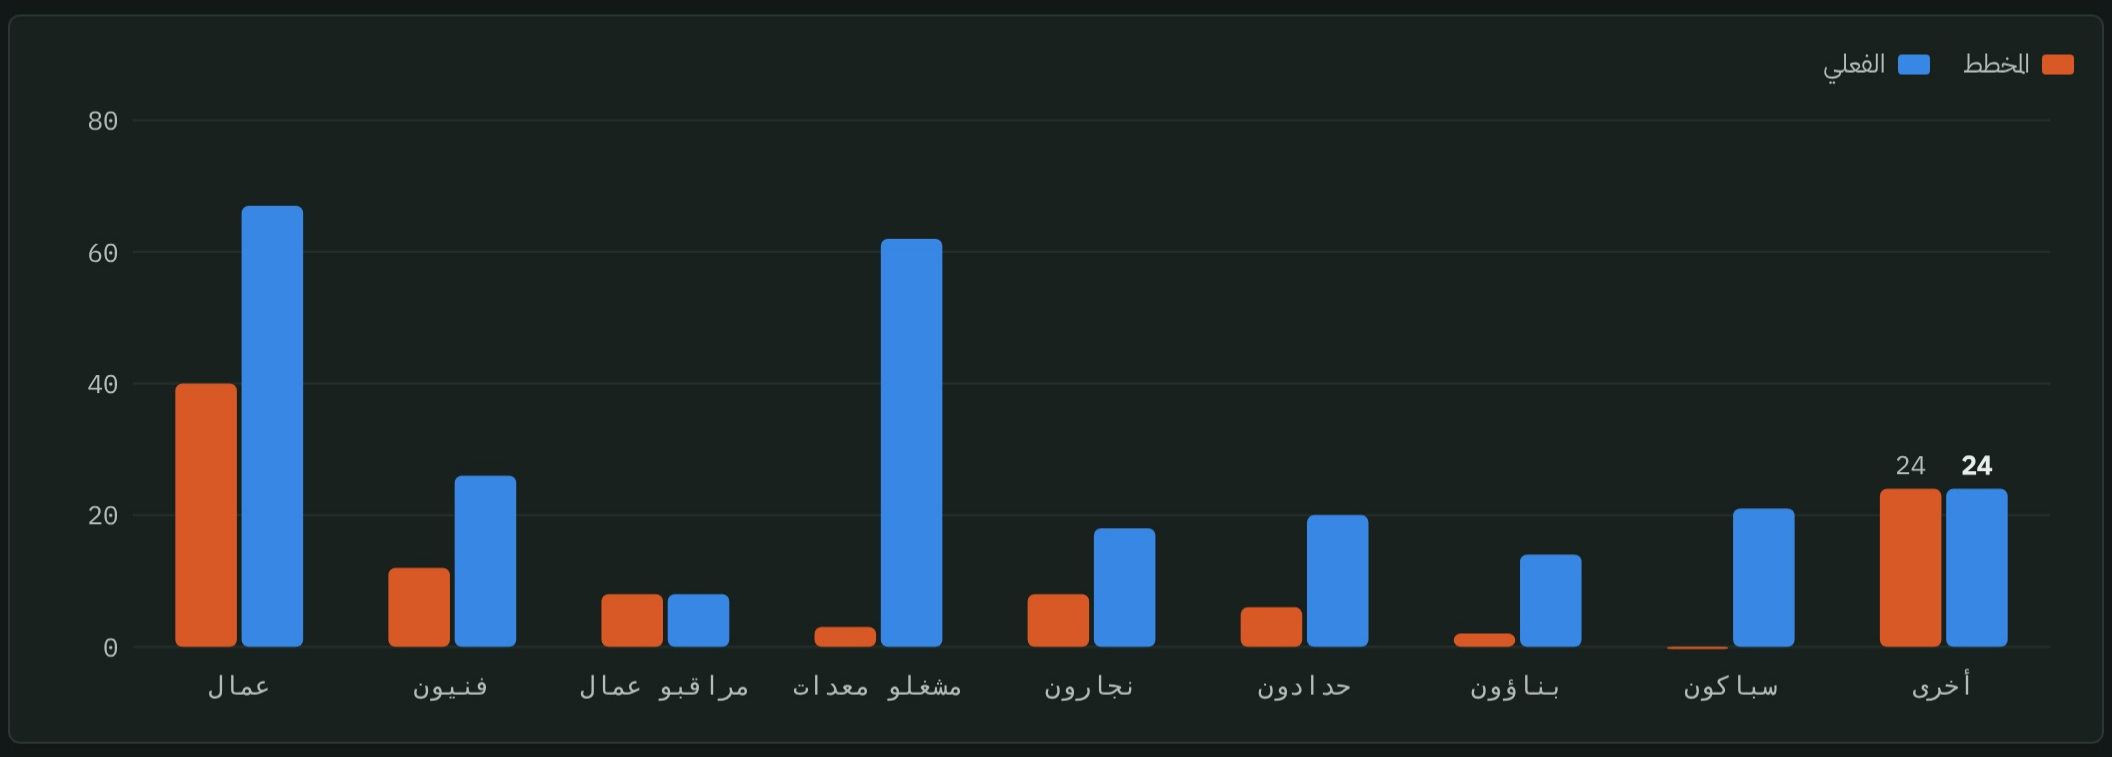


260 عاملاً يدوياً مقابل 103 مخطط، إضافة إلى 19 من الجهاز الإداري والفني مقابل 9 مخطط: الإجمالي 279 مقابل 112. المعدات في الموقع: 145 مقابل 120 مخطط، ولا يوجد معدات متوقفة.

## التكلفة والمستخلصات

### قيمة العقد

| | |
|---|---|
| **قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)** | **67,768,369.77** |
| قيمة العقد شاملة ضريبة 15% | 77,933,625.23 |
| أوامر التغيير | 0 |
| الدفعة المقدمة (10%) | 6,776,836.98 |

جميع القيم بالريال السعودي. القيمة شاملة الضريبة من ورقة Conclusion. سجل أوامر التغيير فارغ.

### المستخلصات

| | |
|---|---|
| المستخلصات المقدمة (سجل المستخلصات / الورقة الرئيسية) | 3 / 2 |
| القيمة الإجمالية المقدمة | 7,617,509.90 |
| المعتمد من مدير المشروع - مدن | 7,617,509.90 |
| المدفوع (سجل المستخلصات / الورقة الرئيسية) | 3,596,613.90 / 0 |
| المحتجزات | 0 |
| الخصومات والغرامات | 0 |

تبلغ المستخلصات 11.2% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 32.47%. وتختلف الورقة الرئيسية وسجل المستخلصات في عدد المستخلصات وفي المدفوعات.

## الصحة والسلامة والجودة

### السلامة التقييم 0.82

| | |
|---|---|
| ساعات العمل الآمنة (تراكمي) | 204,884 |
| ساعات العمل هذا الأسبوع | 15,600 |
| إصابات مضيعة للوقت | 0 |
| الوفيات | 0 |
| حالات الإسعافات الأولية | 0 |
| حوادث وشيكة | 0 |
| أضرار المتلكات | 1 |
| اجتماعات التوعية (عدد الجلسات / الحضور) | 164 / 2,429 |

### الجودة التقييم 0.90

| | |
|---|---|
| طلبات الفحص الميداني: صادرة / مغلقة / معلقة | 394 / 336 / 58 |
| طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة | 15 / 8 / 7 |
| تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / مفتوحة | 16 / 15 / 1 |
| تعليمات الموقع | 0 |
| طرق التنفيذ المعتمدة | 8 من 20 |

تفتيش مراقبة الجودة 28-أكتوبر-2026.

## المشكلات والمخاطر القائمة

| المشكلة | المسؤول | التفاصيل |
|---|---|---|
| نزاع على ملكية الأرض | مدن | نزاع مع أحد المواطنين على ملكية أرض المشروع. مفتوح منذ 01-يناير-2026؛ وأفادت الشرطة بأن النزاع خارج اختصاصها، وقد مضى التاريخ المستهدف 20-أبريل-2026. |
| تأخر أوامر الشراء | المقاول | ما زالت أوامر شراء معلقة (مفتوحة منذ 10-أبريل-2026)، منها تمديدات الجهد المتوسط ووصلاتها ومواد الاتصالات. |
| تأخر بدء أعمال الشبكات | المقاول | الخطر 07، الدرجة 20. بدأت الشبكات متأخرة وتتقدم ببطء بينما تتركز الموارد في السور؛ ولأنشطة الشبكات فائض زمني سالب بين 75 و84 يوماً تقريباً. |
| استشاري ومقاول الجهد المتوسط | المقاول / الاستشاري | الخطر 08، الدرجة 16. لا يمكن المضي في توريد وأعمال الجهد المتوسط قبل اعتماد الاستشاري المتخصص ومقاول الباطن للجهد المتوسط. |
| المياه الجوفية | المقاول | الخطر 05، الدرجة 16. تحتاج الحفريات إلى نزح مستمر للمياه. |
| توريد المواد | المقاول | الخطر 01، الدرجة 15. قد يؤدي تأخر توريد المواد إلى توقف الأنشطة أو تأخرها. |

مخاطر أخرى قائمة في السجل: تأخر صرف الدفعة المقدمة والمستخلصات، وتأخر الاختبارات أو إخفاقها، وجاهزية البنية التحتية القائمة للربط.

## ملاحظات على البيانات

- تاريخ البيانات: تذكر الورقة الرئيسية في WPR-38 تاريخ 29-أكتوبر-2026؛ بينما تحديث P6 وسجل التوريدات وقائمة الأنشطة المتأخرة عن البدء مؤرخة 27-أكتوبر-2026، وملف الجدول الاستباقي مسمّى 20-10-2026 لكن عنوانه Update 27-10-2026.
- إجمالي ساعات العمل: في الورقة الرئيسية وورقة Progress أُزيحت أيام العمل المخططة لبنود التنفيذ صفاً واحداً للأعلى. فسقطت أيام الصرف الصحي (516) وظهرت أيام الاختبار والتشغيل (1,899) أمام مباني المرافق، فصار الإجمالي 18,474 بدلاً من 18,990 في P6 (151,920 ساعة عمل). وبالميزانية الكاملة تكون نسبة الإنجاز الفعلي 31.59%، كما في ورقة Physical-Chart Data وتحديث P6. ويستخدم ملخص التقرير النسبة المعلنة 32.47%.
- بسبب هذه الإزاحة فإن نسب المراحل في الورقة الرئيسية خاطئة (تظهر شبكة السيول بنسبة مخططة 126.8%). لذا يستخدم جدول المراحل مستخرج P6 في ورقة Progress. كما تعطي الورقة الرئيسية كل المراحل نسبة الخطة الأصلية نفسها (68.43%)، فلا توجد خطة أساسية فعلية لكل مرحلة.
- الخطة المعدلة حتى تاريخه: 50.23% في الورقة الرئيسية مقابل 41.04% لشهر أكتوبر في ورقة Physical-Chart Data.
- عمود "المكتسب الأسبوع الماضي" في ورقة Progress يحسب مراحل التنفيذ مرتين (الإجمالي 8,245 يوم عمل بدلاً من 5,402). كما أن الزيادة الأسبوعية المستنتجة منه (597 يوم عمل) تختلف عن الرقم الأسبوعي في الورقة الرئيسية (492 يوم عمل، 2.66%).
- هذا هو الأسبوع الوحيد الذي رُفعت له ملفات لهذا المشروع، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز "—".
- مدة العقد: تذكر الورقة الرئيسية 426 يوماً حتى 22-فبراير-2027، بينما تذكر ورقة Milestones "Contract Weeks 44 of 65" وتورد تاريخ الانتهاء في الخطة الأساسية 22-مايو-2027. وفي P6 تاريخ الانتهاء الإلزامي 23-فبراير-2027.
- أعداد الأنشطة: يذكر التقرير الأسبوعي 310 مكتملة و47 قيد التنفيذ و516 لم تبدأ؛ ويذكر تحديث P6 الأعداد 331 و50 و492.
- تصف ورقة Conclusion التقدم المبني على التكلفة بأنه "فعلي"؛ ولم يُستخدم في هذا التقرير. كما تذكر الأعمال الترابية للطرق 637,536 م³ مقابل 720,764 م³ (الحفر والردم) في ورقة Major Quantities.
- الكميات: تُظهر مواسير السيول النسبة نفسها 1.62% في كل بند، وتُظهر مناهل السيول أعداداً كسرية (0.198 من 20)، فهذه القيم موزّعة نسبياً وليست مقاسة. لذا استُبعدت مناهل السيول من الجدول.
- المستخلصات: تُظهر الورقة الرئيسية مستخلصين وصفراً مدفوعاً؛ بينما يورد سجل المستخلصات 3 مستخلصات دُفع أول اثنين منها (3,596,613.90 ريال). ويشير سجل المستخلصات إلى المشروع DAMT-02-001 ويذكر قيمة عقد معدلة 21,100,000. كما تحمل ورقة تفتيش السلامة رقم المشروع DAMT-02-001 والفترة من 30-سبتمبر إلى 06-أكتوبر-2026.
- سجل التوريدات: يختلف ملخص البنود عن تفاصيل الكميات. مواسير الخط الرئيسي للسيول 0 من 18 م مقابل نحو 4,523 م موّردة في التفاصيل؛ ومناهل السيول 0 من 55 مقابل 50 من 54؛ ومواسير المياه المعالجة 0 مقابل 1,200 م؛ ومناهل الصرف الصحي 1,200 من 2,489.6 مقابل 42 من 42. يستخدم المخطط ملخص البنود ويستبعد مواسير الخط الرئيسي للسيول ومواسير المياه المعالجة ومناهل الصرف الصحي.
- يكرر صف العمالة اليدوية "الفعلي" في ورقة القوى العاملة الأسبوعية القيم التراكمية المخططة، لذا يُعرض عدد العمالة لهذا الأسبوع فقط.
- لا تحمل الصور ختم تاريخ أو GPS، وملفان من الصور المرفوعة متطابقان.

---
