تطوير الطرق لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية)

Road Development for the Support Services Area, Second Industrial City in Makkah (Al-Akayshiyah)

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عبدالله الجليفي	25-Jun-2026	24-Aug-2027

النطاق: أعمال الطرق وشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية). قيمة العقد 33.04 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 14 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في 2026-أكتوبر-20 بلغت نسبة الإنجاز 45.2% مقابل 32.6% مخطط، أي أن المشروع متقدم بنسبة 12.6% عن الخطة، بعد إنجاز 4.3% هذا الأسبوع مقابل 4.1% مخطط.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
45.2% / 32.6% مخطط	**+4.3%** / +4.1% مخطط	**27.5%** · اليوم 117 من 425	**20.4%** · 6.75 مليون ريال
▲ مؤشر الأداء 1.39 · +12.6%	▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.2%	▼ انتهاء P6 في 2027-أكتوبر-14	3 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 27-سبتمبر-2026

التقدم أعلى من المخطط، لكن البرنامج الزمني ينتهي متأخرًا 51 يومًا.

يحدد تحديث P6 (UP 14، تاريخ البيانات 2026-أكتوبر-20) إنجاز المشروع في 2027-أكتوبر-14، أي بعد 51 يومًا من تاريخ انتهاء العقد 2027-أغسطس-24، بفائض كلي −43 يومًا. ويعطي التقرير الأسبوعي التوقع نفسه. الأعمال الترابية متقدمة كثيرًا عن الخطة، لكن طبقات الرصف والبردورات والإنترلوك لم تبدأ، ولم تصدر أوامر شراء لموادها بعد.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ورقة الصور الأسبوعية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 2026-أكتوبر-20، تحمل كل منها ختم 18-2026-أكتوبر مع الوقت والارتفاع (دون إحداثيات GPS). اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال القطع، الطريق المحلي 17

ختم 2026-أكتوبر-18، 08:46، الارتفاع 187.3 م.



أعمال طبقة ما تحت الأساس، الطريق المحلي 28

ختم 2026-أكتوبر-18، 11:33، الارتفاع 164.2 م.



حفر شبكة تصريف السيول، الطريق المحلي 29

ختم 2026-أكتوبر-18، 07:04، الارتفاع 165.5 م.




تركيب المناهل، الطريق المحلي 29

ختم 2026-أكتوبر-18، 07:03، الارتفاع 168.3 م.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، بقيم نهاية كل شهر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

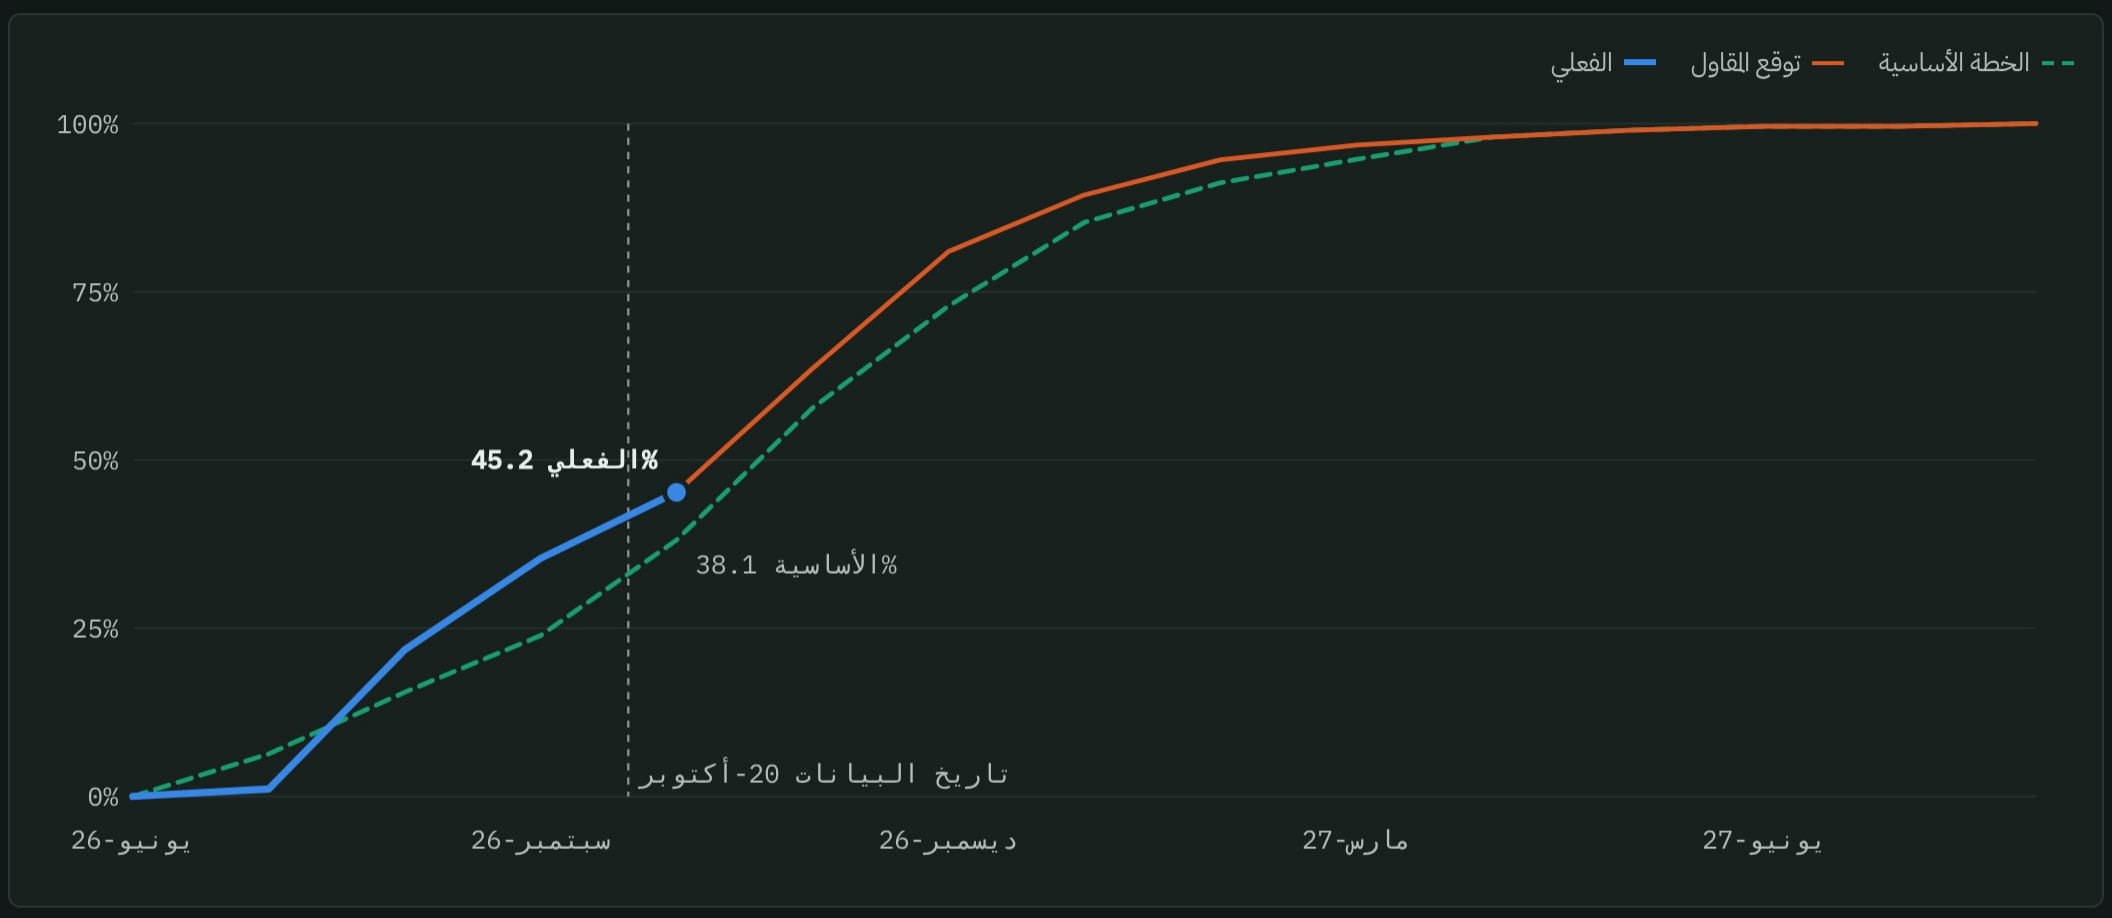

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026	28.5	41.0	+12.4%	—	1.44
20-Oct-2026	**32.6**	**45.2**	**+12.6%**	**+4.3**	**1.39**

استُخدم تقرير هذا الأسبوع فقط. صف 2026-أكتوبر-13 مأخوذ من قيمة "CM Last Week" الواردة في ورقة (2) Progress لهذا الأسبوع، ولا تظهر الأسابيع السابقة.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة (218,590 ساعة إجمالًا). المصدر: ورقة Weekly Progress Report.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز والحشد	3.6%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	2.7%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	2.2%	77.0%	59.4%	−17.6%	0.77	▼ متأخر
أعمال الطرق	54.3%	31.9%	50.1%	+18.2%	1.57	▲ متقدم
تصريف مياه الأمطار والسيول	35.6%	20.5%	29.3%	+8.8%	1.43	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	–	لم يحن موعده
التسليم والإغلاق	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	–	لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**32.6%**	**45.2%**	**+12.6%**	**1.39**	▲ متقدم

يضم تحديث P6 (UP 14، تاريخ البيانات 2026-أكتوبر-20) 381 نشاطًا: 148 مكتملًا و34 قيد التنفيذ و199 لم تبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 2027-أكتوبر-14 بفائض كلي −43 يومًا. انخفضت أنشطة المسار الحرج من 183 إلى 168 هذا الأسبوع، وارتفعت الأنشطة المتأخرة في البدء من 25 إلى 29.

نطاق العمل: الكميات

إجمالي النطاق والكمية المنفذة للبنود الجارية، من ورقة الكميات الرئيسية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 20- أكتوبر-2026. عمود "المنفذ هذا الأسبوع" هو الكمية الواردة في ملخص الأعمال المنفذة خلال الأسبوع.

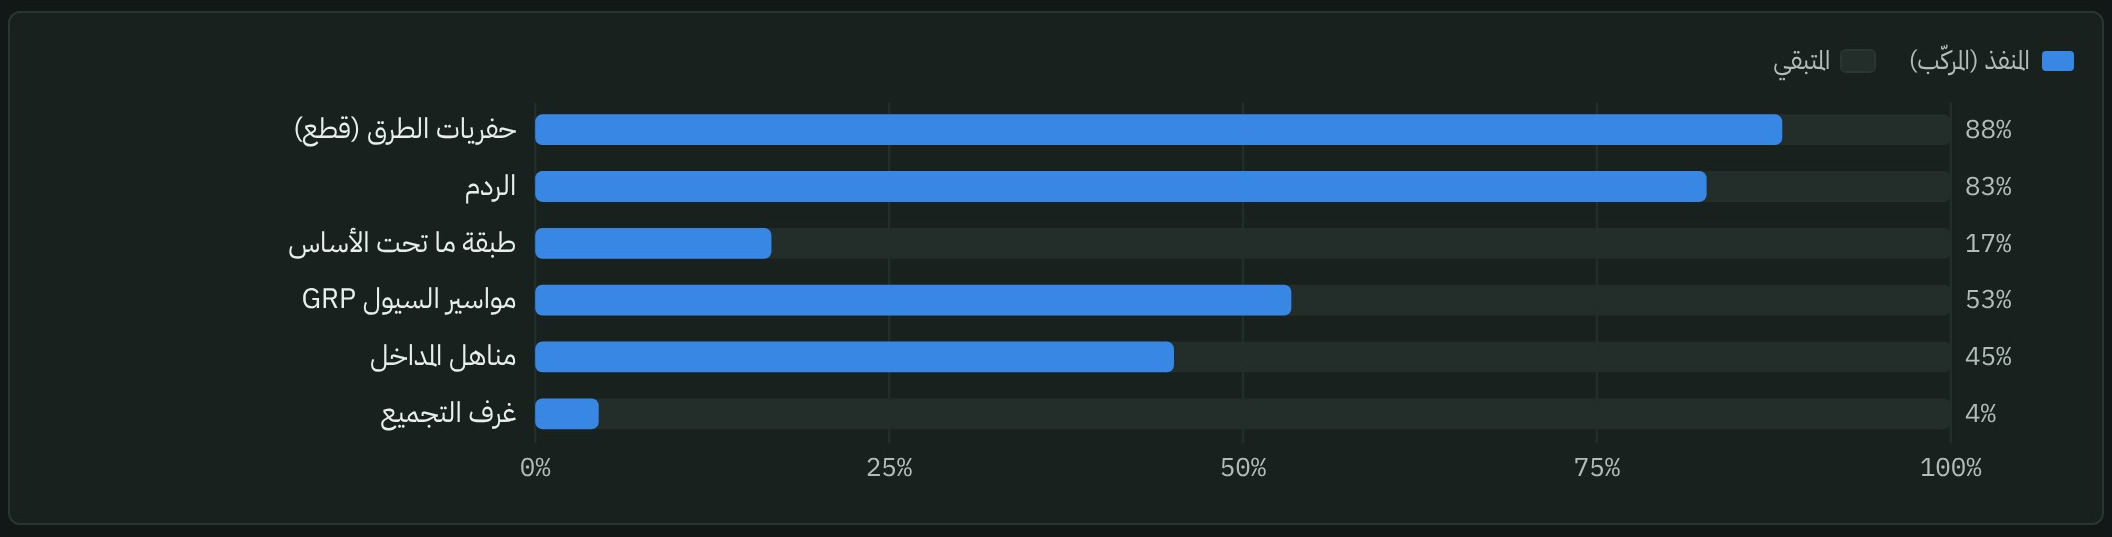

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
حفريات الطرق (قطع)	جميع الطرق	م³	252,115	222,090	7,110+	30,025	88.1%	–
الردم	جميع الطرق	م³	221,841	183,569	4,140+	38,272	82.7%	–
طبقة ما تحت الأساس	جميع الطرق	م³	39,250	6,550	1,968+	32,700	16.7%	–
مواسير السيول GRP	جميع الطرق	م.ط	5,855	3,127	941+	2,728	53.4%	–
مناهل المداخل	جميع الطرق	عدد	82	37	10+	45	45.1%	–
غرف التجميع	جميع الطرق	عدد	156	7	7+	149	4.5%	–

الأعمال الترابية متقدمة كثيرًا عن الخطة

بلغ القطع 222,090 م³ مقابل 148,344 م³ مخطط حتى تاريخه، والردم 183,569 م³ مقابل 130,531 م³ مخطط. هذا الأسبوع: قطع في الطريقين المحليين 17 و31، وردم في الطريق المحلي 31، وطبقة ما تحت الأساس في الطريق المحلي 28.

لم تبدأ بعد

طبقة الأساس الحصوية، وطبقتا الأساس والسطح الإسفلتيتان، والبردورات مسبقة الصب، والإنترلوك، والعلامات الأرضية، واللوحات المرورية كلها عند 0%. ومن أصل 156 غرفة تجميع رُكّبت 7 غرف، جميعها هذا الأسبوع.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث P6 تواريخ التوقع نفسها. يعرض التقرير الأسبوعي التأخير بالأيام التقويمية، ويعرض عمود P6 الفائض الكلي.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	25-Jun-2026	25-Jun-2026	25-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم البرنامج الزمني الأساسي	12-Jul-2026	12-Jul-2026	12-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
إتمام التجهيز والحشد	23-Jul-2026	15-Aug-2026 (+23 يومًا)	15-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخرًا
اعتماد المخططات والمواد	23-Aug-2026	19-Sep-2026 (+27 يومًا)	19-Sep-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخرًا
إنجاز تصريف مياه الأمطار والسيول	24-Feb-2027	10-Apr-2027 (+45 يومًا)	10-Apr-2027	−20	▼ متأخر
إنجاز أعمال الطرق	24-Apr-2027	15-Jun-2027 (+52 يومًا)	15-Jun-2027	−26	▼ متأخر
إنجاز المشروع	24-Aug-2027	14-Oct-2027 (+51 يومًا)	14-Oct-2027	−43	▼ متأخر

الانتهاء متأخر رغم تقدم الأعمال عن الخطة.

التقدم الفعلي أعلى من الخطة بنسبة 12.6%، ومع ذلك يتوقع التقرير الأسبوعي وP6 الإنجاز بعد 51 يومًا من تاريخ العقد. يمتد الفائض السالب عبر أعمال الرصف وتصريف السيول المتبقية: طبقة ما تحت الأساس في الطرق المحلية 17 و11 و29 عند −42 إلى −43 يومًا، وتوريد مواد الرصف عند −17 يومًا.

توريد المواد الرئيسية

نسبة إنجاز التوريدات لكل مادة. المصدر: ورقة التوريدات، التقرير الأسبوعي بتاريخ 2026-أكتوبر-20.

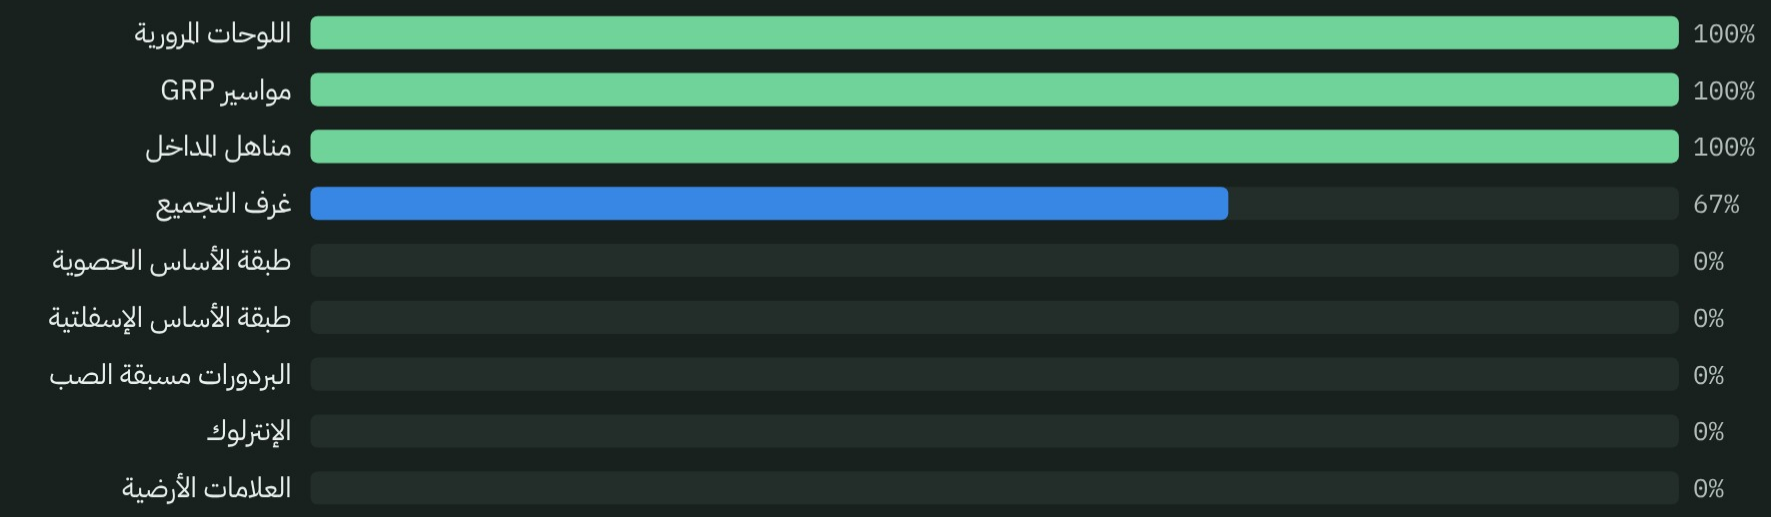

مواد الرصف: لا توجد أوامر شراء


لا توجد أوامر شراء لطبقة الأساس الحصوية والأساس الإسفلتي والبردورات مسبقة الصب والإنترلوك والعلامات الأرضية، رغم مرور تواريخ الطلب المطلوبة (من أغسطس-29 إلى 17-2026-سبتمبر). وتلزم طبقة الأساس الحصوية في الموقع بحلول 2026-نوفمبر-15 والأساس الإسفلتي بحلول 2026-ديسمبر-14.

مواد تصريف السيول

اكتملت توريدات مواسير GRP (5,855 م) ومناهل المداخل (82) واللوحات المرورية (171). وغرف التجميع عند 110 من 164 (67%).

القوى العاملة

متوسط عدد العاملين الشهري في الموقع (عمالة وموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة.

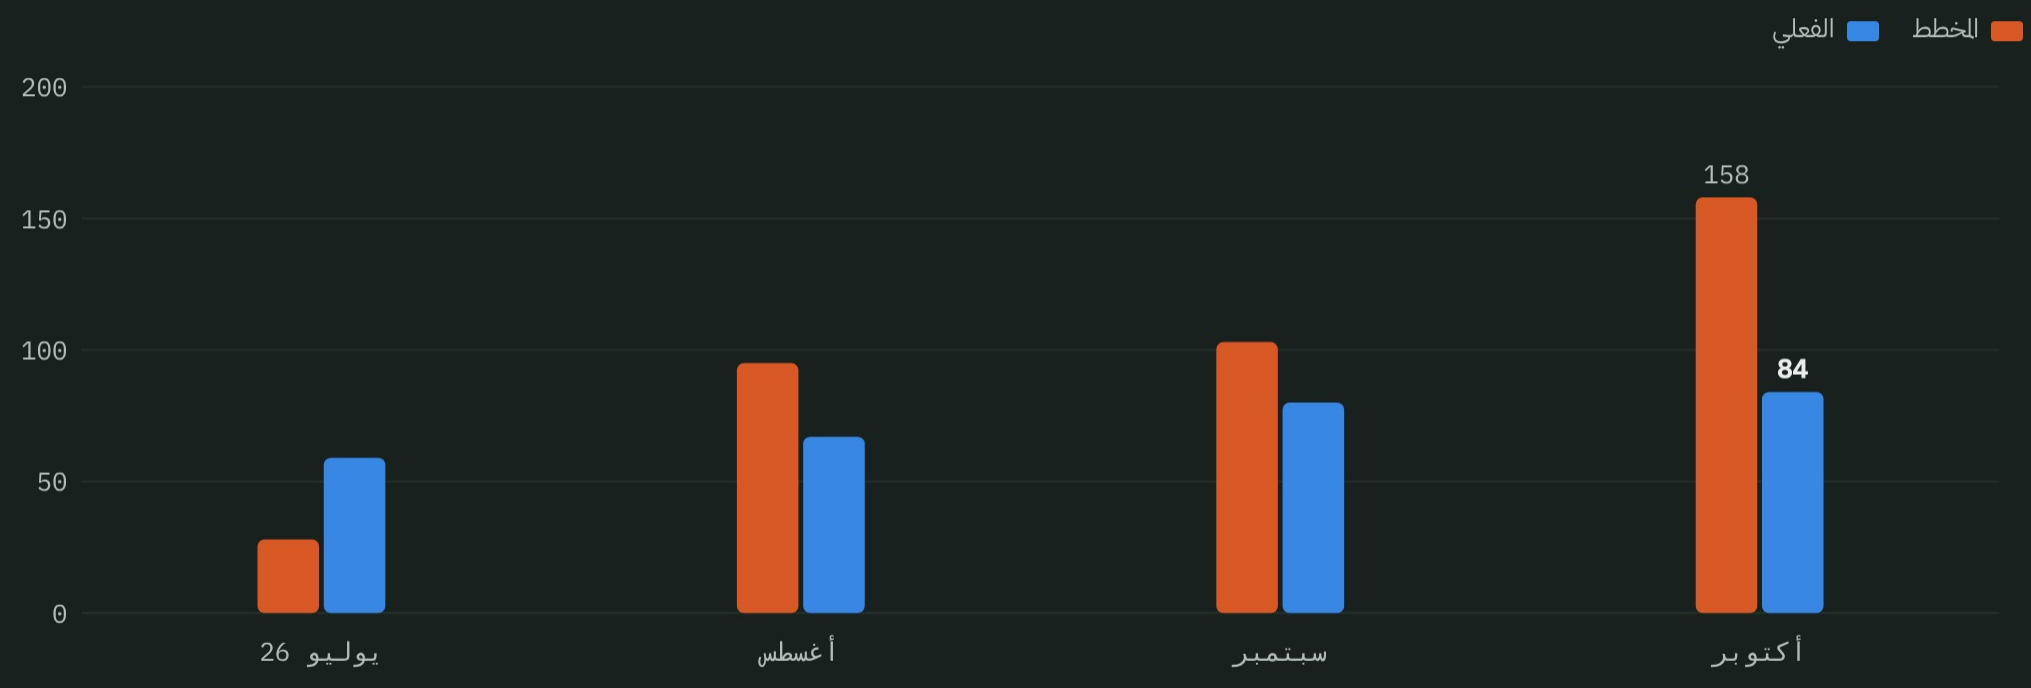

عدد العاملين في أكتوبر 84 مقابل 158 مخطط (−47%): 68 عاملًا مقابل 145 مخطط، و16 موظفًا مقابل 13.
المعدات في الموقع 62 مقابل 80 مخطط. وتبلغ الخطة ذروتها عند 182 في نوفمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الطرق	19,411,954
تصريف مياه الأمطار والسيول	13,628,050
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**33,040,004**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	37,996,005
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال السعودي. تمثل أعمال الطرق 58.8% من جدول الكميات وتصريف مياه الأمطار والسيول 41.2%. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	3
القيمة الإجمالية	6,754,935
الخصومات والغرامات	2,000
الصافي شاملاً الضريبة	7,770,175
المدفوع (مستخلصان)	3,778,785
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	9,511,215

تبلغ المستخلصات 20.4% من قيمة العقد مقابل تقدم فعلي 45.2%. اعتمدت الحسابات المستخلص 3 (من أغسطس-26 إلى 2026-سبتمبر-27) في 2026-أكتوبر-08 ولم يُصرف بعد. لا توجد دفعة مقدمة ولا محتجزات.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.88

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	36,989
ساعات العمل هذا الأسبوع	2,976
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	1
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	4 / 18

الجودة التقييم 0.89

طلبات الفحص الصادرة (تراكمي)	204
طلبات الفحص المغلقة / المعلقة	175 / 29
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	42 / 42
تقارير عدم المطابقة الصادرة	0
تعليمات الموقع (مغلقة)	1
المخططات التنفيذية المعتمدة	22 / 23
اعتمادات المواد	40 / 42

تفتيش الاستشاري للجودة والسلامة بتاريخ 2026-أكتوبر-20.

المشكلات والمخاطر القائمة

الخطر	المسؤول	التفاصيل
السقوط في الحفريات	المقاول	تربة غير مستقرة وغياب الحواجز. حواجز ولوحات تحذيرية ومشرف عند الحفريات. التقييم مرتفع (H20، وH16 بعد المعالجة).
إدارة الحركة المرورية	المقاول	حوادث مركبات بسبب قصور تحويلات المرور. لوحات تحويل وحواجز ومنظمو حركة. التقييم مرتفع (H16).
كفاءة المشغلين	المقاول	حوادث بسبب نقص تدريب المشغلين والإشراف عليهم. تدريب وتقييم للكفاءة وإشراف. التقييم مرتفع (H16).
انسكاب الزيوت	المقاول	تلوث التربة بسبب تسربات المعدات أو سوء التعامل مع الزيوت. خطة استجابة للانسكاب وصيانة واحتواء. التقييم متوسط (M9).

سجل المشكلات ولوحة أهم المشكلات في التقرير الأسبوعي فارغان، ولا تذكر الجداول الملخصة الأسبوعية أسباب تأخير أو تحديات.

ملاحظات على البيانات

- تصف الجداول الملخصة (ملفا الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز، وورقة Progress Summary) نسبة مبنية على التكلفة بأنها التقدم "الفعلي". يعتمد هذا التقرير على التقدم الفعلي بساعات العمل فقط.
- يُظهر ملف نسب الإنجاز وملف الأعمال المنفذة تقدم هذا الأسبوع بإشارتين متعاكستين.
- يذكر ملف الأعمال المنفذة بداية المشروع في 2025-نوفمبر-24 ونهاية العقد في 2026-مايو-23، بينما يذكر التقرير الأسبوعي تسليم الموقع في 2026-يونيو-25 والإنجاز في 2027-أغسطس-24.
- اسم مدير المشروع في مدن مكتوب "الجليفي" في ملف نسب الإنجاز و"الشنيفي" في ملف الأعمال المنفذة.
- تُظهر لوحة التقدم الفعلي الأسبوعي 8.2% مخطط و8.53% منجز هذا الأسبوع، لأنها تجمع كل صف مرتين (17,924 و18,642 ساعة عمل)؛ والقيم الصحيحة 4.10% و4.26%.
- تستخدم ورقة Progress ميزانية 181,410 ساعة عمل، فتعطي 39.3% مخطط و54.5% منجز. أما ورقة Weekly Progress Report وتحديث P6 فتستخدمان 218,590 ساعة عمل (32.6% و45.2%)، وهي ما يعتمده هذا التقرير.

- رقم الأسبوع: يذكر التقرير الأسبوع 17 (التقرير رقم 17 وورقة المعالم). وعدد الأسابيع الكاملة من تسليم الموقع حتى تاريخ البيانات 16.
- يُظهر التقرير الأسبوعي تأخر الإنجاز −51 يومًا، بينما الفائض الكلي في 43− P6 يومًا. ويسرد الجزء السفلي من ورقة المعالم أنشطة وتواريخ المشروع MKH2-02-003. وتذكر ورقة Progress Summary إنجاز أعمال الطرق في 2027-أبريل-27 بدلًا من 2027-أبريل-24.
- يصل التوقع في ورقة Physical-Chart Data إلى 100% في 2027-أغسطس-31، بينما ينتهي P6 في 2027-أكتوبر-14.
- تاريخ اعتماد البرنامج الزمني الأساسي 2025-يوليو-13، أي قبل ترسية العقد في 2026-مايو-11.
- تسرد ورقة الكميات الرئيسية عدة بنود مرتين بإجماليات مختلفة (طبقة الأساس الحصوية 14,403 و26,167 م³؛ الأساس الإسفلتي 7,129 و9,160 م³؛ طبقة ما تحت الأساس 21,604 و39,250 م³؛ الإنترلوك 18,500 و29,206 م²)، كما تتضمن بنودًا كهربائية (تمديدات الجهد المتوسط، المحطة، RMU، أعمدة الإنارة) ليست ضمن نطاق الطرق وتصريف السيول لهذا المشروع.
- المركّب من مواسير GRP هو 3,127 م في ورقة الكميات الرئيسية لكنه 1,778 م في ورقة Progress Summary.
- غرف التجميع 110 من 164 في ورقة التوريدات و110 من 156 في ورقة Progress Summary. والعلامات الأرضية 5,688 م² و5,668 م².
- كميات "المنفذ هذا الأسبوع" مأخوذة من قائمة الأعمال المنفذة هذا الأسبوع. وتظهر طبقة ما تحت الأساس في الطريق المحلي 28 (1,968 م³) تحت بند Subgrade، وهو البند الذي يشير إليه طلب الفحص الخاص بها.
- تُظهر لوحة ملخص القوى العاملة 28 مخطط و94 فعلي، بينما تعطي ورقة القوى العاملة 158 مخطط و84 فعلي لشهر أكتوبر.
- يُظهر ملخص المستخلصات 0 مستخلصات مقدمة و7,768,175 ريال، بينما يسرد سجل المستخلصات 3 مستخلصات بصافي 7,770,175 ريال. والتغييرات المحتملة 0 في الملخص و200,000 ريال في سجل المستخلصات.
- يصنف سجل المخاطر المخاطر الأربع للمشروع على أنها مغلقة بينما حالة معالجتها مفتوحة، ويتضمن أيضًا صفوفًا للمشروع MKH2-02-003 وصفوفًا بلا مشروع.
- تُظهر عدة لوحات ملخصة في ملف التقرير الأسبوعي أخطاء #REF!.
- صور الموقع هي الصور المضمنة في ملف التقرير الأسبوعي، بعرض 600 بكسل تقريبًا. لم تُرفع ملفات صور منفصلة.
