تطوير الطرق لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية)

Road Development for the Support Services Area, Second Industrial City in Makkah (Al-Akayshiyah)

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عبدالله الجليفي	25-Jun-2026	24-Aug-2027

النطاق: أعمال الطرق وشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية). قيمة العقد 33.04 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 14 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في 2026-أكتوبر-27 بلغت نسبة الإنجاز 48.3% مقابل 35.7% مخطط، أي أن المشروع متقدم بنسبة 12.6% عن الخطة. وأنجز هذا الأسبوع 3.0%، مطابقًا للنسبة المخططة للأسبوع البالغة 3.0%.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
48.3% / 35.7% مخطط	+3.0% / 3.0%+ مخطط	29.2% · اليوم 124 من 425	20.4% · 6.75 مليون ريال
▲ مؤشر الأداء 1.35 · +12.6%	● مطابق للخطة الأسبوعية	▼ انتهاء P6 في 2027-أكتوبر-21	3 مستخلصات، جميعها مدفوعة؛ آخر فترة تنتهي في 2026-سبتمبر-27

التقدم أعلى من المخطط، لكن تاريخ الانتهاء المتوقع تأخر أسبوعًا آخر: التأخير الآن 58 يومًا.

يحدد تحديث P6 (UP 15، تاريخ البيانات 2026-أكتوبر-27) إنجاز المشروع في 2027-أكتوبر-21، أي بعد 58 يومًا من تاريخ انتهاء العقد 2027-أغسطس-24، بفائض كلي −49 يومًا (−43 في الأسبوع السابق). ويعطي التقرير الأسبوعي التوقع نفسه. ولا توجد أوامر شراء لمواد الرصف حتى الآن، وارتفع عدد الأنشطة المتأخرة في البدء من 29 إلى 35.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ورقة الصور الأسبوعية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 2026-أكتوبر-27، تحمل كل منها ختم 26-أكتوبر-2026 مع الوقت والارتفاع (دون إحداثيات GPS). اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال القطع، الطريق المحلي 17

ختم 2026-أكتوبر-26، 09:56، الارتفاع 185.0 م.



أعمال طبقة ما تحت الأساس، الطريق المحلي 11

ختم 2026-أكتوبر-26، 10:51، الارتفاع 173.3 م.



حفر شبكة تصريف السيول، الطريق المحلي 17

ختم 2026-أكتوبر-26، 11:17، الارتفاع 183.1 م.




تركيب المناهل، الطريق المحلي 31

ختم 2026-أكتوبر-26، 08:11، الارتفاع 177.3 م.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، بقيم نهاية كل شهر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

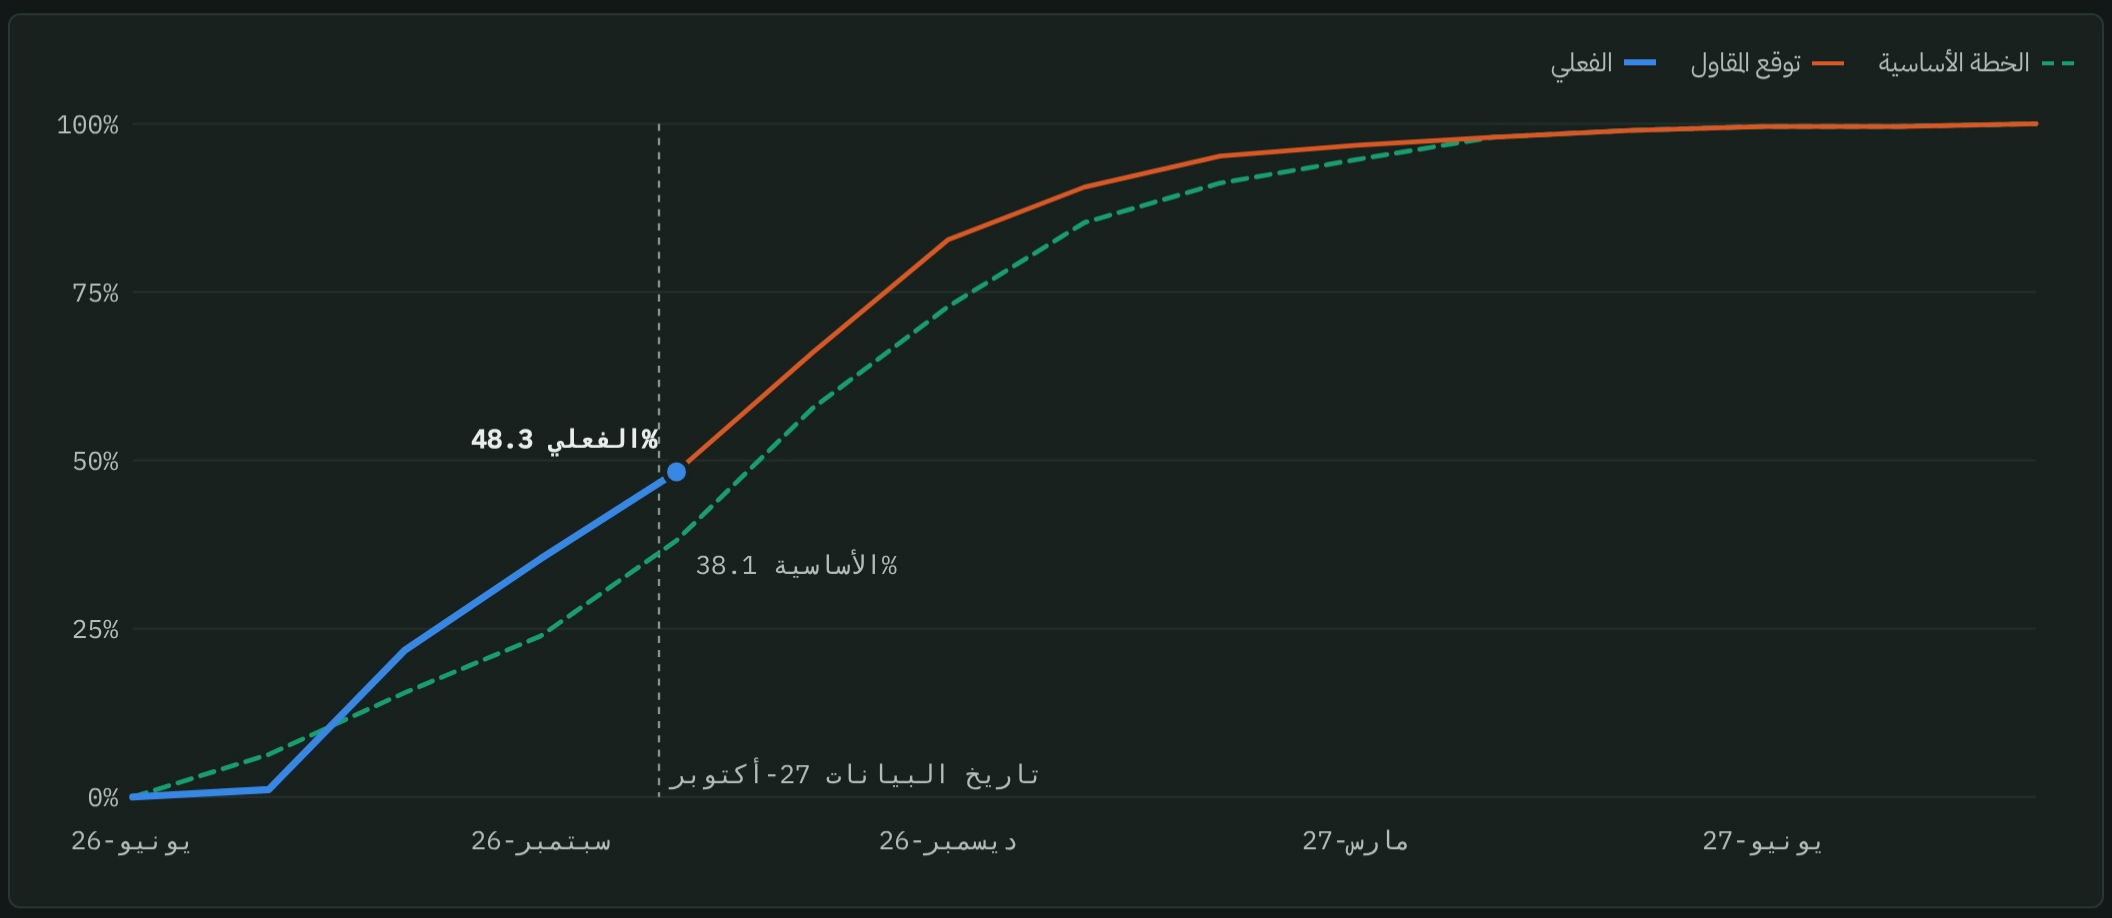

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026	28.5	41.0	+12.4%	—	1.44
20-Oct-2026	32.6	45.2	+12.6%	+4.3	1.39
27-Oct-2026	**35.7**	**48.3**	**+12.6%**	**+3.0**	**1.35**

الصفوف مأخوذة من التقريرين الأسبوعيين رقم 17 ورقم 18. صف 2026-أكتوبر-13 هو قيمة "CM Last Week" الواردة في التقرير رقم 17، ولم تُرفع الأسابيع السابقة.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة (218,590 ساعة إجمالًا). المصدر: ورقة Weekly Progress Report.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز والحشد	3.6%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	2.7%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	2.2%	84.2%	59.8%	−24.3%	0.71	▼ متأخر
أعمال الطرق	54.3%	34.9%	51.7%	+16.8%	1.48	▲ متقدم
تصريف مياه الأمطار والسيول	35.6%	23.9%	35.2%	+11.3%	1.47	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	–	لم يحن موعده
التسليم والإغلاق	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	–	لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**35.7%**	**48.3%**	**+12.6%**	**1.35**	▲ متقدم

يضم البرنامج الزمني (P6 UP 15، تاريخ البيانات 2026-أكتوبر-27) 381 نشاطًا: 150 مكتملًا و46 قيد التنفيذ و185 لم تبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 2027-أكتوبر-21 بفائض كلي −49 يومًا. تغيرت أنشطة المسار الحرج من 168 إلى 166 هذا الأسبوع، وارتفعت الأنشطة المتأخرة في البدء من 29 إلى 35.

نطاق العمل: الكميات

إجمالي النطاق والكمية المنفذة للبنود الجارية، من ورقة الكميات الرئيسية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 27- 2026-أكتوبر. عمود "المنفذ هذا الأسبوع" هو الكمية التراكمية لهذا الأسبوع مطروحًا منها كمية تقرير 20- 2026-أكتوبر.

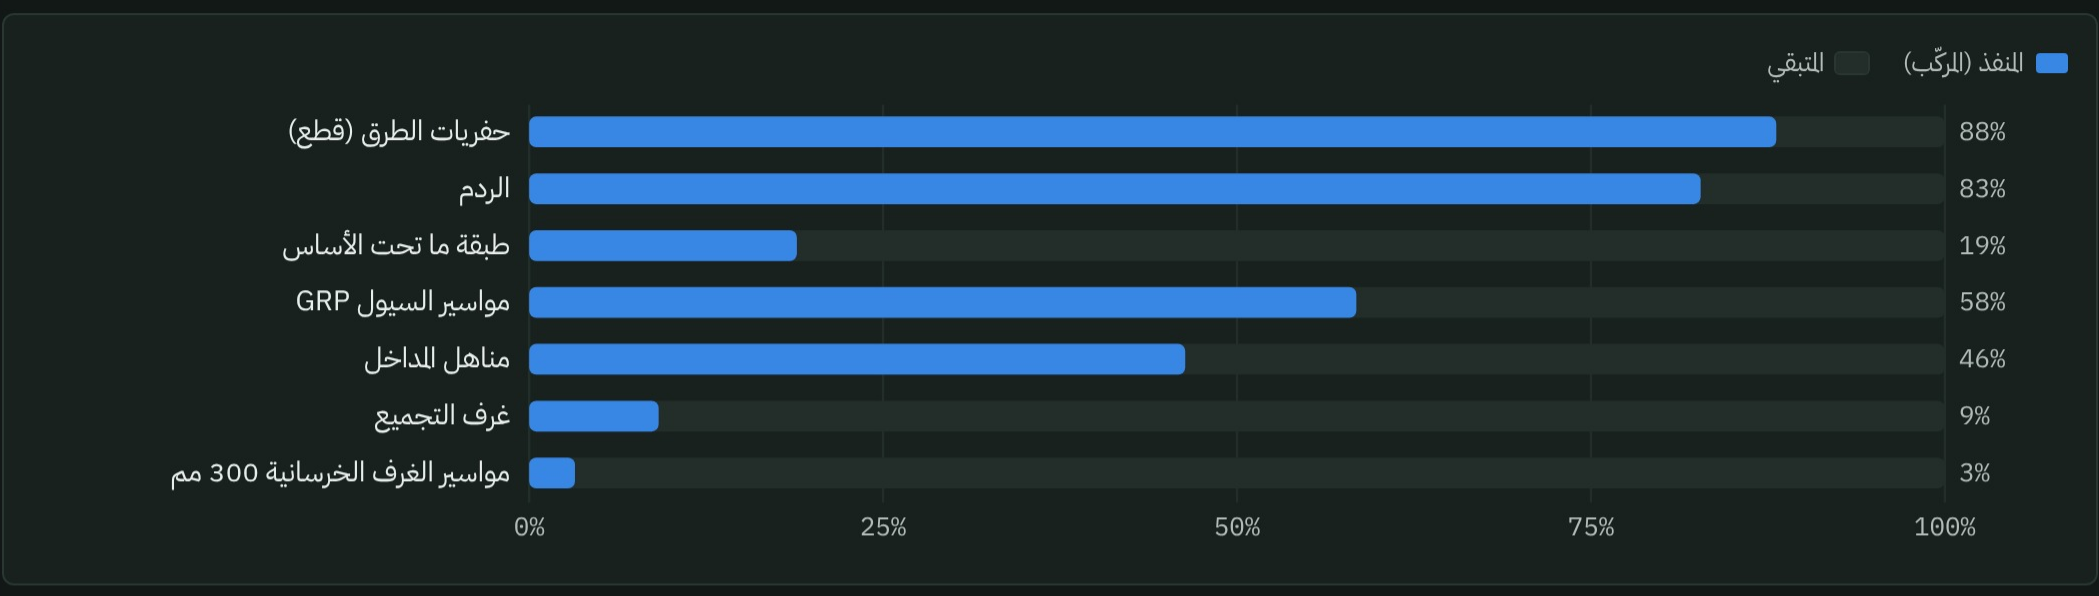

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
حفريات الطرق (قطع)	جميع الطرق	م³	252,115	222,090	0	30,025	88.1%	–
الردم	جميع الطرق	م³	221,841	183,569	0	38,272	82.7%	–
طبقة ما تحت الأساس	جميع الطرق	م³	39,250	7,422	872+	31,828	18.9%	–
مواسير السيول GRP	جميع الطرق	م.ط	5,855	3,421	293.7+	2,434	58.4%	–
مناهل المداخل	جميع الطرق	عدد	82	38	1+	44	46.3%	–
غرف التجميع	جميع الطرق	عدد	164	15	8+	149	9.1%	–
مواسير الغرف الخرسانية 300 مم	جميع الطرق	م.ط	5,410	175	175+	5,235	3.2%	–

الأعمال الترابية متقدمة كثيرًا عن الخطة

بلغ القطع 222,090 م³ مقابل 160,673 م³ مخطط حتى تاريخه، والردم 183,569 م³ مقابل 141,379 م³ مخطط. ولم يتغير إجمالي القطع والردم هذا الأسبوع، رغم أن قائمة الأعمال المنفذة تذكر 6,510 م³ قطعًا في الطريقين المحليين 17 و31.

لم تبدأ بعد

طبقة الأساس الحصوية، وطبقتا الأساس والسطح الإسفلتيتان، والبردورات مسبقة الصب، والإنترلوك، والعلامات الأرضية، واللوحات المرورية كلها عند 0%. وبلغت غرف التجميع 15 من 164 (8 منها هذا الأسبوع)، وظهرت لأول مرة 175 م من مواسير الغرف الخرسانية قطر 300 مم.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث P6 تواريخ التوقع نفسها. ويعرض التقرير الأسبوعي التأخير بالأيام التقويمية. لم يُرفع ملف XER لبرنامج P6 هذا الأسبوع، لذا يتوفر الفائض للمشروع ككل فقط.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	25-Jun-2026	25-Jun-2026	25-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم البرنامج الزمني الأساسي	12-Jul-2026	12-Jul-2026	12-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
إتمام التجهيز والحشد	23-Jul-2026	15-Aug-2026 (+23 يومًا)	15-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخرًا
اعتماد المخططات والمواد	23-Aug-2026	19-Sep-2026 (+27 يومًا)	19-Sep-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخرًا
إنجاز تصريف مياه الأمطار والسيول	24-Feb-2027	17-Apr-2027 (+52 يومًا)	17-Apr-2027	–	▼ متأخر
إنجاز أعمال الطرق	24-Apr-2027	22-Jun-2027 (+59 يومًا)	22-Jun-2027	–	▼ متأخر
إنجاز المشروع	24-Aug-2027	21-Oct-2027 (+58 يومًا)	21-Oct-2027	−49	▼ متأخر

تأخرت معالم التنفيذ الثلاثة 7 أيام هذا الأسبوع.

انتقل إنجاز تصريف السيول من أبريل-10 إلى 2027-أبريل-17، وأعمال الطرق من يونيو-15 إلى 2027-يونيو-22، وإنجاز المشروع من أكتوبر-14 إلى 2027-أكتوبر-21. ويشمل الفائض السالب الآن جميع الطرق: الطريق المحلي 28 عند −49 يومًا، و30 عند −41، و17 عند −40، و11 عند −38، و29 عند −35؛ والتوريدات عند −16 يومًا.

توريد المواد الرئيسية

نسبة إنجاز التوريدات لكل مادة. المصدر: سجل التوريدات، التقرير الأسبوعي بتاريخ 2026-أكتوبر-27.

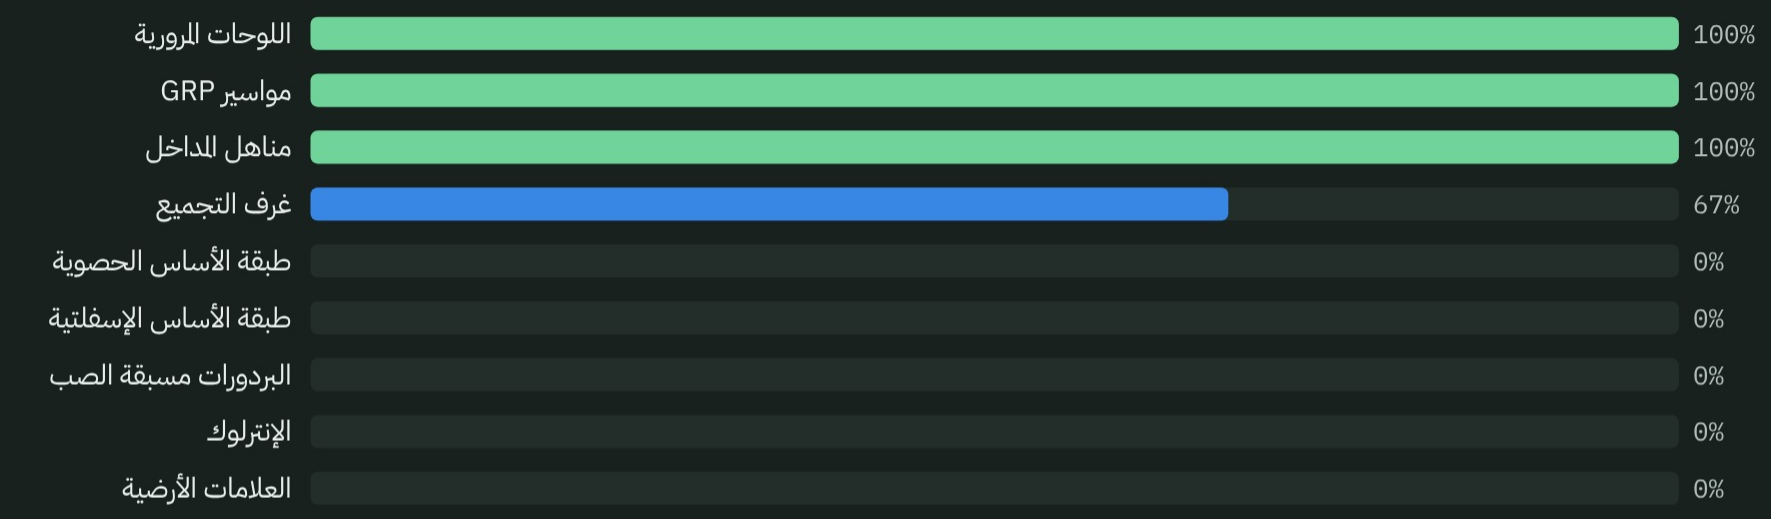

مواد الرصف: لا توجد أوامر شراء حتى الآن

لا توجد أوامر شراء لطبقة الأساس الحصوية والأساس الإسفلتي والبردورات مسبقة الصب والإنترلوك والعلامات الأرضية، رغم مرور تواريخ الطلب المطلوبة (من أغسطس-29 إلى 17-سبتمبر-2026). وتخطط قائمة الأنشطة المتأخرة في البدء لإصدار أمر شراء طبقة الأساس الحصوية في 2026-أكتوبر-27 والأساس الإسفلتي في 2026-نوفمبر-02. وتلزم طبقة الأساس الحصوية في الموقع بحلول 2026-نوفمبر-15.

مواد تصريف السيول

اكتملت توريدات مواسير GRP (5,855 م) ومناهل المداخل (82) واللوحات المرورية (171). وما زالت غرف التجميع عند 110 من 164 (67%)، والتوريد الثالث مخطط في 05-2026-نوفمبر.

القوى العاملة

متوسط عدد العاملين الشهري في الموقع (عمالة وموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة.



عدد العاملين في أكتوبر 84 مقابل 158 مخطط (−47%): 68 عاملًا مقابل 145 مخطط، و16 موظفًا مقابل 13.
المعدات في الموقع 62 مقابل 80 مخطط. وتبلغ الخطة ذروتها عند 182 في نوفمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الطرق	19,411,954
تصريف مياه الأمطار والسيول	13,628,050
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**33,040,004**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	37,996,005
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال السعودي. تمثل أعمال الطرق 58.8% من جدول الكميات وتصريف مياه الأمطار والسيول 41.2%. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	3
القيمة الإجمالية	6,754,935
الخصومات والغرامات	2,000
الصافي شاملاً الضريبة	7,770,175
المدفوع (3 مستخلصات)	7,770,175
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	9,917,485

تبلغ المستخلصات 20.4% من قيمة العقد مقابل تقدم فعلي 48.3%. صُرف المستخلص 3 (من 26- أغسطس إلى 2026-سبتمبر-27) في 2026-أكتوبر-25، فلا يوجد مستخلص معلق، ولم يُقدَّم مستخلص جديد بعده. لا توجد دفعة مقدمة ولا محتجزات.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.89

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	39,965
ساعات العمل هذا الأسبوع	2,976
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	1
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	4 / 19

الجودة التقييم 0.89

طلبات الفحص الصادرة (تراكمي)	252
طلبات الفحص المغلقة / المعلقة	222 / 30
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	42 / 42
تقارير عدم المطابقة الصادرة	0
تعليمات الموقع (مغلقة)	1
المخططات التنفيذية المعتمدة	22 / 23
اعتمادات المواد	40 / 42

تفتيش الاستشاري للجودة والسلامة بتاريخ 2026-أكتوبر-27. صدر هذا الأسبوع 48 طلب فحص.

المشكلات والمخاطر القائمة

الخطر	المسؤول	التفاصيل
السقوط في الحفريات	المقاول	تربة غير مستقرة وغياب الحواجز. حواجز ولوحات تحذيرية ومشرف عند الحفريات. التقييم مرتفع (H20، وH16 بعد المعالجة).
إدارة الحركة المرورية	المقاول	حوادث مركبات بسبب قصور تحويلات المرور. لوحات تحويل وحواجز ومنظمو حركة. التقييم مرتفع (H16).
كفاءة المشغلين	المقاول	حوادث بسبب نقص تدريب المشغلين والإشراف عليهم. تدريب وتقييم للكفاءة وإشراف. التقييم مرتفع (H16).
انسكاب الزيوت	المقاول	تلوث التربة بسبب تسربات المعدات أو سوء التعامل مع الزيوت. خطة استجابة للانسكاب وصيانة واحتواء. التقييم متوسط (M9).

لم يتغير سجل المخاطر عن الأسبوع السابق. وسجل المشكلات ولوحة أهم المشكلات في التقرير الأسبوعي فارغان، ولا تذكر الجداول الملخصة الأسبوعية أسباب تأخير أو تحديات.

ملاحظات على البيانات

- تصف الجداول الملخصة (ملفا الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز، وورقة Progress Summary) نسبة مبنية على التكلفة بأنها التقدم "الفعلي". يعتمد هذا التقرير على التقدم الفعلي بساعات العمل فقط.
- يُظهر ملف نسب الإنجاز وملف الأعمال المنفذة تقدم هذا الأسبوع مرة أخرى بإشارتين متعاكستين.
- ما زال ملف الأعمال المنفذة يذكر بداية المشروع في 2025-نوفمبر-24 ونهاية العقد في 2026-مايو-23، مقابل تسليم الموقع في 2026-يونيو-25 والإنجاز في 2027-أغسطس-24 في التقرير الأسبوعي.
- اسم مدير المشروع في مدن مكتوب "الجليفي" في ملف نسب الإنجاز و"الشنيفي" في ملف الأعمال المنفذة.
- تُظهر لوحة التقدم الفعلي الأسبوعي 6.08% مخطط و6.09% منجز هذا الأسبوع، لأنها تجمع كل صف مرتين (13,288 و13,312 ساعة عمل)؛ والقيم الصحيحة 3.04% و3.05%.

- تستخدم ورقة Progress ميزانية 181,410 ساعة عمل، فتعطي 43.0% مخطط و58.2% منجز. أما ورقة Weekly Progress Report والبرنامج الزمني فيستخدمان 218,590 ساعة عمل (35.7% و48.3%)، وهي ما يعتمده هذا التقرير.

- رقم الأسبوع: يذكر التقرير أسبوع العقد 18 من 61 (ورقة المعالم). وعدد الأسابيع الكاملة من تسليم الموقع حتى تاريخ البيانات 17.
- لم يُرفع ملف XER لبرنامج P6 هذا الأسبوع. الفائض الكلي للمشروع (−49 يومًا) مأخوذ من ورقة Progress (2)؛ ويُظهر ملف P6 بصيغة PDF قيمتي −47 و−41 يومًا لمعلمي أعمال الطرق وتصريف السيول بوصفهما انحرافًا عن تاريخ الانتهاء الأساسي لا فائضًا.
- لم تتغير كميات القطع والردم حتى تاريخه في ورقة الكميات الرئيسية (222,090 و183,569 م³)، بينما تذكر قائمة الأعمال المنفذة هذا الأسبوع 4,410 م³ قطعًا في الطريق المحلي 17 و2,100 م³ في الطريق المحلي 31.
- تغيّر إجمالي غرف التجميع من 156 إلى 164 في ورقة الكميات الرئيسية، بينما ما زالت ورقة Progress Summary تذكر 156.
- تذكر ورقة Progress Summary الطول المنفذ نفسه، 2,101 م، للطرق (من 5,708 م) ولتصريف السيول (من 5,855 م)، بينما تذكر ورقة الكميات الرئيسية 3,421 م من مواسير GRP.
- تحمل قائمة الأنشطة المتأخرة في البدء عنوان المشروع MKH2-02-003 وبيانات مقاوله وتاريخه (2026-أكتوبر-13)، رغم أن أنشطتها تخص هذا المشروع.
- يصل التوقع في ورقة Physical-Chart Data إلى 100% في 2027-أغسطس-31، بينما ينتهي البرنامج الزمني في 21-2027-أكتوبر.
- تاريخ اعتماد البرنامج الزمني الأساسي 2025-يوليو-13، أي قبل ترسية العقد في 2026-مايو-11.
- تسرد ورقة الكميات الرئيسية عدة بنود مرتين بإجماليات مختلفة (طبقة الأساس الحصوية 14,403 و26,167 م³؛ الأساس الإسفلتي 7,129 و9,160 م³؛ طبقة ما تحت الأساس 21,604 و39,250 م³؛ الإنترلوك 18,500 و29,206 م²)، كما تتضمن بنودًا كهربائية ليست ضمن نطاق الطرق وتصريف السيول لهذا المشروع.
- تُظهر لوحة ملخص القوى العاملة 28 مخطط و94 فعلي، بينما تعطي ورقة القوى العاملة 158 مخطط و84 فعلي لشهر أكتوبر.
- يُظهر ملخص المستخلصات 0 مستخلصات مقدمة، بينما يسرد سجل المستخلصات 3 مستخلصات. والتغييرات المحتملة 0 في الملخص و200,000 ريال في سجل المستخلصات.
- يصنف سجل المخاطر المخاطر الأربع للمشروع على أنها مغلقة بينما حالة معالجتها مفتوحة، ويتضمن أيضًا صفوفًا للمشروع MKH2-02-003 وصفوفًا بلا مشروع.
- تُظهر عدة لوحات ملخصة في ملف التقرير الأسبوعي أخطاء #REF!.
- صور الموقع هي الصور المضمنة في ملف التقرير الأسبوعي، بعرض 594 إلى 599 بكسل. لم تُرفع ملفات صور منفصلة.
