محطة ركاب لسار في سدير

Construction of Passenger Station for SAR Railway, Sudair Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة تطوير التقنية للمقاولات (TDC)	إيجيس (EGIS)	زياد الشبات	07-Apr-2026	06-Aug-2027

النطاق: محطة ركاب لقطار سار في مدينة سدير الصناعية (الرصيف والمظلة والتشطيبات والأنظمة الكهربائية وكاميرات المراقبة ونظام الإخلاء الصوتي للمحطة)، مع طريقي الوصول RD-01 وRD-02 وما يتبعهما من شبكات تصريف السيول والصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والاتصالات والجهد المتوسط والمنخفض.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. حتى 26-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 27.3% مقابل 40.0% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 12.7% (مؤشر الأداء الزمني 0.68). وحقق هذا الأسبوع 1.2% مقابل 1.9% مخطط، فاتسعت الفجوة بنسبة 0.7%.

نسبة الإنجاز الفعلي
27.3% / 40.0% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.68 −12.7%

التقدم هذا الأسبوع
+1.2% / +1.9% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.7%

المدة المنقضية من العقد
41.6% · اليوم 202 من 486
▼ انتهاء P6: 07-أغسطس-2027


المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
9.2% · 3.05 مليون ريال
مستخلصان، آخر فترة تنتهي في 30-أغسطس-2026

التوريدات وأعمال المحطة هي ما يؤخر المشروع.

بلغ إنجاز التوريدات 19.2% مقابل 80.0% مخطط. ولم تبدأ حزمة المحطة (الرصيف والمظلة وأنظمة المحطة): 0% مقابل 9.4% مخطط، لأن تصريح سياج سار وتصميم المظلة والرصيف من المالك ما زالا معلقين. أما الطرق والخدمات فهي أقرب إلى الخطة عند 30.7% مقابل 34.2%. وللانتهاء بحلول 06-أغسطس-2027 يحتاج المشروع إلى نحو 1.8% أسبوعياً خلال الأسابيع الأربعين المتبقية، بينما حقق هذا الأسبوع 1.2%.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026. غلبت أعمال الطريق 1 على هذا الأسبوع: الطبقة الإسفلتية الأساسية وطبقة الأساس الحصوية وطبقة ما تحت الأساس. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.

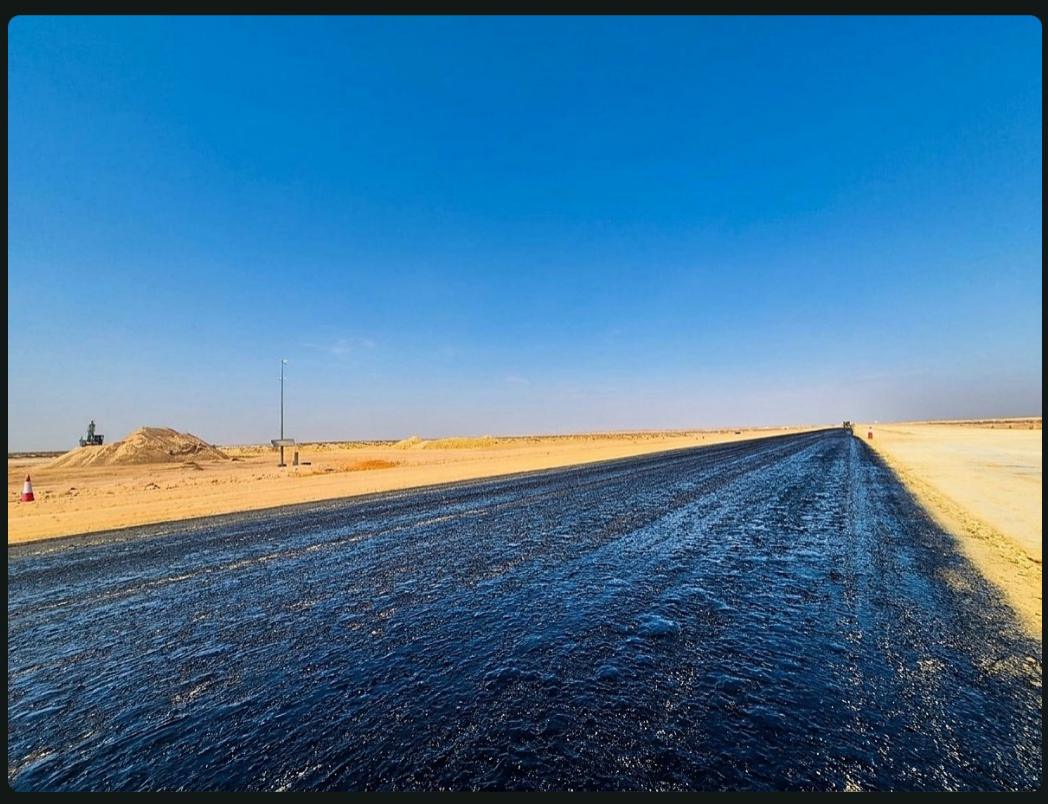

الطبقة الإسفلتية الأساسية، الطريق 1

الطبقة الإسفلتية الأساسية MC-01 على الطريق 1.



طبقة إسفلتية، الطريق 1

يصف ملف PDF هذه الصورة بأنها ردم الدوار عند تقاطع MC20 مع الطريق 1.



دمك طبقة الأساس الحصوية

الطريق 1، من المحطة 1+500 إلى 1+850. ختم بتاريخ 24-أكتوبر-2026، 10:45.



طبقة الأساس الحصوية

أعمال الطبقة على الطريق 1، من المحطة 1+500 إلى 1+850.



تسوية طبقة ما تحت الأساس، الطريق 1

الطبقة الثانية لما تحت الأساس، من المحطة 0+950 إلى 1+200، الجانب الأيمن.




دمك منطقة المواقف

الطبقة الخامسة في منطقة المواقف على الطريق 1.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

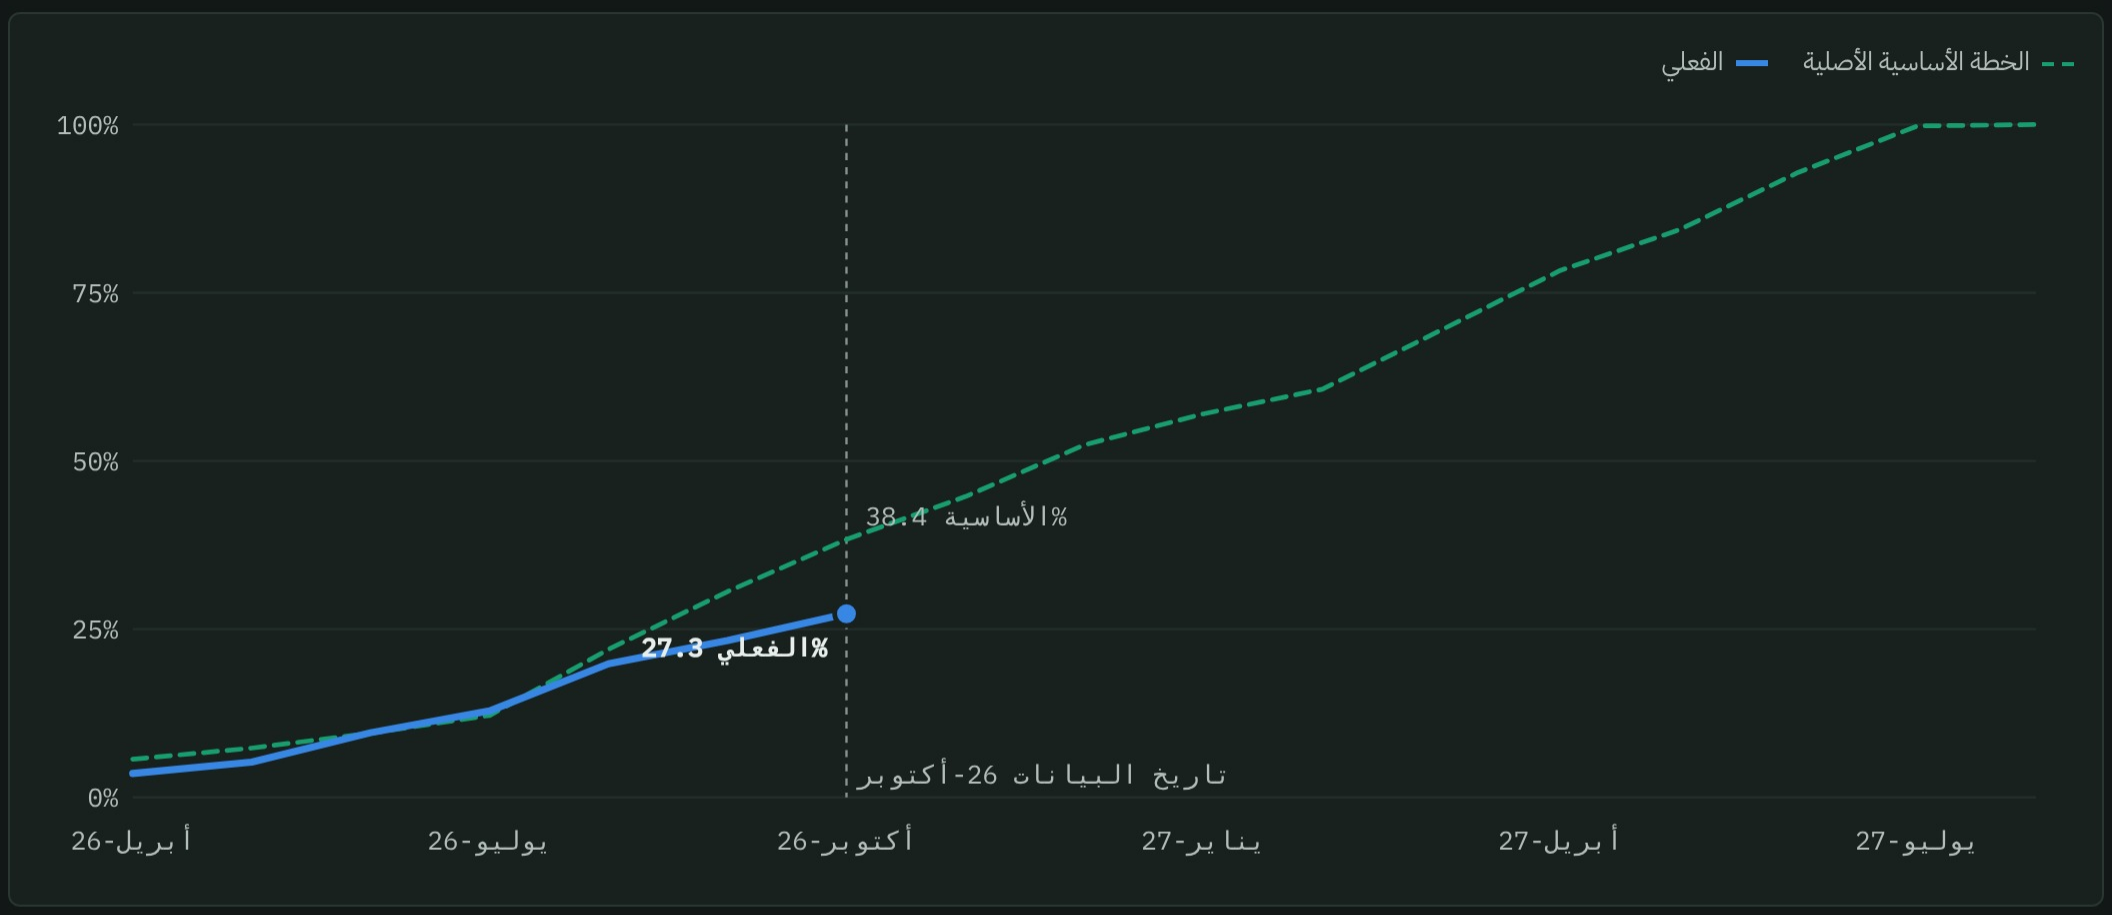

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
19-Oct-2026	38.1	26.1	−12.0	–	0.69
26-Oct-2026	**40.0**	**27.3**	**−12.7**	**+1.2**	**0.68**

صف 19-أكتوبر-2026 مأخوذ من أعمدة الأسبوع السابق في ورقة Progress لهذا الأسبوع، إذ لم يُرفع أي تقرير أسبوعي سابق. لا توجد خطة معدلة في المنحنى، والمخطط فيه حتى 26-أكتوبر-2026 هو 38.4% مقابل 40.0% في ورقة Progress.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3%	103.3%	103.3%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5%	103.3%	98.2%	−5.2	0.95	▼ متأخر
التوريدات	14%	80.0%	19.2%	−60.9	0.24	▼ متأخر كثيراً
التنفيذ	75%	27.3%	22.1%	−5.2	0.81	▼ متأخر
· الحزمة 1: الطرق والخدمات	54.2%	34.2%	30.7%	−3.6	0.90	▼ متأخر
· الحزمة 3: المحطة (الرصيف والمظلة والأنظمة)	20.8%	9.4%	0.0%	−9.4	0.00	▼ لم يبدأ
الاختبار والتشغيل	2%	0.0%	0.0%	0.0	–	● لم يحن موعده
الإغلاق	1%	0.0%	0.0%	0.0	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**40.0%**	**27.3%**	**−12.7**	**0.68**	▼ متأخر

يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026) عدد 855 نشاطاً: 247 مكتملاً و51 قيد التنفيذ و557 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 07-أغسطس-2027، أي بعد تاريخ العقد بيوم واحد، وبفائض زمني −0.5 يوم على معالم الانتهاء.

نطاق العمل: الكميات

الكميات الرئيسية في جدول الكميات من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026: الإجمالي والمنفذ حتى تاريخه والمتبقي. لم يُرفع أي تقرير أسبوعي سابق، لذا عمود المنفذ هذا الأسبوع فارغ.

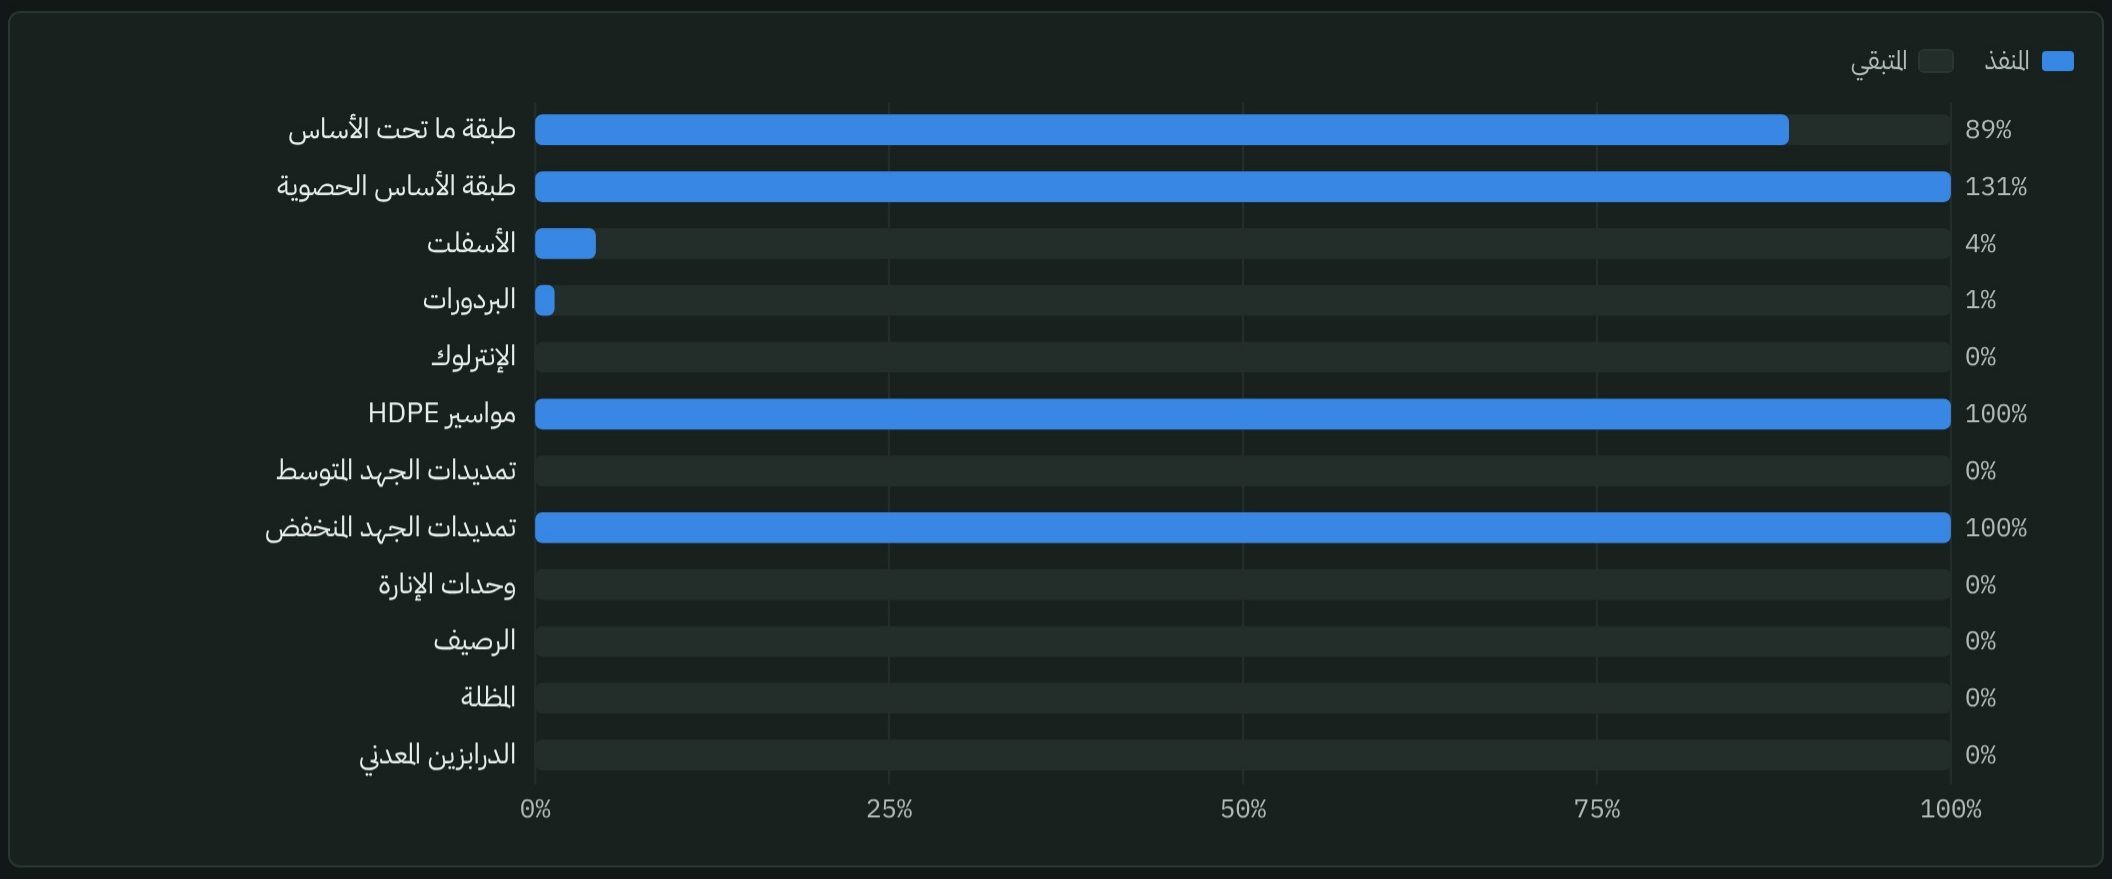

بند النطاق	رقم البند	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
طبقة ما تحت الأساس	B1.32 11 13.01	م³	20,530	18,182	–	2,348	88.6%
طبقة الأساس الحصوية	B1.32 11 23.01	م³	16,376	21,459	–	5,083.2-	131.0%
الأسفلت	B1.32 12 16.01	م³	13,360	573	–	12,787	4.3%
البردورات	B1.32 16 13.23.01	م²	20,555	282	–	20,273	1.4%
الإنترلوك	B1.32 14 13.13.01	م²	27,900	0	–	27,900	0.0%
مواسير HDPE	B4.33 31 23.01	م.ط	5,808	5,808	–	0	100.0%
تمديدات الجهد المتوسط	B2.31 23 00.01	م.ط	7,120	0	–	7,120	0.0%
تمديدات الجهد المنخفض	B2.33 71 00 02.01	م.ط	7,500	7,500	–	0	100.0%
وحدات الإنارة	B2.26 56 19.01	عدد	116	0	–	116	0.0%
الرصيف	00 00 03	م²	4,000	0	–	4,000	0.0%
المظلة	00 00 31	م.ط	4,000	0	–	4,000	0.0%
الدرابزين المعدني	B4.05 52 00.01	م.ط	440	0	–	440	0.0%

أعمال المحطة لم تبدأ

الرصيف (4,000 م²) والمظلة (4,000 م) والدرابزين المعدني (440 م) ووحدات الإنارة (116) جميعها عند 0%. ويتوقف الرصيف والمظلة على تصريح سياج سار وتصميم المالك.

أرقام تحتاج إلى مراجعة

طبقة الأساس الحصوية مسجلة عند 21,459 م³ مقابل إجمالي 16,376 م³ (131%). ومواسير HDPE وتمديدات الجهد المنخفض مسجلة منفذة بنسبة 100%، بينما تُظهر ورقة Progress إنجازاً فعلياً 28.3% لمياه الشرب و9.8% للجهد المنخفض.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث جدول P6 توقعات مختلفة للمعالم المرحلية. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	07-Apr-2026	07-Apr-2026	07-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
انتهاء التجهيز	06-May-2026	06-May-2026	06-May-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم خطة العمل والبرنامج الأساسي	06-May-2026	16-Aug-2026 (+102 يوماً)	15-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
انتهاء مرحلة التصميم	06-May-2026	21-Sep-2026 (+138 يوماً)	27-Oct-2026	59	▼ متأخر
أعمال الطرق والرصف	06-Dec-2026	31-Dec-2026 (+25 يوماً)	27-Jan-2027	0	▼ متأخر
انتهاء مرحلة التوريدات	15-Apr-2027	09-Jun-2027 (+55 يوماً)	16-Mar-2027	53	؟ التوقعات مختلفة
أعمال الجهد المتوسط	12-May-2027	05-May-2027	26-May-2027	6	▼ معرّض للتأخير
أعمال الموقع والرصيف	20-Jul-2027	05-Aug-2027 (+16 يوماً)	17-Apr-2027	90	؟ التوقعات مختلفة
أعمال التشطيبات والأعمال العامة للموقع	20-Jul-2027	06-Aug-2027 (+17 يوماً)	06-Aug-2027	−0.5	▼ معرّض للتأخير
انتهاء المشروع	06-Aug-2027	06-Aug-2027	07-Aug-2027	−0.5	▼ معرّض للتأخير

يختلف التقرير الأسبوعي وP6 على معالم الطرق والتوريدات والرصيف.

يتوقع التقرير الأسبوعي اكتمال أعمال الطرق والرصف في 31-ديسمبر-2026، بينما يحدده P6 في 27-يناير-2027 بفائض صفري. ويُنهي P6 أعمال الموقع والرصيف في 17-أبريل-2027 بفائض 90 يوماً، رغم أن أعمال الرصيف لم تبدأ وتنتظر تصريح سياج سار. وكان التقرير الأسبوعي يتوقع انتهاء التصميم في 21-سبتمبر-2026 لكنه ما زال مفتوحاً في P6.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المورّدة من الكمية المطلوبة، من عمود Completion Rate. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 26-أكتوبر-2026.



ثمانية بنود طويلة التوريد لم تُقدَّم بعد


الدرابزين المعدني والمظلة ومجاري كابلات الجهد المتوسط وتمديدات الجهد المتوسط والمحطات الفرعية وأعمدة الإنارة ووحدات إنارة الشوارع ووحدات الإنارة الخارجية جميعها مسجلة "لم تُقدَّم". وقد انقضت مواعيد أوامر الشراء المطلوبة للدرابزين (25-أغسطس-2026) ومجاري وتمديدات الجهد المتوسط (12-أكتوبر-2026) والمحطات الفرعية (19-أكتوبر-2026).

بنود بلا نسبة توريد

الإنترلوك والعزل المائي ولوحة توزيع الجهد المنخفض ولوحات تغذية الإنارة وكاميرات المراقبة ونظام الإخلاء الصوتي وأغطية المناهل والمحابس لا توجد لها نسبة توريد بعد. وتُظهر أعمدة الإنارة أمر شراء (PO 12725 بتاريخ 01-يوليو-2026) لكنها ما زالت مسجلة "لم تُقدَّم". ويحصي الملخص إصدار 22 من 27 أمر شراء.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

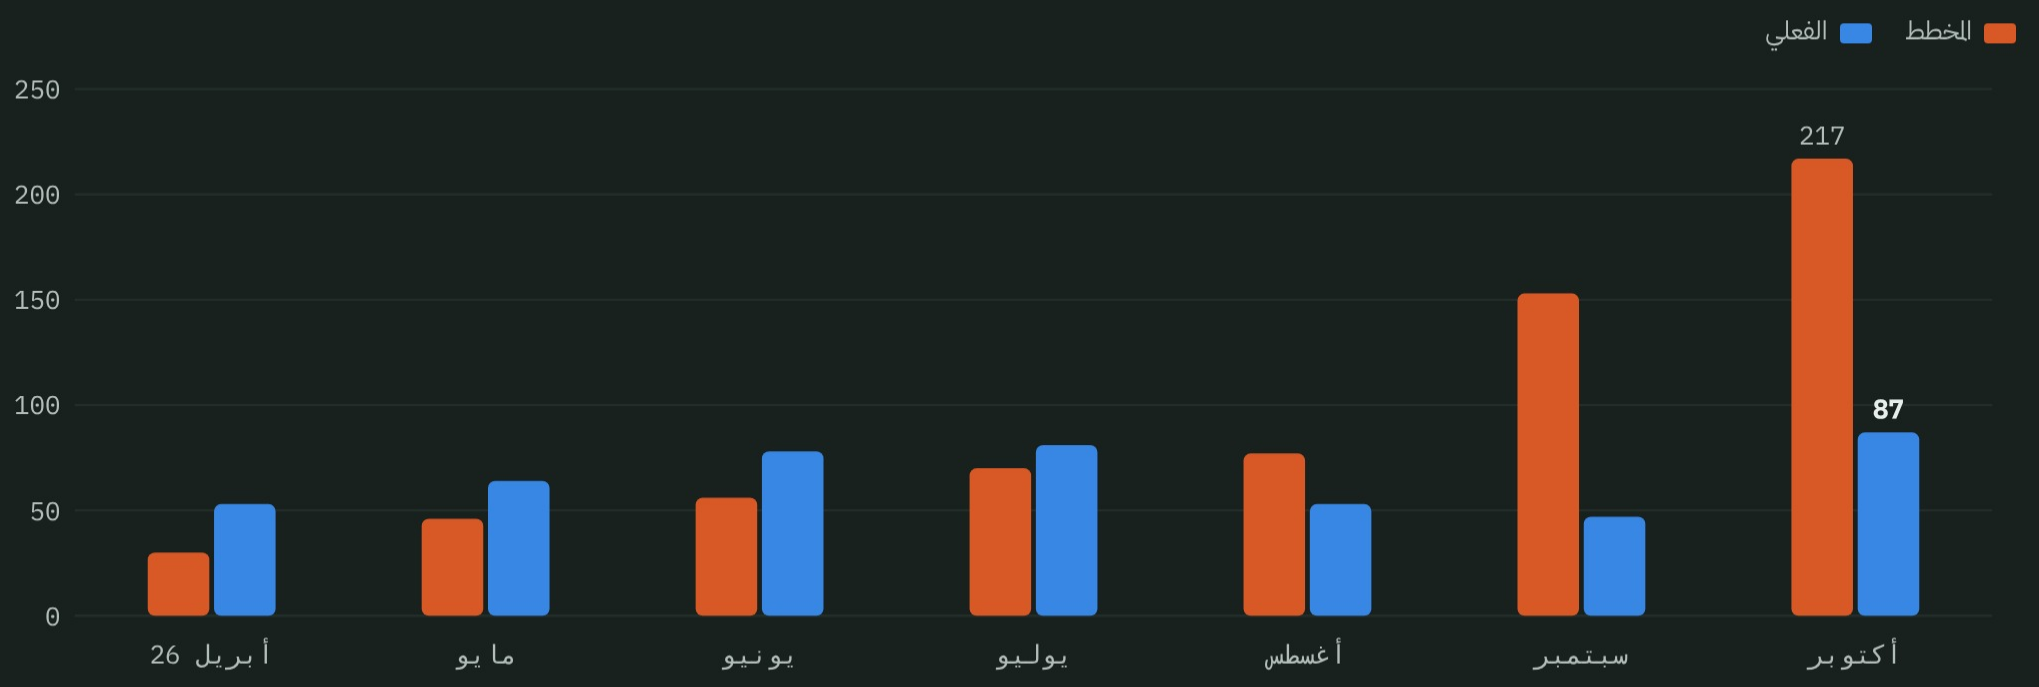

عدد العمالة اليدوية وغير اليدوية معاً. بلغ في أكتوبر 87 مقابل 217 مخططاً (−60%). بينما يذكر الملخص الأسبوعي 60 مخططاً لشهر أكتوبر. وتبلغ الخطة ذروتها عند 263 في ديسمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	33,090,825
أوامر التغيير	0
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	33,090,825

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير خالٍ. إجمالي جدول الكميات في ورقة Progress هو 33,090,852، أي أعلى من قيمة العقد بـ27 ريالاً.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	2
القيمة الإجمالية	3,048,399
ضريبة القيمة المضافة	457,260
الخصومات والغرامات	2,000
الصافي شاملاً الضريبة	3,503,659
المعتمد من مدير المشروع / المدفوع	0 / 0

المفوتر 9.2% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 27.3%. يغطي المستخلص الأول الفترة من 07-أبريل-2026 إلى 18-يوليو-2026، والثاني من 19-يوليو-2026 إلى 30-أغسطس-2026، ولم يُعتمد أي منهما من مدير المشروع ولم يُصرف بعد.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.83

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	82,150
ساعات العمل هذا الأسبوع	5,100
ساعات العمل هذا الشهر	14,640
التدريبات الداخلية (تراكمي)	23
اجتماعات التوعية (تراكمي)	21
ملاحظات السلامة المسجلة / المفتوحة	17 / 0

الجودة التقييم 0.89

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة / المعلقة	157 / 152 / 5
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	15 / 15
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	4 / 4
تعليمات الموقع	0
المخططات التنفيذية المقدمة (من 204)	179
اعتمادات المواد المقدمة (من 45)	45

المخططات التنفيذية: 122 معتمدة (A) و57 معتمدة بملاحظات (B). اعتمادات المواد: 1 (A) و41 (B) و3 (C).

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
تصريح سياج سار	مدن / سار	تصريح العمل داخل منطقة الرصيف ما زال معلقاً، لذا لا يمكن بدء أعمال الرصيف والمظلة. مصنف عالياً جداً (5 × 5) في سجل المخاطر، ومفتوح منذ 16-سبتمبر-2026.
تصميم المظلة والرصيف	مدن (المالك)	لم يُصدر المالك بعد تصميم المظلة والرصيف، لذا لا يمكن إنهاء المخططات التنفيذية والتوريدات والتنفيذ المرتبطة بهما. مصنف عالياً جداً (5 × 5)، بقيمة 9,867,379 ريال.
تقاطعات مجاري الجهد المتوسط	مدن (المالك)	اعتماد المالك لتقاطعات مجاري الجهد المتوسط المقترحة ما زال معلقاً، ويتوقف عليه تركيب تمديدات الجهد المتوسط. مصنف عالياً (4 × 4).
التوريدات طويلة الأجل	المقاول	ثمانية بنود طويلة التوريد لم تُقدَّم للاعتماد بعد، وتجاوز عدد منها مواعيد أوامر الشراء المطلوبة. التوريدات عند 19.2% مقابل 80.0% مخطط.

يضم سجل المشكلات 17 ملاحظة سلامة من 02-سبتمبر-2026 إلى 25-أكتوبر-2026، جميعها مغلقة. وهناك خطران قديمان مسجلان مغلقين: تصريح سار للتقرير الجيوتقني ومخطط المناقصة للرصيف.

ملاحظات على البيانات

- لم يُرفع أي تقرير أسبوعي سابق لهذا المشروع (المجلدات W01 إلى W03 فارغة)، لذا يُظهر عمود كميات هذا الأسبوع "–". أما تقدم هذا الأسبوع وقيم 19-أكتوبر-2026 فمأخوذة من الأعمدة الأسبوعية وأعمدة الأسبوع السابق في ورقة Progress بتاريخ 26-أكتوبر-2026.
- قيمة "Earn Value" في الصفحة الأولى ومؤشرها الزمني مبنيان على التكلفة (قيمة جدول الكميات) لا على الإنجاز الفعلي، ولا يُستخدمان في هذا التقرير.
- التقدم المخطط حتى 26-أكتوبر-2026 هو 40.0% في ورقة Progress لكنه 38.4% في ورقة Physical-Chart Data. ولا يتطابق عمود النسب في تلك الورقة لشهري أبريل ومايو (4.24% و8.17%) مع ساعات العمل فيها، لذا يستخدم المنحنى ساعات العمل مقسومة على إجمالي 638,468 ساعة عمل.
- يُظهر التجهيز 19,793 ساعة عمل مخططة ومكتسبة مقابل ميزانية 19,154، والتصميم 32,988 مخططة مقابل 31,923، وكلاهما 103.3%.
- ساعات العمل المخططة أسبوعياً لأعمال الطرق 1 (17,222) لا تساوي مجموع Road-01 و(2,412) Road-02، ويُظهر بند الجهد المنخفض Road-02 قيمة –11,285 مخططة هذا الأسبوع.
- الكميات الرئيسية: طبقة الأساس الحصوية 21,459 م³ مقابل إجمالي 16,376 م³، ومواسير HDPE وتمديدات الجهد المنخفض منفذة 100%، وهذا لا يتفق مع ورقة Progress. وإجمالي الأسفلت 13,360 م³ هناك لكنه 3,420 م³ في ورقة Procurement، والبردورات بالمتر المربع هناك وبالمتر الطولي في ورقة Procurement.
- تُظهر ورقة Procurement نسبة توريد البردورات 1.4 (140%).
- القوى العاملة: المخطط لشهر أكتوبر 217 في المخطط الشهري لكنه 60 في الملخص الأسبوعي.
- تذكر الصفحة الأولى "Revised Completion" بتاريخ 07-أبريل-2026، وهو تاريخ تسليم الموقع. ومعلم أعمال الجهد المتوسط له تاريخ أساسي 22-مايو-2027 في الصفحة الأولى و12-مايو-2027 في ورقة Milestones.
- يُنهي P6 المشروع في 07-أغسطس-2027 بفائض –0.5 يوم، أي بعد تاريخ العقد بيوم واحد، بينما يتوقع التقرير الأسبوعي 06-أغسطس-2027 دون انحراف.
- تحمل ورقة تفتيش السلامة وملخص طلبات الفحص رقم المشروع SUD1-02-011، وتصف ورقة Conclusion مشروعاً آخر (شبكات البنية التحتية في سدير، المرحلة الثانية الجزء الثاني). وإجمالي ملخص طلبات الفحص 3,646,339 ريال في أعلاه و3,923,633 ريال في أسفله.
- يصف سجل المخاطر المشروع بأنه متقدم عن الجدول، وهذا لا تدعمه أرقام الإنجاز الفعلي. والخطران 3120-4 و3120-5 مسجلان مفتوحين في عمود ومغلقين في عمود آخر.
- وصف الصورة 2 في ملف Excel هو "Bituminous base course MC-01 at Road 1" وفي ملف PDF "backfilling for roundabout at MC20 with road 1".
