مبادرة الملاعب بالمنطقة الوسطى (حائل, واحة القصيم, تبوك)

Playgrounds Initiative: Qassim Oasis, Hail and Tabuk Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنشاء المتقدم للمقاولات	إيجيس (Egis)	بدر الرويضان	17-Feb-2026	16-Dec-2026

النطاق: ملاعب في ثلاثة مواقع (واحة القصيم وحائل والمدينة الصناعية بتبوك) تشمل الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وتنسيق المواقع وأعمال الموقع العامة، ومنها قباب هوائية في القصيم وتبوك ومبنى دورات مياه في كل موقع.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (التقرير الأسبوعي، جدول التقدم الفعلي). في 25-أكتوبر-2026 بلغ الإنجاز 77.64% مقابل 83.26% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 5.62% (مؤشر الأداء الزمني 0.93). وحقق هذا الأسبوع 2.85% مقابل 3.01% مخطط، فاتسعت الفجوة قليلاً.

نسبة الإنجاز الفعلي
77.64% / 83.26%
مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.93 متأخر بنسبة 5.62%

التقدم هذا الأسبوع
+2.85% / +3.01%
مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.16%

المدة المنقضية من العقد
82.8% · اليوم 250 من 302
▼ انتهاء P6: 14-فبراير-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
9.4% · 3.36 مليون ريال
مستخلصان، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

الجدول الزمني يُنهي المشروع الآن بعد تاريخ العقد بـ60 يوماً.

يتوقع تحديث P6 (تاريخ البيانات 23-أكتوبر-2026) والتقرير الأسبوعي التسليم في 14-فبراير-2027 مقابل تاريخ انتهاء العقد 16-ديسمبر-2026، بفائض زمني −50.8 يوماً، وكان تقرير الأسبوع الماضي يتوقع 07-فبراير-2027. لدى 169 من أصل 300 نشاط مفتوح فائض سالب، وتعثر بدء 39 نشاطاً. والقباب الهوائية هي الأكثر تأخراً: القصيم 39.96% مقابل 79.84% مخطط، وتبوك 35.13% مقابل 74.55%.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من التقرير الأسبوعي بتاريخ 25-أكتوبر-2026، وتحمل ختم 22 و24 أكتوبر 2026 حيث يظهر الختم. تستمر أعمال الأسفلت والبردورات والسياج والتبليط والخزانات في المواقع الثلاثة. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



اختبار لب الأسفلت، تبوك

عينة لب من الأسفلت الجديد. ختم 24-أكتوبر-2026، 09:50، تبوك.



أعمال الأسفلت

مسار أسفلت منتهٍ بمحاذاة سياج الموقع. بلا ختم تاريخ.




منطقة الملاعب، القصيم

البردورات وأعمال البلاطة. ختم GPS بتاريخ 22-أكتوبر-2026، 14:02، بريدة.



تركيب الشبك والسياج، القصيم

ملعب مسوّر بجانب مبنى دورات المياه. ختم GPS بتاريخ 22-أكتوبر-2026، 14:00.

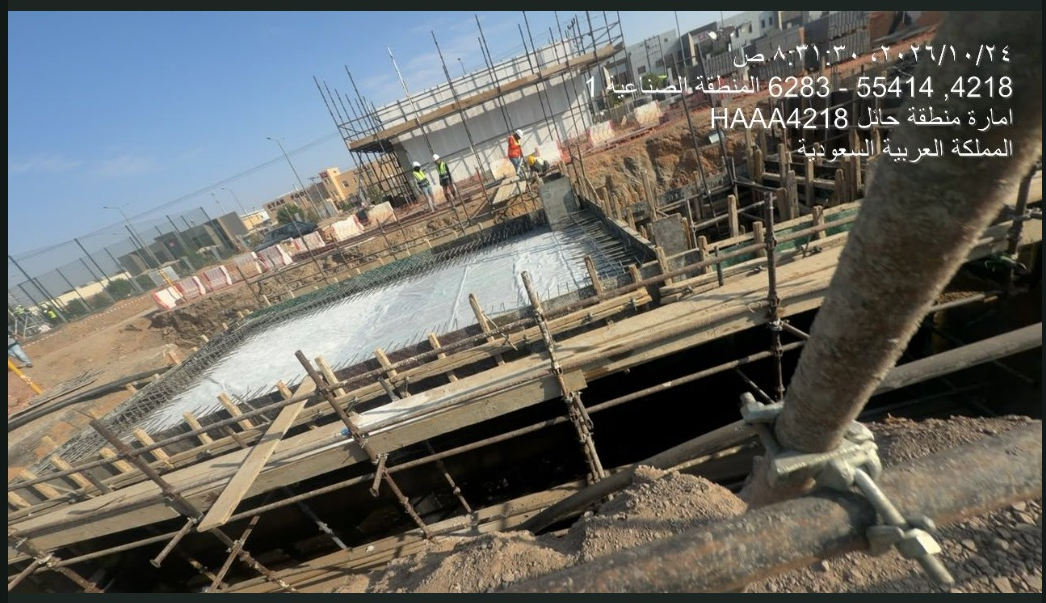

أعمال الخزان الخرساني، حائل

القوالب والتسليح في مكانها. ختم 24-أكتوبر-2026، 08:31، منطقة حائل.




أعمال التبليط، القصيم

بلاطات دائرية وبردورات. ختم GPS بتاريخ 22-أكتوبر-2026، 14:02.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data في التقرير الأسبوعي.

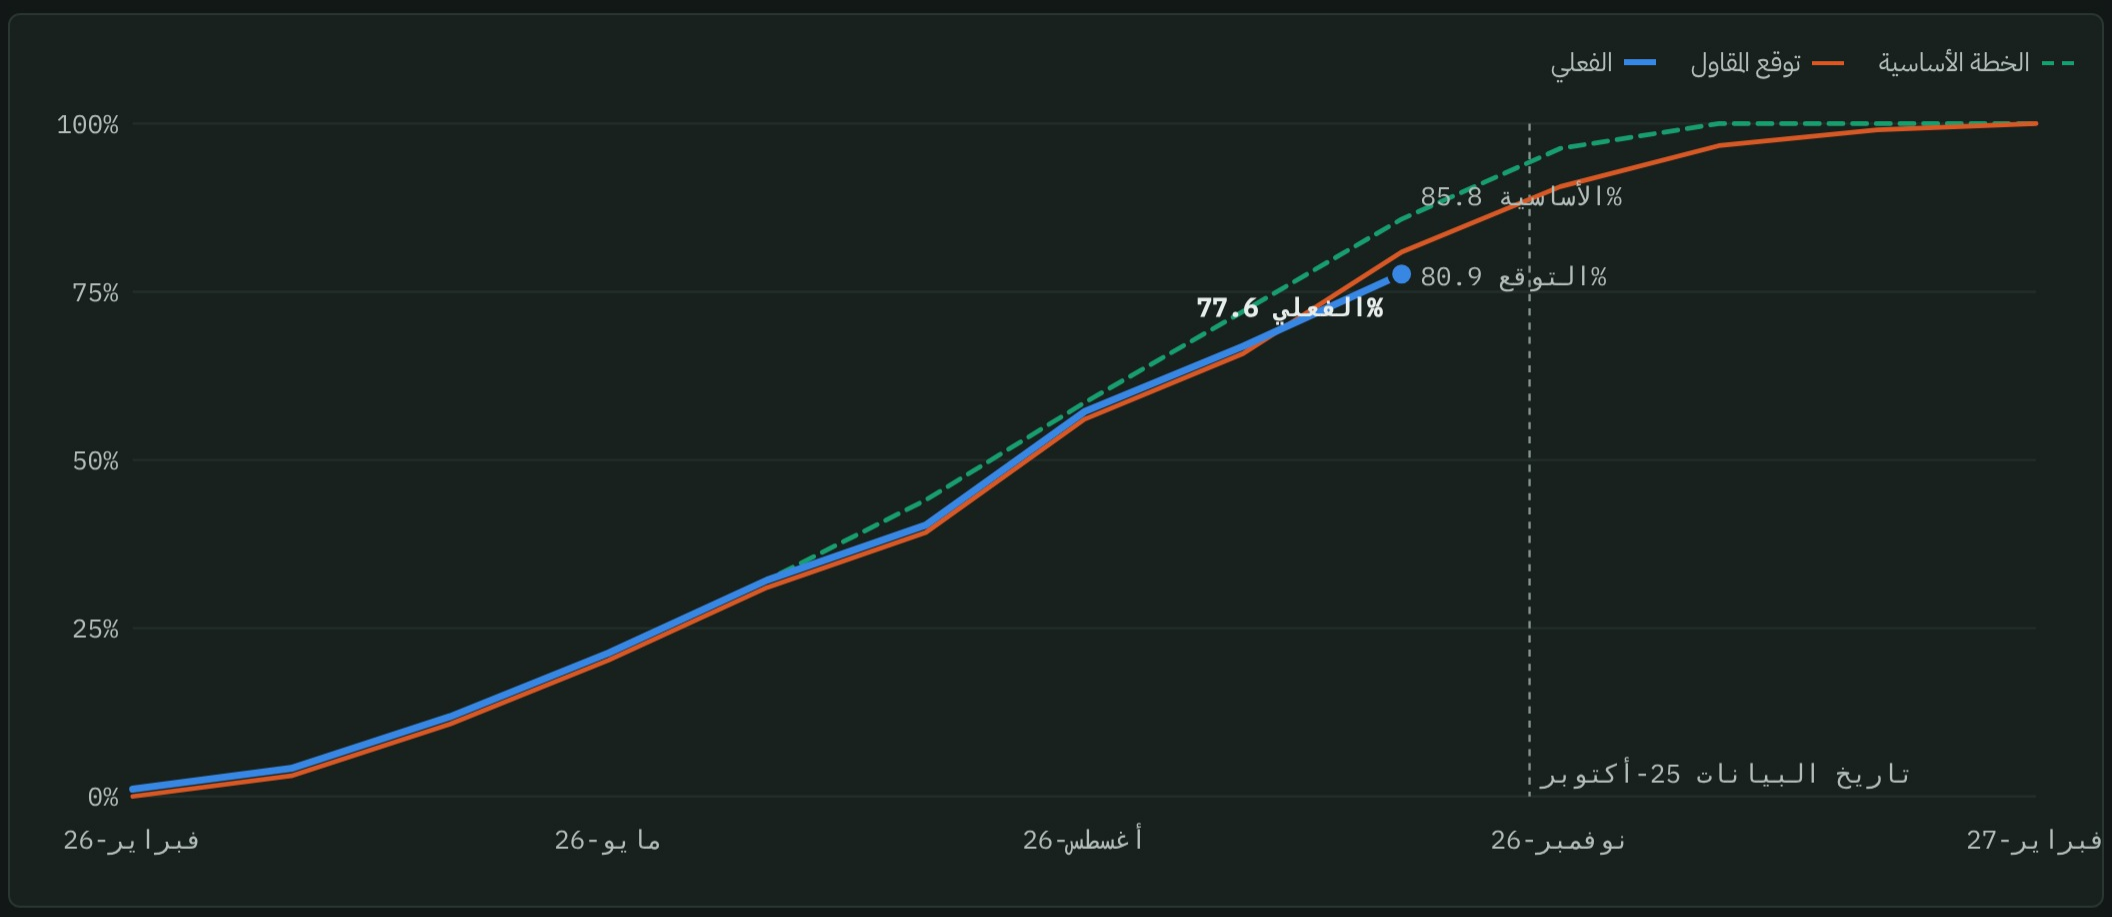

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
18-Oct-2026	80.25	74.79	-5.46	–	0.93
25-Oct-2026	**83.26**	**77.64**	**-5.62**	**+2.85**	**0.93**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 18 و25 أكتوبر 2026، وهما التقريران الأسبوعيان الوحيدان المرفوعان حتى الآن. تبلغ الخطة الأساسية الشهرية في المنحنى 85.82% بنهاية أكتوبر.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (التقرير الأسبوعي، ورقة Progress). لا يحمل التصميم الهندسي والتوريدات ساعات عمل في التقرير، لذا لا يُعرضان.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
معلم المشروع (وقت الإدارة)	**30.0%**	**81.66%**	**81.71%**	**+0.05%**	**1.00**	▲ متقدم
التنفيذ	**66.6%**	**88.16%**	**79.05%**	**-9.11%**	**0.90**	▼ متأخر
واحة القصيم	24.3%	87.27%	78.50%	-8.76%	0.90	▼ متأخر
حائل	17.9%	93.11%	80.57%	-12.54%	0.87	▼ متأخر
تبوك	24.3%	85.42%	78.48%	-6.94%	0.92	▼ متأخر
الإغلاق	**3.5%**	**2.86%**	**15.28%**	**+12.41%**	**5.33**	▲ متقدم
الإجمالي	100%	**83.26%**	**77.64%**	**-5.62%**	**0.93**	▼ متأخر

داخل التنفيذ، القباب الهوائية هي الأكثر تأخراً: القصيم 446 من 1,116 ساعة عمل منجزة مقابل 891 مخططة، وتبوك 392 مقابل 832. ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 23-أكتوبر-2026) عدد 1,929 نشاطاً: 1,629 مكتملاً و220 قيد التنفيذ و80 لم يبدأ.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية للمواقع الثلاثة معاً، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 25-أكتوبر-2026. يُظهر العمود الأخير الكمية المخططة حتى تاريخه. ويُقارن عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بتقرير 18-أكتوبر-2026.

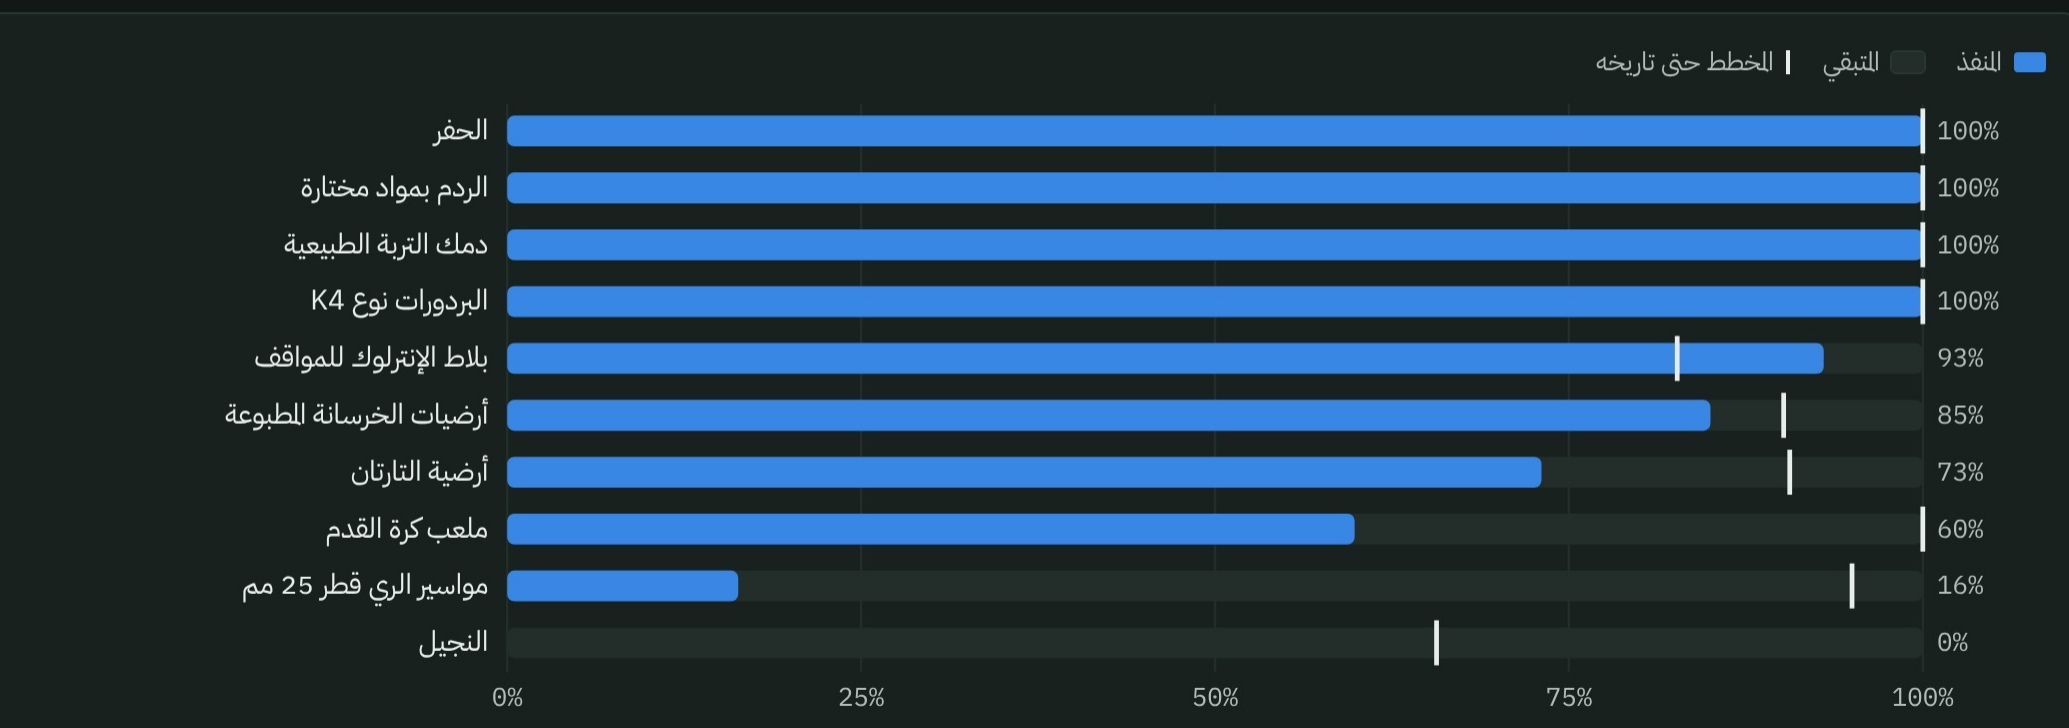

بند النطاق	المواقع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	المخطط %
الحفر	الكل	م³	29,400	29,400	0	0	100.0%	100.0%
الردم بمواد مختارة	الكل	م³	29,400	29,400	0	0	100.0%	100.0%
دمك التربة الطبيعية	الكل	م²	33,300	33,300	0	0	100.0%	100.0%
البردورات نوع K4	الكل	م.ط	27,100	27,100	0	0	100.0%	100.0%
بلاط الإنترلوك للمواقف	الكل	م²	7,140	6,640	0	499.8	93.0%	82.7%
أرضيات الخرسانة المطبوعة	الكل	م²	7,800	6,630	0	1,170	85.0%	90.2%
أرضية التارتان	الكل	م²	10,950	8,000	0	2,950	73.1%	90.6%
ملعب كرة القدم	الكل	م²	7,350	4,400	0	2,950	59.9%	100.0%
مواسير الري قطر 25 مم	الكل	م	11,100	1,812	0	9,288	16.3%	95.0%
النجيل	الكل	م²	19,100	0	0	19,100	0.0%	65.6%

المنجز المُبلغ عنه هذا الأسبوع

الخط الرئيسي للري، والبردورات، واختبار لب الأسفلت في منطقة ملعب كرة القدم، واختبار دمك أرضية التارتان، وتركيب الشبك والسياج، والسباكة في دورات المياه، وأعمال الأسفلت (الملخص التنفيذي الأسبوعي). الأسبوع القادم: الدمك والتسوية، والأسفلت، والبردورات، والخرسانة المطبوعة، وصب خرسانة خزاني الصرف والري، وتركيب خزان GRP.

النجيل ومواسير الري والملاعب متأخرة

النجيل عند 0 من 12,539 م² مخططة حتى تاريخه، ومواسير الري قطر 25 مم عند 1,812 من 10,545 م، وملعب كرة القدم عند 4,400 من 7,350 م²، وأرضية التارتان عند 8,000 من 9,921 م². ولم تتغير أي من الكميات الرئيسية عن تقرير 18-أكتوبر-2026.

المعالم الرئيسية

تختلف بعض تواريخ ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي عن تحديث P6. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول. الفائض من تحديث P6 بتاريخ بيانات 23-أكتوبر-2026.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	17-Feb-2026	17-Feb-2026	17-Feb-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	18-Mar-2026	14-Apr-2026	–	–	✓ منجز متأخراً
اكتمال التصميم الهندسي	16-Aug-2026	25-Oct-2026 (+70 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال التوريدات	27-Aug-2026	25-Oct-2026 (+59 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال مبنى دورات المياه	28-Oct-2026	–	05-Nov-2026	+13.2	▼ معرّض للتأخير

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
اكتمال أعمال الملاعب	07-Dec-2026	–	14-Dec-2026	+2.6	▼ معرّض للتأخير
اكتمال التنفيذ	14-Dec-2026	28-Oct-2026 (−47 يوماً)	30-Jan-2027	–	؟ يتعارض مع P6
اكتمال أعمال تنسيق المواقع	16-Dec-2026	–	10-Jan-2027	−20.9	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	16-Dec-2026	09-Feb-2027 (+55 يوماً)	14-Feb-2027	−50.8	▼ متأخر
اكتمال التسريح	16-Dec-2026	13-Feb-2027 (+59 يوماً)	–	–	▼ متأخر
تسليم المشروع	16-Dec-2026	14-Feb-2027 (+60 يوماً)	14-Feb-2027	−50.8	▼ متأخر

توقع التقرير الأسبوعي لـ"اكتمال التنفيذ" في 28-أكتوبر-2026 يتعارض مع P6.

يُنهي P6 مرحلة التنفيذ في 25-يناير-2027 في القصيم و21-ديسمبر-2026 في حائل و30-يناير-2027 في تبوك، والمشروع في 14-فبراير-2027. وانتقل توقع التسليم من 07-فبراير-2027 في تقرير الأسبوع الماضي إلى 14-فبراير-2027. ومن المعالم التعاقدية، لا يحتفظ بفائض موجب سوى مبنى دورات المياه (+13.2 يوماً) وأعمال الملاعب (+2.6 يوماً).

توريد المواد الرئيسية

نسبة الإنجاز الفعلي لأنشطة "التوريد إلى الموقع" المفتوحة الأقل تقدماً (تحديث P6، تاريخ البيانات 23-أكتوبر-2026). جميع أنشطة التوريد المفتوحة الأخرى عند 90–95%.



مواد القبة الهوائية: 80% موردّة


في كل من القصيم وتبوك، بفائض −50.8 و−49.0 يوماً، وهو في حدود فائض إنجاز المشروع. ولا يزال سجل التوريدات يُظهر أمر شراء القبة الهوائية "قيد الإجراء" بمدة توريد 150 يوماً.

أوامر الشراء والمواد في الموقع

يضم ملخص التوريدات في التقرير الأسبوعي 57 مادة: صدر 33 أمر شراء، ويتبقى 25، و8 مواد في الموقع. الجزء المتبقي من الحائط الستائري عند 70% في القصيم وتبوك و80% في حائل.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (يدوية وغير يدوية)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower في التقرير الأسبوعي.

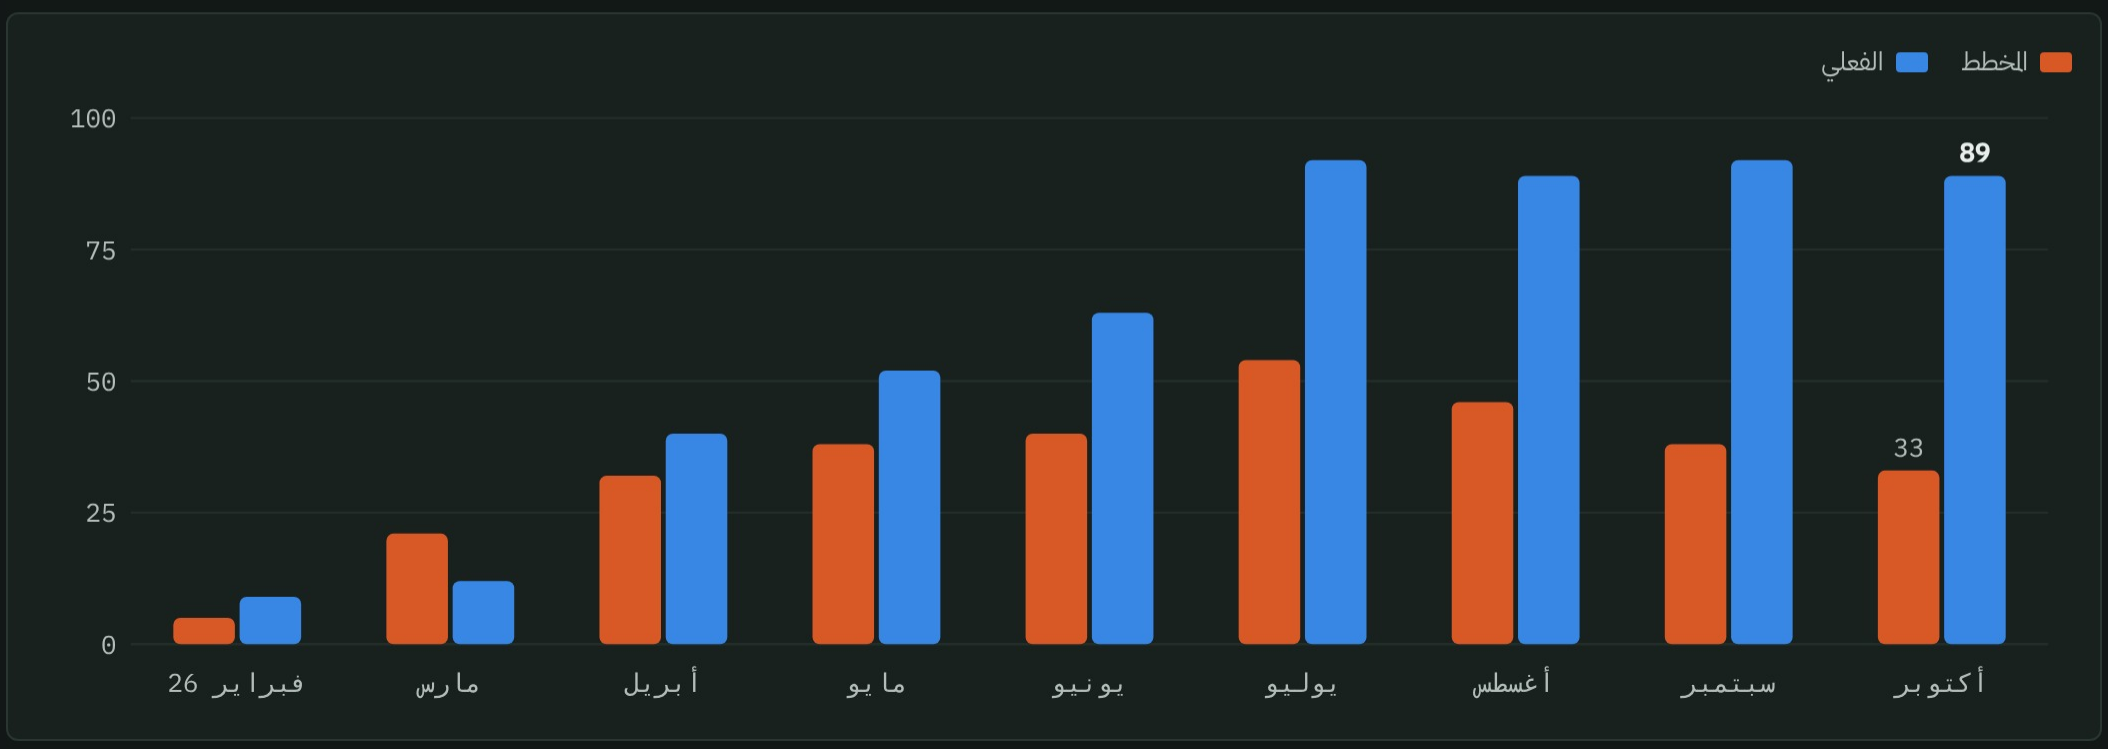

عدد العمالة في أكتوبر 89 مقابل 33 مخططاً (16 غير يدوية و73 يدوية). وتُظهر لوحة المؤشرات في التقرير نفسه 93 مقابل 40. المعدات في الموقع: 30 مقابل 8 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)	35,709,993
قيمة العقد المعدلة	35,709,993
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات في السجل	2
القيمة الإجمالية	3,357,105
استرداد الدفعة المقدمة	−335,711
الخصومات والغرامات	−38,000
المعتمد من مدير المشروع - مدن	0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	3,485,668

المفوتر 9.4% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 77.64%. المستخلصان (2,317,493) IPC-01 و-IPC (1,039,612) 02 معتمدان من الاستشاري، ولم يُعتمد أي منهما من مدير المشروع في مدن.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.92

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	107,530
ساعات العمل هذا الأسبوع	9,660
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	588 / 238

تفتيش مدن للسلامة رقم 29 (22-أكتوبر-2026): 16 بنداً ممارسة جيدة، و7 بحاجة إلى تحسين، و0 إخفاق.

الجودة التقييم 0.91

طلبات الفحص الميداني: صادرة / مغلقة / معلقة	717 / 606 / 111
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	81 / 67 / 14
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / معلقة	22 / 8 / 14
تعليمات الموقع: صادرة / مغلقة	7 / 6
المخططات التنفيذية المعتمدة (A+B) / الإجمالي	316 / 432
اعتمادات المواد (A+B) / الإجمالي	130 / 150

55 مخططاً تنفيذياً و12 تقديماً للمواد قيد الانتظار.

المشكلات والمخاطر القائمة

يضم سجل المشكلات في التقرير الأسبوعي مشكلة واحدة أُغلقت (تصريح العمل في حائل، أُغلقت 19-أبريل-2026). البنود أدناه مأخوذة من أوراق التقدم والكميات والجدول الزمني والمخاطر.

المشكلة	الموقع	التفاصيل
أعمال القبة الهوائية	القصيم، تبوك	الإنجاز الفعلي 39.96% (القصيم) و35.13% (تبوك) مقابل 79.84% و74.55% مخطط، ولم تُنجز أي ساعات عمل في القباب الهوائية هذا الأسبوع. مواد القباب مورّدة بنسبة 80%.
انزلاق الجدول الزمني	جميع المواقع	انتقل توقع التسليم من 07-فبراير-2027 إلى 14-فبراير-2027 خلال أسبوع واحد. لدى 169 من 300 نشاط مفتوح فائض سالب، و170 نشاطاً على المسار الحرج، وتعثر بدء 39 نشاطاً (42 الأسبوع الماضي).
تنسيق المواقع والري	جميع المواقع	لم يبدأ النجيل مقابل 12,539 م² مخططة حتى تاريخه، ومواسير الري قطر 25 مم عند 1,812 من 10,545 م مخططة. ويُتوقع اكتمال تنسيق المواقع في 10-يناير-2027 (فائض −20.9 يوماً).
أرضيات الملاعب	جميع المواقع	ملعب كرة القدم عند 4,400 من 7,350 م²، وأرضية التارتان عند 8,000 من 9,921 م² مخططة حتى تاريخه.
التوريدات	جميع المواقع	يتبقى إصدار 25 من 57 أمر شراء، و8 مواد في الموقع، والجزء المتبقي من الحائط الستائري عند 70–80%.
فحص التربة (سجل المخاطر)	تبوك	خطر قائم: تستغرق نتائج اختبار الجسات 7–10 أيام من المختبر، مما قد يؤخر بدء أعمال الحفر.

ملاحظات على البيانات

- أرقام التقدم هي التقدم الفعلي (الجهد) في التقرير الأسبوعي، ويُقاس بـ33,340 ساعة عمل مخططة، منها 10,000 ساعة لبند "معلم المشروع" الخاص بالإدارة. ويعرض غلاف التقرير ولوحة مؤشراته أيضاً تقدماً محسوباً بالتكلفة بعنوان الفعلي، ويستخدم هذا التقرير التقدم الفعلي فقط.
- يذكر التقرير "Current Contract Weeks: 0 of 0"، لذا حُسب رقم الأسبوع من تاريخ تسليم الموقع (17-فبراير-2026): الأسبوع 35.
- تحمل أعمدة "Weekly Physical Progress" نسبة 75.05% مخطط و68.08% منجز، ولا تطابق أرقام أي من الأسبوعين حتى تاريخه. لذا اعتُبر التقدم هذا الأسبوع الفرق في التقدم حتى تاريخه منذ تقرير 18-أكتوبر-2026.
- جميع الكميات الرئيسية مطابقة لتقرير 18-أكتوبر-2026 رغم الإبلاغ عن أعمال هذا الأسبوع، ويبدو أن الورقة لم تُحدَّث.
- ساعات العمل حسب الموقع: يُظهر مبنى دورات المياه في تبوك 0 من 1,708 ساعة منجزة مع 40 ساعة مخططة فقط، ولا تحمل أعمال الإغلاق في تبوك أي ساعات مخططة رغم إنجاز 62 ساعة.
- تذكر ورقة المعالم اكتمال التجهيز في 14-أبريل-2026 مقابل 18-مارس-2026 دون تغيير في الأيام، واكتمال التنفيذ في 28-أكتوبر-2026 (قبل 47 يوماً)، وهو ما لا يدعمه P6.
- التوريدات: يذكر الملخص 8 مواد من 57 في الموقع، بينما أنشطة التوريد في P6 منجزة بنسبة 70–95%. ولا يتضمن سجل التوريدات كميات أو تواريخ توريد.
- المستخلصات: يُظهر الملخص 0 مستخلصات مقدمة بينما يضم السجل IPC-01 وIPC-02. والمدفوع (3,436,604 ريال) يتجاوز القيمة الإجمالية المقدمة رغم عدم اعتماد أي منهما من مدير المشروع. وتجمع الغرامات في لوحة المؤشرات (−373,711) بين استرداد الدفعة المقدمة والخصومات.
- القوى العاملة: يذكر شهر أكتوبر في ورقة Manpower 25 عاملاً يدوياً مخططاً و73 فعلياً، بينما تُظهر لوحة المؤشرات 32 و77. ولا تزال ورقة DB تحمل بيانات مشروع آخر (HAL1-02-005).
- تاريخ بيانات تحديث P6 هو 23-أكتوبر-2026 مقابل 25-أكتوبر-2026 للتقرير الأسبوعي، ولدى 118 نشاطاً قيد التنفيذ تاريخ انتهاء يسبق تاريخ البيانات. وثلاثة ملفات PDF مسماة MLTX-05-047 رغم أنها تخص MLTX-02-003.
- يبدأ توقع المقاول في ورقة Physical-Chart Data من 0 في فبراير، أي أقل من الفعلي بـ365 ساعة عمل، لذا يبقى أدنى من الفعلي قليلاً حتى أكتوبر.

أُعدّ في 01-نوفمبر-2026 من التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 18 و25 أكتوبر 2026 وتحديث P6 بتاريخ بيانات 23-أكتوبر-2026.
