مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية (عسير, جازان, واحة جدة)

Playground Initiative for Western Region (Asir, Jazan, Jeddah)

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة بروفاست المحدودة	إيجيس (EGIS)	م. يزيد آل رقبة	26-Mar-2026	25-Jan-2027

النطاق: ملاعب رياضية (بادل وكرة سلة وكرة قدم)، ومبنى خدمات ودورات مياه، وأعمال تنسيق المواقع، ومسارات للدراجات والمشي، ومواقف سيارات في ثلاثة مواقع في عسير وجازان وجدة.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة، على مراحل هيكل تجزئة العمل كما في تقرير الأسبوع الماضي. بلغ المشروع 44.6% مقابل 55.2% مخططاً، أي متأخر بنسبة 10.6% (مؤشر الأداء الزمني 0.81). وأنجز 2.2% هذا الأسبوع مقابل 4.2% مخططاً، فاتسعت الفجوة من 8.6% في الأسبوع الماضي. وموقع جازان هو الأكثر تأخراً عند 30.4% مقابل 49.4% مخططاً، بينما موقع جدة متقدم قليلاً على خطته.

نسبة الإنجاز الفعلي
44.6% / 55.2% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.81 −10.6%

التقدم هذا الأسبوع
+2.2% / +4.2% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 2.0%

المدة المنقضية من العقد
70.2% · اليوم 214 من 305
▼ الانتهاء المتوقع 19-مايو-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
14.6% · 4.94 مليون ريال
5 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 08-أكتوبر-2026

يُتوقع الآن انتهاء المشروع متأخراً 114 يوماً.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026) انتهاء المشروع في 19-مايو-2027، أي بعد توقع الأسبوع الماضي بعشرة أيام وبعد تاريخ انتهاء العقد 25-يناير-2027 بـ114 يوماً. ويُظهر P6 فائضاً زمنياً −91 يوماً على انتهاء المشروع و320 نشاطاً مفتوحاً بفائض سالب. ولا يزال المسار الأكثر حرجاً يمر عبر القبة الهوائية: ففي أكثر القباب الثلاث حرجاً لم يبدأ اعتماد غشاء PVC وكابلات الشد الفولاذية وأبواب الطوارئ والأبواب العازلة، وفائضها الزمني −91 يوماً. والنسبة الرئيسية في التقرير الأسبوعي نفسه 60.7% مقابل 76.1% غير قابلة للمقارنة مع الأسبوع الماضي، انظر ملاحظات على البيانات.


صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026، صورتان من كل موقع، وتحمل ختم 25-أكتوبر-2026 حيث يظهر الختم. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال الري، جازان

مد ماسورة الري HDPE في الخندق. لا يظهر ختم.

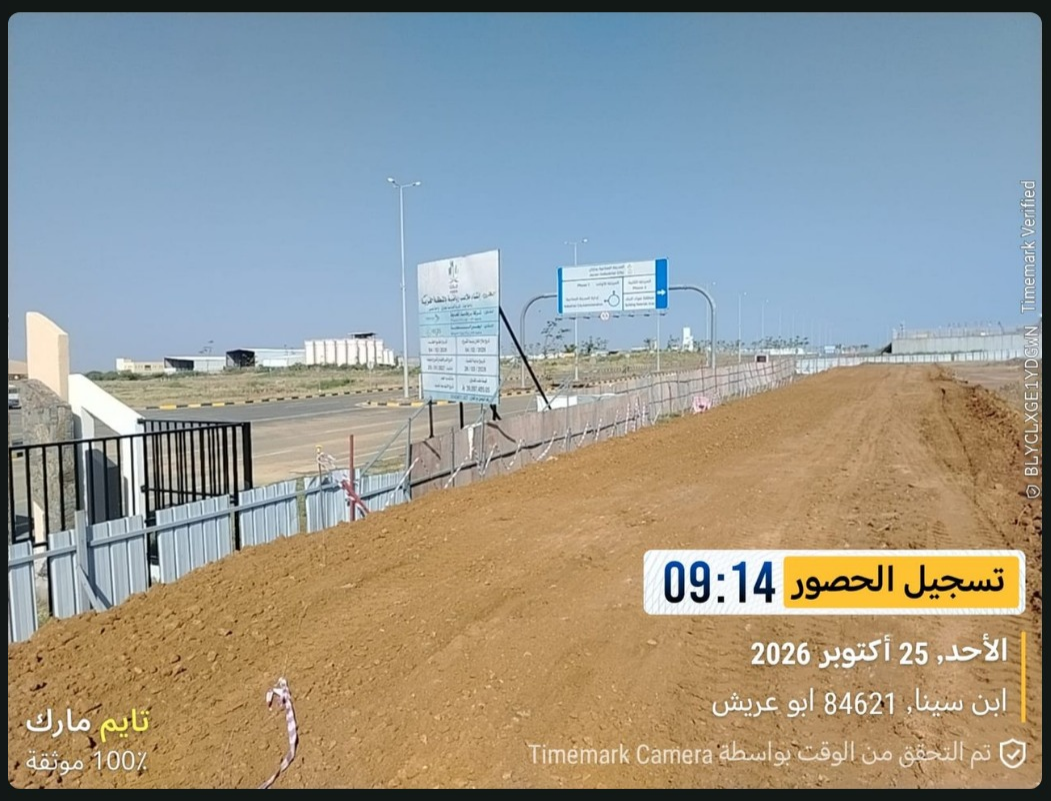

ردم المشى، جازان

ردم وتسوية ممر المشاة بمحاذاة السور. مختومة 25-أكتوبر-2026، 09:14، أبو عريش.



أعمال الأسقف، جدة

معالجة فواصل سقف ألواح الجبس. مختومة 25-أكتوبر-2026، 08:39.



أعمال التشجير، جدة

تركيب البردورات حول حوض تشجير دائري. لا يظهر ختم.



أعمال أعمدة الإنارة، عسير

تركيب قاعدة العمود في خندق التمديدات. مختومة 25-أكتوبر-2026، 14:48، خميس مشيط.




أعمال الردم، عسير

الردم بالجرافة. مختومة 25-أكتوبر-2026، 14:56، إحداثيات GPS 18.3343373°N, 42.6572196°E.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً، في منتصف كل شهر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، التقرير الأسبوعي 26-أكتوبر-2026، والقيمة الفعلية لأكتوبر هي 44.6% المحسوبة على الأساس نفسه للأسبوع الماضي.

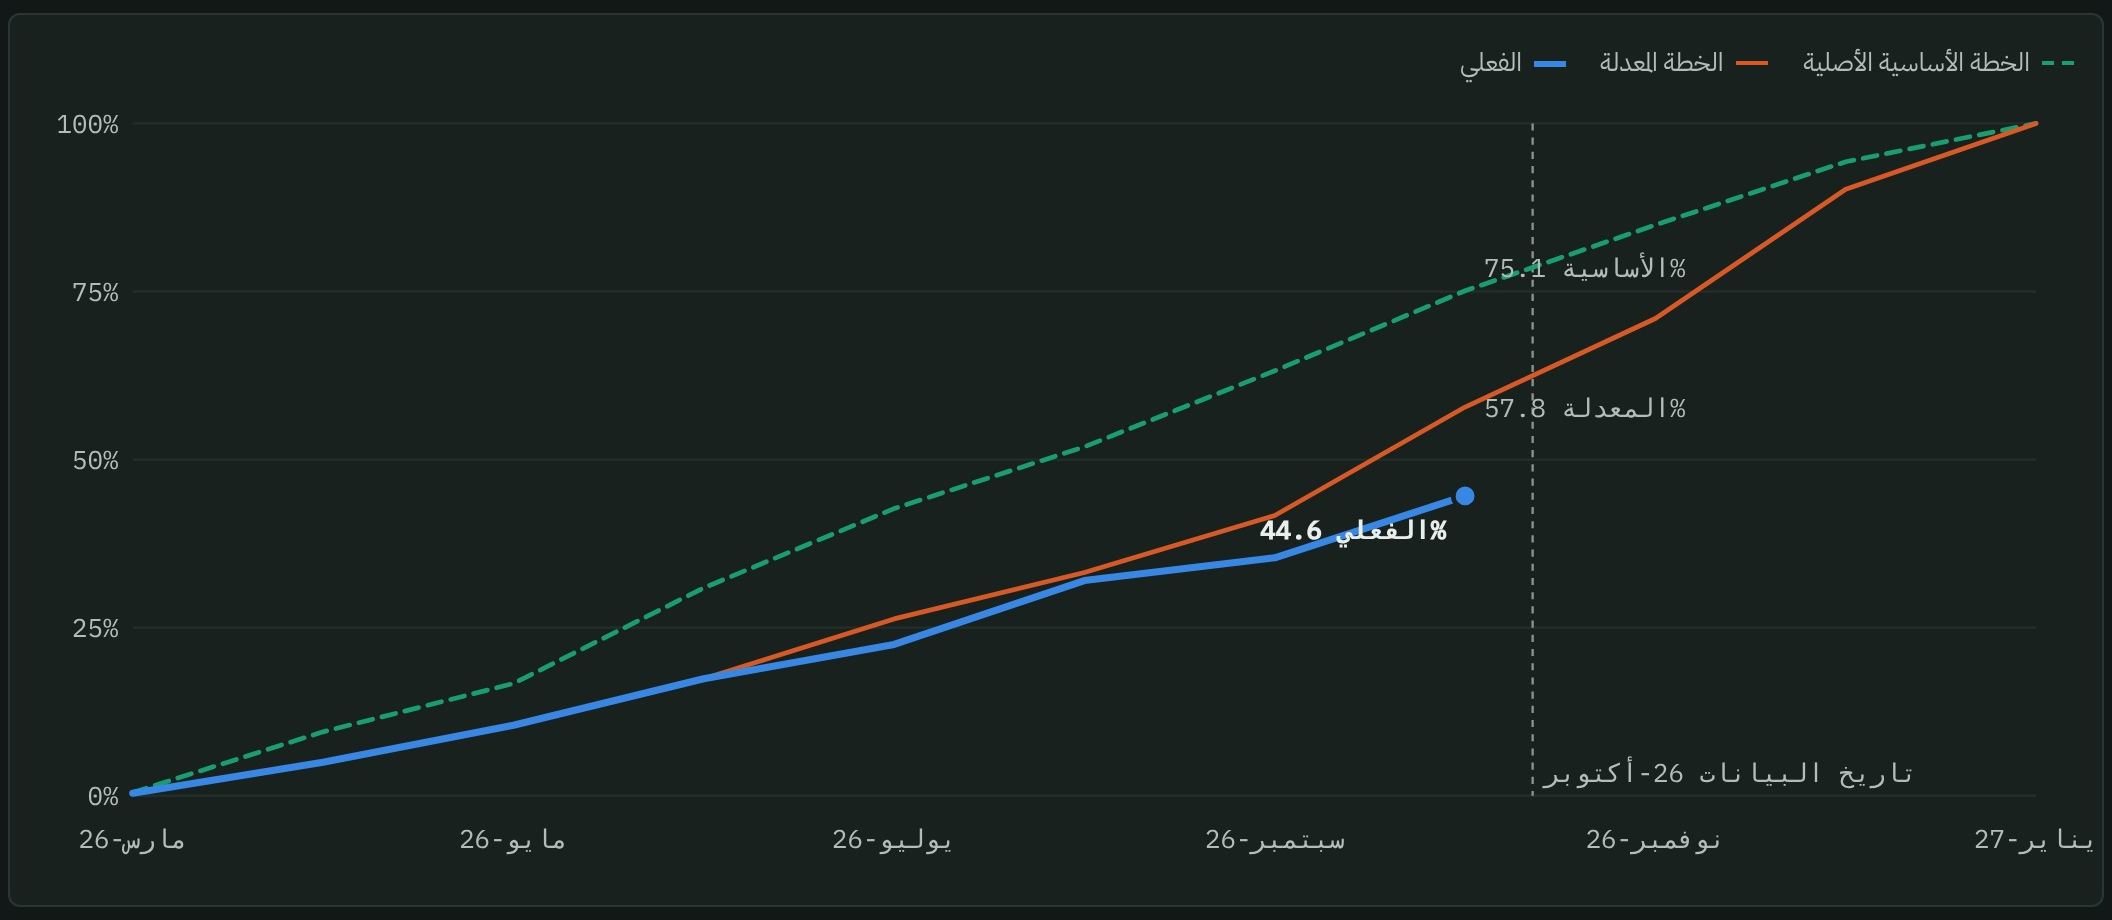

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
12-Oct-2026	47.0	39.0	−8.0	—	0.83
19-Oct-2026	51.0	42.4	−8.6	+3.4	0.83
26-Oct-2026	**55.2**	**44.6**	**−10.6**	**+2.2**	**0.81**

قيم 12 و19 أكتوبر من تقرير 19 أكتوبر، وقيمة 26 أكتوبر من تقرير هذا الأسبوع على مراحل هيكل تجزئة العمل نفسها. وكان المنجز المخطط هذا الأسبوع +4.2%. ولا يتوفر المنجز لأسبوع 12 أكتوبر في هذين التقريرين.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. وقُسّم التنفيذ على المواقع الثلاثة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3.1%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5.2%	100.0%	98.6%	−1.4	0.99	▼ متأخر قليلاً
التوريدات	12.6%	99.1%	62.2%	−37.0	0.63	▼ متأخر
التنفيذ	73.8%	46.6%	38.6%	−8.0	0.83	▼ متأخر
التنفيذ: جازان	25.2%	49.4%	30.4%	−19.0	0.62	▼ متأخر
التنفيذ: عسير	23.8%	47.5%	41.7%	−5.9	0.88	▼ متأخر
التنفيذ: جدة	24.8%	42.8%	43.9%	+1.2	1.03	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	3.2%	0.0%	0.0%	0.0	–	○ لم يحن موعده
الإقفال	2.1%	0.0%	0.0%	0.0	–	○ لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**55.2%**	**44.6%**	**−10.6**	**0.81**	▼ متأخر

أوزان المواقع حصص من المشروع كاملاً. وهذا الأسبوع أنجز موقع جازان 6.2% من نطاقه، وجدة 1.8%، وعسير 0.8%. ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026) عدد 2,134 نشاطاً: 1,737 مكتملاً و26 قيد التنفيذ و371 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 19-مايو-2027، مقابل تاريخ الانتهاء الملزم 25-يناير-2027.

نطاق العمل: الكميات

الكميات الرئيسية للمواقع الثلاثة مجتمعة، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير منذ تقرير 19-أكتوبر-2026، ولم تتغير أي من الكميات. والردم لا ينطبق على هذه البنود.

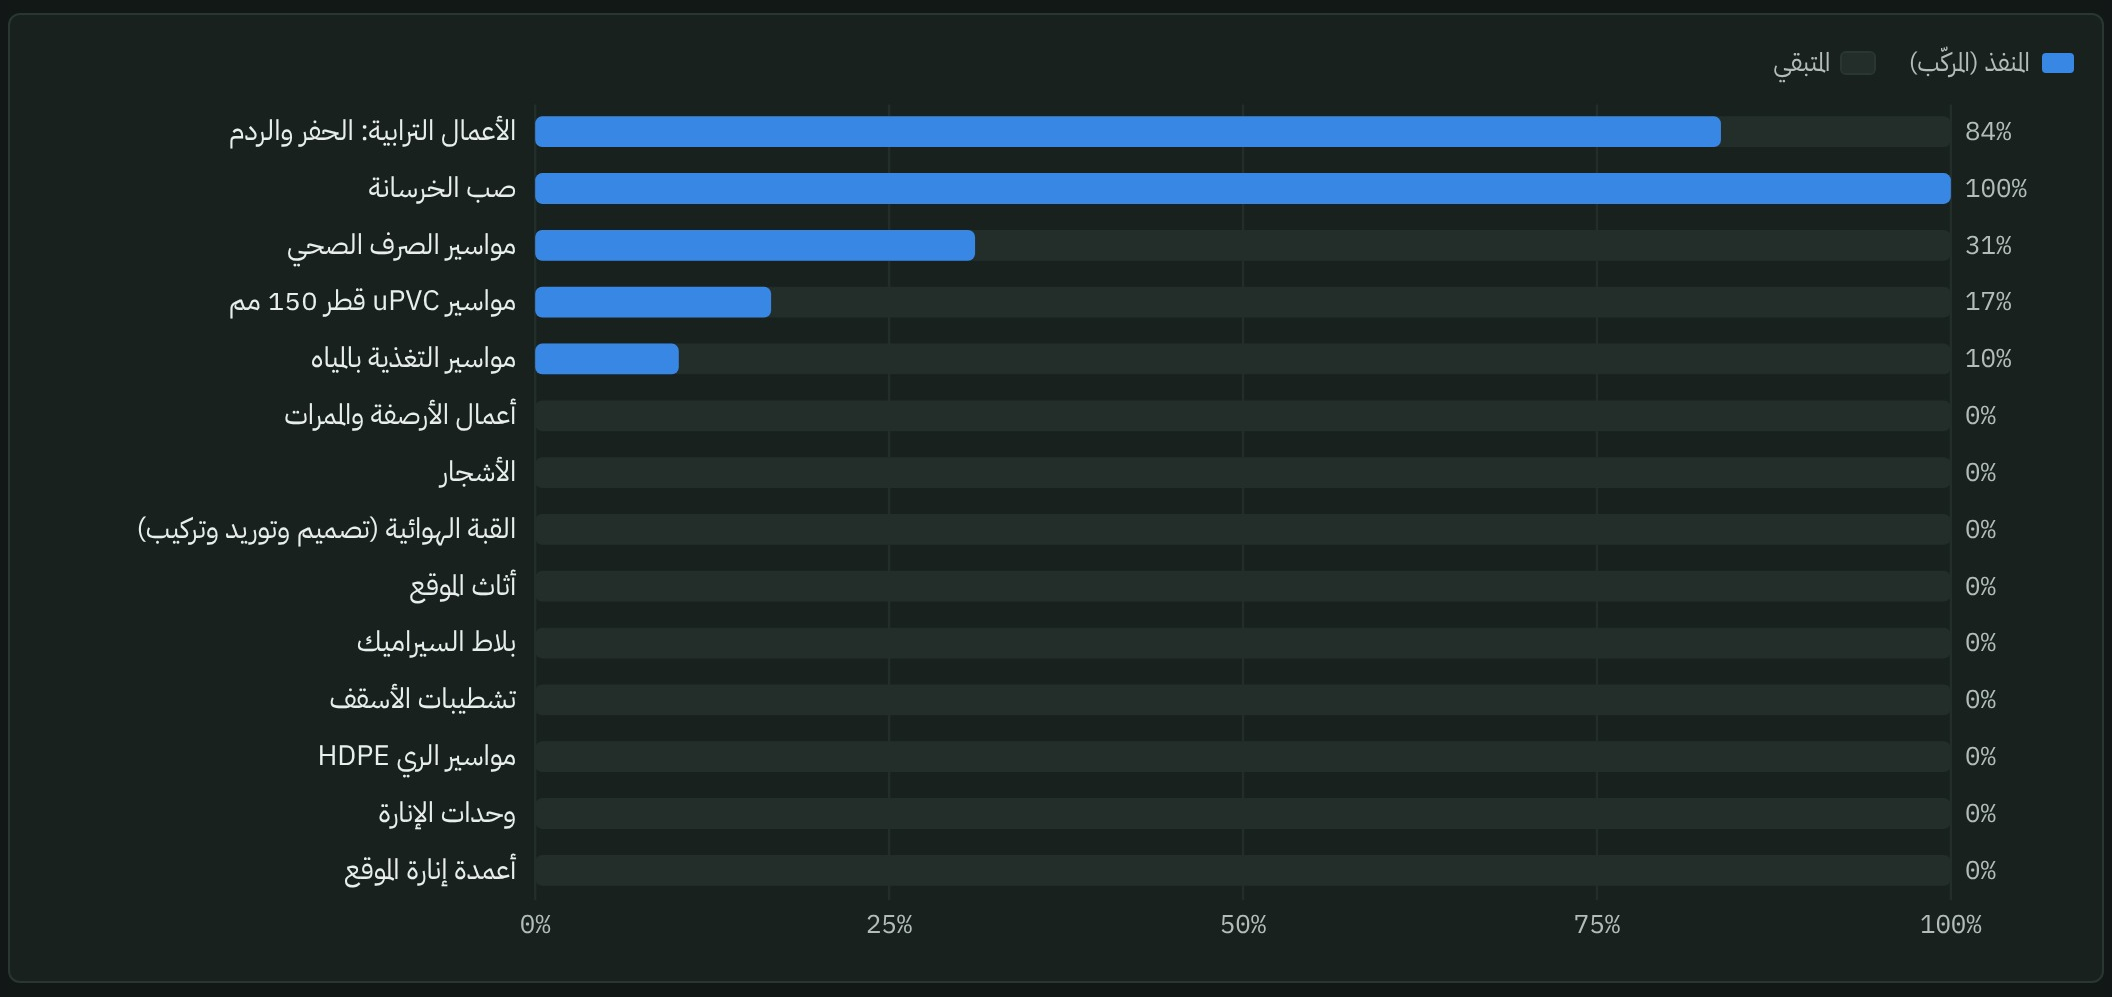

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الأعمال الترابية: الحفر والردم	جميع المواقع	م³	68,052	57,000	0	11,052	83.8%	–
صب الخرسانة	جميع المواقع	م³	145	145	0	0	100.0%	–
مواسير الصرف الصحي	جميع المواقع	م.ط	177	55	0	122	31.1%	–
مواسير uPVC قطر 150 مم	جميع المواقع	م.ط	300	50	0	250	16.7%	–
مواسير التغذية بالمياه	جميع المواقع	م.ط	138	14	0	124	10.1%	–
أعمال الأرصفة والممرات	جميع المواقع	م²	30,380	0	0	30,380	0.0%	–
الأشجار	جميع المواقع	عدد	895	0	0	895	0.0%	–
القبة الهوائية (تصميم وتوريد وتركيب)	جميع المواقع	بند	3	0	0	3	0.0%	–
أثاث الموقع	جميع المواقع	عدد	248	0	0	248	0.0%	–
بلاط السيراميك	جميع المواقع	م²	219	0	0	219	0.0%	–
تشطيبات الأسقف	جميع المواقع	م²	207	0	0	207	0.0%	–
مواسير الري HDPE	جميع المواقع	م.ط	7,150	0	0	7,150	0.0%	–
وحدات الإنارة	جميع المواقع	عدد	129	0	0	129	0.0%	–
أعمدة إنارة الموقع	جميع المواقع	عدد	322	0	0	322	0.0%	–

الأعمال المنفذة هذا الأسبوع

يذكر الملخص الأسبوعي البنود العشرة نفسها للأسبوع الماضي: البلاطة الأرضية للملاعب في عسير، وقواعد القبة الهوائية وحدادة الواجهة الزجاجية في جميع المواقع، ومواسير الري في عسير وجدة، والبردورات حول ملاعب جدة، وسيراميك دورات المياه وعزل أسطحها، وتمديدات وقواعد أعمدة الإنارة. والجديد هذا الأسبوع: الانتهاء من حجر الواجهة لدورات المياه في جازان أيضاً، وصب ومعالجة خزان المياه في جازان.

كميات متأخرة عن المخطط حتى تاريخه

لا تزال مواسير الصرف الصحي عند 55 م.ط مقابل 177 م.ط مخططة حتى تاريخه، ومواسير uPVC قطر 150 مم عند 50 م.ط مقابل 150 م.ط، والأعمال الترابية عند 57,000 م³ مقابل 57,844 م³. ولا تزال أعمال الأرصفة والأشجار والقبة الهوائية ومواسير الري والإنارة عند 0 في هذه الورقة، رغم أن صور هذا الأسبوع تُظهر تركيب مواسير الري وأحواض التشجير وقواعد أعمدة الإنارة.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث P6 التواريخ المتوقعة نفسها لجميع المعالم، والتأخير مقارنة بالخطة الأساسية. والأيام بين القوسين هي الفرق عن الخطة الأساسية كما ورد في التقرير الأسبوعي.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	26-Mar-2026	26-Mar-2026	26-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد البرنامج الزمني الأساسي	29-Apr-2026	29-Apr-2026	29-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	02-Jun-2026	02-Jun-2026	02-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
أعمال التسوية	22-Jul-2026	27-Oct-2026 (+97 يوماً)	27-Oct-2026	11	▼ متأخر
التصميم الهندسي	19-Jan-2027	12-Nov-2026 (−68 يوماً)	12-Nov-2026	63	● متقدم على الخطة الأساسية
مبنى دورات المياه	09-Aug-2026	11-Jan-2027 (+155 يوماً)	11-Jan-2027	12	▼ متأخر
منطقة الملاعب	30-Nov-2026	06-May-2027 (+157 يوماً)	06-May-2027	−83	▼ متأخر
أعمال موقع عسير	13-Dec-2026	05-Apr-2027 (+113 يوماً)	05-Apr-2027	−56	▼ متأخر
أعمال المناظر الطبيعية	16-Jan-2027	18-Mar-2027 (+61 يوماً)	18-Mar-2027	−59	▼ متأخر
أعمال موقع جازان	19-Jan-2027	19-May-2027 (+120 يوماً)	19-May-2027	−91	▼ متأخر
أعمال موقع جدة	25-Jan-2027	01-Apr-2027 (+66 يوماً)	01-Apr-2027	−53	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	29-Apr-2026 *	18-Apr-2027 (+354 يوماً)	18-Apr-2027	−67	▼ متأخر
انتهاء المشروع	25-Jan-2027	19-May-2027 (+114 يوماً)	19-May-2027	−91	▼ متأخر

موقع جازان يحدد تاريخ الانتهاء.

تشترك أعمال موقع جازان وانتهاء المشروع في أبعد تاريخ متوقع، 19-مايو-2027، بفائض −91 يوماً. وتأخرت توقعات جميع المعالم المفتوحة من 7 إلى 10 أيام هذا الأسبوع، وانتقل انتهاء المشروع من 09-May إلى 19-مايو-2027. وتتصدر الأنشطة المفتوحة ذات الفائض السالب: الأثاث (18) والأعمال الكهربائية (15) والتجهيزات (14) والأبواب العازلة للهواء (12) وكابلات الشد الفولاذية (11) وأبواب الطوارئ (11) ووحدات الضغط (10). * تاريخ الخطة الأساسية للاختبار والتشغيل 29-أبريل-2026 كما ورد في ورقة Milestones ويبدو خاطئاً.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المورّدة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: جدول متابعة التوريدات في ملف Procurement Log ضمن تقرير 26-أكتوبر-2026.

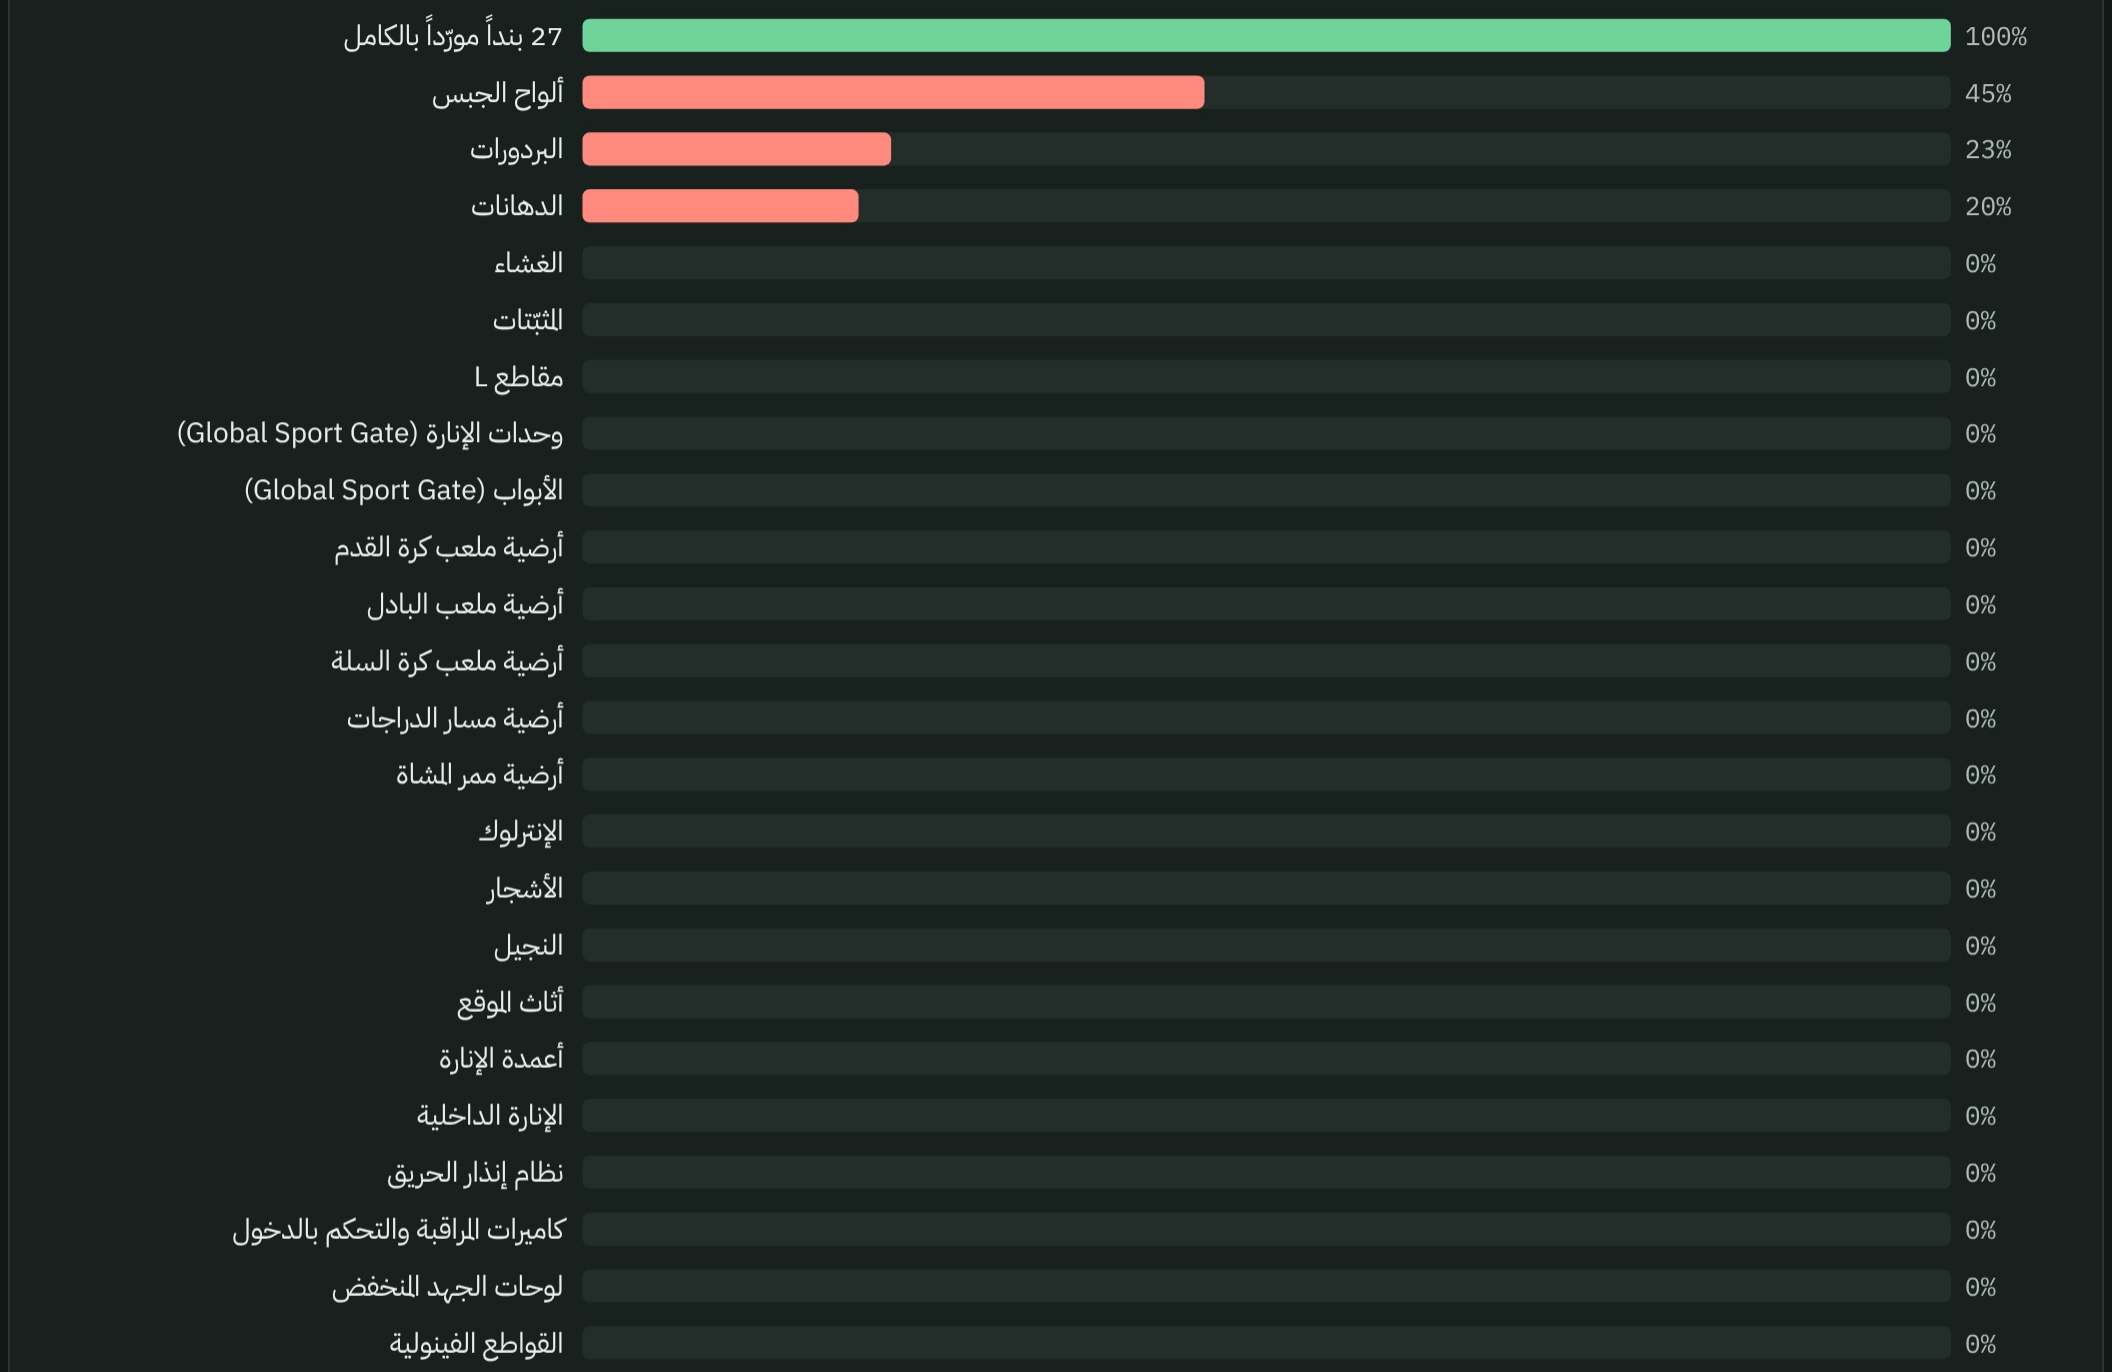

القبة الهوائية وأرضيات الملاعب: لم يورَّد شيء


لا تزال بنود Global Sport Gate الاثنا عشر (الغشاء 18,019 م² و1,521 مثبّتاً و1,488 م.ط من مقاطع L و162 وحدة إنارة و24 باباً والمولدات واللوحات) عند 0، والتوريد مجدول من 01-نوفمبر إلى 25-ديسمبر-2026. وتُظهر خمسة صفوف جديدة أرضيات الملاعب من First Roshn قيد التصنيع لتوريدها في 01-ديسمبر-2026: ملعب كرة القدم 2,982 م²، والبادل 600 م²، وكرة السلة 1,530 م²، ومسار الدراجات 2,896 م²، وممر المشاة 2,779.5 م².

ما ورِّد هذا الأسبوع وما زال متبقياً

منذ جدول 19 أكتوبر: اكتمل توريد تمديدات الجهد المنخفض (7,700 م.ط، بزيادة 3,200)، وبلغت البردورات 2,000 من 8,868 م.ط، واكتمل حجر الواجهات (258 م²)، وبدأ توريد ألواح الجبس (90 من 198 م²) والدهانات (70 من 347 م²). ولا يزال الإنترلوك والأشجار والنجيل وأثاث الموقع وأعمدة الإنارة (قيد التصنيع) والإنارة الداخلية وإنذار الحريق وكاميرات المراقبة ولوحات الجهد المنخفض عند 0، ولم يورَّد شيء من 37 بنداً متابَعاً.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمال والموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

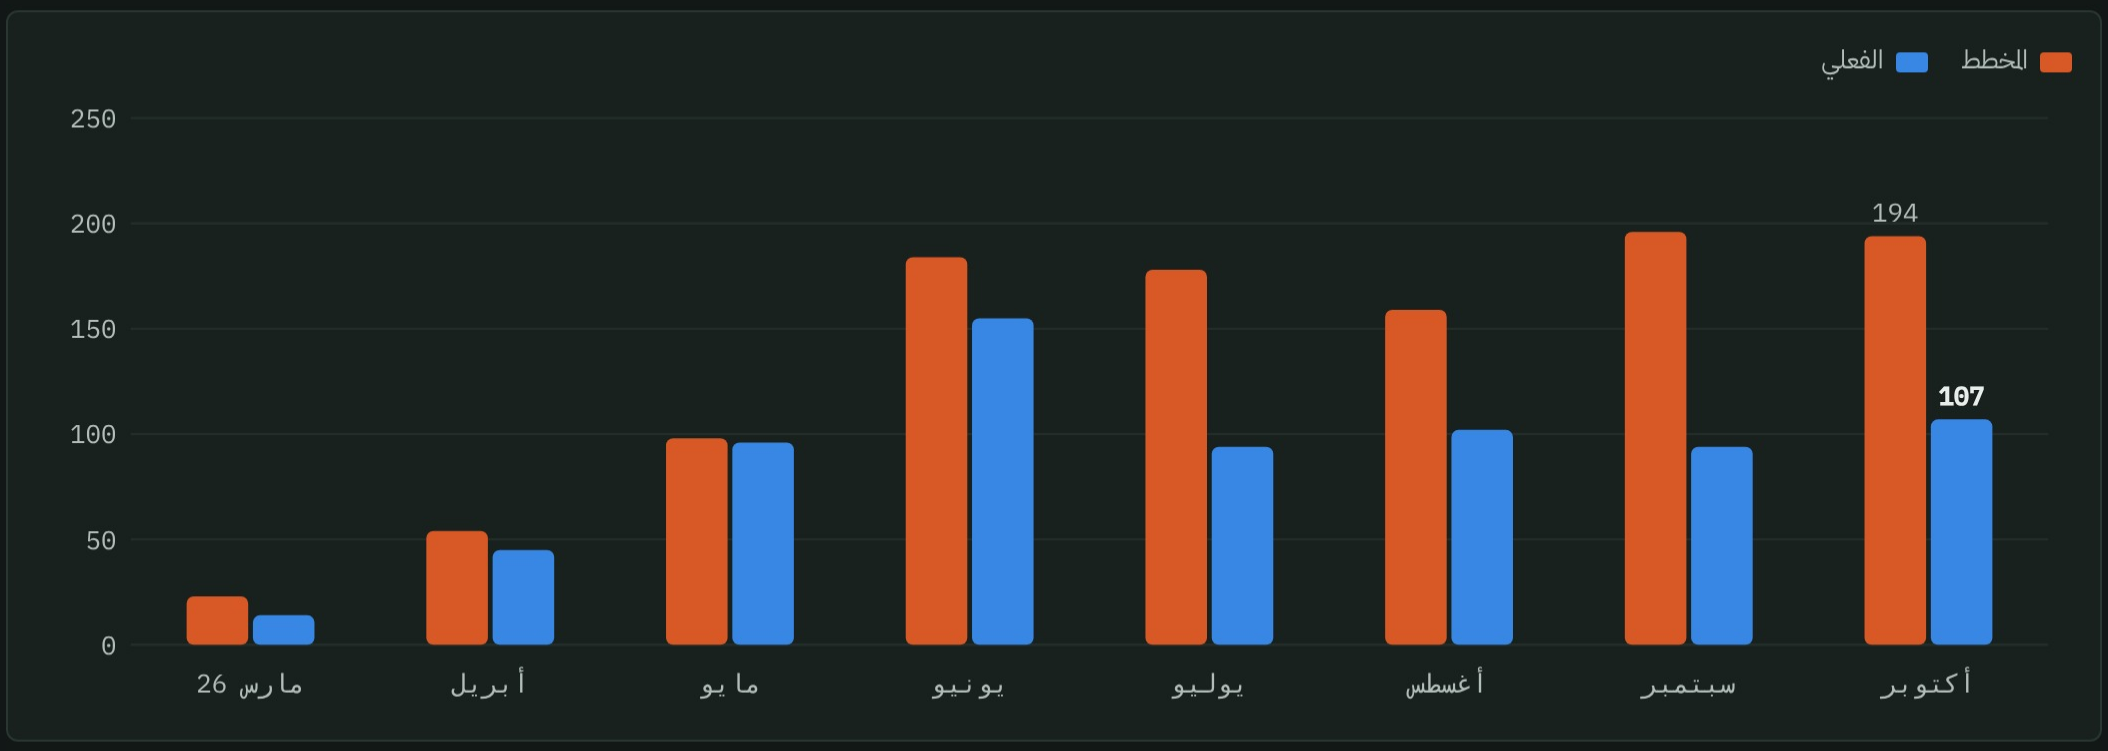

عدد العمالة في أكتوبر الآن 107 مقابل 194 مخططاً (−45%): 77 عاملاً مقابل 175 مخططاً، و30 موظفاً مقابل 19. وتُظهر الورقة الشهرية 27 معدة مقابل 27 مخططة، بينما يُظهر ملخص التقرير 8 مقابل 9.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	33,997,787
التغييرات المحتملة	−204,183
قيمة العقد المعدلة	33,793,604
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	33,997,787
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. تذكر ورقة Conclusion أن 33,997,787 شاملة ضريبة القيمة المضافة. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	5
القيمة الإجمالية	4,943,711
الخصومات والغرامات	11,000
الصافي شاملاً الضريبة	5,674,267
المعتمد من مدير المشروع - مدن / المدفوع	0 / 0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	6,488,909

المفوتر 14.6% من قيمة العقد المعدلة مقابل إنجاز فعلي 44.6%. ولم يُقدَّم مستخلص جديد هذا الأسبوع. المستخلصات الخمسة معتمدة من الاستشاري، لكن لم يُسجَّل اعتماد أي منها من مدير المشروع في مدن ولا دفعه.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.84

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	132,050
ساعات العمل هذا الأسبوع	6,480
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	160 / 156

تفتيش مدن للصحة والسلامة في الموقع 13-أكتوبر-2026 (التقرير رقم 13). وأرقام السلامة دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

الجودة التقييم 0.86

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	704 / 683
طلبات الفحص المعلقة	19
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	106 / 103
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة / المعلقة	23 / 33 / 1
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	27 / 25
تقديمات المخططات التنفيذية المنجزة	141 من 145
تقديمات اعتماد المواد المنجزة	130 من 147

قائمة ملاحظات مراقبة الجودة رقم 26، يوم التفتيش 26-أكتوبر-2026. وصدر 47 طلب فحص هذا الأسبوع.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
تمديدات الجهد المتوسط في مسار الحفر	المسؤول	أُثيرت في 10-أكتوبر-2026 (جازان، وفق سجل المخاطر والمشكلات) وما زالت قائمة، وقد تجاوزت تاريخ الإغلاق المتوقع 17-أكتوبر-2026. تتعارض تمديدات الجهد المتوسط مع مسار الحفر، والتنسيق بشأن المعالجة مستمر، والمقاول بانتظار إذن المالك.
توريد القبة الهوائية	المقاول	لا يزال مذكوراً بوصفه تحدي المشروع في الملخص الأسبوعي. ويصنّف سجل المخاطر تأخر توريد مواد القبة الهوائية بدرجة عالية (20)، والمعالجة متابعة مستمرة مع مدن لتسريع اعتماد تصميم القبة الهوائية، والموعد المستهدف 15-نوفمبر-2026. وفي P6، لأكثر القباب الثلاث حرجاً، لم يبدأ اعتماد غشاء PVC وأبواب الطوارئ والأبواب العازلة، وفائضها الزمني −91 يوماً.

سجل المخاطر دون تغيير عن الأسبوع الماضي: 9 مخاطر قائمة، ستة منها عالية (تأخر توريد القبة الهوائية، وجودة الهواء في الأماكن المغلقة، وصيانة المعدات وشهاداتها، والحماية من السقوط، والإجهاد الحراري، وفصل الحركة المرورية العامة)، واثنان متوسطان (الدخول غير المصرح به إلى الموقع، والتخزين غير الآمن للمواد) وواحد منخفض (الأدوات المعيبة). والمشكلات السبع السابقة في سجل المشكلات مغلقة.

ملاحظات على البيانات

- قفزت نسبة الإنجاز الفعلي الرئيسية في التقرير الأسبوعي من 42.41% إلى 60.74% (والمخطط من 51.03% إلى 76.10%)، مع 18.33% "منجزة هذا الأسبوع". وسبب القفزة صف أضافه إجمالي هذا الأسبوع وأغفله إجمالي الأسبوع الماضي: مجموعة "No W-Construction" في P6 بساعات مخططة 84,775.4 ومنجزة 65,538.7. وكانت ساعاتها المنجزة 65,538.7 في الأسبوع الماضي أيضاً، وموازنتها البالغة 106,595.4 ساعة غير داخلة في المقام البالغ 406,255 ساعة. لذا يستخدم هذا التقرير مراحل هيكل تجزئة العمل فقط كما في الأسبوع الماضي: 44.6% مقابل 55.2%.
- أسبوع التقرير هو أسبوع المشروع محسوباً من تسليم الموقع (من 26-مارس-2026 إلى 26-أكتوبر-2026 تساوي 214 يوماً، أي الأسبوع 30). تحمل الملفات الرقم التسلسلي WPR-26 ولا تذكر رقم الأسبوع.
- قيم هذا الأسبوع مقارنة بين هذا التقرير وتقرير 19-أكتوبر-2026 (الأسبوع 29).
- تذكر أوراق الملخص الأسبوعي (الملفان 15 و16) وملف (12) Conclusion وملف (10) Tracking Progress نسبة مبنية على التكلفة على أنها "الفعلي". ويستخدم هذا التقرير التقدم الفعلي (بعدد ساعات العمل) فقط.
- قائمة الأعمال المنفذة هذا الأسبوع (الملفان 15 و16) تكرر نص الأسبوع الماضي حرفياً تقريباً، ولم تتغير ورقة Major Quantities والمستخلصات وإحصاءات السلامة وسجل المخاطر عن الأسبوع الماضي.
- لا يزال الملف 16 يذكر مقاولاً مختلفاً (شركة الانجاز للتجارة والمقاولات) ومدير مشروع (عبد الله الشنيفي) وقطاعاً (القطاع الأوسط) وتاريخ بدء 24-نوفمبر-2025 ونهاية عقد 23-مايو-2026.
- غيّر ملخص التوريدات في ملف Conclusion إجمالياته عن الأسبوع الماضي (حديد التسليح من 25 إلى 160 طناً، والخرسانة من 100 إلى 1,500، والإنترلوك من 6,400 إلى 8,044 م²، والبردورات من 17,550 إلى 8,900 م.ط)، ويذكر توريد 1,900 من البردورات، مقابل 2,000 من 8,868 م.ط في جدول Procurement Log.
- تُظهر إحصاءات الجودة إغلاق 33 تقرير عدم مطابقة مقابل 23 صادراً.
- لا تزال تواريخ الخطة الأساسية في ورقة Milestones لاعتماد البرنامج (02-يونيو-2026) والتجهيز (25-يناير-2027) والاختبار والتشغيل (29-أبريل-2026) تبدو مُزاحة، ولا يزال ملف Conclusion يؤرخ نهاية المشروع بـ 25-يناير-2026.
- لا تزال ورقة إحصاءات السلامة تغطي الفترة 06–13 أكتوبر 2026 (137,270 ساعة عمل تراكمية و159 اجتماع توعية)، مقابل 132,050 و156 في ملخص التقرير. ولا يزال سجل المستخلصات يحسب 47 مستخلصاً معتمداً من الاستشاري مقابل 5 مقدمة.
- الملف 08 مسمّى باسم تقرير 19-أكتوبر-2026 (WPR-25) ولا يحتوي إلا صفحة عنوان.

أُعدّ في 01-نوفمبر-2026 من التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 19-أكتوبر-2026 و26-أكتوبر-2026.
