مبادرة الملاعب بالمنطقة الشرقية (عرعر, واحة الاحساء, الدمام الثانية)

Playground Initiative for Eastern Region (Arar, Hasa Oasis, Dammam 2nd)

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة بروفاست المحدودة	إيجيس (EGIS)	م. محمد العيسى	03-Mar-2026	02-Jan-2027

النطاق: ملاعب كرة قدم وكرة سلة وبادل، وقبة هوائية، ومبنى خدمات ودورات مياه، وأعمال تنسيق المواقع، ومواقف سيارات، ومسارات للدراجات والمشي في ثلاثة مواقع: واحة الأحساء، والمدينة الصناعية الثانية بعرعر، والمدينة الصناعية الثانية بالدمام.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بلغ المشروع 53.9% مقابل 53.7% مخططاً، أي متقدم بنسبة 0.2% على الخطة الحالية (مؤشر الأداء الزمني 1.00). وأنجز 3.6% هذا الأسبوع مقابل 3.6% مخططاً. وأعمال التنفيذ في واحة الأحساء متقدمة (61.4% مقابل 44.9% مخططاً)، بينما موقع عرعر متأخر بنسبة 1.9% والتوريدات متأخرة بنسبة 28.6%.

نسبة الإنجاز الفعلي
53.9% / 53.7% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.00 +0.2%

التقدم هذا الأسبوع
+3.6% / +3.6% مخطط
● مطابق للخطة الأسبوعية

المدة المنقضية من العقد
77.7% · اليوم 237 من 305
▼ الانتهاء المتوقع 14-مارس-2027


المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
15.0% · 4.50 مليون ريال
6 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 20-أكتوبر-2026

يُتوقع انتهاء المشروع متأخراً 71 يوماً.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026) انتهاء المشروع في 14-مارس-2027، مقابل تاريخ انتهاء العقد 02-يناير-2027. ويُظهر P6 فائضاً زمنياً –57 يوماً على انتهاء المشروع و268 نشاطاً مفتوحاً بفائض سالب. وجميع معالم اكتمال المواقع الثلاثة متوقعة بين 28-فبراير-2027 و01-مارس-2027. وتوريد القبة الهوائية هو سبب التأخير المذكور في الملخص الأسبوعي. ومقارنة بالخطة الأساسية الأصلية التي كانت تستهدف 85.7% بنهاية أكتوبر، بلغ المشروع 53.9%.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة) بقيم نهاية كل شهر، وقيمة أكتوبر الفعلية عند تاريخ البيانات 26 أكتوبر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، التقرير الأسبوعي 26-أكتوبر-2026.

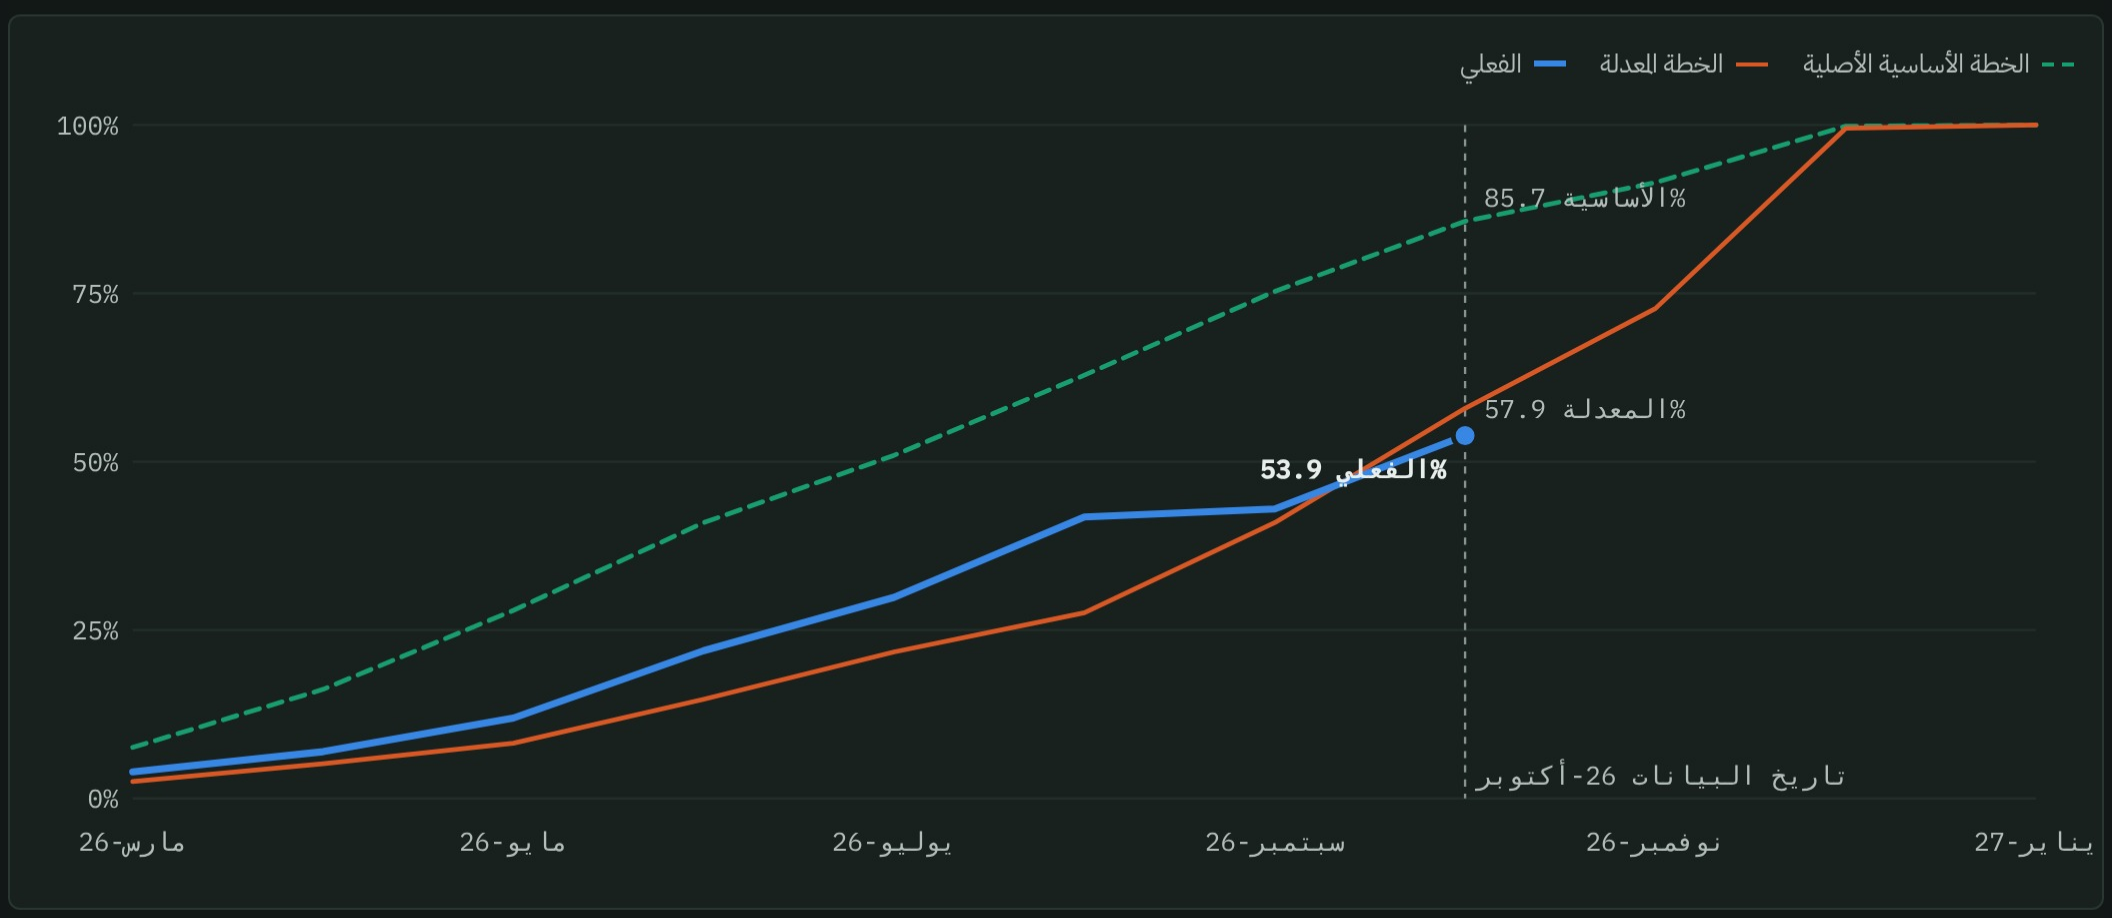

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
28-Sep-2026	—	43.0	—	—	—
05-Oct-2026	—	46.0	—	+3.0	—
12-Oct-2026	—	46.9	—	+0.9	—
19-Oct-2026	50.1	50.3	+0.2	+3.4	1.00
26-Oct-2026	**53.7**	**53.9**	**+0.2**	**+3.6**	**1.00**

القيم الفعلية هي النقاط الأسبوعية في ورقة Physical-Chart Data، نقطة لكل تاريخ بيانات (يوم الاثنين). والقيم المخططة لـ 19 و26 أكتوبر مأخوذة من مستخرجات P6 في ورقة Progress، ولا تعطي الورقة خطة أسبوعية للأسابيع السابقة. ولم يُرفع أي تقرير أسبوعي سابق لهذا المشروع.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Weekly Progress Report بتاريخ 26-أكتوبر-2026.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5.0%	97.3%	99.5%	+2.3%	1.02	▲ متقدم
التوريدات	12.0%	80.3%	51.7%	−28.6%	0.64	▼ متأخر
التنفيذ	75.0%	48.2%	52.9%	+4.7%	1.10	▲ متقدم
التنفيذ: عرعر	24.9%	47.1%	45.2%	−1.9%	0.96	▼ متأخر قليلاً
التنفيذ: واحة الأحساء	25.0%	44.9%	61.4%	+16.6%	1.37	▲ متقدم
التنفيذ: الدمام	25.0%	52.7%	52.1%	−0.6%	0.99	● وفق الخطة
الاختبار والتشغيل	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	—	○ لم يبدأ
الإقفال	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	—	○ لم يبدأ
الإجمالي	100%	**53.7%**	**53.9%**	**+0.2%**	**1.00**	● وفق الخطة

حسب الموقع، شاملاً جميع المراحل: عرعر 50.5% مقابل 54.1% مخططاً، وواحة الأحساء 61.0% مقابل 53.0%، والدمام 53.4% مقابل 57.1%. ويضم تحديث P6 عدد 2,150 نشاطاً: 1,818 مكتملاً و26 قيد التنفيذ و306 لم تبدأ. وتاريخ انتهائه المجدول 14-مارس-2027، أي بعد تاريخ العقد بـ 71 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والكمية المنفذة حتى تاريخه لبنود جدول الكميات الرئيسية، للمواقع الثلاثة مجتمعة، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026. ولا تفصل الورقة الكميات حسب الموقع. ولم يُرفع أي تقرير سابق، لذا عمود هذا الأسبوع فارغ.

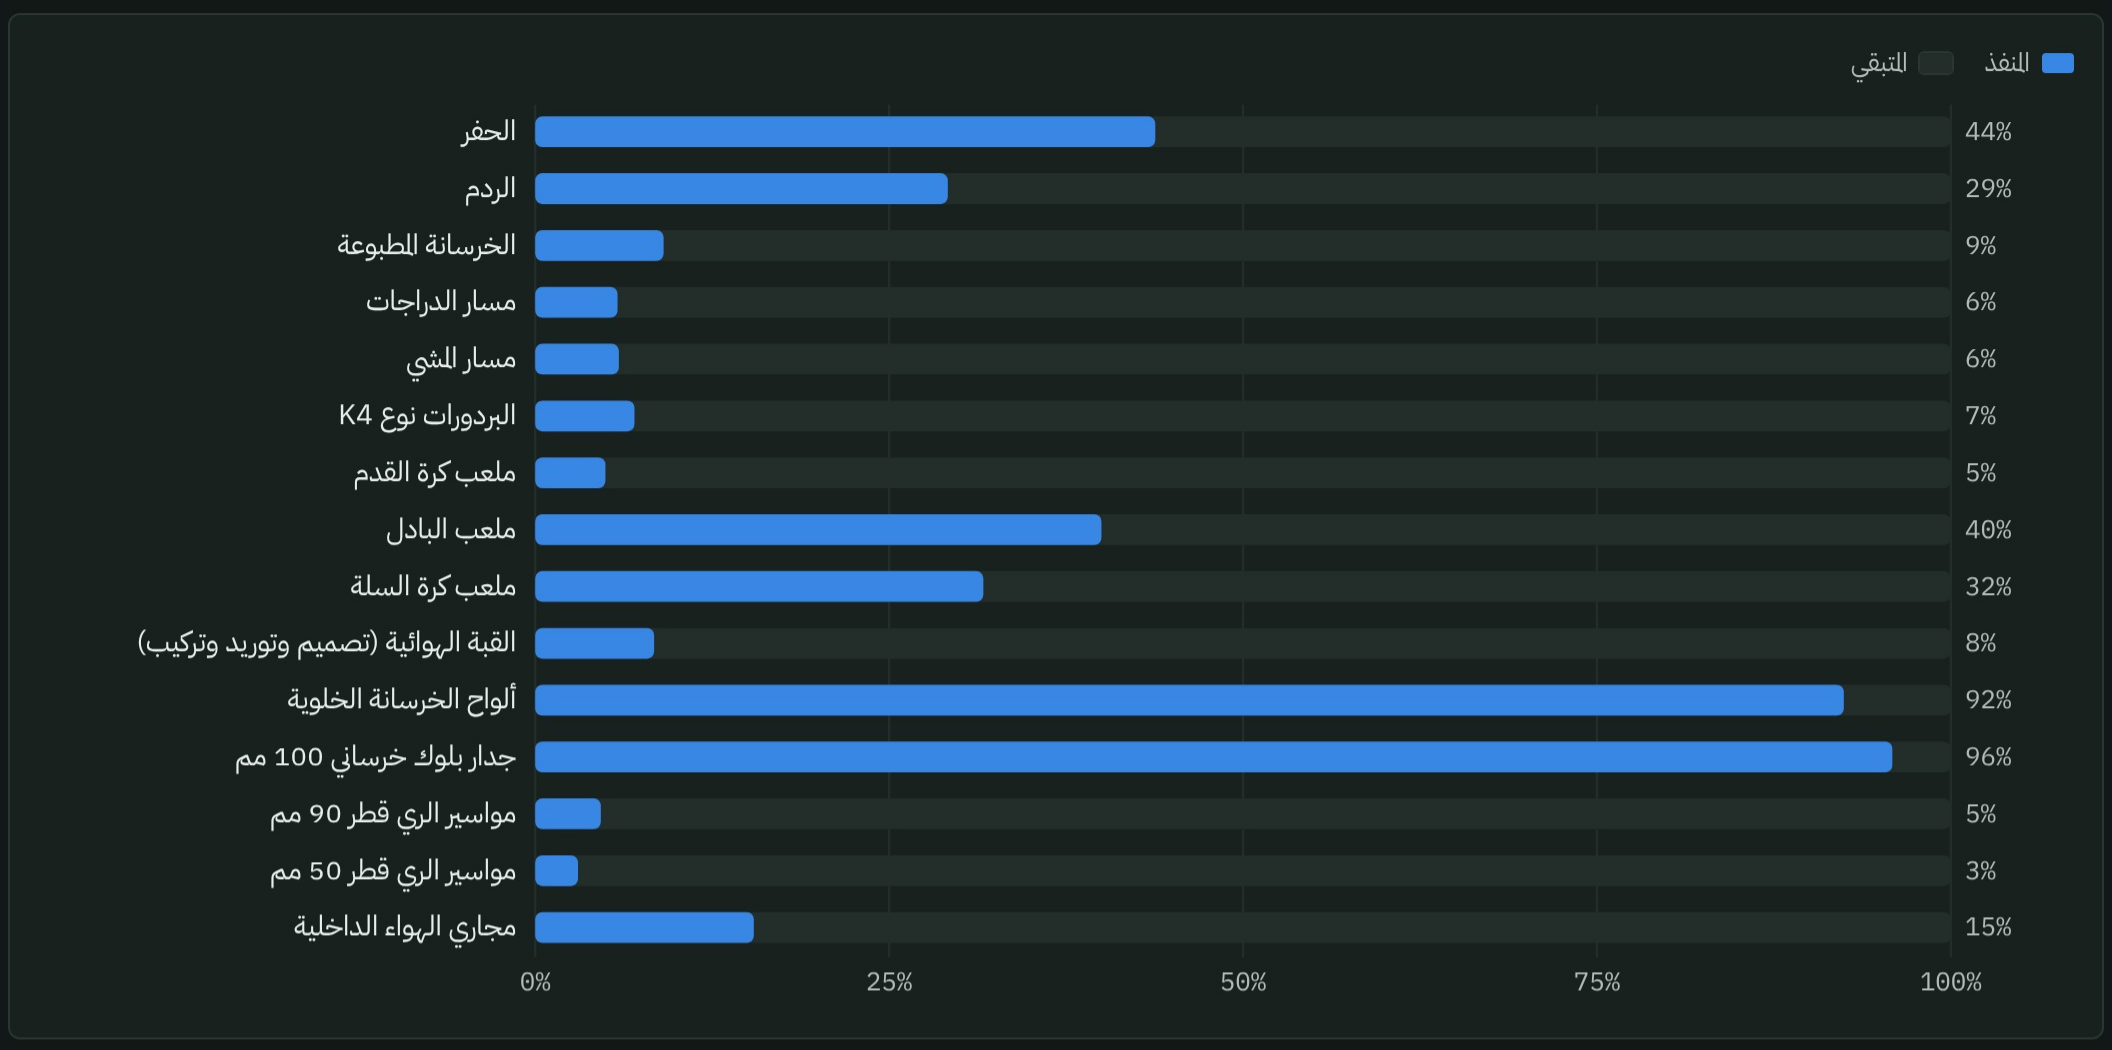

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر	جميع المواقع	م³	10,295	4,510	–	5,785	43.8%	–
الردم	جميع المواقع	م³	10,266	2,992	–	7,274	29.1%	–
الخرسانة المطبوعة	جميع المواقع	م²	1,800	163.3	–	1,637	9.1%	–
مسار الدراجات	جميع المواقع	م²	2,300	133.8	–	2,166	5.8%	–
مسار المشي	جميع المواقع	م²	2,200	130.1	–	2,070	5.9%	–
البردورات نوع K4	جميع المواقع	م.ط	9,080	636.7	–	8,443	7.0%	–
ملعب كرة القدم	جميع المواقع	م²	3,000	148.9	–	2,851	5.0%	–
ملعب البادل	جميع المواقع	م²	600	240	–	360	40.0%	–
ملعب كرة السلة	جميع المواقع	م²	1,530	484.4	–	1,046	31.7%	–
القبة الهوائية (تصميم وتوريد وتركيب)	جميع المواقع	بند	3	0.3	–	2.7	8.4%	–
ألواح الخرسانة الخلوية	جميع المواقع	م²	750	693.3	–	56.7	92.4%	–
جدار بلوك خرساني 100 مم	جميع المواقع	م²	135	129.4	–	5.6	95.9%	–
مواسير الري قطر 90 مم	جميع المواقع	م.ط	750	34.8	–	715.2	4.6%	–
مواسير الري قطر 50 مم	جميع المواقع	م.ط	350	10.6	–	339.4	3.0%	–
مجاري الهواء الداخلية	جميع المواقع	كغ	300	46.3	–	253.7	15.4%	–

حالة المواقع هذا الأسبوع

واحة الأحساء: اكتملت طبقة الأسفلت في ملعب كرة القدم، وجارٍ تركيب الإنترلوك بين الملاعب، وتم تركيب أعمدة الإنارة والكشافات، والزراعة جارية. الدمام: دمك لتركيب الإنترلوك في الملاعب الثلاثة، واكتمل خط الصرف وجارٍ ردمه، وجارٍ تركيب وحدات الإنارة. عرعر: اكتمل سيراميك الأرضيات، وجارية أعمال الجبس بورد والدهان في مبنى الخدمات، وتم تمديد ودفن تمديدات أعمدة الإنارة. وجارية أعمال الشدات والحديد لقواعد مدخل القبة الهوائية في عرعر والدمام.

بنود تجاوزت كمية جدول الكميات

تُذكر عدة بنود بكميات تتجاوز إجمالي جدول الكميات: مواسير uPVC قطر 150 مم للصرف الخارجي (126.81 من 50 م)، واللياسة (551.07 من 471 م²)، وغشاء عزل الأساسات (101.55 من 60 م²)، والبلاطة على الأرض (46.17 من 45 م³)، وشرائح البولي إيثيلين ومكافحة النمل الأبيض (288.75 من 270 م²). وقد استُبعدت من المخطط والجدول.

المعالم الرئيسية

تعطي ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي وتحديث P6 تواريخ التوقع نفسها. والفائض الزمني من تحديث P6 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026).


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	03-Mar-2026	03-Mar-2026	03-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد البرنامج الزمني الأساسي	01-Apr-2026	04-Apr-2026	04-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	02-Apr-2026	02-Apr-2026	02-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال أعمال التسوية	02-Apr-2026	02-May-2026	02-May-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التصميم الهندسي	02-May-2026	27-Dec-2026	27-Dec-2026	+1	▼ متأخر
اكتمال مبنى دورات المياه	02-Aug-2026	01-Mar-2027	01-Mar-2027	−50	▼ متأخر
اكتمال منطقة الملاعب	24-Aug-2026	01-Mar-2027	01-Mar-2027	−50	▼ متأخر
اكتمال أعمال المناظر الطبيعية	02-Nov-2026	01-Mar-2027	01-Mar-2027	−49	▼ متأخر
اكتمال أعمال موقع عرعر	21-Dec-2026	01-Mar-2027	01-Mar-2027	−49	▼ متأخر
اكتمال أعمال موقع واحة الأحساء	21-Dec-2026	01-Mar-2027	01-Mar-2027	−49	▼ متأخر
اكتمال أعمال موقع الدمام	21-Dec-2026	28-Feb-2027	28-Feb-2027	−48	▼ متأخر
اكتمال الاختبار والتشغيل	21-Dec-2026	09-Mar-2027	09-Mar-2027	−56	▼ متأخر
انتهاء المشروع	02-Jan-2027	14-Mar-2027	14-Mar-2027	−57	▼ متأخر

القبة الهوائية وحزم الأعمال الكهربائية والتشطيبات المتأخرة تحدد تاريخ الانتهاء.

في P6 يمتد توريد غشاء PVC من 27 أكتوبر إلى 17-ديسمبر-2026، وتركيب الغشاء من 23-ديسمبر-2026 إلى 14-يناير-2027، بفائض زمني بين −5 و−31 يوماً. ويقع أكبر فائض سالب (−57 يوماً) على أنظمة التحكم واللوحات الإرشادية للقبة الهوائية، والمفاتيح والمقابس، ومخارج الكهرباء، وكاميرات المراقبة، واختبار الأعمال الكهروميكانيكية لمنطقة الملاعب. ويُتوقع الاختبار والتشغيل للمناطق الثلاث بين 20 فبراير و28-فبراير-2027.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المورّدة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ملف التوريدات بتاريخ 26-أكتوبر-2026.

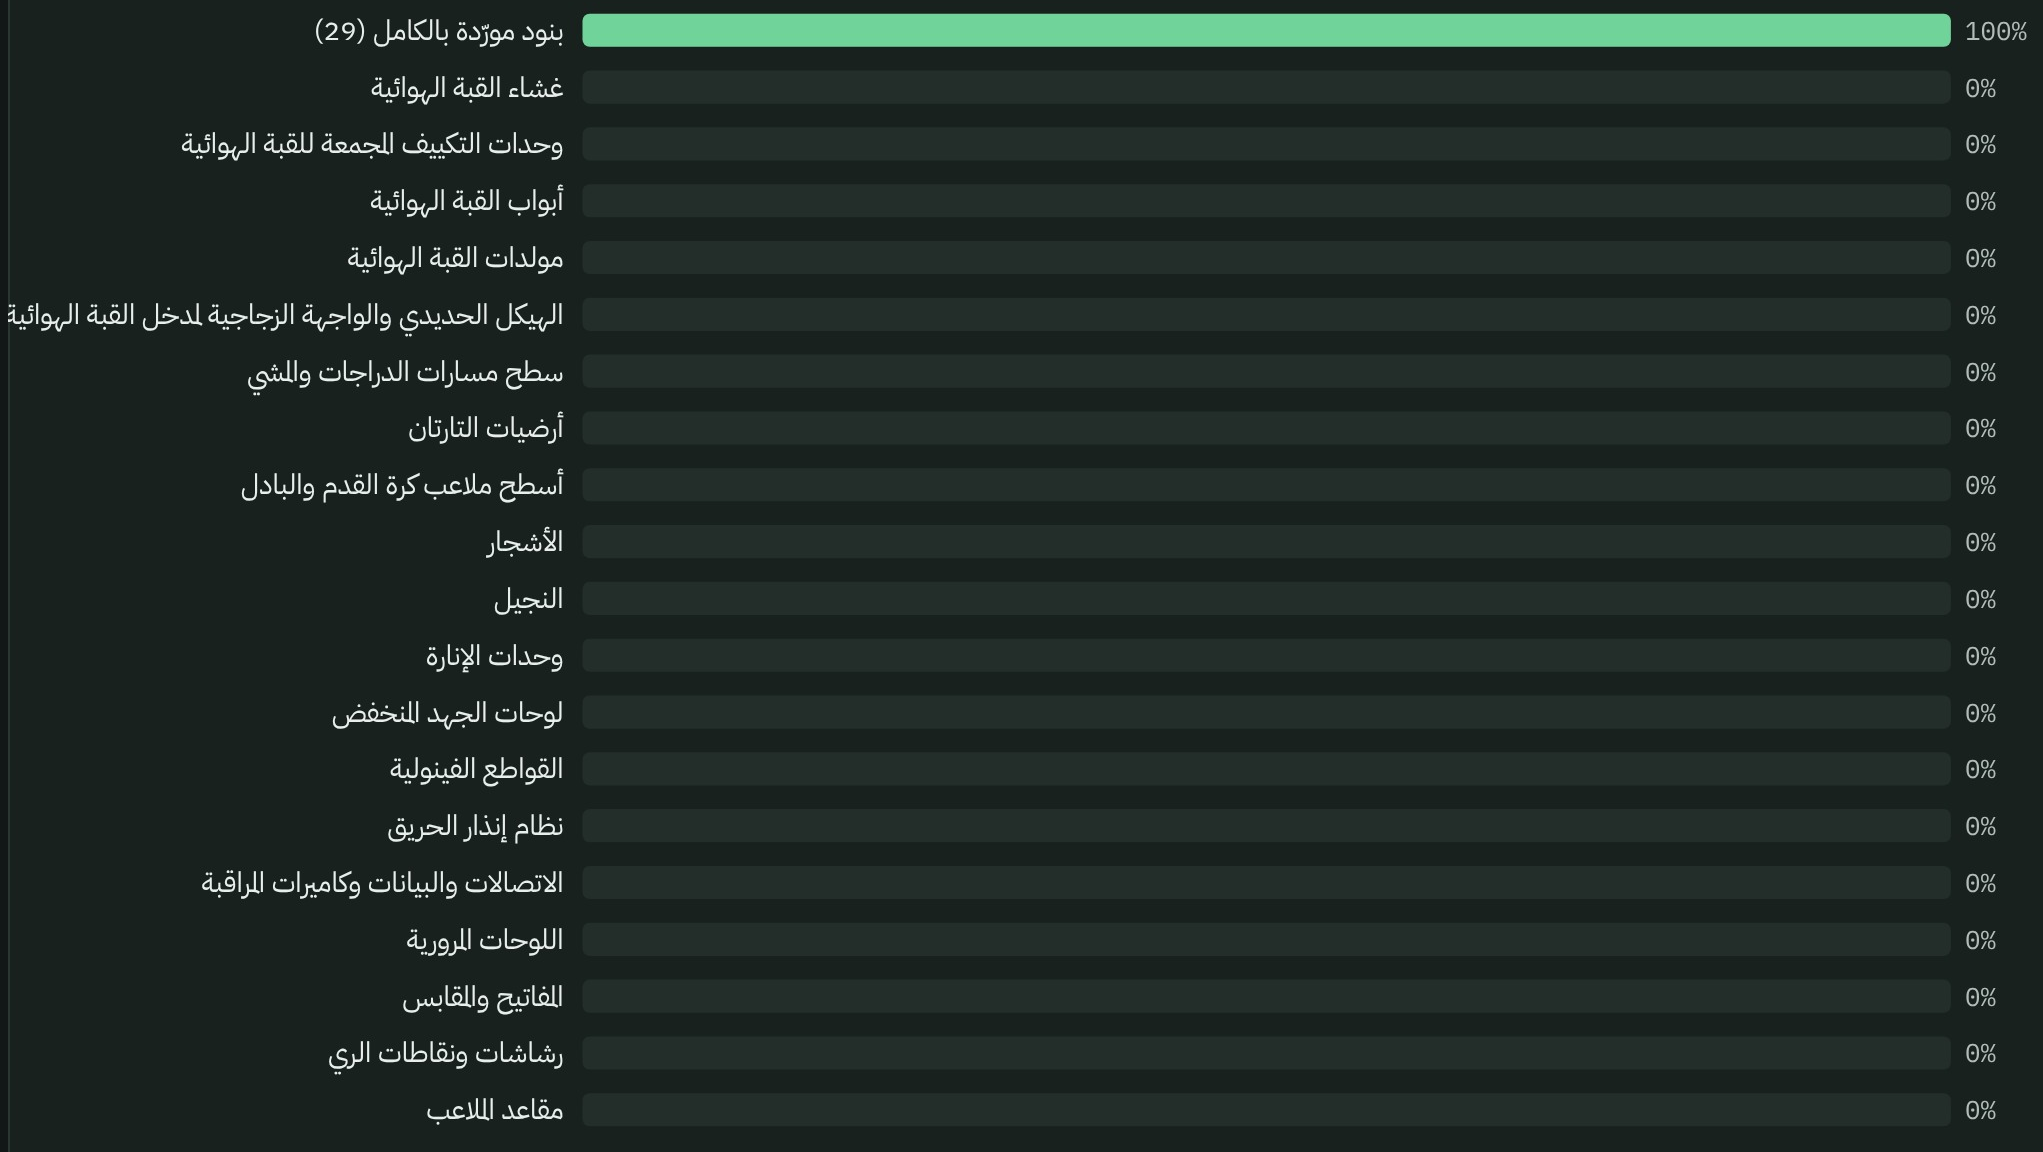

يحصي ملخص التوريدات في التقرير الأسبوعي 119 مادة: صدر أمر الشراء لـ 116 منها ومتبقي 3، ووصلت 99 مادة إلى الموقع ومتبقي 20.

القبة الهوائية: لم يورَّد شيء بعد


صدرت أوامر الشراء ودُفعت الدفعات المقدمة للغشاء والمثبّتات ومقاطع L والإنارة والتهوية والمولدات ومفاتيح التحويل الآلي والأبواب ونظام الإطفاء واللوحات والمواد الكهربائية، والتوريد مجدول من 01 نوفمبر إلى 05-ديسمبر-2026. وما زالت وحدات التكييف المجمعة (18 وحدة) في مرحلة الاعتماد النهائي، وعينة المثبّتات بانتظار الاعتماد، وعينات الأبواب يُعاد تجهيزها، والهيكل الحديدي والواجهة الزجاجية للمدخل قيد التصنيع.

التشجير وأسطح المسارات والملاعب

صدرت أوامر الشراء ودُفعت قيمة الأشجار (298) والنجيل (7,030 م²) وأرضيات التارتان (510 م²) وأسطح مسارات الدراجات والمشي (4,281 م²) وأسطح ملاعب كرة القدم والبادل، والتوريد مستحق بين 29 أكتوبر و30-نوفمبر-2026. وطبقة التشطيب للمسارات والملاعب مرتبطة بتشطيب القبة الهوائية. ووحدات الإنارة (105) مدفوعة وجاهزة للتوريد، ولوحات الجهد المنخفض (9) قيد التصنيع.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمال والموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

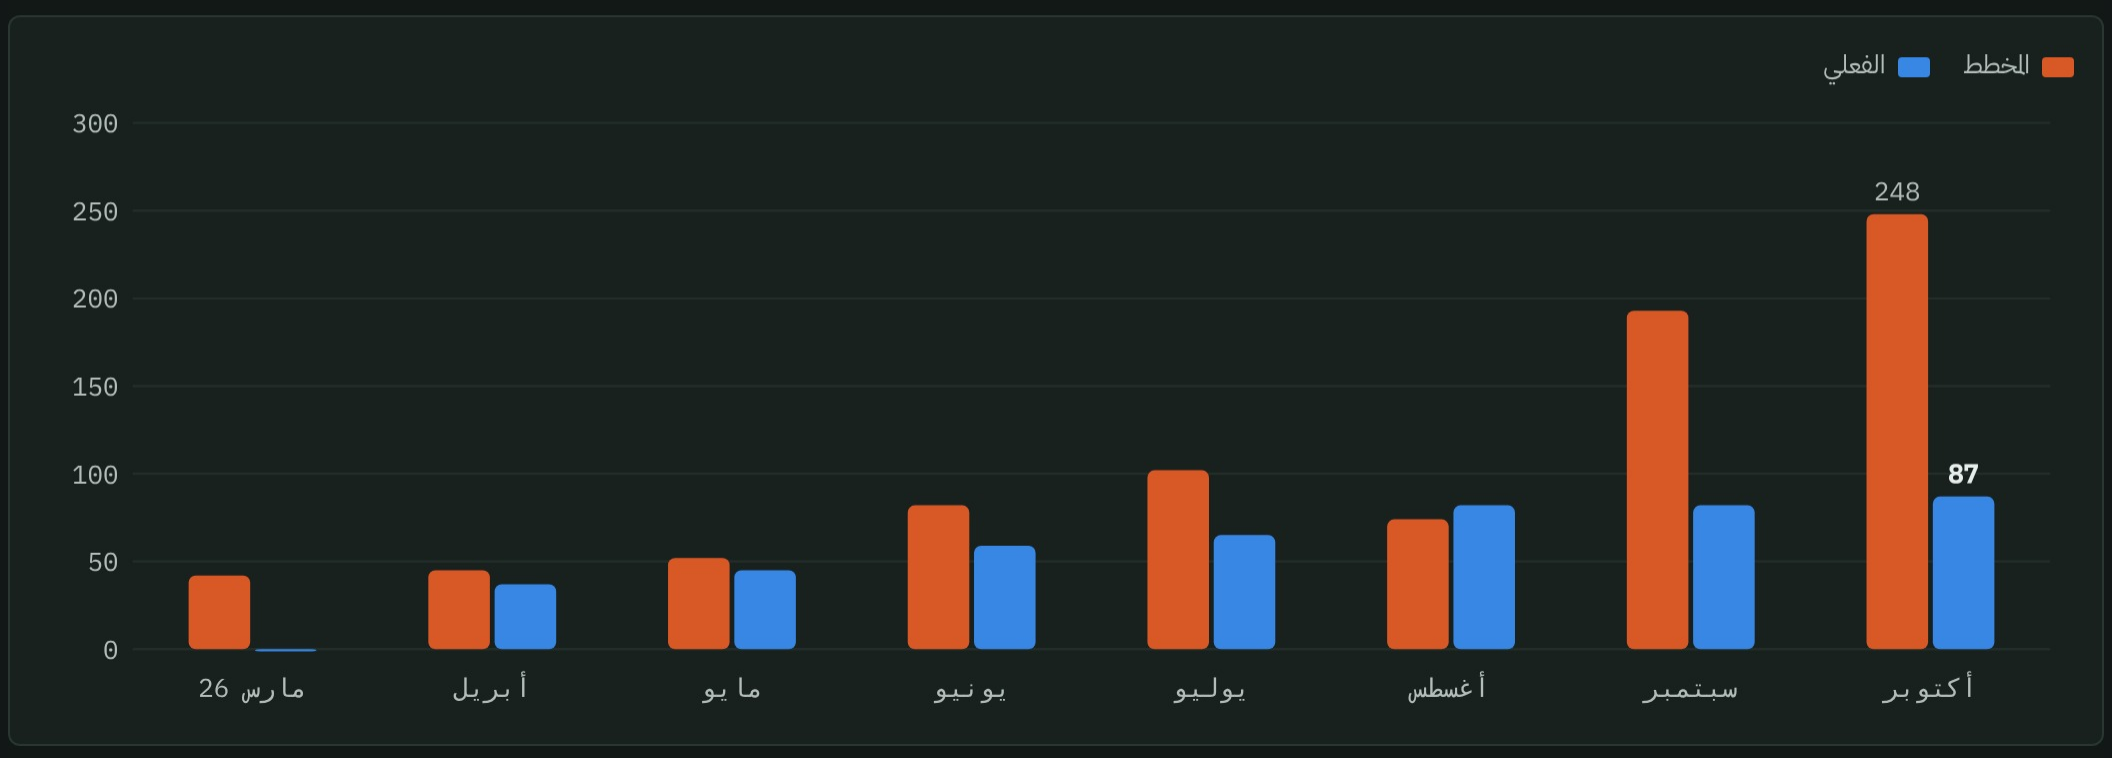

عدد العمالة في أكتوبر 87 مقابل 248 مخططاً (−65%): 68 عاملاً مقابل 229 مخططاً، و19 موظفاً كما هو مخطط. والمعدات في الموقع 12 مقابل 37 مخططة. وترتفع الخطة إلى 380 في ديسمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الملاعب	20,775,269
أعمال الموقع العام	5,722,500
المباني الخدمية	3,500,083
قيمة العقد (غير شاملة الضريبة)	**29,997,852**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	34,497,529
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال، من ورقتي Progress Summary وInvoice Log. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	6
القيمة الإجمالية	4,501,527
المعتمد من مدير المشروع - مدن (5 مستخلصات)	3,673,916
المدفوع (3 مستخلصات)	2,178,751
الخصومات والغرامات	59,000
الصافي شاملاً الضريبة	5,117,756
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	5,381,841

المفوتر 15.0% من قيمة العقد مقابل نسبة إنجاز فعلي 53.9%، وقيمة طلبات الفحص المعتمدة 17.9%. ولا توجد دفعة مقدمة أو محتجزات مسجلة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.89

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	44,620
ساعات العمل هذا الأسبوع	1,450
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	32 / 107
التدقيقات الداخلية	5

الجودة التقييم 0.86

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة / المعلقة	952 / 914 / 38
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة / المعلقة	184 / 167 / 17
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة / المعلقة	29 / 27 / 2
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة / المعلقة	14 / 6 / 8
تقديمات المخططات التنفيذية (134 مخططة)	159
تقديمات اعتماد المواد (119 مخططة)	140

أعداد تراكمية من ورقة Quality-Stat. وجميع البنود المعلقة عمرها أقل من 10 أيام.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
توريد القبة الهوائية	المقاول	تأخر تصنيع وتوريد القبة الهوائية هو سبب التأخير المذكور في الملخص الأسبوعي. ويصنّف سجل المخاطر تأخر توريد هذا البند طويل التوريد بأنه مرتفع الاحتمال وشديد الأثر. ويجري توريد الغشاء وتركيبه بفائض زمني سالب.
تقديمات المخططات التنفيذية	المقاول	قائمة منذ 03-أبريل-2026، ويُتوقع إغلاقها في 29-أكتوبر-2026. ومتبقٍ مخططان تنفيذيان لم يُقدَّما.
التوريدات متأخرة عن الخطة	المقاول	التوريدات عند 51.7% مقابل 80.3% مخططاً (إنجاز فعلي). وعشرون مادة لم تصل إلى الموقع بعد، وثلاثة أوامر شراء لم تصدر بعد.
العمالة والمعدات	المقاول	68 عاملاً في الموقع في أكتوبر مقابل 229 مخططاً، و12 معدة مقابل 37 مخططة، بينما تتطلب الخطة 361 عاملاً في ديسمبر.
التداخل بين التشطيبات والقبة الهوائية	المقاول	يربط ملف التوريدات الطبقة النهائية للمسارات والملاعب بتشطيب القبة الهوائية لتفادي أي تلف، وهذه الأسطح مدفوع 60% من قيمتها لكنها لم تورَّد.

أُغلق هذا الأسبوع: فرق المناسيب في موقع الأحساء، وعدم إدراج خزان الصرف (البيارة) في موقع الأحساء في المستخلص. وتشمل المخاطر القائمة الأخرى في السجل الدخول إلى الموقع، والأماكن المغلقة، وتخزين المواد، وشهادات المعدات، والعمل على ارتفاع، والحرارة، وفصل الحركة المرورية.

ملاحظات على البيانات

- رقم الأسبوع: تذكر ورقة Milestones عبارة "Current Contract Weeks: 26 of 44"، وهو رقم التقرير (WPR-26) ولا يتفق مع التواريخ. فمن تسليم الموقع في 03-مارس-2026 إلى تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026 تمضي 237 يوماً، أي الأسبوع 33، وهو ما يعتمده هذا التقرير. وتذكر ورقتا Weekly Progress Report وHSE رقم التقرير 25.
- التقدم الفعلي الأسبوعي في التقرير (20,555 ساعة عمل، 4.91%) هو الفرق بين مستخرجَي P6 فيه (231,540 ساعة في 26 أكتوبر و210,985 في 19 أكتوبر). أما رقمه حتى تاريخه فهو 225,576 ساعة (53.9%) وليس 231,540 (55.3%) الواردة في مستخرج 26 أكتوبر، والفرق في ساعات التوريدات لموقعي واحة الأحساء (7,939 مقابل 10,266) والدمام (7,414 مقابل 11,116). ويعتمد هذا التقرير 53.9% وسلسلة Physical-Chart Data التي تعطي +3.6% هذا الأسبوع.
- تذكر ملفات ملخص مدن (Look Ahead، والأعمال المنفذة ونسب الإنجاز، والأعمال المنفذه خلال الإسبوع) وورقة Progress Summary نسبة مبنية على التكلفة على أنها نسبة الإنجاز الفعلي، ولم تُستخدم هذه الأرقام هنا.
- يحمل ملف الأعمال المنفذه خلال الإسبوع بيانات مشروع آخر: مدير المشروع عبد الله الشنيفي، والمقاول شركة الانجاز، والبدء 24-نوفمبر-2025، ونهاية العقد 23-مايو-2026، والقطاع الأوسط. ويذكر ملف Look Ahead الاستشاري إيجيس في عمود المقاول.
- أسماء المعالم في جدول ورقة Weekly Progress Report مُزاحة صفاً واحداً عن ورقة Milestones، فمثلاً "Completion of Toilet Building" تحمل تواريخ أعمال التسوية. ومعلم اكتمال التصميم الهندسي مؤشَّر عليه كمنجز رغم أن P6 يتوقعه في 27-ديسمبر-2026، ويُظهر ملف Tracking Progress معلم مبنى دورات المياه بنسبة 100% بينما لم يبدأ في P6.
- لم يمكن استخدام صور للموقع: الصور الست في ورقة Weekly Photos بالتقرير الأسبوعي مضمّنة بأبعاد 414 × 311 بكسل، أقل من الحد الأدنى 600 بكسل، ولم تُرفع ملفات صور منفصلة.
- ورقة Major Quantities: تتجاوز عدة بنود كمية جدول الكميات (انظر نطاق العمل)، وقيمة "Plan To Date" تساوي الكمية الكاملة لكل البنود، وتُظهر بعض الصفوف !DIV/0#. وتبدو الكميات المنفذة منخفضة مقارنة بالوصف (مثلاً 636.74 م.ط من البردورات K4، بينما يذكر ملف التوريدات تركيب 6,448 م.ط من البردورات)، يُرجى تأكيد أساس القياس.
- يحمل اسم ملف Failed Start List تاريخ 19-10-2026، أي الأسبوع السابق. وتُظهر عدة خلايا ملخص في ورقتي DB وInvoice Log أخطاء !REF#.
- عدد المعدات في الموقع 10 في أحد جداول ورقة Manpower و12 في جدول آخر. وتاريخا إغلاق لتدقيقَي سلامة في ورقة HSE-Stat مسجلان في عام 2006.
- يختلف توزيع قيمة العقد حسب الموقع بين ورقة Weekly Progress Report (عرعر 10,110,715) ومستخرج P6 في ورقة Progress (عرعر 10,226,640).
