تطوير البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة

Infrastructure Development in the Third Industrial City, Jeddah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الرواف للمقاولات	إيجيس (Egis)	أحمد الكتبي	16-Mar-2025	15-Mar-2028

النطاق: شبكات الصرف الصحي وتصريف السيول (إلى البحيرات) والري ومياه الشرب، وتمديدات الجهد المتوسط 13.8 ك.ف، والإنارة، وتمديدات الاتصالات، والطرق الداخلية والخارجية بطبقات الأسفلت والأرصفة، ومحطتا ضخ مياه الشرب والمياه المعالجة، وثلاث محطات رفع، ومسجد. قيمة العقد 560 مليون ريال دون الضريبة، ومدته 36 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

تُقاس نسبة الإنجاز بالإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة (أيام العمل). رُفع هذا الأسبوع ملف التقرير الأسبوعي الكامل لمدن، لذا أُخذت الأرقام منه بدلاً من ملف P6: يضع ملخصه المشروع عند 58.70% مقابل 55.32% مخطط، متقدماً بنسبة 3.38%، بمؤشر أداء 1.06. أما بيانات P6 المصدّرة في الملف نفسه فتعطي نسبة أقل هي 53.45% مقابل 53.97% (مؤشر أداء 0.99)، ولم يُنجز هذا الأسبوع سوى 0.21% مقابل 0.66% مخطط.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المستخلصات حتى تاريخه (إجمالي)
58.70% / 55.32%	**+0.21%** / +0.66%	**54.5%** · اليوم 597 من 1,096	**47.1%** · 263.9 مليون ريال
مخطط	مخطط	توقع التقرير 15-مارس-2028	17 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.06 +3.38%	▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.45%		

التقدم المُعلن يستند إلى أرقام لا تؤيدها بيانات P6 في الملف نفسه.

تتجاوز أيام العمل المكتسبة في الملخص الميزانية في ثلاثة بنود (المسجد 185% والري 110% والأعمال الترابية للبلوكات 101%)، ويختلف إجمالي الميزانية فيه (169,568 يوم عمل) عن بيانات P6 المصدّرة (159,298). ووفق أساس P6 فإن المشروع متأخر بنسبة 0.52% عن خطته المعدلة وبنسبة 8.8% عن الخطة الأساسية الأصلية (62.29% مستحقة بحلول 01-نوفمبر-2026). وانخفضت أيام العمل المكتسبة إلى 514 في أكتوبر و56 حتى الآن في نوفمبر، مقابل 8,136 مخططة لأكتوبر، وإنجاز هذا الأسبوع (0.21%) ثلث المخطط (0.66%). وأضعف البنود الطرق (34.9% مقابل 51.8%) والإنارة (40.0% مقابل 68.8%). ويُنهي تحديث P6 بتاريخ 26-أكتوبر-2026 المشروع في 19-مارس-2028، أي بعد التاريخ التعاقدي بأربعة أيام، بينما لا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع 15-مارس-2028.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست من الصور العشر المرفوعة لهذا الأسبوع، مختومة بتاريخي 31-أكتوبر و01-نوفمبر-2026. أعمال الأسفلت وطبقة الأساس على طريق موبكو والطريق R100-01 وفي محطة ضخ مياه الشرب، والعزل المائي في محطة الرفع 1، والشدات في محطة ضخ المياه المعالجة. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




طبقة الأساس الإسفلتية، طريق موبكو

الطاقم والشاحنة على الطبقة الجديدة. مختومة بتاريخ 31-أكتوبر-2026، 08:03.



طبقة الأساس الإسفلتية، الطريق R100-01

فرّادة تغذيها شاحنة قلّابة. مختومة بتاريخ 31-أكتوبر-2026، 08:37.

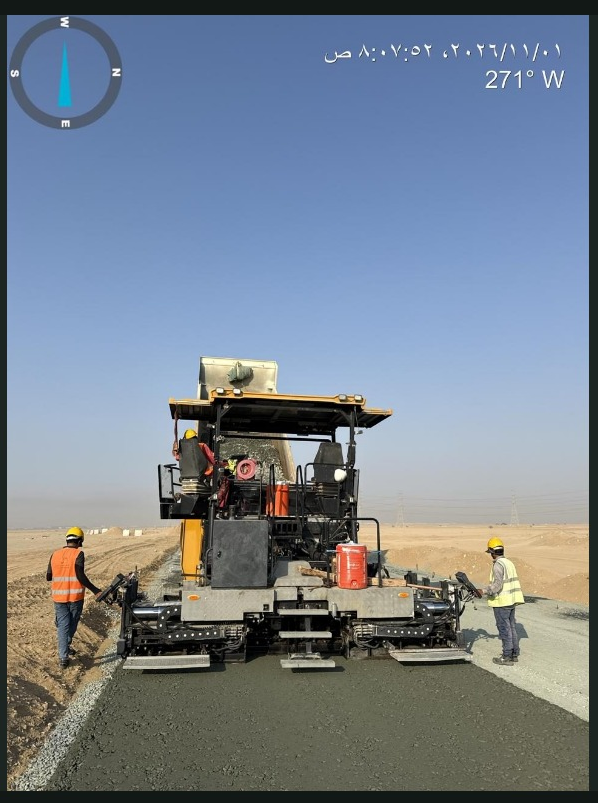

طبقة الأساس الحصوية، محطة ضخ مياه الشرب

فرّادة تفرش طبقة الأساس. مختومة بتاريخ 01-نوفمبر-2026، 08:07.




دمك طبقة الأساس، محطة ضخ مياه الشرب

دحّال على الطبقة الجديدة. مختومة بتاريخ 01-نوفمبر-2026، 08:08.



محطة الرفع 1

عزل مائي على جدران المنشأ. مختومة بتاريخ 01-نوفمبر-2026، 09:11.

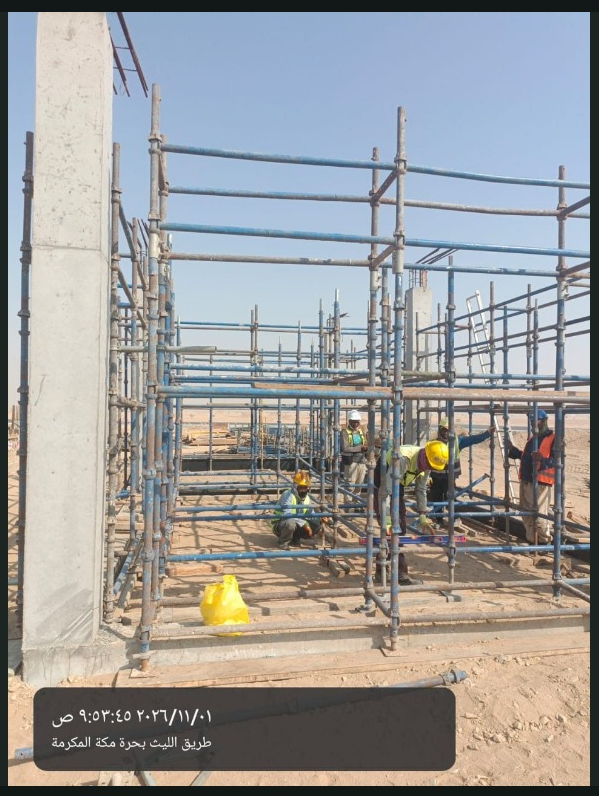


محطة ضخ المياه المعالجة

سقالات وشدات بين الأعمدة. مختومة بتاريخ 01-نوفمبر-2026، 09:53.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد أيام العمل المخططة) في بداية كل شهر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data في التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026 (بيانات P6 المصدّرة، 159,298 يوم عمل مخطط).

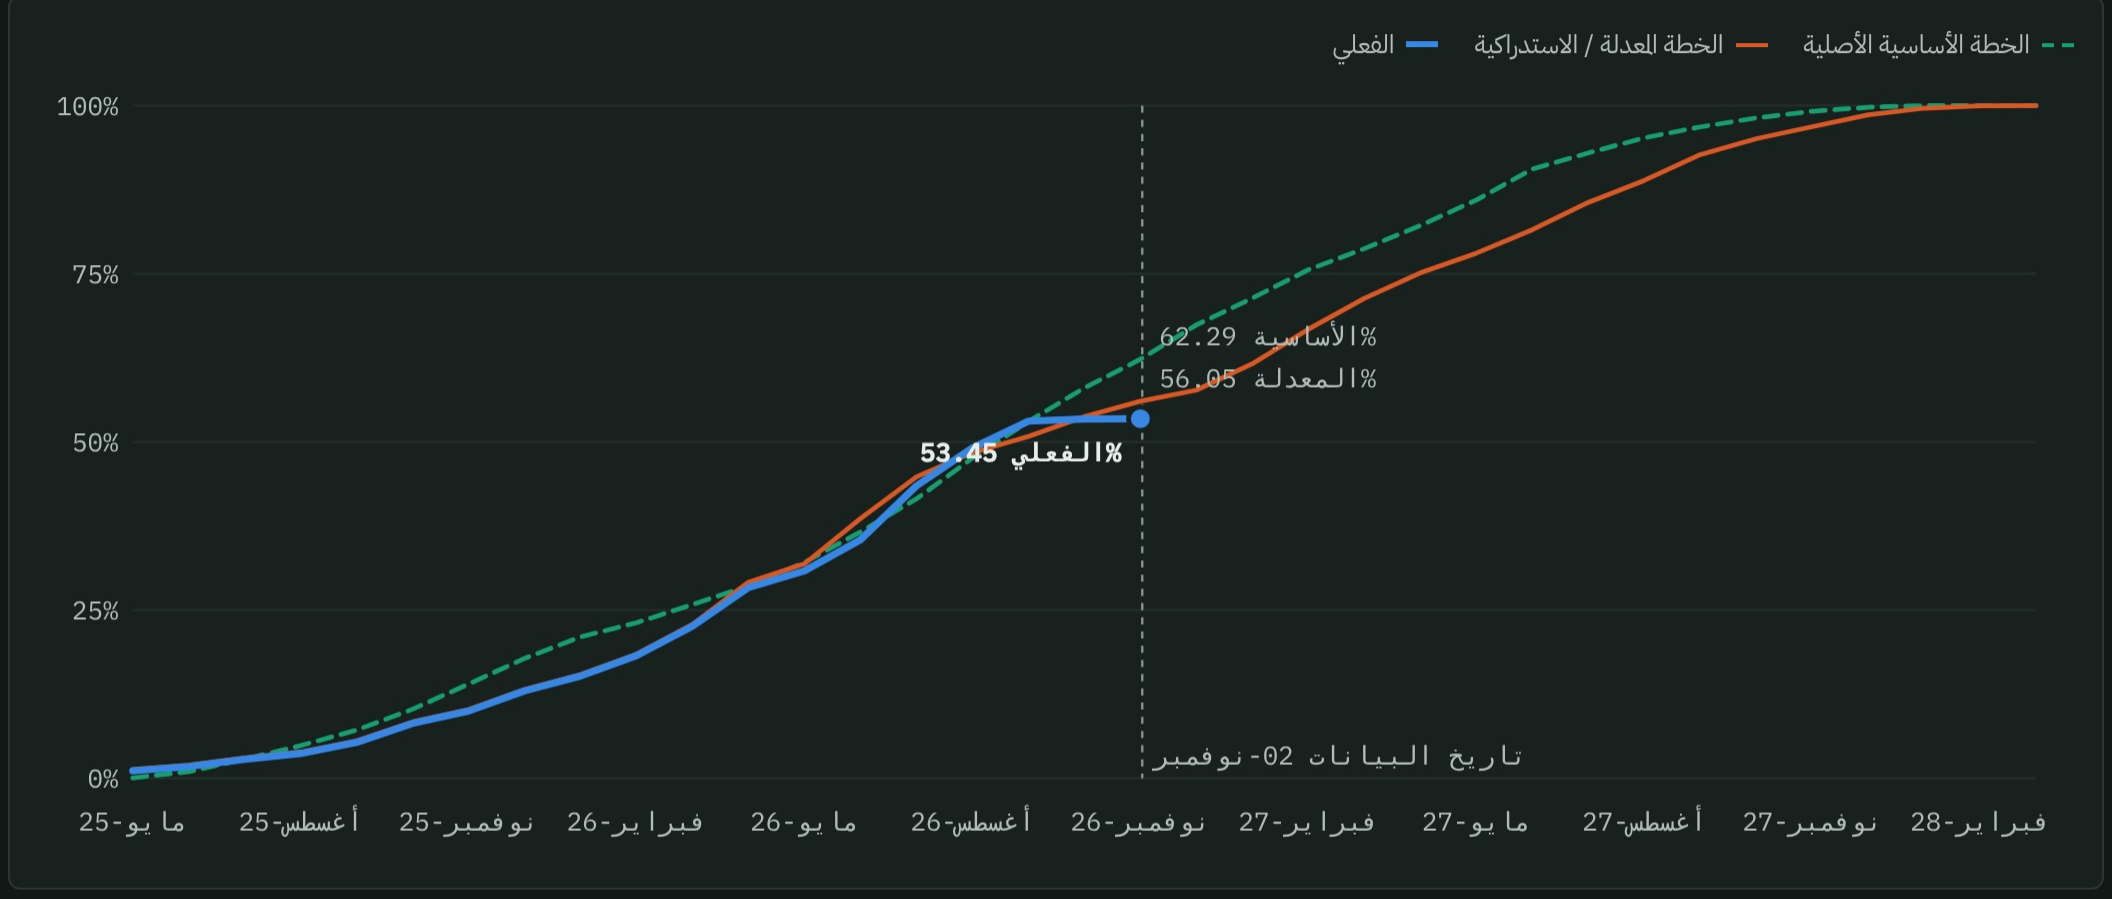

نهاية الأسبوع	الأساس	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
26-Oct-2026	بيانات P6 المصدّرة	53.27	53.23	−0.04%	–	1.00
02-Nov-2026	بيانات P6 المصدّرة	53.97	53.45	−0.52%	+0.22%	0.99
02-Nov-2026	**ملخص التقرير الأسبوعي**	**55.32**	**58.70**	**+3.38%**	**+0.21%**	**1.06**

الأساسان كلاهما من ملف 02-نوفمبر-2026: صفّا بيانات P6 من ورقة Progress Summery (التي تتضمن أيضاً قيم 26-أكتوبر-2026)، وصف الملخص من ورقة Weekly Progress Report. وقد حسب تقرير الأسبوع الماضي (الأسبوع 84) نسبة 52.75% من ملف P6 مباشرة بوزن أيام العمل الحالية لا الأساسية، لذا لا تصح المقارنة المباشرة.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد أيام العمل المخططة. المصدر: ورقة Weekly Progress Report بتاريخ 02-نوفمبر-2026. لا يُعرض مؤشر الأداء حيث يقل المخطط عن 5%.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
طريق الخريف	0.57%	62.59%	65.08%	+2.49%	1.04	▲ متقدم
الطريق الرابط مع طريق جدة-جازان	2.46%	92.15%	72.52%	−19.63%	0.79	▼ متأخر
الأعمال الترابية للبلوكات	1.72%	97.86%	100.54%	+2.68%	1.03	؟ أكثر من 100%
الأعمال الترابية للطرق	2.90%	69.76%	78.88%	+9.12%	1.13	▲ متقدم
شبكة الصرف الصحي	1.54%	97.56%	99.16%	+1.60%	1.02	▲ متقدم
شبكة تصريف السيول	19.57%	74.50%	85.77%	+11.27%	1.15	▲ متقدم
شبكة الري	4.37%	109.36%	110.19%	+0.83%	1.01	؟ أكثر من 100%
شبكة مياه الشرب	5.89%	85.95%	78.55%	−7.40%	0.91	▼ متأخر
الشبكة الكهربائية	2.09%	83.09%	77.20%	−5.89%	0.93	▼ متأخر
شبكة الإنارة	5.12%	68.77%	39.95%	−28.82%	0.58	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	1.68%	86.00%	74.68%	−11.32%	0.87	▼ متأخر
شبكة الطرق	19.87%	51.77%	34.90%	−16.87%	0.67	▼ متأخر
تنسيق المواقع	5.41%	17.71%	29.19%	+11.48%	1.65	▲ متقدم
محطة ضخ المياه المعالجة	5.20%	3.59%	22.70%	+19.11%	–	▲ متقدم
محطة ضخ مياه الشرب	16.49%	22.28%	41.14%	+18.86%	1.85	▲ متقدم
المسجد	1.21%	70.76%	185.10%	+114.34%	2.62	؟ أكثر من 100%
محطة الرفع 1	1.44%	5.60%	32.84%	+27.24%	–	▲ متقدم
محطة الرفع 2	1.50%	17.88%	33.38%	+15.50%	1.87	▲ متقدم
محطة الرفع 3	0.95%	3.37%	14.82%	+11.45%	–	▲ متقدم
الإجمالي	100%	**55.32%**	**58.70%**	**+3.38%**	**1.06**	▲ متقدم

لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات والاختبار والحواجز الواقية أيام عمل، فهي خارج مقياس الإنجاز الفعلي. ويضم البرنامج الزمني في الملف 16,623 نشاطاً: 9,117 مكتملاً و357 قيد التنفيذ و7,149 لم تبدأ؛ وارتفع عدد الأنشطة التي فات موعد بدئها من 1,994 إلى 2,108.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية والتوقع من التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026؛ وتوقع P6 والفائض من تحديث P6 بتاريخ 26-أكتوبر-2026 (لم يُرفع ملف P6 أحدث).

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	16-May-2025	16-Apr-2025	16-Mar-2025 (فعلي)	–	؟ تواريخ متعارضة
اكتمال التجهيز	16-Apr-2025	17-Aug-2025	08-May-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم المخططات التنفيذية	16-Apr-2025	17-May-2025	29-Jun-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
إنهاء أعمال الطرق	16-Jan-2026	16-Jan-2026	18-Jul-2027	204	▼ متأخر
إنهاء الأعمال العميقة	16-Sep-2026	16-Sep-2026	12-Jun-2027	235	▼ متأخر
إنهاء أعمال الجهد المتوسط	19-Nov-2026	19-Nov-2026	17-Dec-2026	378	▼ معرّض للتأخير
إنهاء جميع الشبكات	25-Feb-2027	25-Feb-2027	14-Feb-2027	328	● في الموعد
انتهاء المشروع	15-Mar-2028	15-Mar-2028	19-Mar-2028	0	▼ متأخر

تواريخ المعالم في التقرير الأسبوعي لا تطابق البرنامج الزمني.

يُبقي التقرير إنهاء أعمال الطرق في 16-يناير-2026 والأعمال العميقة في 16-سبتمبر-2026، وكلاهما مضى، بتوقع مساوٍ للخطة الأساسية و"0 أيام تغيير"، مع وصف أعمال الطرق بأنها متأخرة. بينما يتوقع تحديث P6 للمعلمين نفسيهما 18-يوليو-2027 و12-يونيو-2027. وتذكر ورقة Conclusion في التقرير نفسه تواريخ أخرى (جميع الشبكات 16-مارس-2027، وكامل المشروع 28-يوليو-2026).

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموردة إلى الموقع من إجمالي الكمية. المصدر: ملف متابعة التوريدات لمدن المحدَّث في 02-نوفمبر-2026، وورقة Status of Procurement في التقرير الأسبوعي لمواسير HDPE.



أنظمة المحطات لم تُعتمد بعد


لم تُعتمد بعد أنظمة المراقبة التلفزيونية والإذاعة الداخلية والتحكم في الدخول وإنذار الحريق والبيانات والهاتف (المورد والعينات والمخططات التنفيذية)، وسيعيد المقاول التقديم لأن أسعار المورد المعتمد مرتين مرتفعة. ولم يُورَّد الإنترلوك (166,014 م²) بعد، وقد صدر أمر شرائه.

بنود قيد التصنيع

اللوحات والمحطات الفرعية في نهاية نوفمبر 2026؛ ونظام الوقود في 15-نوفمبر-2026؛ وخزانات المطرقة المائية في 30-نوفمبر-2026؛ وصمامات الارتفاع تكتمل أول ديسمبر؛ والرافعات خلال أسبوعين؛ والبوابات (6) في يناير 2027؛ ونظام SCADA في يناير 2027. والمضخات المتبقية (11) خلال أسبوع.

القوى العاملة

العمالة الشهرية بأيام العمل، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower في التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026.

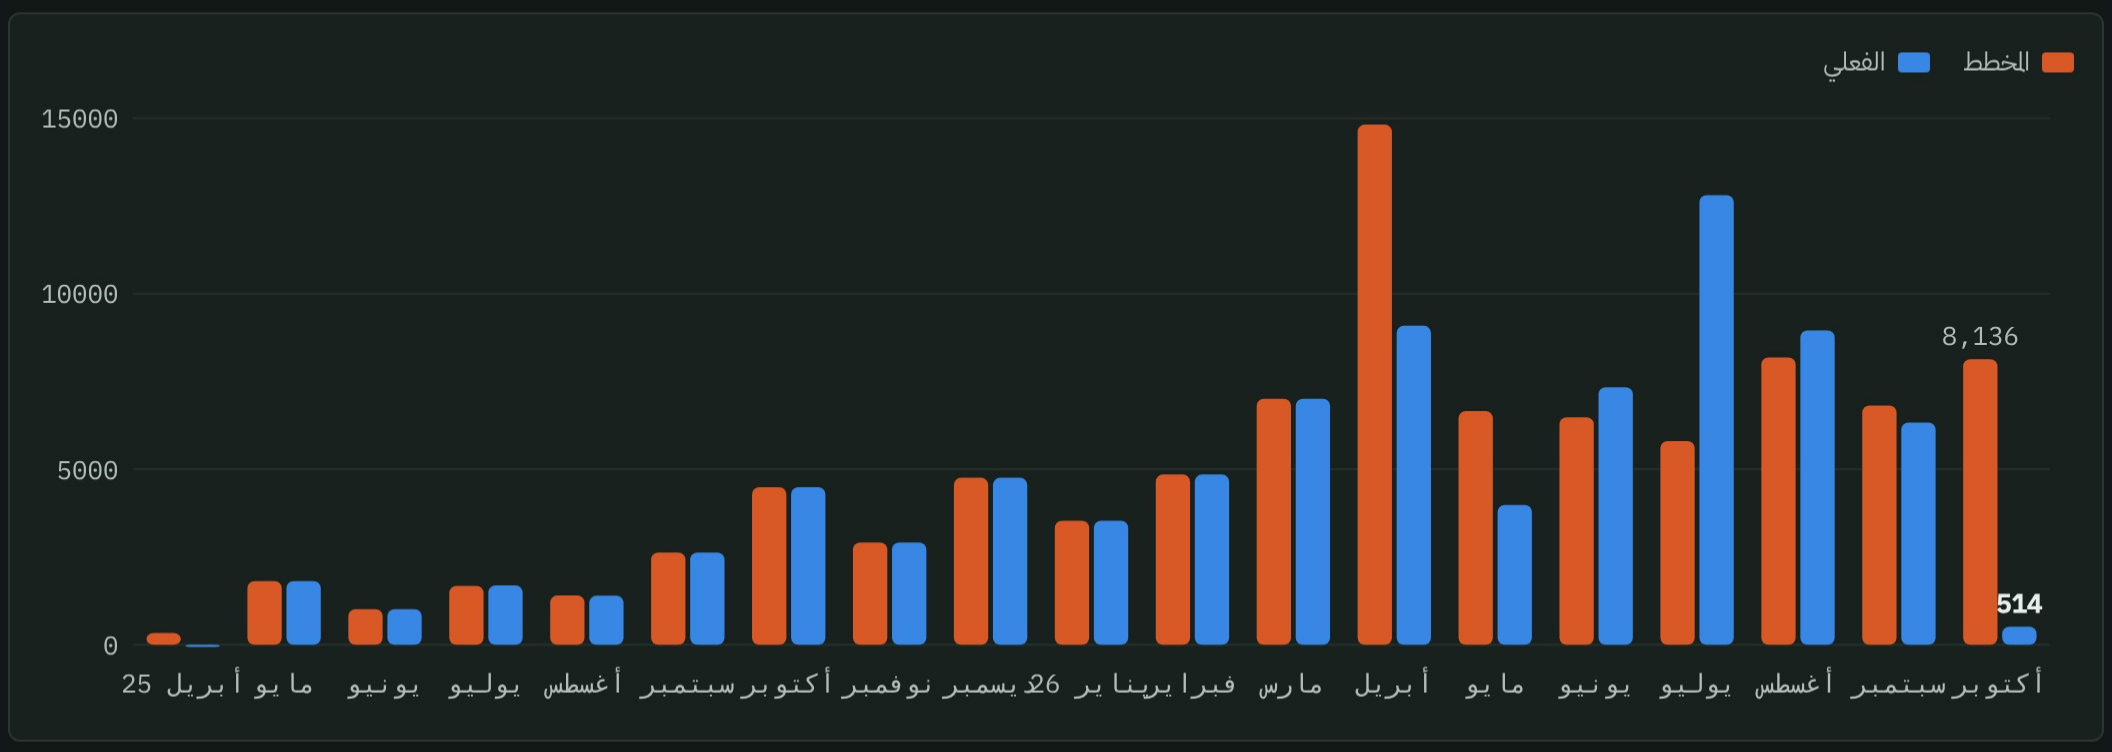

سُجل في أكتوبر 514 يوم عمل مقابل 8,136 مخططاً (−94%)، و56 حتى الآن في نوفمبر. ويذكر جدول الموارد في التقرير 6,329 عدداً فعلياً للعمالة، وهو إجمالي أيام العمل لشهر سبتمبر، مقابل 1,703.5 مخطط.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (دون الضريبة)	560,000,000
قيمة العقد المعدلة	560,000,000
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	644,000,000
أوامر التغيير	0
الدفعة المقدمة (10%)	56,000,000

جميع القيم بالريال. القيمة شاملة الضريبة من ورقة Info في متتبع التوريدات؛ وسجل أوامر التغيير فارغ والتغييرات المحتملة صفر.

المستخلصات

المستخلصات في السجل	17
القيمة الإجمالية	263,926,803
استرداد الدفعة المقدمة	26,392,680
الخصومات والغرامات	600,000
المعتمد والمدفوع (الصافي شاملاً الضريبة)	272,564,241

تبلغ المستخلصات 47.1% من قيمة العقد، ويغطي آخر مستخلص شهر سبتمبر 2026. ويعدّ الملخص 16 مستخلصاً مقدماً مقابل 17 معتمداً ومدفوعاً ("−1 معلق") لأن صفين في السجل يحملان الرقم 16.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.78

ساعات العمل هذا الأسبوع	17,640
ساعات العمل (تراكمي)	2,082,696
ساعات العمل الآمنة منذ آخر تصفير	27,160
الوفيات (تراكمي)	1
إصابات مضيعة للوقت	0
الإسعافات الأولية / الحوادث الوشيكة (تراكمي)	4 / 2
عمليات التفتيش / اجتماعات التوعية هذا الأسبوع	25 / 15

سجل تفتيش مدن للسلامة بتاريخ 22-أكتوبر-2026 نسبة 78.12%، وصنّف الحفريات والخنادق والحماية من الحريق "راسب (خطر على الحياة)".

الجودة التقييم 0.93

تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / مفتوحة	121 / 110 / 11
تعليمات الموقع: صادرة / مفتوحة	55 / 5
طلبات فحص المواد: صادرة / مفتوحة	206 / 5
طلبات الفحص الميداني: صادرة / مفتوحة	17,521 / 201
المخططات التنفيذية: الإجمالي / A / B / معلقة	3,799 / 1,197 / 2,307 / 26
اعتمادات المواد: الإجمالي / A / B	179 / 15 / 141

تفتيش الجودة بتاريخ 25-أكتوبر-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
حادث الوفاة وبطء استئناف الأعمال	المقاول	يسجل التقرير الأسبوعي حالة وفاة واحدة هذا العام ويعيد ساعات العمل الآمنة إلى 27,160. وكان سجل المخاطر الأسبوع الماضي قد سجل عدم استئناف الأعمال لحين استيفاء متطلبات السلامة؛ وتُظهر صور هذا الأسبوع (31-أكتوبر و01-نوفمبر) أعمالاً جارية، لكن لم يُسجَّل لشهر نوفمبر سوى 56 يوم عمل.
تأخر الطرق والإنارة	المقاول	شبكة الطرق 34.9% مقابل 51.8% مخطط، والإنارة 40.0% مقابل 68.8%؛ ويمثلان معاً 25% من وزن مقياس الإنجاز الفعلي.
تنفيذ الشبكات بعد الأسفلت	مدن	المشكلة 1 (16-أبريل-2025، معلقة، 565 يوماً): تنفيذ الشبكات بعد الانتهاء من الأسفلت يتلف الأسفلت ويتسبب في إعادة العمل.
قسوة الأحوال الجوية	أخرى	المشكلة 2 (19-أبريل-2025، قائمة): الأحوال الجوية القاسية تؤثر على معدل الإنتاجية.
عدم اعتماد أنظمة المحطات	المقاول	لا تزال أنظمة المراقبة والإذاعة الداخلية والتحكم في الدخول وإنذار الحريق والبيانات بحاجة إلى اعتماد المورد والعينات والمخططات التنفيذية.

يضم سجل المشكلات في التقرير أربعة بنود؛ أُغلق منها بندا توريد المناهل وغرف التجميع في 2025.

ملاحظات على البيانات

- الأساس: أرقام الإنجاز الفعلي لهذا الأسبوع من ملف التقرير الأسبوعي لمدن (xlsx.1111، تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026). ويختلف ملخصه (58.70% مقابل 55.32%) عن بيانات P6 المصدّرة فيه (53.45% مقابل 53.97%)، ويُعرض كلاهما. كما يذكر الملف تقدماً قائماً على التكلفة بعنوان "Earn Value"، ولم يُستخدم هنا.
- في الملخص تتجاوز أيام العمل المكتسبة الميزانية للمسجد (3,783 من 2,044) والري (8,164 من 7,409) والأعمال الترابية للبلوكات، ويبلغ المخطط للري 109%. ويُظهر تنسيق المواقع 2,680 يوم عمل مكتسباً في الملخص مقابل صفر في بيانات P6.
- تُظهر ورقتا Physical-Chart Data وManpower انخفاض أيام العمل الفعلية إلى 514 في أكتوبر و56 في نوفمبر، بينما يذكر الملخص 356 يوم عمل مكتسباً هذا الأسبوع.
- تاريخ تسليم الموقع 16-مارس-2025 في ورقة General Information، لكنه 16-مايو-2025 (أساسي) و16-أبريل-2025 (متوقع) في جدول المعالم. ويُدخل تاريخ اعتماد خطة السلامة 05-مايو-2028.
- تواريخ المعالم في التقرير الأسبوعي (الطرق 16-يناير-2026، والأعمال العميقة 16-سبتمبر-2026) مضت لكنها تُظهر "0 أيام تغيير"، وتتعارض مع تحديث P6 ومع ورقة Conclusion في التقرير.
- يذكر جدول الموارد 6,329 عدداً فعلياً للعمالة مقابل 1,703.5 مخطط؛ و6,329 هو إجمالي أيام العمل لشهر سبتمبر. والموظفون السعوديون 52.
- تختلف كميات التوريد بين الملفات: تمديدات الجهد المتوسط 100,000 من 116,000 م.ط في ملف متابعة التوريدات لمدن مقابل 189,522 من 189,522 م.ط في ورقة Status of Procurement؛ وأعمدة الإنارة 1,132 من 1,273 مقابل 1,161 من 1,161؛ وأغطية غرف التجميع 1,373 مقابل 1,441.
- لم يُرفع ملف P6 جديد هذا الأسبوع؛ وتوقع P6 (19-مارس-2028) من تحديث 26-أكتوبر-2026. ويرقّم سجل المستخلصات مستخلصين بالرقم 16، لذا يُظهر الملخص "−1" مستخلصاً معلقاً. ولا تزال ورقة Info في المتتبع مؤرخة في 15-يونيو-2026.

أُعدّ في 08-نوفمبر-2026 من الملفات المرفوعة للأسبوع W06 (05-نوفمبر-2026): ملف التقرير الأسبوعي لمدن xlsx.1111 (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026)، وملف متابعة التوريدات لمدن 02-نوفمبر-2026، ومتتبع التوريدات 02-نوفمبر-2026، وبرنامج الأسابيع الثلاثة، وصور الموقع؛ وتوقعات P6 من تحديث 26-أكتوبر-2026.
