سور للمدينة الصناعية - الدمام الثالثة

Dammam 3rd Industrial City Gates and Fence

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الديري للمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عفات العنزي	06-May-2026	05-Aug-2026

النطاق: السور الخارجي من النوعين 1 و2، والبوابات الرئيسية وبوابات الشبك، وغرف الحراسة مع خزانات المياه، وأعمالها الميكانيكية والكهربائية (الإنارة، وحواجز البوابات، وأنظمة كشف التسلل). مدة العقد 91 يوماً، وقيمته 16,500,001.96 ريال.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (25,284 ساعة عمل إجمالاً). في 03-نوفمبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 98.4% مقابل 100% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 1.6%، بعد إنجاز 0.51% (130 ساعة عمل) هذا الأسبوع. وقد مضى 90 يوماً على تاريخ انتهاء العقد في 05-أغسطس-2026.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
98.4% / 100% مخطط	+0.51% / 0.00% مخطط	199% · اليوم 181 من 91	59.3% · 9.78 مليون ريال
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.98	▼ 1.6% لم تُنجز بعد موعد الانتهاء المخطط	▼ انتهاء P6: 02-نوفمبر-2026 (انقضى)	5 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 26-سبتمبر-2026
−1.6%			

تجاوز المشروع تاريخ انتهاء العقد بـ 90 يوماً، وانقضى تاريخ التسليم في P6 (02-نوفمبر-2026) مع بقاء أعمال مفتوحة.

ملف P6 المرفوع هذا الأسبوع (باسم DD03-11-2026) لا يزال بتاريخ بيانات 27-أكتوبر-2026 ولم تُعد جدولته. ويُبقي التسليم الابتدائي في 02-نوفمبر-2026، أي بعد 89 يوماً من التاريخ التعاقدي 05-أغسطس-2026، بفائض زمني سالب بين −70.5 و−75 يوماً في الأنشطة الـ 21 المفتوحة، وكلها كانت مستحقة بحلول ذلك التاريخ. ولا يزال التقرير الأسبوعي يذكر 05-أغسطس-2026 تاريخاً متوقعاً للانتهاء. بقي التنفيذ عند 99.9%، وارتفع التسليم إلى 33.4% والاختبار والتشغيل إلى 87.5%. وأُعيد فتح أربع مشكلات في سجل المشكلات هذا الأسبوع.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع من الصور الخمس المرفوعة مع التقرير الأسبوعي بتاريخ 03-نوفمبر-2026. صورة واحدة فقط تحمل ختم التاريخ وGPS. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




لوحة مدن

لوحة مدن المضيئة على جدار غرفة الحراسة، ليلاً.




زراعة الجزيرة الوسطية وإنارتها

جزيرة وسطية مزروعة مع إنارة أرضية، ليلاً.

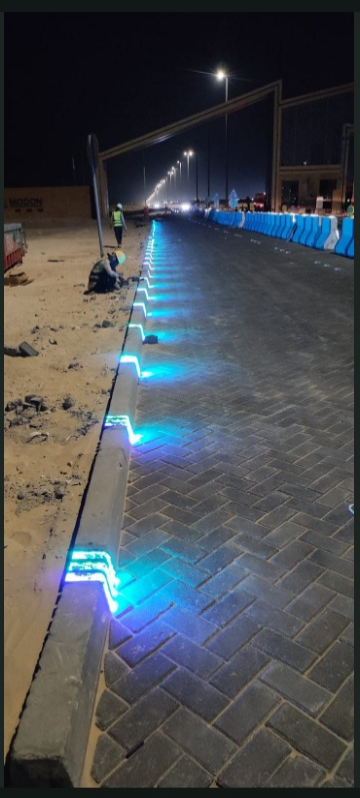

إنارة البردورات

إنارة مثبتة على البردورات بمحاذاة طريق الإنترلوك، والطاقم يعمل، ليلاً.

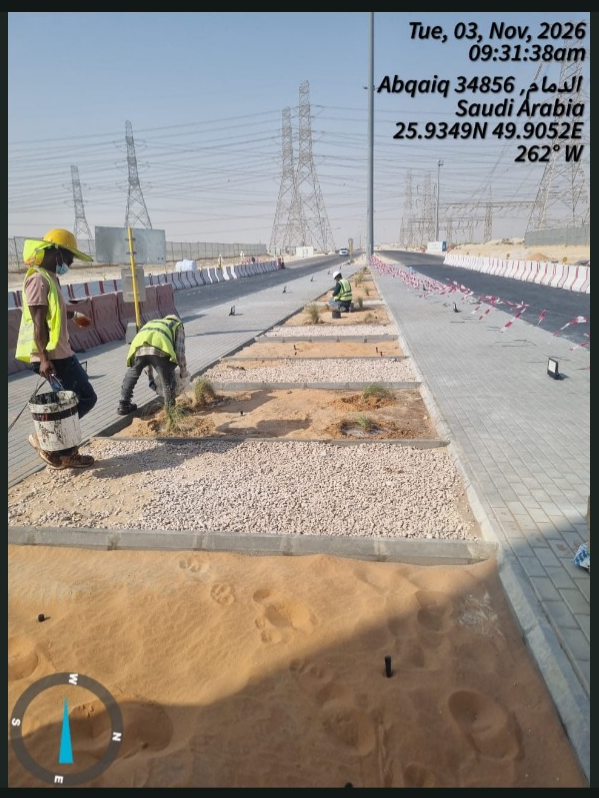


أعمال تنسيق المواقع

الزراعة في الجزيرة الوسطية. ختم GPS بتاريخ 03-نوفمبر-2026، 09:31.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

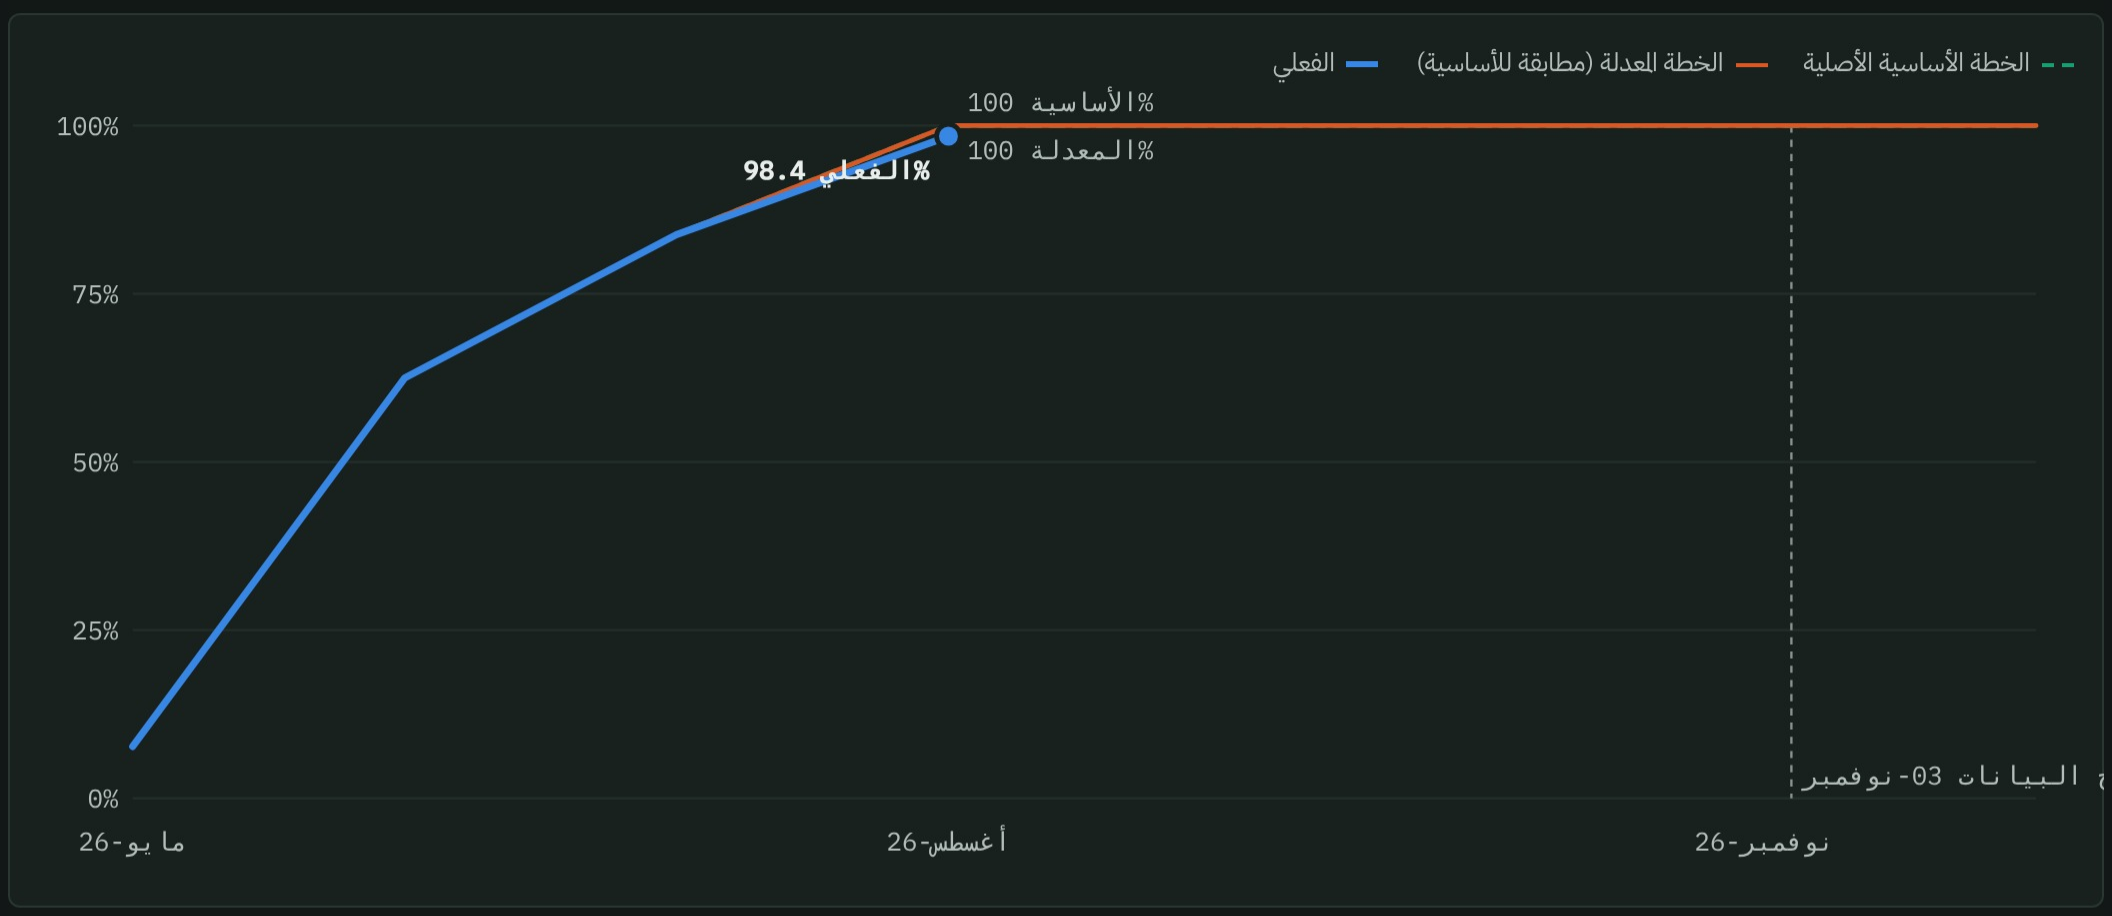

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
20-Oct-2026	100.0	97.6	−2.4%	–	0.98
27-Oct-2026	100.0	97.9	−2.1%	+0.30%	0.98
03-Nov-2026	**100.0**	**98.4**	**−1.6%**	**+0.51%**	**0.98**

ساعات العمل المكتسبة من ورقتي Progress في التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 27-أكتوبر-2026 و03-نوفمبر-2026 (24,681 و24,757 و24,887 من 25,284)؛ وصف 20-أكتوبر مأخوذ من أعمدة الأسبوع السابق في تقرير 27-أكتوبر. وتسجّل ورقة المنحنى كل التقدم المنجز بعد يوليو في شهر أغسطس، لذا ينتهي خط الفعلي عنده عند 98.4%.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	1.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التقديمات الأولية	0.2%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	26.5%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	26.4%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التنفيذ	43.5%	100.0%	99.9%	-0.1%	1.00	▼ في مرحلة الإنهاء
الاختبار والتشغيل	0.3%	100.0%	87.5%	-12.5%	0.88	▼ متأخر
التسليم	2.2%	100.0%	33.4%	-66.6%	0.33	▼ متأخر
الإجمالي	100%	**100.0%**	**98.4%**	**-1.6%**	**0.98**	▼ متأخر

ضمن التنفيذ، بقي السور الحديدي من النوع 2 عند 99.5% والأعمال الكهربائية عند 99.7%، واكتملت بقية الأعمال. يضم تحديث P6 عدد 391 نشاطاً: 370 مكتملاً و21 قيد التنفيذ ولا يوجد نشاط لم يبدأ. ولا يزال تاريخ الانتهاء المجدول 02-نوفمبر-2026، أي بعد 89 يوماً من التاريخ التعاقدي، لأن الملف لم تُعد جدولته.

المعالم الرئيسية

المعالم التعاقدية في جدول P6. تستخدم ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي تواريخ مختلفة ولا تتوقع أي تأخير؛ ويُعرض المصدران معاً لمعالجة الفرق مع المقاول.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	06-May-2026	30-Apr-2026	–	–	✓ منجز
التقديمات الأولية	25-May-2026	01-Aug-2026 (فعلي)	–	–	✓ منجز متأخراً
التجهيز	31-May-2026	02-Aug-2026 (فعلي)	20-May-2026	–	✓ منجز متأخراً
المخططات التنفيذية	22-Jun-2026	24-Aug-2026 (فعلي)	–	–	✓ منجز متأخراً
تقديم المواد واعتمادها	18-Jul-2026	19-Sep-2026 (فعلي)	–	–	✓ منجز متأخراً
التصنيع والتوريد	04-Aug-2026	12-Aug-2026 (فعلي)	–	–	✓ منجز متأخراً
التنفيذ	05-Aug-2026	16-سبتمبر-2026 (مسجّل كمنجز)	25-Aug-2026	-73.7	؟ أعمال لا تزال مفتوحة
انتهاء المشروع	05-Aug-2026	02-Nov-2026	05-Aug-2026	-75	▼ متأخر

يختلف التقرير الأسبوعي وتحديث P6 في تاريخ الانتهاء.

يذكر التقرير الأسبوعي 05-أغسطس-2026 تاريخاً متوقعاً للانتهاء (ورقة المعلومات العامة) و30-أغسطس-2026 في ورقة المعالم، وكلاهما دون تأخير. بينما ينهي تحديث P6 المشروع في 02-نوفمبر-2026، وهو تاريخ انقضى الآن. ويسجّل P6 معلمي التنفيذ وانتهاء المشروع منجزين في 16-سبتمبر-2026، مع أن أربعة أنشطة تنفيذ لا تزال مفتوحة: بوابة الشبك، وتركيبات الإنارة، وحاجز البوابة الكهربائي، وكواشف الدخان والحرارة.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (موظفون وعمالة)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

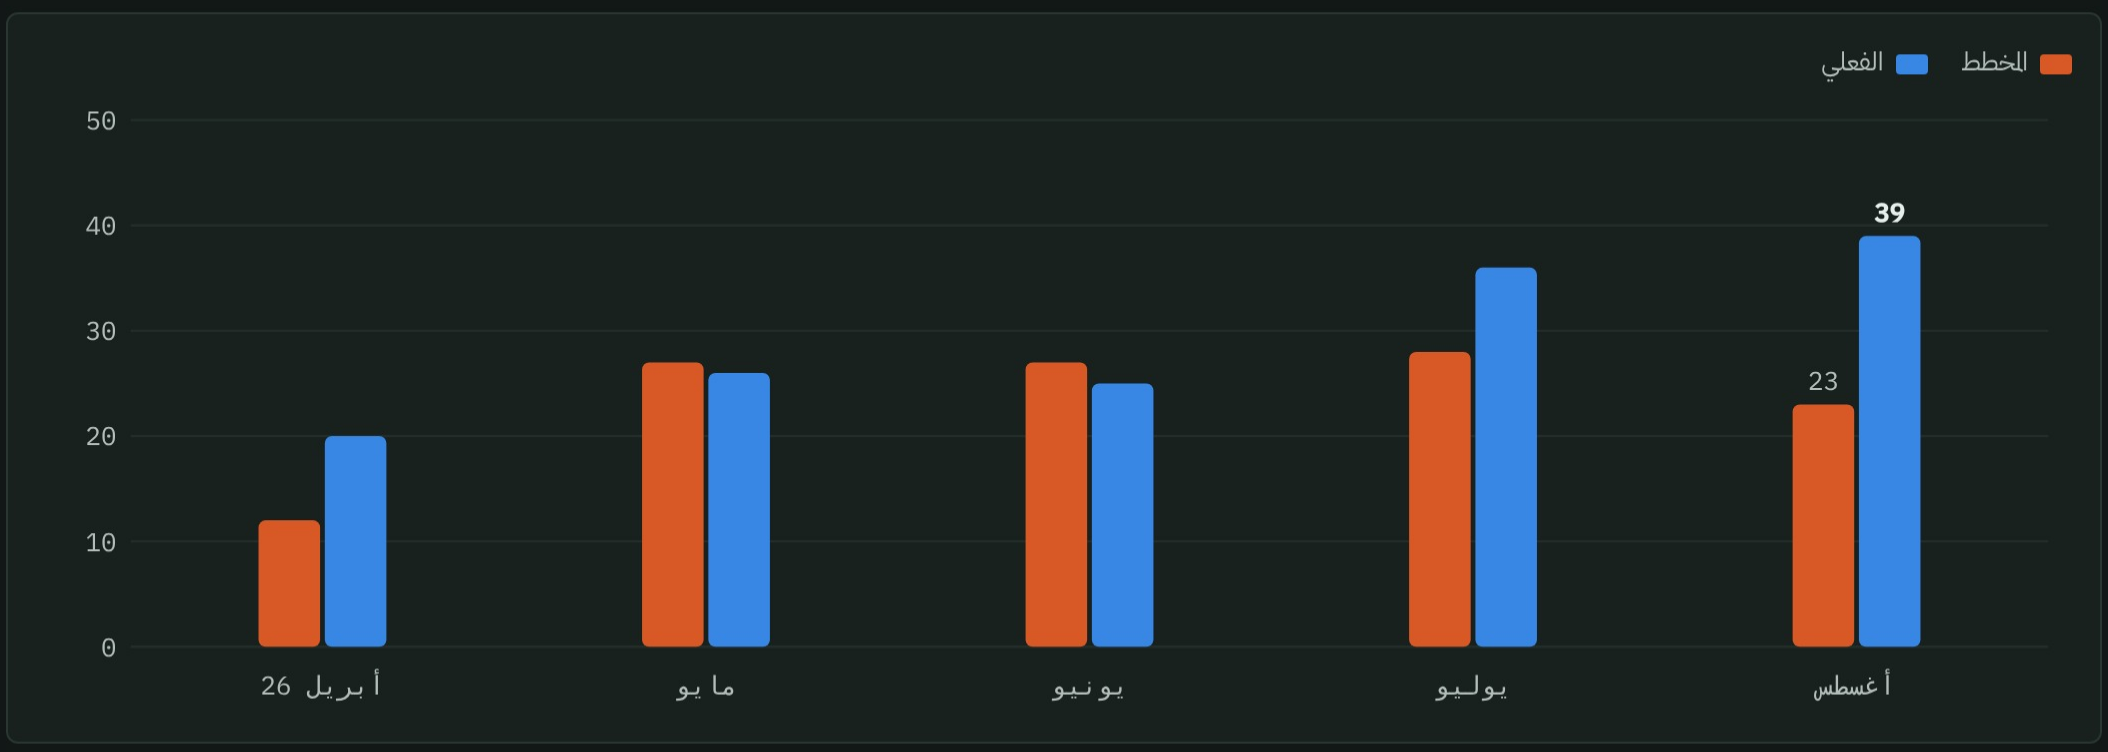

لا تتضمن ورقة القوى العاملة أرقاماً بعد أغسطس 2026. ويكرر ملخص التقرير الأسبوعي عدد أغسطس: 39 فعلياً (11 موظفاً و28 عاملاً) مقابل 23 مخططاً.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	16,500,001.96
قيمة العقد المعدلة	16,500,001.96
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة. ويُظهر سجل المستخلصات أيضاً قيمة معدلة قدرها 21,100,000 وتغييرات محتملة بقيمة 200,000؛ انظر ملاحظات على البيانات.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	5
القيمة الإجمالية	9,780,875.90
المعتمدة من الاستشاري	5
المعتمدة من مدير المشروع في مدن / المدفوعة	0 / 0
الخصومات والغرامات	1,501,000
الصافي شاملاً الضريبة	9,747,007.29
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	10,354,344.40

بلغت الفوترة 59.3% من قيمة العقد مقابل نسبة إنجاز فعلي 98.4%. ويتضمن المستخلص 5 (من 06-أغسطس إلى 26-سبتمبر-2026) خصماً بقيمة 1,500,000.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.80

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	15,737
ساعات العمل هذا الأسبوع	2,160
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	42 / 129

تفتيش السلامة الميداني رقم 31 بتاريخ 02-نوفمبر-2026.

الجودة التقييم 0.88

طلبات الفحص: صادرة / مغلقة / معلقة	858 / 842 / 16
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	92 / 90 / 2
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة	4 / 4
تعليمات الموقع: صادرة / مغلقة	4 / 4
المخططات التنفيذية المعتمدة	72 من 75
اعتمادات المواد	103 من 113

ملاحظة مراقبة الجودة رقم 25، 11-أكتوبر-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
بنود التنفيذ المتبقية	المقاول	بوابة الشبك وتركيبات الإنارة (التركيب النهائي) وحاجز البوابة الكهربائي وكواشف الدخان والحرارة لا تزال عند 0% في P6. وكانت مستحقة في 28-أكتوبر-2026 بفائض زمني سالب بين −70.5 و−73.7 يوماً.
الاختبار والتشغيل	المقاول	الأنظمة الكهربائية والميكانيكية منجزة بنسبة 88%؛ وكانت مستحقة في 29-أكتوبر و01-نوفمبر-2026.
مستندات الإغلاق	المقاول / الاستشاري	المخططات حسب التنفيذ معدّة بنسبة 85% ومراجعة بنسبة 85%؛ قطع الغيار التشغيلية مقدمة بنسبة 85% ومفحوصة بنسبة 35% ومقبولة بنسبة 85%؛ الضمانات 35%؛ الأدلة والتدريب 20–24%.
قائمة الملاحظات والتسليم الابتدائي	المقاول / مدن	لا يزال إصلاح قائمة الملاحظات وتسريح الموقع والتسليم الابتدائي عند 0%، رغم أن P6 جدول التسليم في 02-نوفمبر-2026.
المشكلات المعاد فتحها	المقاول	أعاد سجل المشكلات فتح أربع مشكلات هذا الأسبوع: نقص ملحقات السور من النوع 2، وكابل الجهد المتوسط على مسار السور من النوع 2، وتعثر أعمال الطريق الترابي بسبب الردم والمعدات والدفعات، وتوريد مواد الإنارة. وقد انقضت تواريخها المستهدفة (10–15 أكتوبر 2026).
اعتماد المستخلصات	مدن	اعتمد الاستشاري المستخلصات الخمسة جميعها، لكن لم يُعتمد أي منها من مدير المشروع في مدن ولم يُصرف. وطُبّقت خصومات وغرامات بقيمة 1,501,000 ريال.

لا يزال سجل المخاطر يسجّل المخاطر الست جميعها مغلقة، وتبقى مشكلة عرض البوابات (RFI-0009) مغلقة.

ملاحظات على البيانات

- نسبة الإنجاز الفعلي مأخوذة من ورقة Progress في التقرير الأسبوعي (ساعات العمل المكتسبة مقابل المخططة). أما عمود "Actual %" في ملفات P6 بصيغة PDF وخلايا القيمة المكتسبة في التقرير الأسبوعي فهي مبنية على التكلفة، لذا لم تُستخدم.
- المنجز هذا الأسبوع هو الفرق بين ساعات العمل المكتسبة في تقرير 03-نوفمبر-2026 (24,887) وتقرير 27-أكتوبر-2026 (24,757)، وتتطابق معه أعمدة الأسبوع السابق في تقرير 03-نوفمبر. ولا تتوفر كميات هذا الأسبوع.
- تتعارض التواريخ داخل التقرير الأسبوعي: تذكر ورقة المعلومات العامة تسليم الموقع في 06-مايو-2026 والانتهاء في 05-أغسطس-2026 (كما في جدول P6 الأساسي)، بينما تذكر ورقة المعالم الترسية في 16-أبريل-2026 والتسليم في 30-أبريل-2026 والانتهاء في 30-أغسطس-2026. والجدول السفلي في ورقة المعالم يعود لمشروع سور آخر (SUD1-05-015).
- لا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع الانتهاء في 05-أغسطس-2026 بانحراف صفري رغم مرور هذا التاريخ؛ بينما يتوقع P6 تاريخ 02-نوفمبر-2026.
- ملف P6 المرفوع هذا الأسبوع باسم DD03-11-2026 لكن تاريخ بياناته 27-أكتوبر-2026 ولم تُعد جدولته: حُدّثت نسب الأنشطة، لكن تواريخها المتبقية (من 28-أكتوبر إلى 02-نوفمبر-2026) أصبحت في الماضي.
- يسجّل ملخص طلبات الفحص فحوصات بتاريخ 01-نوفمبر-2026 لثلاث بوابات شبك (واحدة بعرض 6 م واثنتان بعرض 5 م) و4.3 م.ط من السور الحديدي من النوع 1 مع بوابات المشاة، بينما لا يزال ملف P6 يُظهر نشاط بوابة الشبك عند 0%.
- في تحديث P6، سُجّل معلما التنفيذ وانتهاء المشروع منجزين في 16-سبتمبر-2026 بينما لا يزال 21 نشاطاً قيد التنفيذ. وتبدأ التواريخ الفعلية في 13-يوليو-2026 (بداية المشروع)، أي بعد شهرين من تسليم الموقع؛ ويظهر لحاجز البوابة الكهربائي تاريخ بدء فعلي 12-أبريل-2026، قبل ترسية العقد.
- ورقة الكميات الرئيسية غير صالحة للاستخدام: الكميات الفعلية أجزاء من وحدة واحدة (مثل 0.25 م.ط من 18,500 م.ط من سور الشبك) وجدول الموارد فيها من مشروع آخر. لذا حُذف قسم نطاق العمل.
- تحمل ورقة التوريدات رمز مشروع آخر ولا تتضمن بيانات توريد إلا لعدد قليل من البنود الثانوية، لذا حُذف قسم التوريدات.
- يُظهر سجل المستخلصات قيمة عقد معدلة قدرها 21,100,000 وتقديراً عند الإنجاز قدره 20,900,000 وتغييرات محتملة بقيمة 200,000، مقابل 16,500,001.96 و0 في ورقتي المعلومات العامة والتقرير الأسبوعي.
- لا تزال مرحلة المشروع "Mobilization" (التجهيز) في التقرير الأسبوعي، وحقل مدير المشروع في مدن فارغ؛ وأُخذ اسم مدير المشروع من ورقة تفتيش السلامة. وتذكر قائمة فحص الجودة المقاول (HMA) بصفته الاستشاري.
- أعاد سجل المشكلات فتح أربعة بنود كانت مسجلة مغلقة الأسبوع الماضي مع الإبقاء على تواريخها المستهدفة الأصلية؛ ولا يزال سجل المخاطر يسجّل جميع البنود مغلقة بينما يذكر عمود "الحالة الحالية" "In Progress" (قيد التنفيذ)، ولوحة أهم 5 مشكلات فارغة. وتظهر في عدة لوحات ملخصة أخطاء #REF! أو #N/A.
- صورة واحدة فقط من الصور الخمس المرفوعة تحمل ختم التاريخ وGPS (03-نوفمبر-2026). واستُبعدت الصورة الخامسة، وهي كشاف إنارة ملقى بجانب جدار، للإبقاء على عدد زوجي.
