مبادرة الملاعب بالمنطقة الوسطى (حائل, واحة القصيم, تبوك)

Playgrounds Initiative: Qassim Oasis, Hail and Tabuk Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	تاريخ البدء	انتهاء العقد	الانتهاء المتوقع في P6
مدن	ADV	إيجيس (Egis)	17-Feb-2026	16-Dec-2026	10-Feb-2027

النطاق: ملاعب كرة قدم وكرة سلة وبادل، وقباب هوائية (القصيم وتبوك)، ودورات مياه، وتنسيق مواقع، وخزانات وخدمات موقع في ثلاثة مواقع: واحة القصيم وحائل والمدينة الصناعية بتبوك.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (وحدات العمالة) في تحديث P6، مجمّعاً من نسب الإنجاز الفعلي للأنشطة؛ ويُوزَّع التقدم المخطط خطياً على تواريخ خط الأساس التعاقدي حتى تاريخ بيانات P6 في 09-أكتوبر-2026. بلغ الإنجاز 67.93% مقابل 76.61% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 8.68% (مؤشر الأداء الزمني 0.89). حائل هي الأكثر تأخراً عند 65.96% مقابل 81.93%.

نسبة الإنجاز الفعلي
67.93% / 76.61%
مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.89 متأخر بنسبة 8.68%

التقدم هذا الأسبوع
— غير مذكور
لا تتضمن ملفات هذا الأسبوع التقدم المحقق خلال الأسبوع.

المدة المنقضية من العقد
78.1% · اليوم 236 من 302
▼ انتهاء P6: 10-فبراير-2027

التأخير المتوقع في الإنجاز
56 يوماً
العقد 16-ديسمبر-2026، توقع P6 10-فبراير-2027، الفائض −47.4 يوماً

يتوقع تحديث P6 الانتهاء في 10-فبراير-2027، أي بعد تاريخ العقد بـ56 يوماً.

ينتقل الإنجاز الجوهري لجميع الأعمال من 16-ديسمبر-2026 إلى 10-فبراير-2027 بفائض زمني كلي −47.4 يوماً. لدى 205 من أصل 338 نشاطاً مفتوحاً فائض سالب، وتضم قائمة الأنشطة المتعثرة في البدء بتاريخ 11-أكتوبر-2026 عدد 77 نشاطاً لم تبدأ في موعدها (القصيم 28، حائل 31، تبوك 18). وتمثل القباب الهوائية الفجوة الأكبر: القصيم عند 39.96% إنجازاً فعلياً مقابل 74.00% مخطط، وتبوك عند 35.13% مقابل 65.24%.

التقدم حسب المرحلة


نسبة الإنجاز الفعلي حسب الموقع والمرحلة، وتُقاس بعدد ساعات العمل المخططة من تحديث P6 (تاريخ البيانات 09-أكتوبر-2026)؛ والمخطط من خط الأساس التعاقدي موزعاً خطياً. الوزن هو حصة ساعات العمل. لا يحمل التصميم الهندسي والتوريدات ساعات عمل في الجدول الزمني، لذا لا يمكن عرضهما.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
واحة القصيم	**36.4%**	**76.81%**	**67.79%**	**−9.02%**	**0.88**	▼ متأخر
التنفيذ	34.8%	80.31%	70.24%	−10.07%	0.87	▼ متأخر
إغلاق المشروع	1.6%	2.92%	16.04%	+13.12%	5.49	▲ متقدم
حائل	**27.2%**	**81.93%**	**65.96%**	**−15.97%**	**0.81**	▼ متأخر
التنفيذ	25.6%	87.01%	69.52%	−17.49%	0.80	▼ متأخر
إغلاق المشروع	1.6%	2.92%	10.79%	+7.87%	3.70	▲ متقدم
تبوك	**36.4%**	**72.44%**	**69.53%**	**−2.91%**	**0.96**	▼ متأخر
التنفيذ	34.8%	75.73%	72.06%	−3.67%	0.95	▼ متأخر
إغلاق المشروع	1.6%	2.92%	16.04%	+13.12%	5.49	▲ متقدم
الإجمالي	100%	**76.61%**	**67.93%**	**−8.68%**	**0.89**	▼ متأخر

يضم تحديث P6 (المشروع PG-Reco-4، تاريخ البيانات 09-أكتوبر-2026) عدد 1,929 نشاطاً: 1,591 مكتملاً و205 قيد التنفيذ و133 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 10-فبراير-2027 مقابل تاريخ الانتهاء الملزم 16-ديسمبر-2026. ويتقدم إغلاق المشروع على الخطة لأن المخططات حسب التنفيذ بدأت مبكراً.

نطاق العمل: المواقع وحزم الأعمال

لا يتضمن الجدول الزمني كميات، لذا يُعرض النطاق كحزم أعمال التنفيذ في كل موقع، مقاسة بساعات العمل المخططة من تحديث P6: ساعات العمل، والساعات المنجزة (نسبة الإنجاز الفعلي × ساعات العمل)، والنسبة المخططة حتى تاريخه من خط الأساس التعاقدي. لا تتضمن ملفات هذا الأسبوع أرقام الأسبوع السابق، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز –.

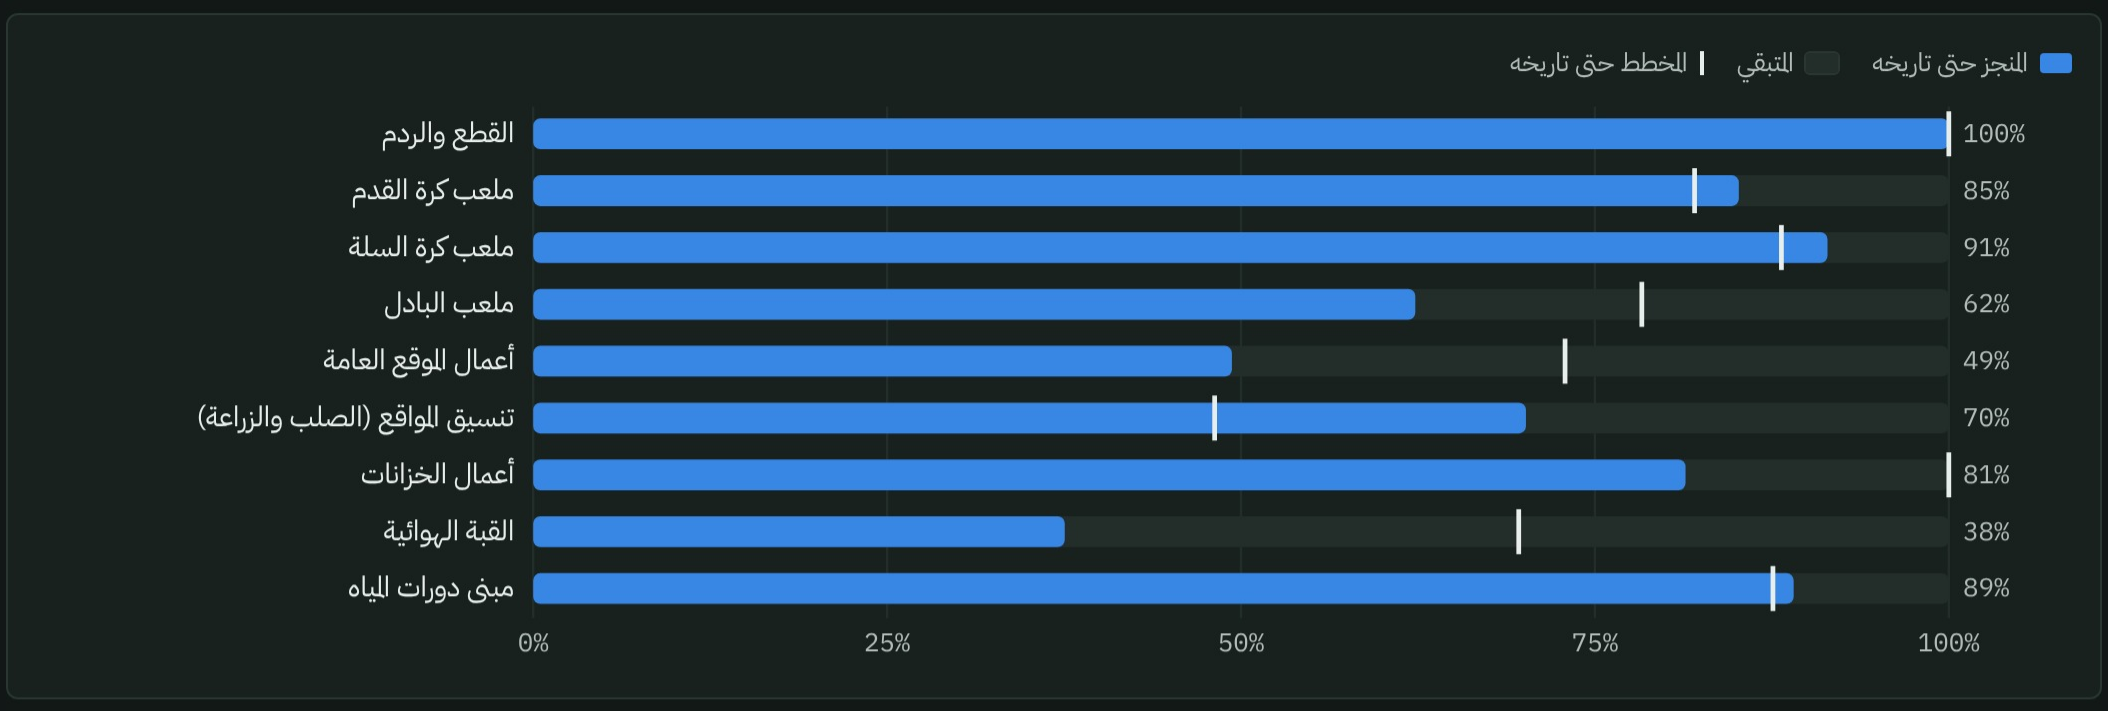

حزمة الأعمال	الموقع	الوحدة	ساعات العمل	المنجز	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% الإنجاز	المخطط %
القطع والردم	القصيم	ساعة	376	376	–	0	100.0%	100.0%
	حائل	ساعة	376	376	–	0	100.0%	100.0%
	تبوك	ساعة	376	376	–	0	100.0%	100.0%
	الإجمالي	ساعة	**1,128**	**1,128**	–	**0**	**100.0%**	100.0%
ملعب كرة القدم	القصيم	ساعة	741.6	864	–	122.4	85.8%	82.6%
	حائل	ساعة	713.1	864	–	150.9	82.5%	82.1%
	تبوك	ساعة	752.8	864	–	111.2	87.1%	81.4%
	الإجمالي	ساعة	**2,208**	**2,592**	–	**384.5**	**85.2%**	82.0%
ملعب كرة السلة	القصيم	ساعة	564	608	–	44	92.8%	88.6%
	تبوك	ساعة	547.8	608	–	60.2	90.1%	87.7%
	الإجمالي	ساعة	**1,112**	**1,216**	–	**104.2**	**91.4%**	88.2%
ملعب البادل	القصيم	ساعة	242.8	424	–	181.2	57.3%	79.2%
	تبوك	ساعة	285.6	424	–	138.4	67.4%	77.4%
	الإجمالي	ساعة	**528.4**	**848**	–	**319.6**	**62.3%**	78.3%
أعمال الموقع العامة	القصيم	ساعة	966.5	1,996	–	1,030	48.4%	71.1%
	حائل	ساعة	888	1,996	–	1,108	44.5%	78.6%
	تبوك	ساعة	1,101	1,996	–	895	55.2%	69.0%
	الإجمالي	ساعة	**2,956**	**5,988**	–	**3,033**	**49.4%**	72.9%
تنسيق المواقع (الصلب والزراعة)	القصيم	ساعة	259	392	–	133	66.1%	49.8%
	حائل	ساعة	244.8	392	–	147.2	62.4%	54.0%
	تبوك	ساعة	320.9	392	–	71.1	81.9%	40.6%

حزمة الأعمال	الموقع	الوحدة	ساعات العمل	المنجز	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% الإنجاز	المخطط %
	الإجمالي	ساعة	**1,176**	**824.7**	–	**351.3**	**70.1%**	48.1%
أعمال الخزانات	القصيم	ساعة	628	576	–	52	91.7%	100.0%
	حائل	ساعة	628	484	–	144	77.1%	100.0%
	تبوك	ساعة	628	473.6	–	154.4	75.4%	100.0%
	الإجمالي	ساعة	**1,884**	**1,534**	–	**350.4**	**81.4%**	100.0%
القبة الهوائية	القصيم	ساعة	1,116	446	–	670	40.0%	74.0%
	تبوك	ساعة	1,116	392.1	–	723.9	35.1%	65.2%
	الإجمالي	ساعة	**2,232**	**838.1**	–	**1,394**	**37.5%**	69.6%
مبنى دورات المياه	القصيم	ساعة	1,708	1,526	–	181.6	89.4%	86.8%
	حائل	ساعة	1,708	1,440	–	268	84.3%	99.3%
	تبوك	ساعة	1,708	1,596	–	112	93.4%	76.6%
	الإجمالي	ساعة	**5,124**	**4,562**	–	**561.6**	**89.0%**	87.6%

المنجز المُبلغ عنه هذا الأسبوع

الخرسانة المطبوعة، والبردورات، وتركيب القوائم الحديدية للسياج، وردم شبكة الري، والأسفلت، وعزل اللبشة لواجهة الزجاج ومنطقة دورات المياه، والدمك والتسوية (الملخص التنفيذي الأسبوعي). الأسبوع القادم: الدمك والتسوية، والأسفلت، والبردورات، وتركيب السياج، والخرسانة المطبوعة.

القباب الهوائية وأعمال الموقع العامة الأكثر تأخراً

القبة الهوائية: القصيم 39.96% مقابل 74.00% مخطط، وتبوك 35.13% مقابل 65.24%. أعمال الموقع العامة عند 44–55% مقابل 69–79% مخطط في المواقع الثلاثة. كما تتأخر ملاعب البادل وأعمال الخزانات، بينما يتقدم تنسيق المواقع ومبنيا دورات المياه في القصيم وتبوك على الخطة.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية من جدول خط الأساس التعافي (Recovery Schedule.01). التوقعات من جدول المستوى 5 (PDF بتاريخ 11-أكتوبر-2026) ومن تحديث P6 (XER، تاريخ البيانات 09-أكتوبر-2026)، وهما متطابقان في جميع المعالم. الفائض هو الفائض الكلي في P6.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع جدول المستوى 5	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	17-Feb-2026	17-Feb-2026	17-Feb-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال الأعمال الترابية (القطع والردم)	05-May-2026	05-May-2026	05-May-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تجهيز الموقع وخطط العمل والجدول الزمني وتقديم المخططات	04-Aug-2026	16-Sep-2026 (+43 يوماً)	16-Sep-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
اكتمال مبنى دورات المياه	28-Oct-2026	28-Nov-2026 (+31 يوماً)	28-Nov-2026	−5.5	▼ متأخر
اكتمال أعمال الملاعب	07-Dec-2026	14-Dec-2026 (+7 أيام)	14-Dec-2026	+2.6	▼ معرّض للتأخير
اكتمال أعمال تنسيق المواقع	16-Dec-2026	25-Jan-2027 (+40 يوماً)	25-Jan-2027	−33.0	▼ متأخر
الإنجاز الجوهري: جميع الأعمال	16-Dec-2026	10-Feb-2027 (+56 يوماً)	10-Feb-2027	−47.4	▼ متأخر
تاريخ انتهاء المشروع	16-Dec-2026	10-Feb-2027 (+56 يوماً)	10-Feb-2027	−47.4	▼ متأخر

جميع المعالم التعاقدية المفتوحة متوقعة الآن بعد تواريخها في الخطة الأساسية.

يتأخر اكتمال مبنى دورات المياه 31 يوماً، وأعمال تنسيق المواقع 40 يوماً، والإنجاز الجوهري 56 يوماً. تحتفظ أعمال الملاعب بفائض +2.6 يوم لكنها متوقعة بعد خطتها الأساسية بـ7 أيام. وتحقق معلم تجهيز الموقع وتقديم المخططات في 16-سبتمبر-2026 متأخراً 43 يوماً.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الإنجاز الفعلي لأنشطة "التوريد إلى الموقع" المفتوحة للمواد الرئيسية (تحديث P6، تاريخ البيانات 09-أكتوبر-2026).



مواد القبة الهوائية: 60% موزّدة

في كل من القصيم وتبوك، بفائض −38.8 و−47.4 يوماً. وتحمل مواد القبة الهوائية في تبوك نفس الفائض السالب لإنجاز المشروع (−47.4 يوماً).

الحائط الستائري (المتبقي)

لم يبدأ التوريد في القصيم: كان التصنيع مقرراً أن يبدأ في 25-يونيو-2026 ومن المتوقع الآن أن يبدأ في 10-أكتوبر-2026، والتوريد من 08-نوفمبر-2026 إلى 24-نوفمبر-2026. حائل عند 80% وتبوك عند 60%. طفايات الحريق في حائل عند 20%.

الصحة والسلامة والجودة

لا تتضمن ملفات هذا الأسبوع إحصاءات السلامة أو سجلات الفحص في الموقع (MIR وIR وNCR). سجل التقديمات الفنية هو سجل الجودة الوحيد المتوفر. المصدر: سجل تقديم المستندات الفنية، ورقة Summary %.

التقديمات الفنية

المقدمة حتى تاريخه	819
المعتمدة (الرمزان A وB)	677 (82.7%)
تعديل وإعادة تقديم (الرمز C)	50
قيد المراجعة	57
مراجعة متأخرة (5 أيام أو أكثر)	35

المعتمد / المقدم حسب النوع

المخططات التنفيذية	309 / 375
تقديمات المستندات (فنية وعامة)	148 / 183
تقديمات المواد	120 / 137
التأهيل المسبق	47 / 55
طلبات الاستيضاح	30 / 34
بيانات طريقة العمل	22 / 22
اعتماد مصادر المواد	1 / 13

9 من أصل 13 طلب اعتماد مصدر مواد في مراجعة متأخرة.

المشكلات والمخاطر القائمة

من قائمة الأنشطة المتعثرة في البدء (11-أكتوبر-2026) وتحديث P6 وسجل التقديمات. لا تحدد الملفات المسؤول عن كل بند.

المشكلة	الموقع	التفاصيل
أعمال القبة الهوائية	القصيم، تبوك	الإنجاز الفعلي 39.96% (القصيم) و35.13% (تبوك) مقابل 74.00% و65.24% مخطط. تركيب الهيكل الكابلي الفولاذي والغشاء ووحدات الهواء والتكييف والإنارة ضمن قائمة الأنشطة المتعثرة في البدء (15 نشاطاً).
الأعمال الكهربائية والتيار الخفيف وإنذار الحريق في الموقع	جميع المواقع	29 من أصل 77 نشاطاً متعثراً: لوحات التوزيع الرئيسية ولوحات القوى، والتمديدات، ووحدات الإنارة، والألياف البصرية، والاتصالات، والمراقبة بالكاميرات، وإنذار الحريق.
أعمال تصريف السيول والمرافق	جميع المواقع	لم تبدأ أعمال التغليف الخرساني والردم والدمك وإعادة الأسطح في موعدها (14 نشاطاً ميكانيكياً متعثراً، منها طفايات الحريق ورشاشات الري).
خزانات المياه	جميع المواقع	تركيب خزانات المياه من GRP ضمن قائمة الأنشطة المتعثرة في المواقع الثلاثة. أعمال الخزانات عند 91.72% (القصيم) و77.07% (حائل) و75.41% (تبوك) إنجازاً فعلياً مقابل 100% مخطط.
الحائط الستائري	القصيم، حائل	تصنيع الجزء المتبقي من الحائط الستائري ضمن قائمة الأنشطة المتعثرة في القصيم وحائل (البدء في الخطة الأساسية 25-يونيو-2026، والآن 10-أكتوبر-2026).
تأخر مراجعة التقديمات	جميع المواقع	35 تقديماً في مراجعة متأخرة، منها 12 مخططاً تنفيذياً و12 تقديم مستندات.

ملاحظات على البيانات

- يعتمد هذا التقرير على ملفات W2 فقط (تاريخ البيانات 11-أكتوبر-2026). لا تتضمن ورقة تقدم فعلي، ولا بيانات منحنى التقدم، ولا صور موقع، ولا قوى عاملة، ولا بيانات مستخلصات، ولا إحصاءات سلامة، لذا حُذفت هذه الأقسام.
- حُسب التقدم الفعلي من ملف P6 الأصلي (XER) لهذا الأسبوع (نسخة Markdown لا تتضمن الحقول اللازمة): نسبة الإنجاز الفعلي لكل نشاط مقيسة بوحدات العمالة المخططة له، على 488 نشاطاً محمّلاً بالعمالة، مع استبعاد نشاطي "مدة المشروع" اللذين يحملان 10,000 ساعة لطاقم الإدارة. وتستخدم النسبة المخططة الوحدات نفسها في ملف خط الأساس التعاقدي، موزعة خطياً بين البدء والانتهاء المخططين حتى 09-أكتوبر-2026. لا تحمل أنشطة التصميم الهندسي والتوريدات وحدات عمالة.
- لا تذكر هذه الملفات أرقام الأسبوع السابق أو "هذا الأسبوع"، لذا يظهر التقدم خلال الأسبوع وعمود المنفذ هذا الأسبوع بالرمز –.
- تاريخ بيانات ملف P6 (XER) هو 09-أكتوبر-2026، بينما الجداول بصيغة PDF وقائمة الأنشطة المتعثرة مؤرخة 11-أكتوبر-2026.
- ثلاثة ملفات PDF (جدول المستوى 5، والنظرة المستقبلية لثلاثة أسابيع، والأعمال المتبقية) مسماة MLTX-05-047 رغم أنها تخص هذا المشروع (MLTX-02-003).
- تعرض ملفات ملخص هيكل تجزئة العمل وجدول المستوى 5 بصيغة PDF نسبة محمّلة بالتكاليف بعنوان "Performance complete %". يستخدم هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي فقط ولا يعرض تلك الأرقام.
- لدى 108 أنشطة قيد التنفيذ في تحديث P6 تاريخ انتهاء يسبق تاريخ البيانات (مثل مواد القبة الهوائية في القصيم: 60%، الانتهاء 06-أكتوبر-2026). يجب تحديث المدد المتبقية لها.
- تصنيع الحائط الستائري في حائل ضمن قائمة الأنشطة المتعثرة (لم يبدأ)، بينما يُظهر تحديث P6 توريد الحائط الستائري في حائل بنسبة 80%.
- لا يتضمن سجل التقديمات تقديمات مخططة أو مواعيد نهائية (N/A)، وتُظهر صفوف مخططات التصميم الخطأ #DIV/0!.

أُعدّ في 28-أكتوبر-2026 من ملفات الرفع الأسبوعي W2 فقط (تاريخ البيانات 11-أكتوبر-2026).
