رقم المشروع 3121 · KHJ1-02-007

# تطوير شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية بالخرج

## Development of Infrastructure Networks, Al-Kharj Industrial City

| المالك | المقاول | الاستشاري | مدير المشروع - مدن | تسليم الموقع |
|---|---|---|---|---|
| مدن | مجموعة مفرح (MMAH) | إيجيس (EGIS) | راكان العتيبي | 03-Dec-2025 |

انتهاء العقد

02-Dec-2027

النطاق: شبكات البنية التحتية على مساحة 3.5 كم² تقريباً في المنطقتين A وB ومنطقة السكن العمالي.

---

## ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. صدرت هذا الأسبوع خطة معدلة جديدة أصبح فيها التقدم المخطط حتى تاريخه 48.4% بعد أن كان 52.5% في الخطة السابقة. ووفقها المشروع متقدم بنسبة 0.9% بعد إنجاز 2.2% خلال الأسبوع.


| نسبة الإنجاز الفعلي | التقدم هذا الأسبوع | المدة المنقضية من العقد | المفوتر حتى تاريخه (إجمالي) |
|---|---|---|---|
| 49.3% / 48.4% مخطط | 2.2% / 1.0% مخطط | 44.8% · اليوم 327 من 729 | 16.1% · 49.7 مليون ريال |
| ▲ مؤشر الأداء الزمني 1.02 +0.9% | ▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 1.2% | ▼ انتهاء P6: 27-أبريل-2028 | 5 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026 |

**الجدول الزمني يُنهي المشروع الآن متأخراً نحو خمسة أشهر.**

يُحدد تحديث P6 المرفوع مع تقرير هذا الأسبوع انتهاء المشروع في 27-أبريل-2028، أي بعد تاريخ انتهاء العقد (02-ديسمبر-2027) بـ147 يوماً، وبفائض زمني –126 يوماً. ولا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع 02-ديسمبر-2027. وارتفع عدد الأنشطة المفتوحة ذات الفائض السالب من 701 إلى 1,243. ومقارنة بالخطة الأساسية الأصلية التي كانت تستهدف 83.0% بنهاية أكتوبر، يبقى المشروع متأخراً كثيراً عند 49.3%.

## صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026، وتحمل ختم GPS بتاريخ 27-أكتوبر-2026 حيث يظهر الختم. تستمر أعمال الأسفلت والبردورات والإنارة، ويتقدم العمل في كرفان مكتب الموقع وهيكل مبنى خرساني. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.

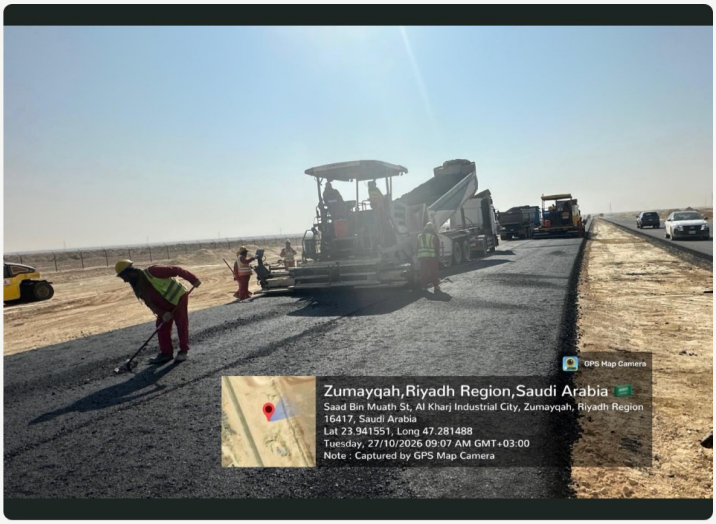



**فرش الأسفلت**

الفرّادة والطاقم على الطبقة الرابطة. ختم GPS بتاريخ 27-أكتوبر-2026، 09:07.



**دمك الأسفلت**

دحّالات مطاطية ومزدوجة على الطبقة الجديدة.

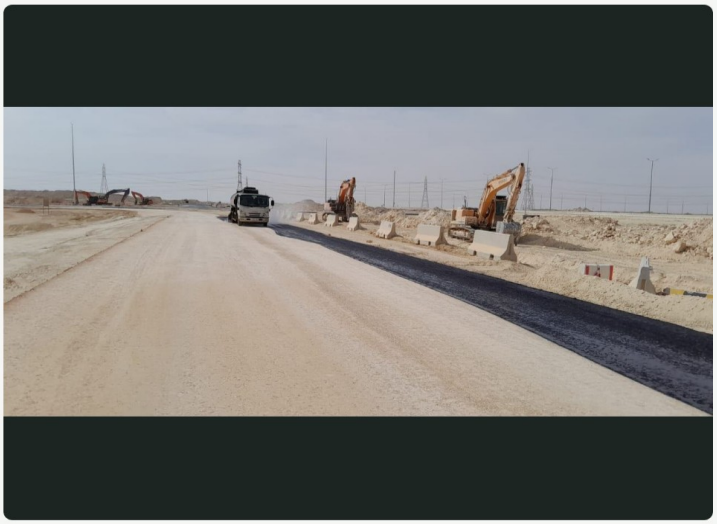

**أعمال الطرق**

مسار أسفلت منتهٍ بجانب طبقة الأساس، والحفّارات تعمل في الأمام.



**البردورات والإنارة**

بردورات مركّبة على حافة الطريق، وأعمدة الإنارة مركّبة.



**كرفان مكتب الموقع**

كرفان مسبق الصنع مع تركيب الكسوة.




**هيكل مبنى خرساني**

اكتمل الهيكل الخرساني.

## منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

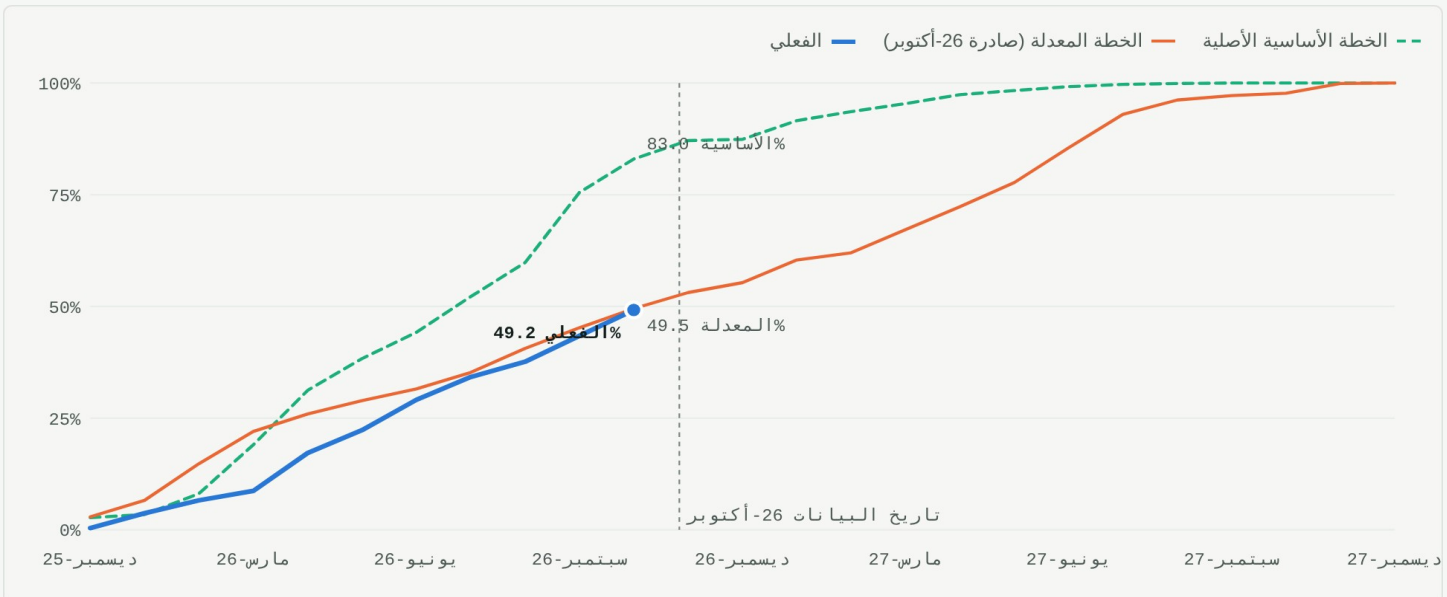

| نهاية الأسبوع | المخطط % | الفعلي % | الانحراف | المنجز خلال الأسبوع | مؤشر الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-Sep-2026 | 47.2 | 42.5 | −4.7 | +0.8 | 0.90 |
| 05-Oct-2026 | 50.1 | 43.4 | −6.7 | +0.9 | 0.87 |
| 12-Oct-2026 | 51.4 | 45.7 | −5.7 | +2.3 | 0.89 |
| 19-Oct-2026 | 52.5 | 47.0 | −5.5 | +1.3 | 0.89 |
| **26-Oct-2026** | **48.4*** | **49.3** | **+0.9** | **%2.2** | **1.02** |

نسبة الإنجاز الفعلي من التقارير الأسبوعية من 28 سبتمبر إلى 26 أكتوبر. * اعتباراً من 26 أكتوبر تأتي القيمة المخططة من الخطة المعدلة الجديدة، لذا فإن الانتقال من −5.5% إلى +0.9% يعكس الخطة الجديدة إلى جانب تقدم هذا الأسبوع.

## التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

| المرحلة | الوزن | المخطط | الفعلي | الانحراف | مؤشر الأداء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التصميم الهندسي | 3% | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 1.00 | ✓ مكتمل |
| التوريدات | 20% | 68.6% | 76.5% | +7.9 | 1.12 | ▲ متقدم |
| التنفيذ | 67% | 44.8% | 46.2% | +1.4 | 1.03 | ▲ في المسار |
| الاختبار والتشغيل | 10% | 16.0% | 0.0% | −16.0 | 0.00 | ▼ لم يبدأ |
| **الإجمالي** | 100% | **48.4%** | **49.3%** | **+0.9** | **1.02** | ▲ في المسار |

يضم تحديث P6 (نسخة الجدول ICKM01-22.Oct.2026، تاريخ البيانات 17-أكتوبر-2026) عدد 5,877 نشاطاً: 3,671 مكتملاً و254 قيد التنفيذ و1,952 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 27-أبريل-2028، أي بعد تاريخ العقد بـ147 يوماً.

## نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية لكل شبكة، من جداول الكميات في صفحات المخططات بعرض التقدم بتاريخ 26-أكتوبر-2026. بالنسبة للمواسير والتمديدات والمناهل، "المنفذ" يعني المركّب، ويُظهر العمود الأخير نسبة ما تم ردمه أيضاً.

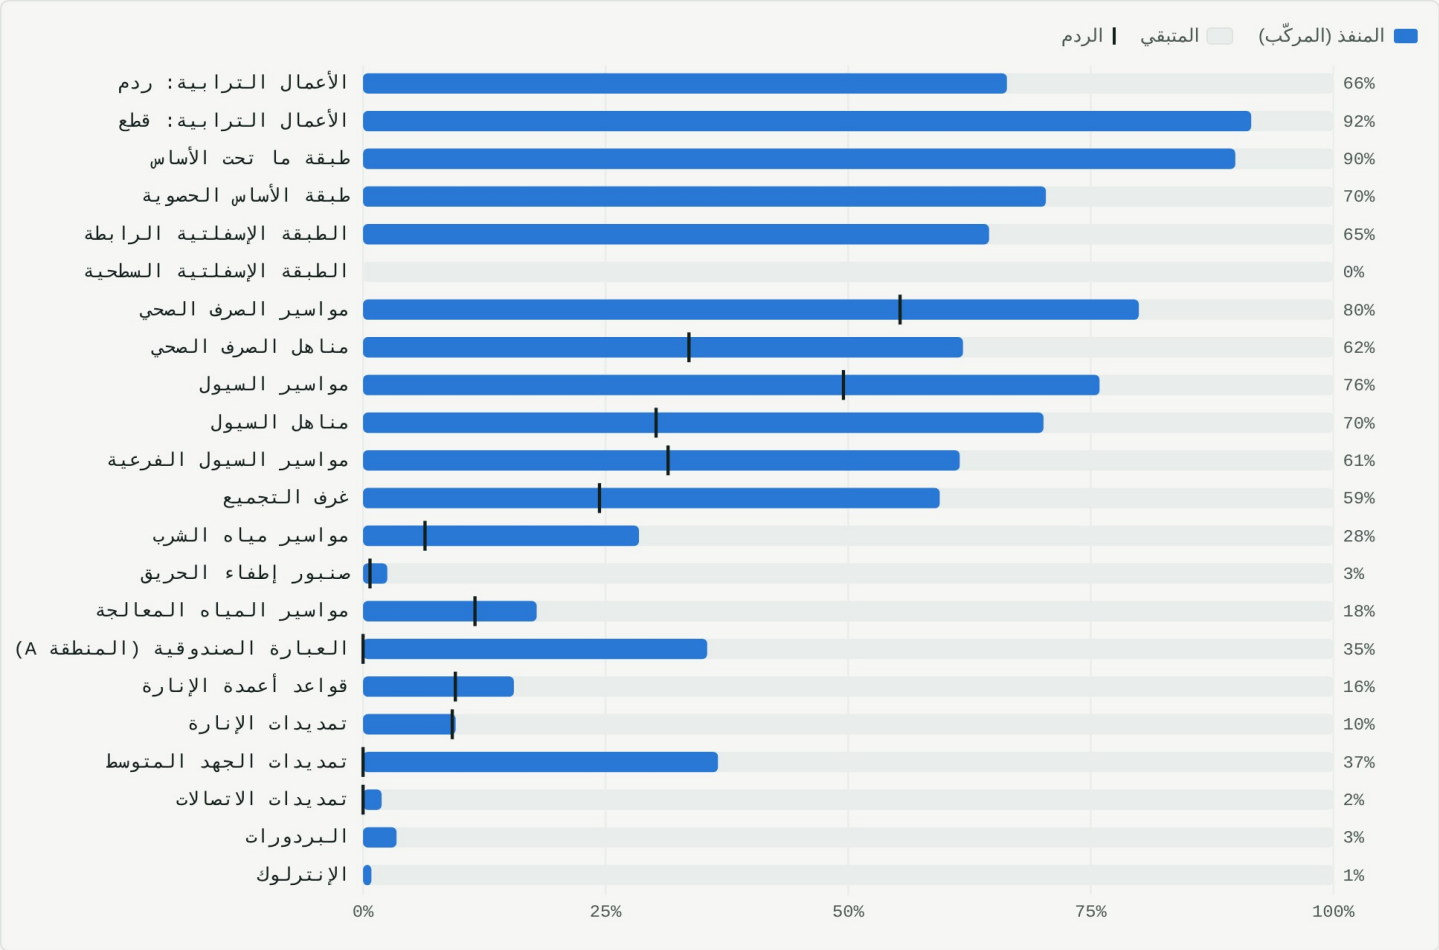
المنفذ (المركّب)
المتبقي
الردم
الأعمال الترابية: ردم
66%
الأعمال الترابية: قطع
92%
طبقة ما تحت الأساس
90%
طبقة الأساس الحصوية
70%
الطبقة الإسفلتية الرابطة
65%
الطبقة الإسفلتية السطحية
0%
مواسير الصرف الصحي
80%
مناهل الصرف الصحي
62%
مواسير السيول
76%
مناهل السيول
70%
مواسير السيول الفرعية
61%
غرف التجميع
59%
مواسير مياه الشرب
28%
صنبور إطفاء الحريق
3%
مواسير المياه المعالجة
18%
العبارة الصندوقية (المنطقة A)
35%
قواعد أعمدة الإنارة
16%
تمديدات الإنارة
10%
تمديدات الجهد المتوسط
37%
تمديدات الاتصالات
2%
البردورات
3%
الإنترلوك
1%
0%
25%
50%
75%
100%

| بند النطاق | المنطقة | الوحدة | الإجمالي | المنفذ | المتبقي | % المنفذ | الردم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **الأعمال الترابية: ردم** | A | م³ | 357,335 | 268,632 | 88,703 | 75.2% | – |
| | B | م³ | 499,555 | 300,000 | 199,555 | 60.1% | – |
| | **الإجمالي** | م³ | **856,890** | **568,632** | **288,258** | **66.4%** | – |
| **الأعمال الترابية: قطع** | A | م³ | 97,475 | 89,831 | 7,644 | 92.2% | – |
| | B | م³ | 40,190 | 36,189 | 4,001 | 90.0% | – |
| | **الإجمالي** | م³ | **137,665** | **126,020** | **11,645** | **91.5%** | – |
| **طبقة ما تحت الأساس** | A | م³ | 82,330 | 73,996 | 8,334 | 89.9% | – |
| | B | م³ | 78,595 | 70,682 | 7,913 | 89.9% | – |
| | **الإجمالي** | م³ | **160,926** | **144,678** | **16,248** | **89.9%** | – |
| **طبقة الأساس الحصوية** | A | م³ | 52,379 | 35,604 | 16,775 | 68.0% | – |
| | B | م³ | 47,537 | 34,715 | 12,822 | 73.0% | – |
| | **الإجمالي** | م³ | **99,916** | **70,319** | **29,597** | **70.4%** | – |
| **الطبقة الإسفلتية الرابطة** | A | م³ | 19,245 | 12,211 | 7,034 | 63.5% | – |
| | B | م³ | 24,948 | 16,303 | 8,645 | 65.3% | – |
| | **الإجمالي** | م³ | **44,192** | **28,514** | **15,678** | **64.5%** | – |
| **الطبقة الإسفلتية السطحية** | A | م³ | 12,400 | 0 | 12,400 | 0.0% | – |
| | B | م³ | 11,205 | 0 | 11,205 | 0.0% | – |
| | **الإجمالي** | م³ | **23,605** | **0** | **23,605** | **0.0%** | – |
| **مواسير الصرف الصحي** | A | م.ط | 14,308 | 11,541 | 2,767 | 80.7% | 50.7% |
| | B | م.ط | 7,539 | 5,928 | 1,611 | 78.6% | 64.1% |
| | **الإجمالي** | م.ط | **21,847** | **17,468** | **4,378** | **80.0%** | 55.3% |
| **مناهل الصرف الصحي** | A | عدد | 286 | 160 | 126 | 55.9% | 39.5% |
| | B | عدد | 107 | 83 | 24 | 77.6% | 17.8% |
| | **الإجمالي** | عدد | **393** | **243** | **150** | **61.8%** | 33.6% |
| **مواسير السيول** | A | م.ط | 14,482 | 10,911 | 3,571 | 75.3% | 52.4% |
| | B | م.ط | 8,544 | 6,568 | 1,977 | 76.9% | 44.6% |
| | **الإجمالي** | م.ط | **23,026** | **17,479** | **5,547** | **75.9%** | 49.5% |
| **مناهل السيول** | A + السكن العمالي | عدد | 194 | 124 | 70 | 63.9% | 33.5% |
| | B | عدد | 104 | 85 | 19 | 81.7% | 24.0% |
| | **الإجمالي** | عدد | **298** | **209** | **89** | **70.1%** | 30.2% |
| **مواسير السيول الفرعية** | A | م.ط | 7,207 | 4,544 | 2,663 | 63.0% | 44.4% |
| | B | م.ط | 5,323 | 3,162 | 2,161 | 59.4% | 13.9% |
| | **الإجمالي** | م.ط | **12,529** | **7,705** | **4,824** | **61.5%** | 31.4% |
| **غرف التجميع** | A | عدد | 416 | 221 | 195 | 53.1% | 25.5% |
| | B | عدد | 257 | 179 | 78 | 69.6% | 22.6% |
| | **الإجمالي** | عدد | **673** | **400** | **273** | **59.4%** | 24.4% |
| **مواسير مياه الشرب** | A + السكن العمالي | م.ط | 20,475 | 2,445 | 18,030 | 11.9% | 1.4% |
| | B | م.ط | 10,308 | 6,310 | 3,998 | 61.2% | 16.2% |
| | **الإجمالي** | م.ط | **30,783** | **8,754** | **22,029** | **28.4%** | 6.4% |
| **صنبور إطفاء الحريق** | A | عدد | 170 | 3 | 167 | 1.8% | 1.2% |
| | B | عدد | 110 | 4 | 106 | 3.6% | 0.0% |
| | **الإجمالي** | عدد | **280** | **7** | **273** | **2.5%** | 0.7% |
| **مواسير المياه المعالجة** | A | م.ط | 13,023 | 130 | 12,893 | 1.0% | 0.0% |
| | B | م.ط | 10,991 | 4,167 | 6,824 | 37.9% | 25.2% |
| | **الإجمالي** | م.ط | **24,014** | **4,297** | **19,717** | **17.9%** | 11.5% |
| **العبارة الصندوقية (المنطقة A)** | A | م.ط | 1,500 | 532 | 968 | 35.5% | 0.0% |
| **قواعد أعمدة الإنارة** | A | عدد | 509 | 68 | 441 | 13.4% | 0.0% |
| | B | عدد | 353 | 66 | 287 | 18.7% | 23.2% |
| | **الإجمالي** | عدد | **862** | **134** | **728** | **15.5%** | 9.5% |
| **تمديدات الإنارة** | A | م.ط | 26,093 | 1,831 | 24,262 | 7.0% | 7.0% |
| | B | م.ط | 18,277 | 2,403 | 15,873 | 13.1% | 12.3% |
| | **الإجمالي** | م.ط | **44,370** | **4,234** | **40,136** | **9.5%** | 9.2% |
| **تمديدات الجهد المتوسط** | A | م.ط | 27,225 | 5,313 | 21,912 | 19.5% | 0.0% |
| | B | م.ط | 44,775 | 21,024 | 23,751 | 47.0% | 0.0% |
| | **الإجمالي** | م.ط | **72,000** | **26,337** | **45,663** | **36.6%** | 0.0% |
| **تمديدات الاتصالات** | A | م.ط | 34,149 | 0 | 34,149 | 0.0% | 0.0% |
| | B | م.ط | 20,299 | 1,042 | 19,257 | 5.1% | 0.0% |
| | **الإجمالي** | م.ط | **54,448** | **1,042** | **53,406** | **1.9%** | 0.0% |
| **البردورات** | A | م.ط | 81,768 | 1,041 | 80,727 | 1.3% | – |
| | B | م.ط | 74,109 | 4,333 | 69,776 | 5.8% | – |
| | **الإجمالي** | م.ط | **155,877** | **5,374** | **150,503** | **3.4%** | – |
| **الإنترلوك** | A | م² | 71,538 | 0 | 71,538 | 0.0% | – |
| | B | م² | 68,822 | 1,206 | 67,616 | 1.8% | – |
| | **الإجمالي** | م² | **140,359** | **1,206** | **139,154** | **0.9%** | – |

**العبّارات**

العبّارتان 01 (الطريق المحلي 19) و02 (الطريق المحلي 20) مكتملتان. العبّارة 05 (الطريق المحلي 23) رُكّبت جميع وحداتها مسبقة الصب وعددها 35. العبّارة 06 (الطريق المحلي 24) رُكّبت 37 وحدة والحفر ما زال جارياً. العبارة الصندوقية في المنطقة A مركّبة بنسبة 35% ولم تُردم بعد.

**لم تبدأ أو بالكاد بدأت**

طبقة الأسفلت السطحية واتصالات المنطقة A عند 0%. الإنترلوك عند 0.9% (المنطقة B فقط)، والبردورات نحو 3%، وصنبور إطفاء الحريق 2–4%، والمياه المعالجة في المنطقة A 1%، ومياه الشرب في المنطقة A 12%. وتظهر شبكة السيول في منطقة المصانع لأول مرة في عرض هذا الأسبوع ولم يبدأ العمل فيها بعد.

## المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث جدول P6 توقعات مختلفة للمعالم المرحلية. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول.


| المعلم | الخطة الأساسية | توقع التقرير الأسبوعي | توقع تحديث P6 | الفائض في P6 (أيام) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| تسليم الموقع | 03-Dec-2025 | 03-Dec-2025 | 03-Dec-2025 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| اكتمال التجهيز | 02-Jan-2026 | 02-Jan-2026 | – | – | ✓ منجز |
| أعمال الطرق | 02-Oct-2026 | 07-Nov-2026 (+36 يوماً) | 20-Dec-2026 | −68 | ▼ متأخر |
| شبكة الجهد المتوسط | 02-Oct-2026 | 31-Oct-2026 (+29 يوماً) | 28-Jan-2027 | −102 | ▼ متأخر |
| شبكة تصريف السيول | – | – | 03-Mar-2027 | −24 | ▼ معرّض للتأخير |
| شبكة الصرف الصحي | – | – | 14-Mar-2027 | −33 | ▼ معرّض للتأخير |
| شبكة الاتصالات | – | – | 25-May-2027 | −94 | ▼ متأخر |
| شبكة الري | – | – | 18-Jul-2027 | −141 | ▼ متأخر |
| شبكة مياه الشرب | – | – | 30-Oct-2027 | −230 | ▼ متأخر |
| جميع الشبكات | 02-Feb-2027 | 02-Feb-2027 | – | – | ؟ يتعارض مع P6 |
| تنسيق المواقع | – | – | 19-Apr-2028 | −118 | ▼ متأخر |
| تسليم المشروع | 02-Dec-2027 | 02-Dec-2027 | 27-Apr-2028 | −126 | ▼ متأخر |

**تواريخ P6 تتعارض مع معلم "جميع الشبكات" بتاريخ 02-فبراير-2027 ومع تاريخ انتهاء العقد.**

يُنهي تحديث P6 لهذا الأسبوع الشبكات بين ديسمبر 2026 وأكتوبر 2027، والمشروع في 27-أبريل-2028. أضعف نقطة هي شبكة مياه الشرب بفائض −230 يوماً بسبب المحابس. ويشمل الفائض السالب الآن 1,243 نشاطاً مفتوحاً، في مقدمتها اللوحات المرورية (74) والغطاء النباتي والشجيرات (64) والأشجار والنخيل (61) وبنود التشجير (60) والبردورات مسبقة الصب (47).

## توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المورّدة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 26-أكتوبر-2026.

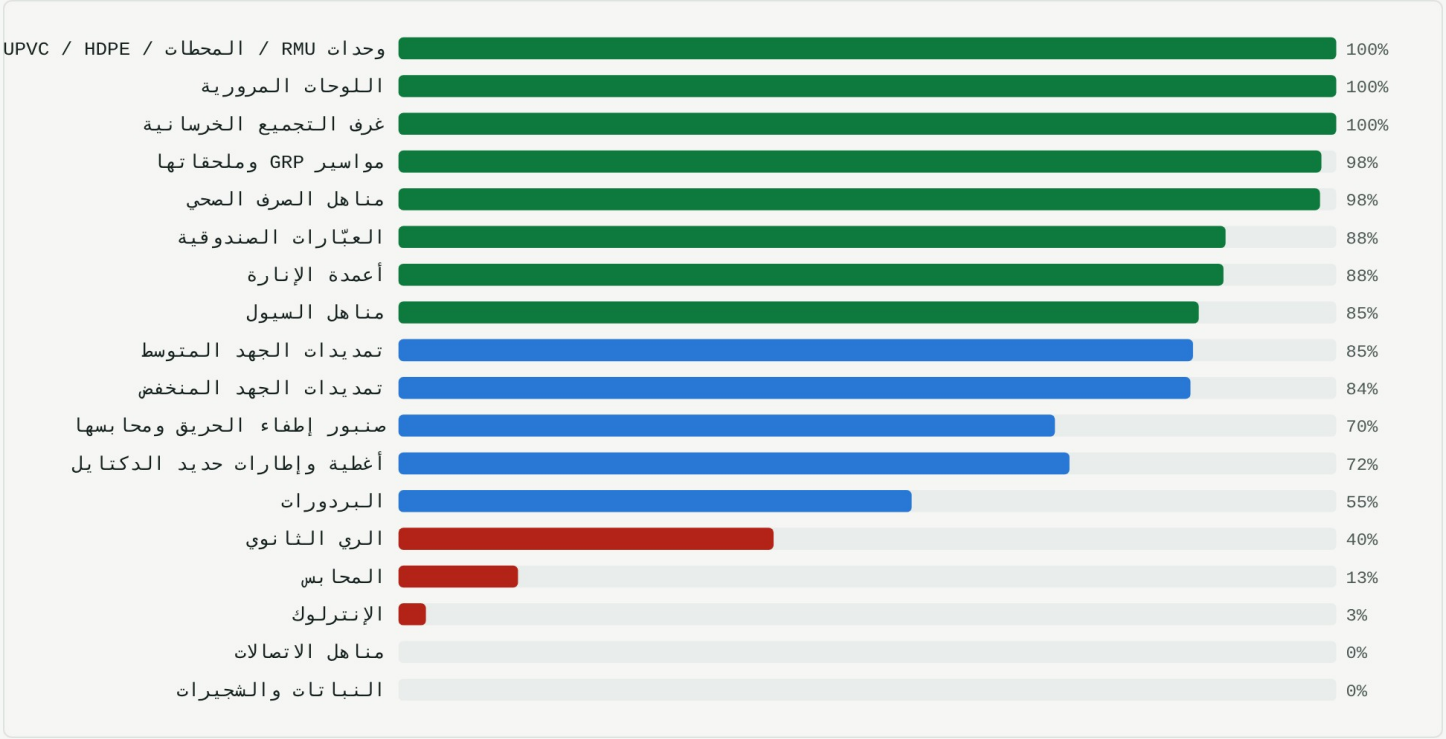


**الإنترلوك: 3% مورّد**


3,780 من 129,381 م.ط. العيّنة لم تُعتمد بعد والتوريدات ما زالت متوقفة، ومع ذلك يُذكر الآن تركيب 1,206 م² في المنطقة B.

**المحابس ومناهل الاتصالات والتشجير**

المحابس المورّدة 347 من 2,723 (13%). مناهل الاتصالات 0 من 214، والموعد بحلول 20-نوفمبر. التشجير (30,556 م²) بانتظار الاتفاق على الكمية النهائية. تمديدات الجهد المتوسط 61 من 72 كم، بانتظار إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من اختبار القبول في المصنع.

## القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

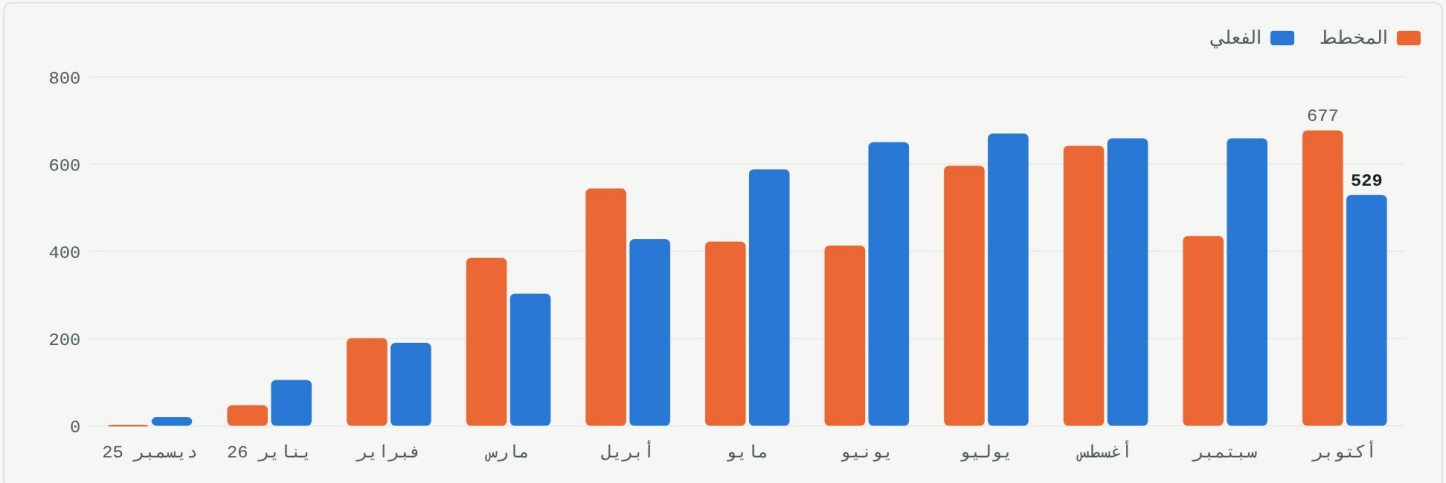


عدد العمالة في أكتوبر 529 مقابل 677 مخططاً (−22%). يكرر تقرير 26 أكتوبر رقم أكتوبر من الأسبوع الماضي. وتبلغ الخطة ذروتها عند 841 في نوفمبر 2026.

## التكلفة والمستخلصات

### قيمة العقد

| | |
|---|---|
| الحزمة 01: البنية التحتية، 3.5 كم² | 226,527,683 |
| الحزمة 02: منطقة السكن العمالي | 18,085,168 |
| الحزمة 03: مسجد ومهبط مروحيات وسيول وتأهيل طرق | 23,118,731 |
| **إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)** | **267,731,582** |
| قيمة العقد شاملة ضريبة 15% | 307,891,320 |
| أوامر التغيير | 0 |

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

### المستخلصات

| | |
|---|---|
| المستخلصات المقدمة | 5 |
| القيمة الإجمالية | 49,710,656 |
| المحتجزات (10%) | 4,971,066 |
| الخصومات والغرامات | 111,000 |
| الصافي شاملاً الضريبة | 51,339,529 |
| قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه | 61,710,656 |

المفوتر 16.1% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 49.3%. يسجل سجل المستخلصات تواريخ اعتماد للمستخلصات الخمسة، لكن ملخصه يُظهر 0 معتمداً من مدير المشروع و0 مدفوعاً. يجب تأكيد حالة الدفع.

## الصحة والسلامة والجودة

### السلامة التقييم 0.90

| | |
|---|---|
| ساعات العمل الآمنة (تراكمي) | 1,135,445 |
| ساعات العمل هذا الأسبوع | 30,630 |
| إصابات مضيعة للوقت | 0 |
| الوفيات | 0 |
| حالات الإسعافات الأولية | 6 |
| حوادث وشيكة | 2 |
| أضرار الممتلكات | 3 |
| التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية | 1,944 / 217 |

### الجودة التقييم 0.93

| | |
|---|---|
| طلبات الفحص هذا الأسبوع: معتمدة | 294 |
| طلبات الفحص هذا الأسبوع: مرفوضة | 9 |
| طلبات الفحص قيد المراجعة | 49 |
| الاختبارات المنفذة (تراكمي) | 2,450 |
| تقارير عدم المطابقة (تراكمي) | 37 |
| طلبات الاستيضاح مفتوحة / مغلقة | 1 / 122 |
| طلبات فحص المواد المعتمدة | 49 |
| المخططات التنفيذية المعتمدة | 2,087 |

أسبوع الجودة: 18–24 أكتوبر 2026.

## المشكلات والمخاطر القائمة

| المشكلة | المسؤول | التفاصيل |
|---|---|---|
| عوائق الموقع | المالك | عوائق بين حدود المصنع والطريقين المحليين 19–20. غرف قديمة ومستودع مسوّر ولوحات على الطريق المحلي 18. خزان ديزل لم تُحدَّد الجهة المسؤولة عن إزالته. منطقة الكسارة لم تُسلَّم رسمياً بعد. |
| تعارضات شبكة الجهد المتوسط | المقاول | مسار الجهد المتوسط قريب جداً من شبكتي المياه والري، مما يمنع بدء أعمال الجهد المتوسط الداخلية. |
| العبّارة الصندوقية، المنطقة A | المقاول | يتعارض حفر العبّارة الصندوقية لتصريف السيول مع تمديدات الجهد المنخفض والمتوسط القائمة ومواسير المياه والري. |
| استمرارية الأسفلت | المقاول | يجب استمرار أعمال الأسفلت دون انقطاع لاستعادة معلم الطرق. |
| استعادة المعالم | المقاول | أُغلق التعافي في التصميم والتوريد، والتعافي في التنفيذ مستمر. |
| وفورات التكلفة | المقاول | تحديد الوفورات المالية والفنية الممكنة. |

المخاطر القائمة في السجل: الطقس (أمطار ورياح وغبار)، وتوريد مواد الردم والمناهل والمواسير، وسلامة الحفر العميق، والخدمات والطرق القائمة، وتأخر المواد الرئيسية.

## ملاحظات على البيانات

- تُظهر عدة جداول ملخصة في ملف التقرير الأسبوعي (التقديمات، التوريد، العمالة حسب المهنة، أهم المشكلات) أخطاء #REF! ، لذا أُخذت الأرقام من الأوراق التفصيلية.
- توقعات المعالم في التقرير الأسبوعي لا تطابق تحديث P6، ويختلفان الآن أيضاً على تاريخ الانتهاء، انظر قسم المعالم الرئيسية.
- صدرت خطة معدلة جديدة مع تقرير 26 أكتوبر. انخفض التقدم المخطط حتى تاريخه من 52.5% إلى 48.4%، لذا فإن معظم التغير من −5.5% إلى +0.9% يعود إلى الخطة الجديدة وليس إلى أعمال هذا الأسبوع.
- تحديث P6 المرفوع في 26 أكتوبر تاريخ بياناته 17-أكتوبر-2026، وهو نفس تاريخ ملف الأسبوع السابق، لذا لا يشمل أعمال الأسبوع الأخير.
- ورقة القوى العاملة تكرر رقم أكتوبر من الأسبوع الماضي (529).
- طلبات فحص المواد المعتمدة تُظهر 49 تراكمياً هذا الأسبوع مقابل 213 الأسبوع الماضي، ويبدو أن العداد أُعيد ضبطه.
- تُظهر ورقة الجودة 53,207 طلب فحص معتمداً للأسبوع السابق، ويبدو ذلك خطأً في الإدخال.
- التقارير الأسبوعية موجودة في W1–W5 (من 28 سبتمبر إلى 26 أكتوبر). كما رُفعت نسخ من ملفات Excel وPDF الأصلية داخل مجلد MD Files في W1، ومكانها مجلد All Files.
- كميات النطاق: يضيف عرض هذا الأسبوع جدول مياه الشرب للمنطقة A الذي كان ناقصاً، ويصحح إجمالي اتصالات المنطقة A من 155,000 م.ط إلى 34,149 م.ط. ولا تزال أعمدة الإنارة موسومة بالمتر الطولي في المصدر رغم أنها معدودة بالوحدة.

أُعدّ في 28-أكتوبر-2026 من التقارير الأسبوعية المرفوعة للأسابيع المنتهية من 28 سبتمبر إلى 26 أكتوبر 2026.
