تطوير شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام المرحلة الثانية الجزء الثاني - المنطقة J

Development of Infrastructure Networks, 3rd Industrial City in Dammam, Phase 2 Part 2, Zone J

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة أنساب للمقاولات العامة	إيجيس (EGIS)	المهندس محمد العيسى	12-Jan-2025	11-Jan-2027

النطاق: الطرق التجميعية والمحلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والجهد المتوسط وإنارة الشوارع والاتصالات، ومحطة رفع للصرف الصحي وبحيرات لتصريف السيول في البلوك J. قيمة العقد 117.4 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 24 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 13-أكتوبر-2026 بلغ الإنجاز 54.8% مقابل 85.3% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 30.5% (مؤشر الأداء الزمني 0.64). ويذكر التقرير الأسبوعي إنجاز 3.4% خلال هذا الأسبوع مقابل 1.4% مخططاً.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
54.8% / 85.3% مخطط	**+3.4%** / 1.4% مخطط	**87.7%** · اليوم 639 من 729	**37.0%** · 43.4 مليون ريال
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.64	▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 2.0%	▼ الانتهاء المتوقع 31-أغسطس-2027	19 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 31-أغسطس-2026
−30.5%			

من المتوقع أن ينتهي المشروع متأخراً نحو سبعة أشهر ونصف.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026) الانتهاء في 31-أغسطس-2027، أي بعد تاريخ انتهاء العقد (11-يناير-2027) بـ232 يوماً. ويبلغ الفائض الزمني لمعلم انتهاء المشروع في 189.5– P6 يوماً. وبعد انقضاء 87.7% من مدة العقد، يتبقى 45.2% من الأعمال، وجميع معالم اكتمال الشبكات في P6 بفائض سالب بين 124 و207 أيام.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور مرفوعة مع تقرير هذا الأسبوع. حيث يظهر ختم الكاميرا فهو 11-أكتوبر-2026 أو 15-أكتوبر-2026، المدينة الصناعية الثالثة بالدمام. تُظهر الصور غرف الخط المزدوج لشبكة السيول وغرف تجميع الأمطار وأعمال تجهيز قاع الطرق. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



تسليح غرفة الخط المزدوج

قفص حديد تسليح لغرفة فوق ماسورتي GRP المزدوجتين. مختومة 11-أكتوبر-2026، 10:26.



غرفة عند تقاطع المواسير

تركيب التسليح حول تقاطع مواسير GRP والحفّارة تعمل بجانبه. مختومة 11-أكتوبر-2026، 10:13.



تركيب غرفة تجميع أمطار

غرفة تجميع مسبقة الصب CB-BJ1-SWD-18 مع ماسورة التوصيل ممدودة في الخندق.



حفر الخنادق

خندق بمحاذاة الطريق المسفلت، وغرفة تجميع مركّبة في الأمام.



الدمك في مسار الطريق

مدكّة هزازة على قاع الطريق. ختم GPS بتاريخ 15-أكتوبر-2026، 11:29.




تجهيز قاع الطريق

قاع مسوّى يجري رشه بالماء، وأعمدة الإنارة على الحافة. مختومة 15-أكتوبر-2026، 11:39.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

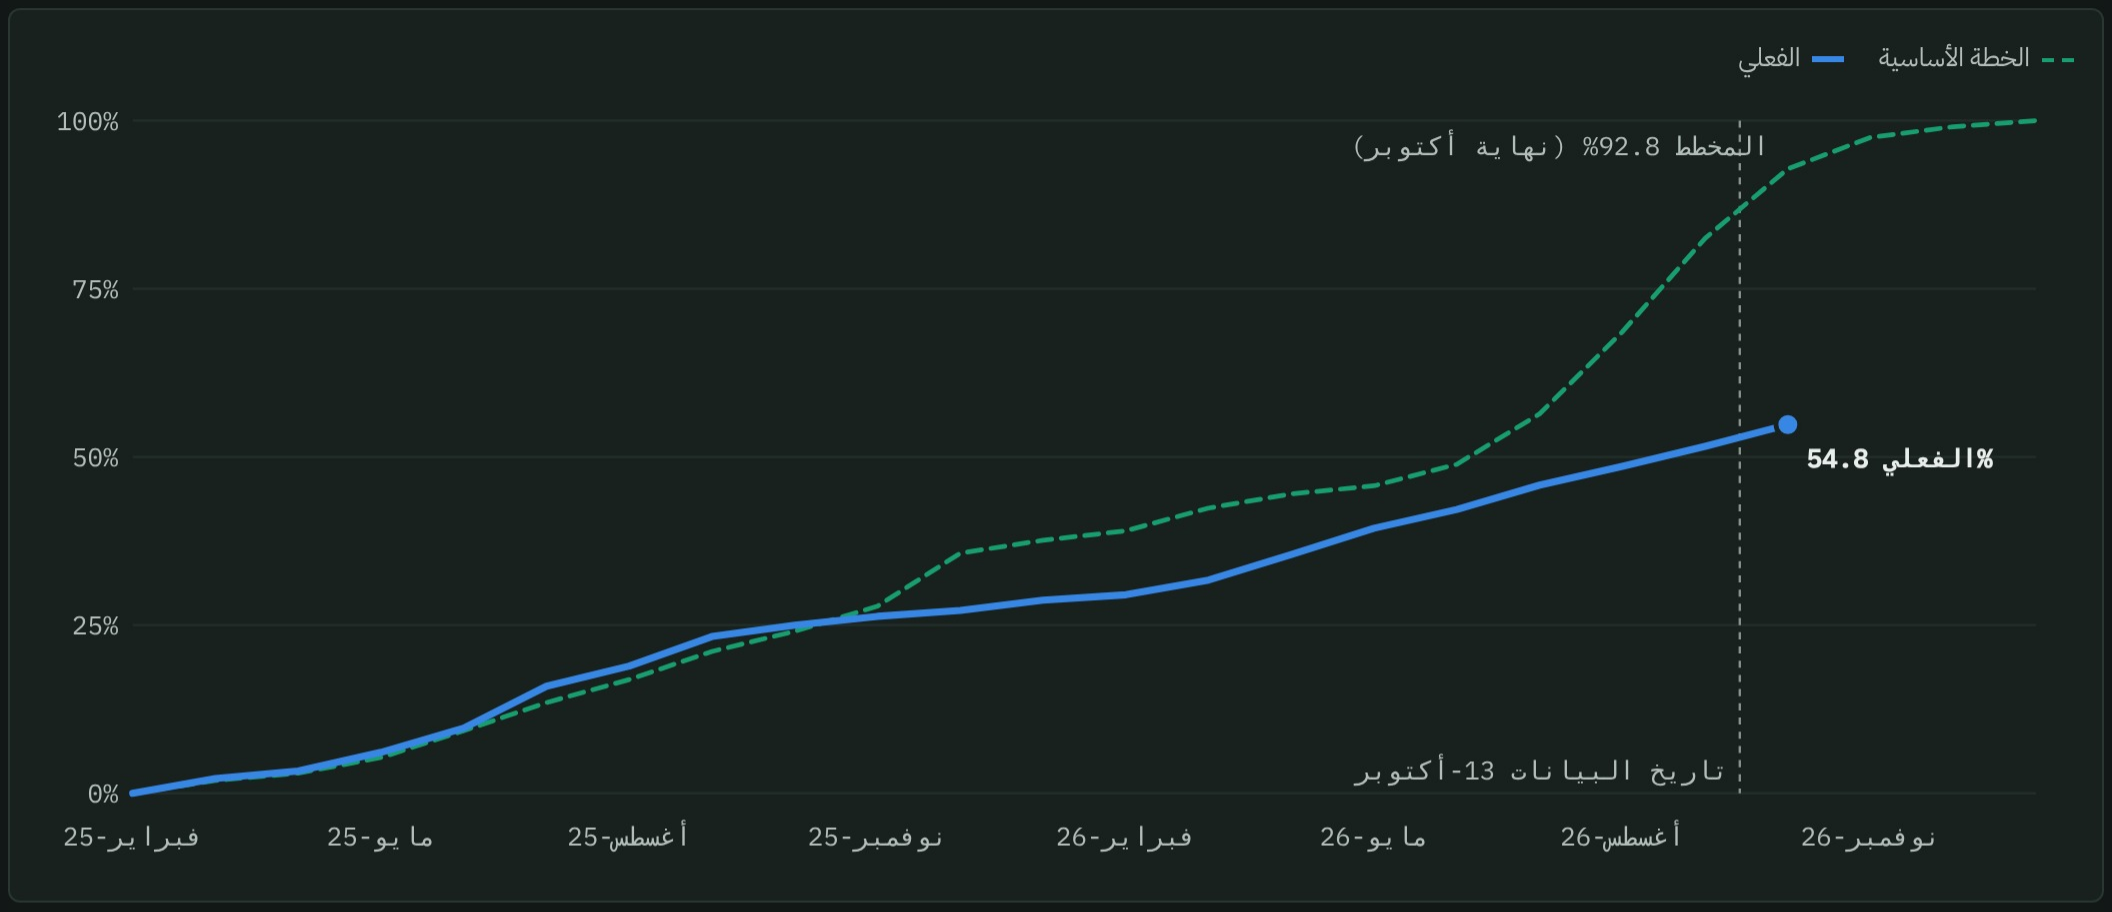

نهاية الشهر	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الشهر	مؤشر الأداء
مايو-2026	45.7	39.4	−6.3	+3.9	0.86
يونيو-2026	48.9	42.3	−6.6	+2.9	0.86
يوليو-2026	56.4	45.8	−10.6	+3.6	0.81
أغسطس-2026	68.6	48.6	−20.0	+2.8	0.71
سبتمبر-2026	82.5	51.6	−30.9	+3.0	0.63
13-Oct-2026	**85.3***	**54.8**	**−30.5**	**+3.2**	**0.64**

استُخدم أحدث تقرير أسبوعي فقط، ولا يتضمن سجلاً أسبوعياً، لذا الجدول شهري. * القيمة المخططة في تاريخ البيانات من غلاف التقرير، والمخطط لنهاية أكتوبر 92.8%. ينجز المشروع نحو 3% شهرياً منذ مايو بينما ترتفع الخطة بنسبة 8–14% شهرياً.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
شبكة الأعمال الترابية	8.3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
شبكة الري	3.5%	94.9%	21.4%	−73.4	0.23	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	4.1%	89.1%	33.8%	−55.3	0.38	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	3.6%	95.0%	76.8%	−18.3	0.81	▼ متأخر
شبكة إنارة الشوارع	12.5%	100.0%	26.3%	−73.7	0.26	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	2.2%	100.0%	54.6%	−45.4	0.55	▼ متأخر
شبكة الطرق	33.2%	68.7%	53.2%	−15.6	0.77	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	17.6%	86.6%	54.9%	−31.7	0.63	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	15.1%	92.4%	65.3%	−27.1	0.71	▼ متأخر
الإجمالي	100%	**85.3%**	**54.8%**	**−30.5**	**0.64**	▼ متأخر

لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات والاختبار ساعات عمل في قياس التقدم الفعلي لذا لم تُدرج. ووفق القيمة المكتسبة (على أساس التكلفة) بلغ المشروع 75.8% مقابل 85.8% مخططاً (مؤشر الأداء 0.88)، لكنه ليس المقياس الرئيسي للتقدم. يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026) عدد 1,921 نشاطاً: 1,221 مكتملاً و64 قيد التنفيذ و636 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 31-أغسطس-2027، أي بعد تاريخ العقد بـ232 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

الأطوال الإجمالية والمنفذة والمتبقية لكل شبكة، من ملخص التنفيذ في ورقة ملخص سير الأعمال. لا يتضمن التقرير الكميات التراكمية السابقة، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز "–". والأعمال المنفذة هذا الأسبوع مدرجة في الجدول الثاني من ورقة أنشطة الأسبوع في التقرير.

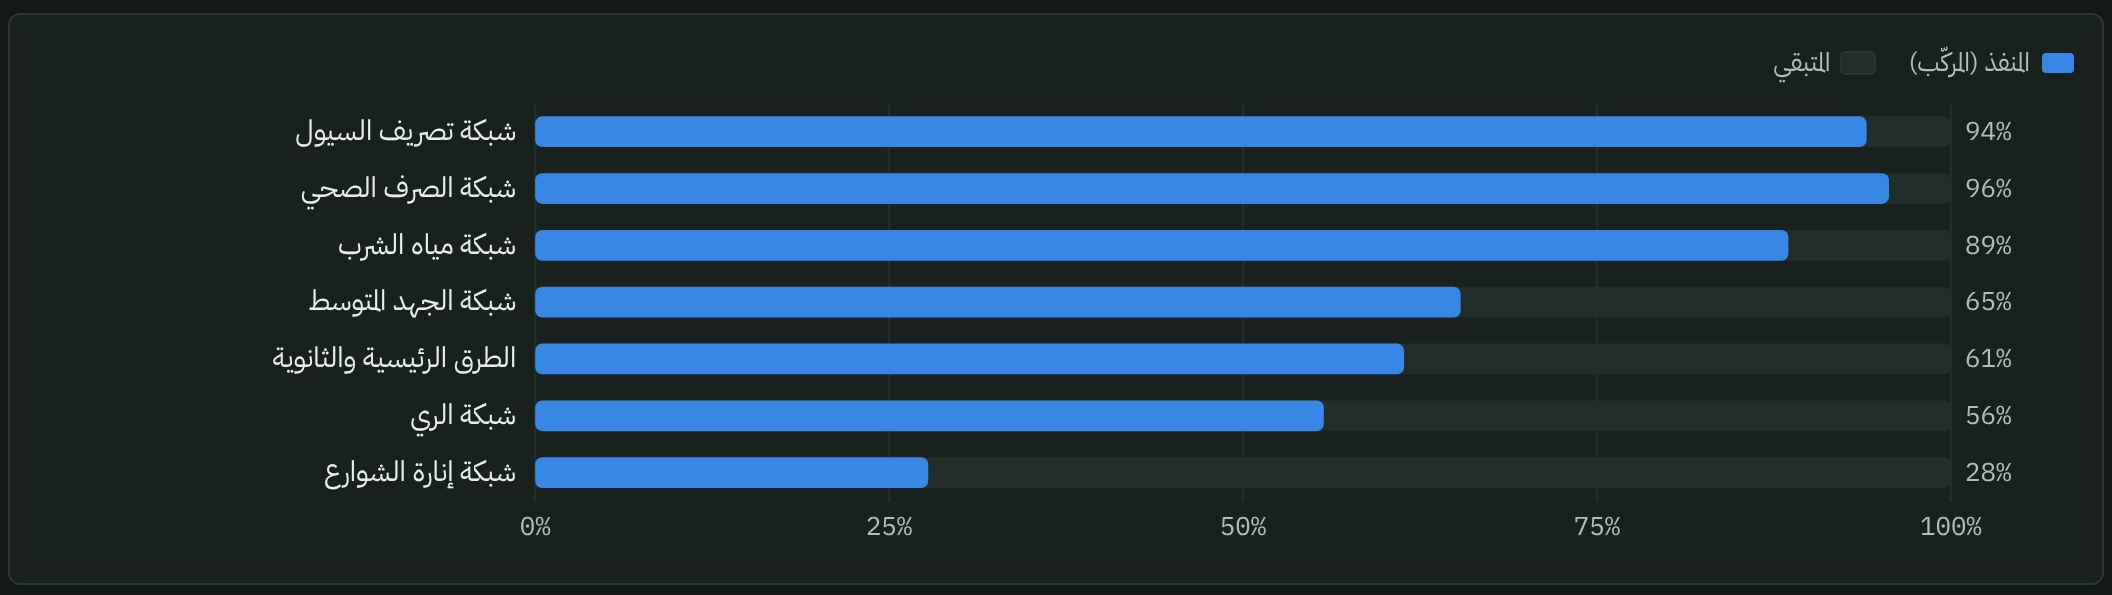

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
شبكة تصريف السيول	البلوك J	م.ط	18,554	17,450	–	1,104	94.0%	–
شبكة الصرف الصحي	البلوك J	م.ط	9,152	8,752	–	400	95.6%	–
شبكة مياه الشرب	البلوك J	م.ط	12,200	10,800	–	1,400	88.5%	–
شبكة الجهد المتوسط	البلوك J	م.ط	17,328	11,328	–	6,000	65.4%	–
الطرق الرئيسية والثانوية	البلوك J	م.ط	8,146	5,000	–	3,146	61.4%	–
شبكة الري	البلوك J	م.ط	14,494	8,074	–	6,420	55.7%	–
شبكة إنارة الشوارع	البلوك J	م.ط	12,786	3,550	–	9,236	27.8%	–

الأعمال المنفذة هذا الأسبوع

الشبكة	النشاط	الموقع	الوحدة	المنفذ هذا الأسبوع	المتوقع الأسبوع القادم
تصريف السيول	حفر وتمديد الخطوط الفرعية	RD 9	م.ط	155	500
تصريف السيول	غرف الخط المزدوج	RD 9	عدد	2	4
تصريف السيول	تركيب المناهل	RD 9, RD 10	عدد	3	5
تصريف السيول	تركيب مصائد الأمطار	RD 9, RD 10	عدد	7	20
الصرف الصحي	حفر وتمديد الخطوط الرئيسية	RD 9, RD EXT	م.ط	448	348
مياه الشرب	حفر وتمديد الخطوط الرئيسية	RD 10, RD 14	م.ط	80	400
الري	حفر وتمديد الخطوط الرئيسية	RD 10, RD EXT	م.ط	531	531
الجهد المتوسط	حفر وتمديد الكابلات	RD EXT	م.ط	1,500	1,500

الأكثر تأخراً

نُفذ 27.8% من إنارة الشوارع (3,550 من 12,786 م.ط)، ولم تُركّب أي وحدات إنارة LED أو تأريض أو تمديدات عبور الطرق أو غرف السحب. ونسبة المنفذ في الري 55.7% وفي الطرق 61.4%. ولم تبدأ أعمال الدهانات المرورية واللوحات وصنبور إطفاء الحريق (0 من 55).

قريبة من الاكتمال

نُفذ 95.6% من أطوال الصرف الصحي و94.1% من تصريف السيول و88.5% من مياه الشرب. واكتملت العبارة الصندوقية لتصريف السيول (2,051 م). ولا تزال مصائد الأمطار عند 207 من 505، وبحيرات تصريف السيول ومحطة رفع الصرف الصحي قيد الإنشاء.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتواريخ المتوقعة من جدول المعالم في التقرير الأسبوعي، مقابل تحديث P6 بتاريخ 20-أكتوبر-2026. الأيام بين القوسين هي التأخير عن الخطة الأساسية كما يذكره التقرير الأسبوعي.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	12-Jan-2025	12-Jan-2025	12-Jan-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	12-Mar-2025	12-Mar-2025	09-Mar-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد المخططات التنفيذية والمواد	10-Feb-2025	11-Feb-2025	24-May-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
شبكة الأعمال الترابية	24-May-2026	31-May-2025	–	–	✓ منجز
شبكة الاتصالات	28-Sep-2026	07-Apr-2027 (+191 يوماً)	13-Mar-2027	-160	▼ متأخر
شبكة الري	23-Aug-2026	05-May-2027 (+255 يوماً)	05-May-2027	-158	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	05-Oct-2026	03-Jul-2027 (+271 يوماً)	19-Jun-2027	-173	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	06-Oct-2026	29-Jun-2027 (+266 يوماً)	15-Jun-2027	-179	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	17-Oct-2026	17-Apr-2027 (+182 يوماً)	27-Mar-2027	-124	▼ متأخر
أعمال الطرق	21-Oct-2026	17-Aug-2027 (+300 يوم)	17-Aug-2027	-189.5	▼ متأخر
شبكة إنارة الشوارع	20-Dec-2026	15-Jul-2027 (+207 أيام)	24-Jun-2027	-207	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	–	13-Jul-2027	05-Jul-2027	-167	▼ متأخر
بحيرات تصريف السيول	–	–	25-Apr-2027	-104	▼ متأخر
محطة رفع الصرف الصحي	–	–	30-May-2027	-129	▼ متأخر
الربط بالشبكات القائمة	–	–	17-Aug-2027	-186.5	▼ متأخر
انتهاء المشروع	11-Jan-2027	31-Aug-2027 (+232 يوماً)	31-Aug-2027	-189.5	▼ متأخر

يتفق التوقعان على تاريخ الانتهاء لكنهما يختلفان في معالم الشبكات.

كلاهما يحدد 31-أغسطس-2027 لانتهاء المشروع ونفس التواريخ للري وأعمال الطرق. أما الاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي والجهد المتوسط وإنارة الشوارع وتصريف السيول فتحديث P6 أبكر من التقرير الأسبوعي بـ8 إلى 25 يوماً. وشهادة عدم الممانعة من المالك لشبكة الجهد المتوسط هي المعلم الرقابي الوحيد الذي لم يتحقق بعد، ويجدولها P6 في 14-ديسمبر-2026 بفائض −39 يوماً.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الكمية المطلوبة. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 13-أكتوبر-2026. جميع المواد المدرجة معتمدة.

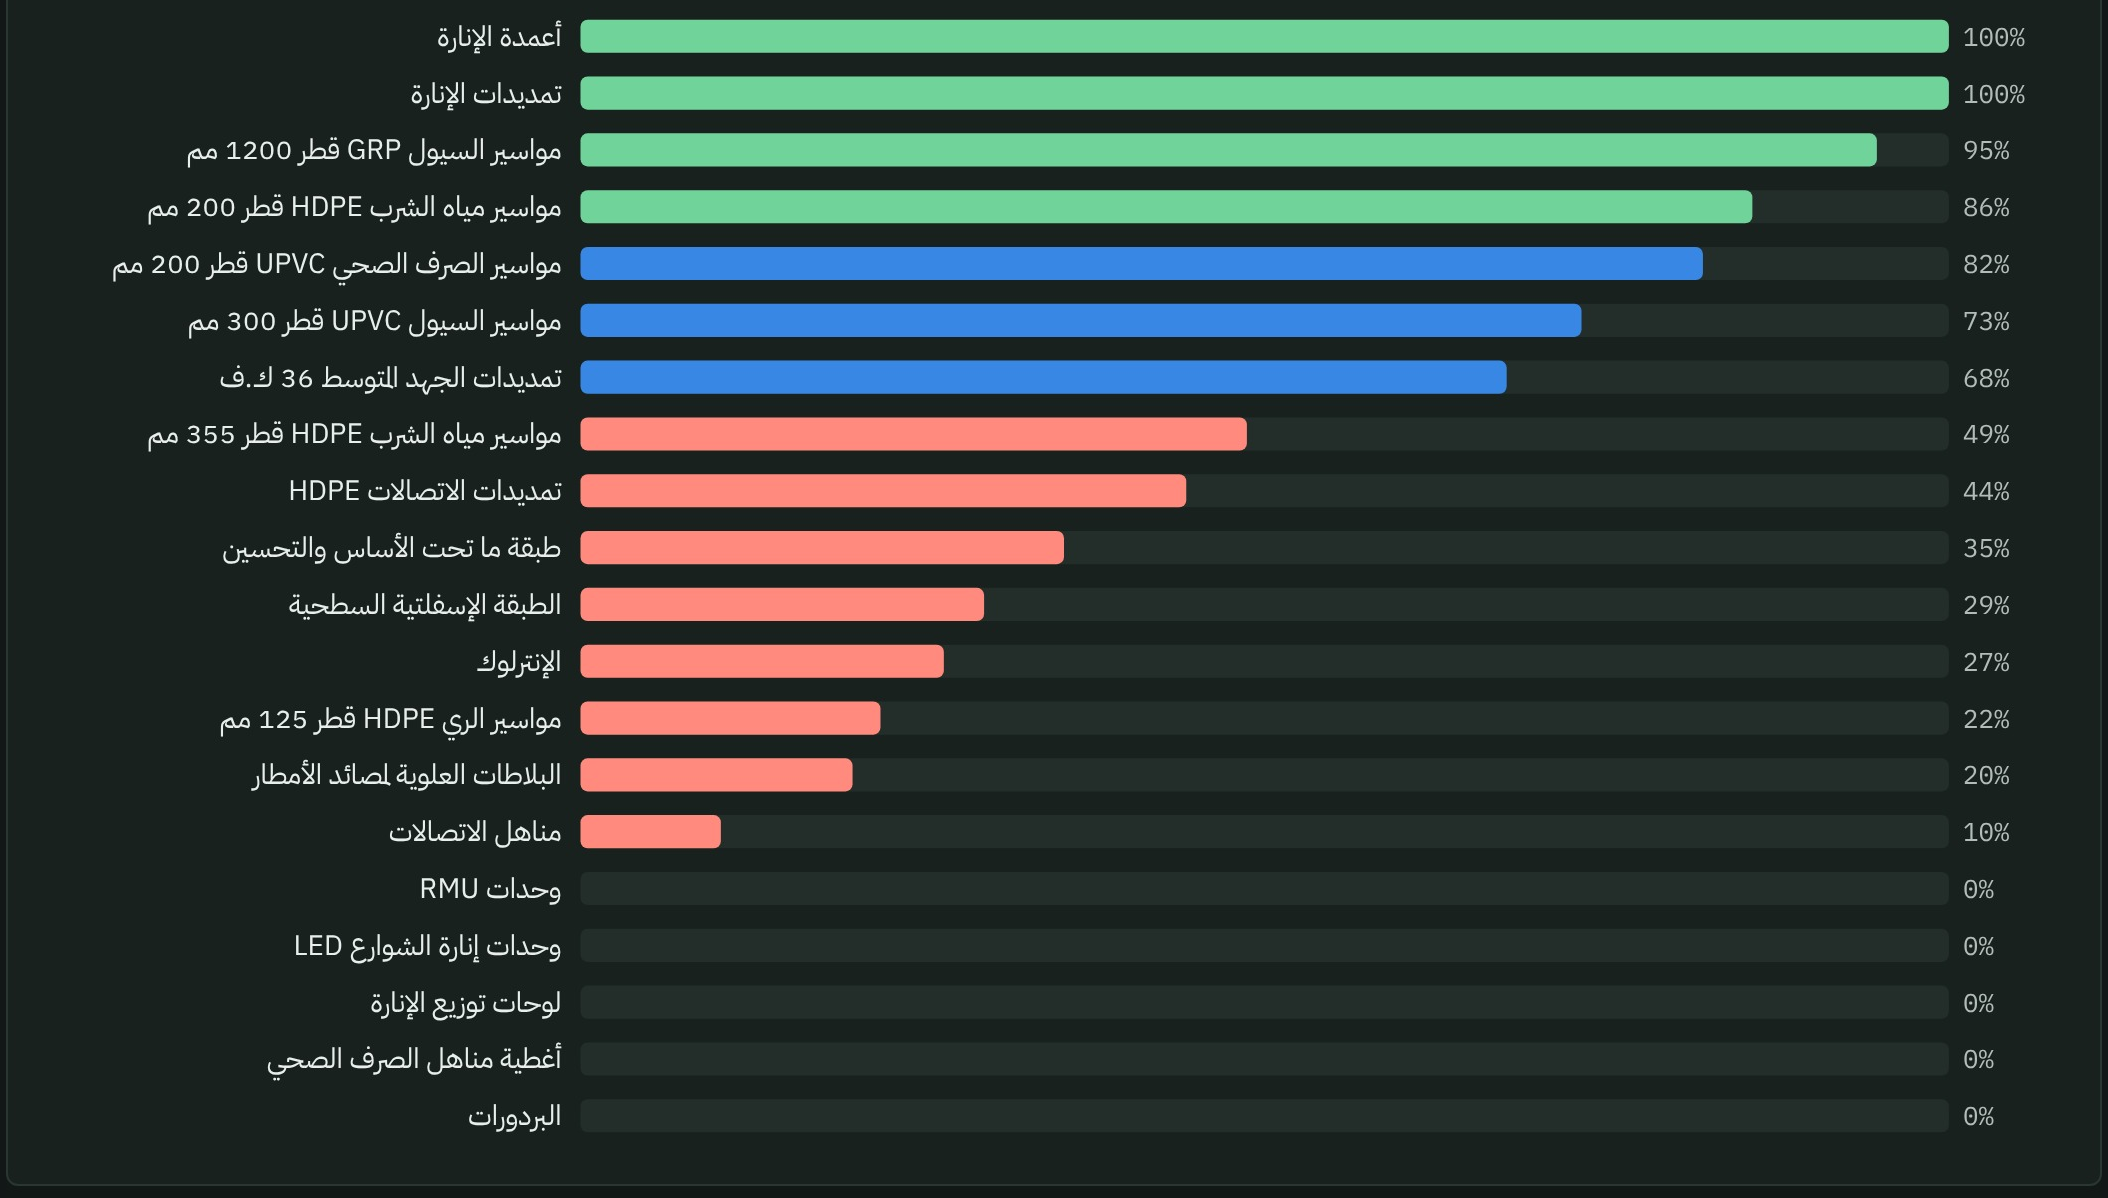

لم يُورّد شيء بعد لعدة بنود في الشبكات الحرجة


وحدات RMU (0 من 9)، ووحدات إنارة الشوارع LED (0 من 363)، ولوحات توزيع الإنارة (0 من 6)، والبردورات (0 من 42,552 قطعة)، وأغطية مناهل الصرف الصحي (0 من 129)، وأغطية وشبكات السيول. ويصنف سجل المخاطر تأخر المواد طويلة الأجل كخطر مرتفع.

تأخر مواد الاتصالات والري وطبقات الطرق

ورُد 44% من تمديدات الاتصالات و8 من 78 من مناهل الاتصالات. وورُد 22% من مواسير الري 125 مم، و20% من البلاطات العلوية لمصائد الأمطار، و17–35% من مواد طبقات الطرق (طبقة التحسين وما تحت الأساس والأساس والأسفلت والإنترلوك). وتمديدات الجهد المتوسط عند 8,378 من 12,378 م.

القوى العاملة

عدد العمالة في الموقع هذا الشهر حسب المهنة، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower. لا يتضمن التقرير سجلاً شهرياً.

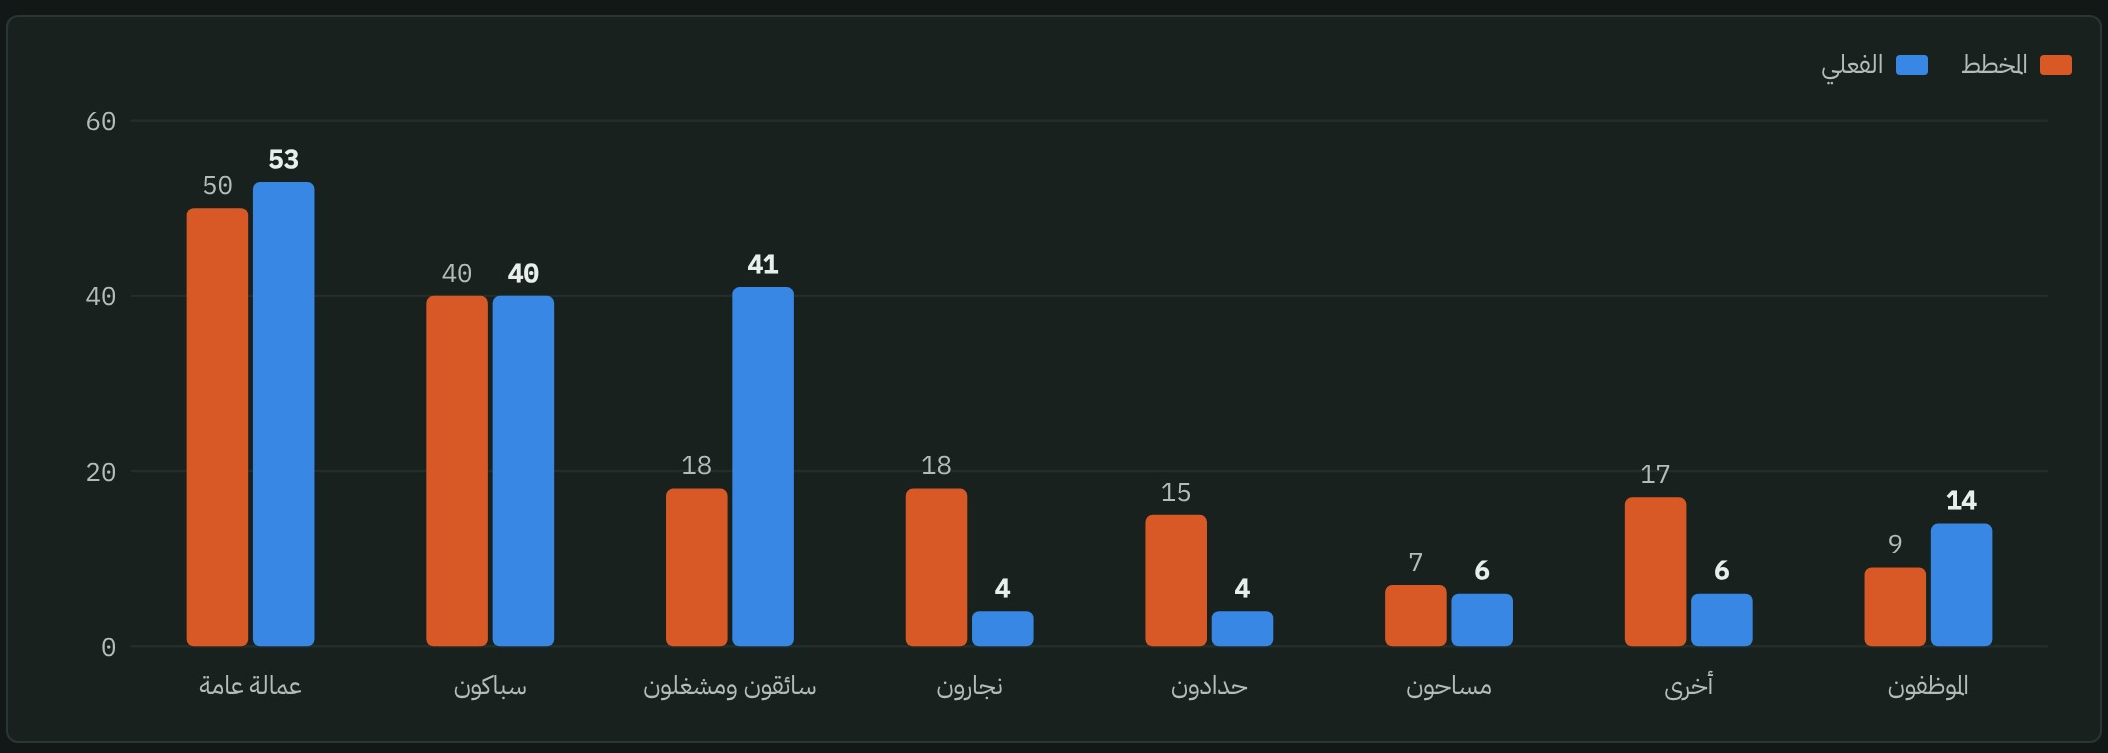

إجمالي العمالة 166 مقابل 174 مخططاً: 152 عاملاً مقابل 165، و14 موظفاً مقابل 9. النجارون والحدادون أقل بكثير من الخطة (4 من 18 و4 من 15)، بينما السائقون والمشغلون أعلى منها (41 مقابل 18). والمعدات في الموقع 74 وحدة مقابل 14 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الطرق والرصف	31,308,119
تصريف مياه الأمطار	33,717,595
الصرف الصحي ومحطات الرفع	24,177,287
مياه الشرب	10,220,942
الري	6,738,491
إنارة الشوارع والاتصالات	6,440,353
الجهد المتوسط	4,788,987
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**117,391,774**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	135,000,540
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. سجل أوامر التغيير فارغ، ويذكر التقرير تغييراً محتملاً واحداً.

المستخلصات

الدفعة المقدمة (10%)	11,739,177
المستخلصات الجارية المقدمة	19
القيمة الإجمالية	43,414,468
استرداد الدفعة المقدمة	4,341,447
المحتجزات / الغرامات	0 / 0
المعتمد من مدير المشروع - مدن	43,414,468
المدفوع (18 مستخلصاً)	40,094,952
القيمة المكتسبة حتى تاريخه	88,941,456

المفوتر 37.0% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 54.8% وقيمة مكتسبة 75.8%. المستخلص 19 (من 01-يوليو إلى 31-أغسطس-2026، بقيمة إجمالية 3,319,515 ريال) معتمد وبانتظار الدفع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.82

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	389,098
ساعات العمل هذا الأسبوع	9,120
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	5
حوادث وشيكة	1
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	94 / 314

أرقام تراكمية. هذا الأسبوع: جلستا تعريف بالسلامة و6 اجتماعات توعية.

الجودة التقييم 0.90

طلبات الفحص الميداني الصادرة (تراكمي)	1,847
طلبات الفحص المغلقة	1,757
طلبات الفحص المعلقة (0–10 أيام)	90
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	21 / 21
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	13 / 12
طلبات فحص المواد الصادرة	0
المخططات التنفيذية المقدمة (جميعها بالرمز B)	23
اعتمادات المواد (A / B / C / D)	1 / 72 / 2 / 1

تُغلق تقارير عدم المطابقة خلال 7 أيام في المتوسط. ولا يزال 7 من طلبات اعتماد المواد بانتظار الاعتماد.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
التأخر في الجدول الزمني	المقاول	الانتهاء المتوقع 31-أغسطس-2027، بتأخير 232 يوماً. يُظهر التقرير 406 أنشطة متعثرة البدء (411 الأسبوع الماضي) و669 نشاطاً على المسار الحرج. ولا يوجد تسجيل لاعتماد جدول تعافٍ.
المواد طويلة الأجل	المقاول	الخطر 05، مرتفع وقائم: قد يؤدي تأخر توريد المواد طويلة الأجل إلى توقف العمل. المعالجة: متابعة الموردين والحصول على موافقة مدن على مصادر بديلة. الموعد المستهدف 20-نوفمبر-2026.
الربط بالشبكات القائمة	المقاول / مدن	الخطر 01، منخفض وقائم: قد لا تكون البنية التحتية القائمة جاهزة للربط، مما يؤخر التشغيل والتسليم. معلم الربط في P6 بتاريخ 17-أغسطس-2027 بفائض −186.5 يوماً.
الاختبار والتشغيل	المقاول	كان مخططاً بدء اختبار الشبكات من 12-أكتوبر-2026 (الاتصالات) و18-أكتوبر-2026 (الري). لم يبدأ أي منها، وتمتد تواريخ البدء المتوقعة من 12-نوفمبر-2026 إلى 04-يناير-2027.
شهادة عدم الممانعة لشبكة الجهد المتوسط	المقاول	شهادة عدم الممانعة من المالك لشبكة الجهد المتوسط لم تصدر بعد (P6: 14-ديسمبر-2026، بفائض −39 يوماً).

المغلق في السجلات: المياه الجوفية ونزحها (مرتفع)، وتأخر أو فشل الاختبارات، والمشكلتان المسجلتان (نقطة توصيل الري، وخط الضخ لمحطة الرفع). وسُجلت وفورات إعادة قياس جدول الكميات كفرصة متحققة.

ملاحظات على البيانات

استُخدمت ملفات آخر رفع فقط (W3).

- تختلف تواريخ البيانات: التقرير الأسبوعي (رقم 92) بتاريخ 13-أكتوبر-2026، بينما تحديث P6 وقائمة الأنشطة متعثرة البدء وملفات PDF بتاريخ 20-أكتوبر-2026. يعتمد هذا التقرير 13-أكتوبر-2026 تاريخاً للبيانات ويعرض أرقام P6 كما في 20-أكتوبر-2026.
- الأسبوع 91 محسوب من تسليم الموقع (من 12-يناير-2025 إلى 13-أكتوبر-2026 تساوي 639 يوماً)، ويطابق "أسبوع العقد 91 من 104" في ورقة المعالم بالتقرير. أما ملف التقرير نفسه فرقمه 92.
- تعذّر تحويل ملفات PDF الأربعة المصدّرة من P6 (المستوى 5، والخطة قصيرة المدى، وملخص هيكل العمل، والأعمال المتبقية) إلى نص، لذا لم تُستخدم.
- في غلاف التقرير، التقدم الفعلي حسب هيكل العمل مزاح بصف واحد (تظهر للأعمال الترابية ساعات عمل الري وهكذا). أُخذت الأرقام من ورقة Progress حيث تتطابق مع جدول P6.
- تعرض ورقة الملخص العربية 85.79% مخططاً و75.76% فعلياً بوصفها "نسبة الإنجاز"، وهي قيمة مكتسبة على أساس التكلفة. أما التقدم الفعلي فهو 85.32% مخطط و54.81% فعلي.
- التقدم الفعلي "الأسبوعي" في الغلاف (603 ساعات عمل مخططة و1,493 مكتسبة) يساوي كامل شهر أكتوبر حتى تاريخه في ورقة Physical-Chart Data. كما تساوي القيمة المكتسبة الأسبوعية (2,593,776 ريال) رقم أكتوبر. لذا قد تكون قيم "هذا الأسبوع" منذ بداية الشهر.
- ورقة "Last week vs this week" لا تزال مبنية على تحديثي P6 بتاريخ 21-أبريل و28-أبريل-2026، لذا لم تُستخدم.
- يصل التوقع الفعلي في بيانات المنحنى إلى 100% في يناير 2027، وهذا يتعارض مع الانتهاء المتوقع في 31-أغسطس-2027.
- إجماليات الشبكات في ورقة الملخص العربية لا تطابق ورقة Major Quantities. مثلاً، مياه الشرب 12,200 م.ط مقابل 9,720 م من المواسير، والجهد المتوسط 17,328 م.ط مقابل 19,500 م من التمديدات. كما يذكر الملخص توريد 100% للجهد المتوسط والإنارة، بينما يُظهر سجل التوريدات تمديدات الجهد المتوسط عند 68% ووحدات RMU والإنارة عند 0%.
- تذكر ورقة الملخص تاريخ استلام الموقع 12-فبراير-2025 (12-يناير-2025 في التقرير الأسبوعي). كما تختلف تواريخ المعالم فيها عن الخطة الأساسية في التقرير الأسبوعي، مثلاً الطرق 20-ديسمبر-2026 مقابل 21-أكتوبر-2026.
- يتضمن سجل التوريدات كميات مورّدة أعلى من المطلوبة: مواسير GRP للصرف الصحي 400 مم SN5000 بكمية 1,060 من 261 م، ووصلات الري 110 مم 322 من 58، وفواصل الاتصالات 5,500 من 4,405. ووصلة 250 مم كميتها المطلوبة 0. ووحدتا بندين للأسفلت مكتوبتان "m132" و"m133".
- عدد العمالة اليدوية 152 في الغلاف و154 في جدول المهن و113 في إجمالي المهن بالغلاف الذي لا يشمل السائقين والمشغلين. ويبدو توقع الشهر القادم (1,148 عاملاً) خاطئاً، وصفوف العمالة الأسبوعية تكرر القيم نفسها.
- ورقة تفتيش الصحة والسلامة تغطي الفترة من 26-أغسطس إلى 01-سبتمبر-2026، وليس هذا الأسبوع.
- تُظهر عدة حقول في الغلاف الخطأ !REF# (التكلفة المتوقعة عند الإنجاز، وأهم المشكلات). ويحتوي سجل المستخلصات على قيم شاذة 21,100,000 و20,900,000 في خانتي قيمة العقد المعدلة والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز.
- قيمة تصريف السيول 33,717,565 ريال في ورقة الملخص العربية و33,717,595 ريال في المستخلص 19، والأخيرة تطابق إجمالي جدول الكميات.
- معلم الأعمال الترابية تاريخه في الخطة الأساسية 24-مايو-2026 لكنه انتهى في 31-مايو-2025. وتذكر ورقة الخطة قصيرة المدى تاريخ انتهاء متوقعاً 22-فبراير-2026، وقد مضى بالفعل.
- الصور: إحداها مكررة، وأخرى صغيرة جداً (384 بكسل)، وثالثة صورة عرض مؤطرة ("MODON 2 — Steel Reinforcement Works"). لم تُستخدم هذه الصور.

أُعدّ في 28-أكتوبر-2026 من آخر رفع أسبوعي (W3): التقرير الأسبوعي 92 (تاريخ البيانات 13-أكتوبر-2026) وتحديث P6 بتاريخ 20-أكتوبر-2026.
