مشروع تطوير شبكات البنية التحتية بالرياض الرابعة

Developing Infrastructure Networks in Riyadh's Fourth Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الرواف للمقاولات	شركة إيجيس للاستشارات الهندسية (EGIS)	شعيب الشعيبي	30-Nov-2025	30-May-2028

النطاق: بنية تحتية على مساحة نحو 6.5 كم² في المدينة الصناعية الرابعة بالرياض: الطرق والأنفاق، وشبكات الكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات والحماية، ومياه الشرب ومكافحة الحريق، والري، والصرف الصحي، وتصريف السيول، ومحطات رفع الصرف الصحي والسيول.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بنسبة إنجاز 27.4% مقابل 30.8% مخطط، المشروع متأخر بنسبة 3.5% (مؤشر الأداء الزمني 0.89). تقدم المشروع بنسبة 2.1% هذا الأسبوع مقابل 0.7% مخطط، فتقلصت الفجوة من 4.9% في الأسبوع الماضي، وجاء معظم تقدم هذا الأسبوع من التوريدات. لا تزال الأعمال الترابية متقدمة كثيراً على الخطة، بينما لا تزال التوريدات وأعمال الشبكات في المناطق والأنفاق متأخرة.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
27.4% / 30.8% مخطط	+2.1% / 0.7% مخطط	37.0% · اليوم 337 من 912	16.0% · 71.0 مليون ريال
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.89 · −3.5%	▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 1.4%	▼ انتهاء P6: 25-يناير-2029	8 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

لا يزال البرنامج الزمني ينهي المشروع متأخراً نحو ثمانية أشهر.

ينهي تحديث P6 المرفوع هذا الأسبوع (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026) المشروع في 25-يناير-2029، أي بعد 240 يوماً من تاريخ انتهاء العقد في 30-مايو-2028 (الأسبوع الماضي: 01-فبراير-2029، −247 يوماً). ويذكر التقرير الأسبوعي الآن التاريخ نفسه. وفي P6 تنتهي الطرق في 02-مايو-2027 وشبكة الجهد المتوسط في 10-نوفمبر-2027، مقابل المعلم التعاقدي 30-سبتمبر-2026 لأعمال الجهد المتوسط والطرق.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من رفع 02-نوفمبر-2026 الأسبوعي. خمس منها بختم GPS بتاريخ 01–02 نوفمبر 2026: الأسفلت على الطريقين RD-L-7 وRD-A-1، ودمك طبقة الأساس على RD-A-1، وتحسين التربة والردم في البلوكين BL-30 وBL-35. والسادسة لصب بلاطة النفق. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال الأسفلت، RD-L-7، المنطقة 05

فرّادة تفرش طبقة الأساس الإسفلتية. ختم GPS بتاريخ 02-نوفمبر-2026، 11:00.



أعمال الأسفلت، RD-A-1، المنطقة 04

دحّال مطاطي على طبقة الأسفلت الجديدة. ختم GPS بتاريخ 01-نوفمبر-2026، 08:24.



طبقة الأساس الحصوية، RD-A-1، المنطقة 08

دحّالات تدمك طبقة الأساس. ختم GPS بتاريخ 02-نوفمبر-2026، 11:17.



صب بلاطة النفق

مضخات خرسانة تصب بلاطة النفق (وفق العرض: الجزء 02 من النفق). بلا ختم.



الدمك بالصدم السريع، BL-30، المنطقة 09

معدة الدمك بالصدم (RIC) تدمك منسوب البلوك. ختم GPS بتاريخ 01-نوفمبر-2026، 10:29.



أعمال الردم، BL-35، المنطقة 09

قلاب يفرغ مواد الردم للبلدوزر. ختم GPS بتاريخ 01-نوفمبر-2026، 10:34.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة التقرير الأسبوعي، 02-نوفمبر-2026.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التصميم الهندسي	2.0%	100.0%	84.5%	-15.5%	0.85	▼ متأخر
التوريدات	8.2%	100.0%	23.4%	-76.6%	0.23	▼ متأخر
التنفيذ	78.7%	26.3%	30.3%	+3.9%	1.15	▲ متقدم
↳ الأعمال الترابية	21.9%	23.7%	74.0%	+50.3%	3.13	▲ متقدم
↳ أعمال المناطق (Z1–Z9)	50.7%	24.8%	10.4%	-14.4%	0.42	▼ متأخر
↳ الأنفاق	3.0%	99.4%	76.2%	-23.2%	0.77	▼ متأخر
↳ المحطات والقنوات المفتوحة والإزالة	3.1%	0.0%	1.4%	+1.4%	–	● لم يحن موعدها
الاختبار والتشغيل	11.2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعدها
الإجمالي	100%	**30.8%**	**27.4%**	**-3.5%**	**0.89**	▼ متأخر

ارتفعت التوريدات من 6.6% إلى 23.4% هذا الأسبوع. وفي أعمال المناطق يتراوح مؤشر الأداء الزمني بين 0.06 (المنطقتان 1 و2) و0.58 (المنطقة 8). ويضم تحديث P6 عدد 8,625 نشاطاً: 1,506 مكتملة و445 جارية و6,674 لم تبدأ.

نطاق العمل: الكميات

إجمالي النطاق والكمية المنفذة والمتبقية لكل بند، من ورقة الكميات المنفذة في ملف "الكميات والتوريدات" المرفوع بتاريخ 02-نوفمبر-2026 (وهي نفس أرقام ورقة الخلاصة في التقرير الأسبوعي). الكميات للمشروع كاملاً وليست حسب المنطقة. "المنفذ هذا الأسبوع" هو كمية هذا الأسبوع مطروحاً منها كمية تقرير 26-أكتوبر-2026.

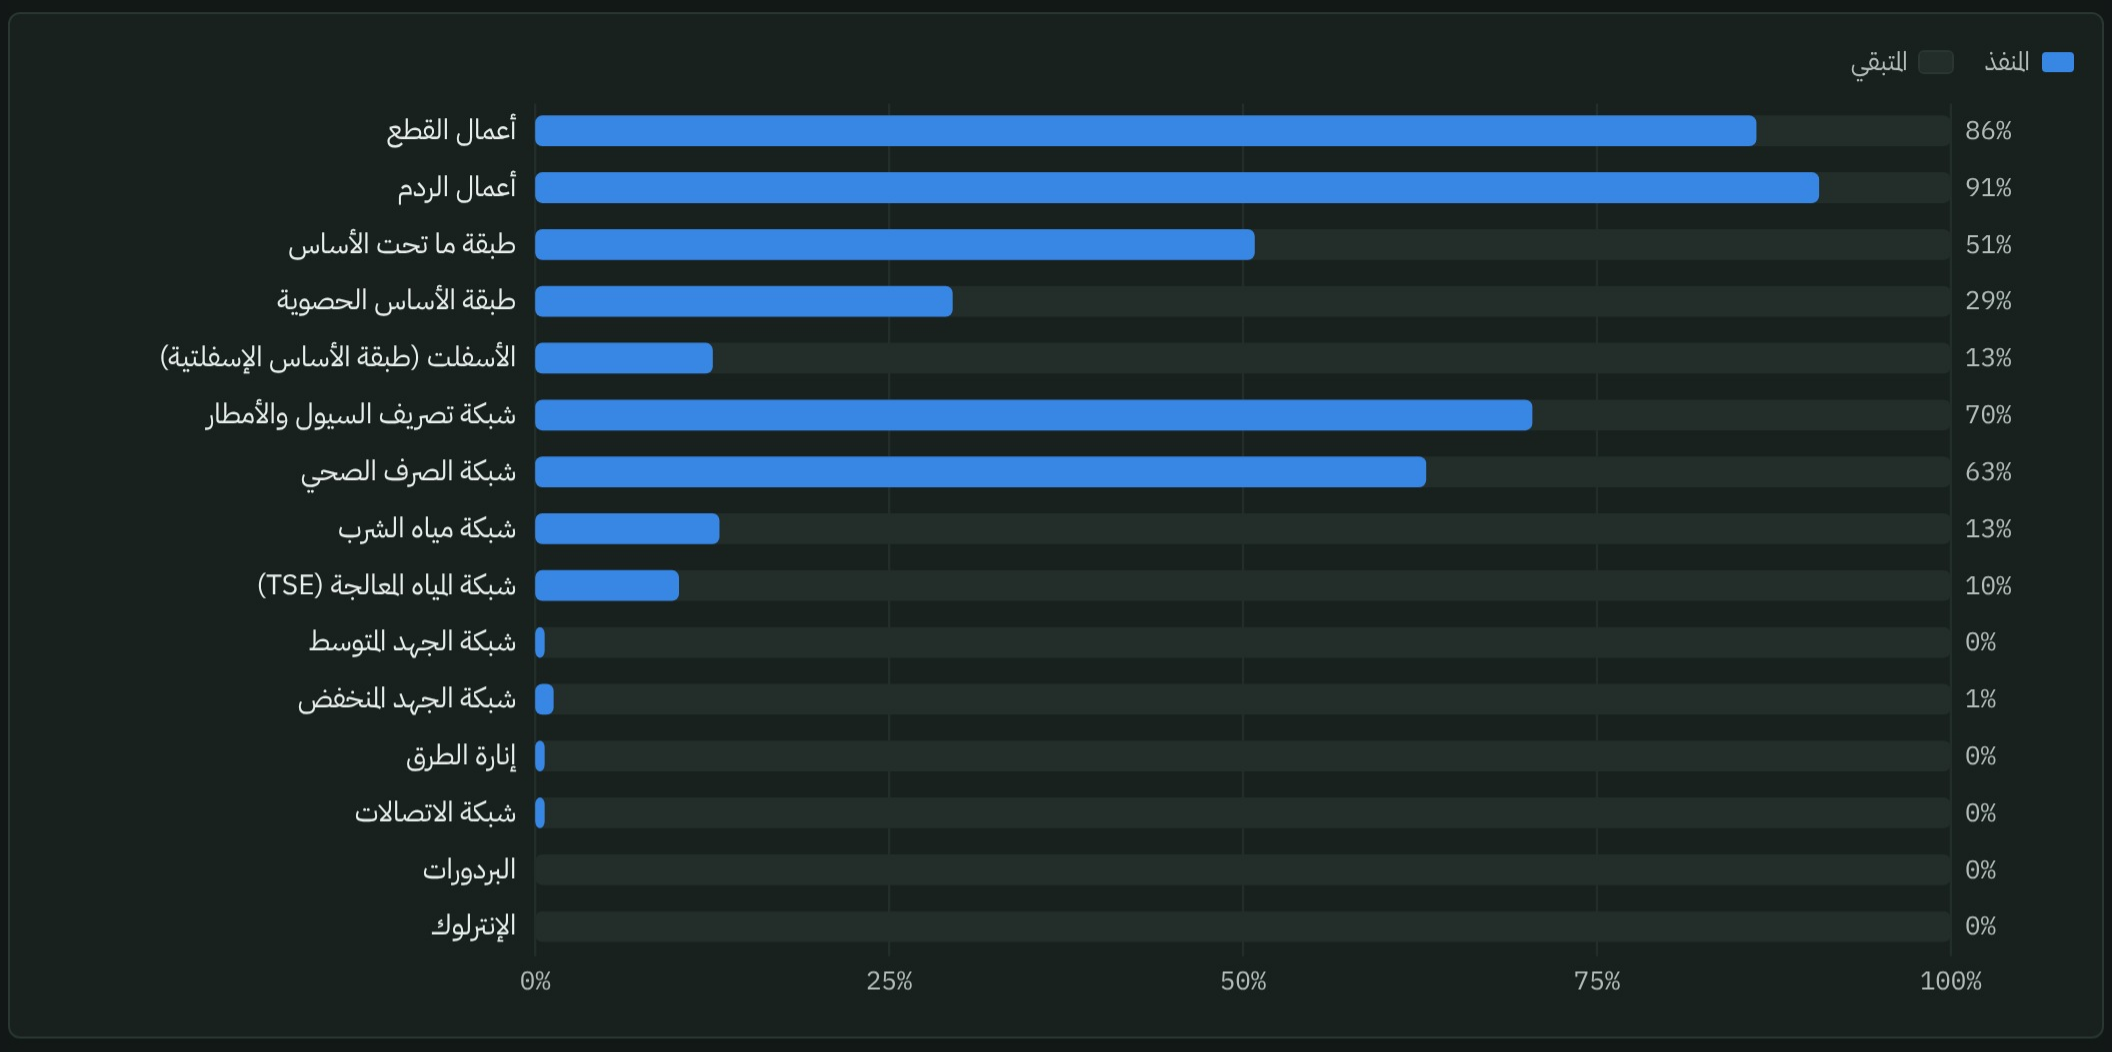

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
أعمال القطع	الكل	م³	4,319,104	3,726,000	10,000+	593,104	86.3%	–
أعمال الردم	الكل	م³	3,811,986	3,457,315	2,110+	354,671	90.7%	–
طبقة ما تحت الأساس	الكل	م³	232,143	118,000	2,000+	114,143	50.8%	–
طبقة الأساس الحصوية	الكل	م³	145,809	43,000	10,000+	102,809	29.5%	–
الأسفلت (طبقة الأساس الإسفلتية)	الكل	م³	86,559	10,860	1,359+	75,699	12.5%	–
شبكة تصريف السيول والأمطار	الكل	م.ط	50,642	35,672	642+	14,970	70.4%	–
شبكة الصرف الصحي	الكل	م.ط	22,579	14,211	555+	8,368	62.9%	–
شبكة مياه الشرب	الكل	م.ط	31,687	4,125	213+	27,562	13.0%	–
شبكة المياه المعالجة (TSE)	الكل	م.ط	35,746	3,632	182+	32,114	10.2%	–
شبكة الجهد المتوسط	الكل	م.ط	131,104	350	0	130,754	0.3%	–
شبكة الجهد المنخفض	الكل	م.ط	24,579	320	0	24,259	1.3%	–
إنارة الطرق	الكل	م.ط	67,945	180	0	67,765	0.3%	–
شبكة الاتصالات	الكل	م.ط	53,637	201	0	53,436	0.4%	–
البردورات	الكل	م.ط	130,589	0	0	130,589	0.0%	–
الإنترلوك	الكل	م²	42,347	0	0	42,347	0.0%	–

تقدم طبقات الطرق

ارتفعت طبقة الأساس الحصوية إلى 29.5% (+10,000 م³ هذا الأسبوع) والأسفلت إلى 12.5% (+1,359 م³). القطع عند 86.3% والردم 90.7% وطبقة القاعدة 50.8%. وشبكة السيول عند 70.4% (+642 م) والصرف الصحي 62.9% (+555 م). وارتفعت خرسانة بلاطات النفق 01 من 690 إلى 1,340 م³.

شبكات الكهرباء والاتصالات متوقفة

لا تزال شبكة الجهد المتوسط عند 0.3% (350 من 131,104 م)، وإنارة الطرق 0.3%، والاتصالات 0.4%، والجهد المنخفض 1.3%، دون تغيير منذ ثلاثة أسابيع. مياه الشرب عند 13.0% والمياه المعالجة 10.2%. ولم تبدأ البردورات والإنترلوك.

المعالم الرئيسية

معالم العقد من ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي، مع التواريخ المتوقعة للمعالم المقابلة في تحديث P6 لهذا الأسبوع (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026). لا يذكر ملف P6 قيم الفائض الزمني.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الحالة
تسليم الموقع	30-Nov-2025	30-Nov-2025	30-Nov-2025 (فعلي)	✓ منجز
اكتمال التجهيز	29-Dec-2025	30-Mar-2026	29-Dec-2025 (فعلي)	؟ المصدران مختلفان
تقديم واعتماد المخططات والمواد	28-Jan-2026	30-Apr-2026	30-Nov-2026	▼ متأخر
توريد جميع المواد للموقع	28-Feb-2026	–	16-Dec-2026	▼ متأخر
اكتمال أعمال الجهد المتوسط والطرق	30-Sep-2026	30-Sep-2026	الطرق 02-مايو-2027؛ الجهد المتوسط 10-نوفمبر-2027	▼ متأخر
اكتمال الشبكات العميقة	30-May-2027	30-May-2027	16-Nov-2027	▼ متأخر
اكتمال جميع الشبكات	30-Nov-2027	30-Nov-2027	08-Jul-2028	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للاستلام الابتدائي	30-May-2028	30-May-2028	25-Jan-2029	▼ متأخر

لا تزال ورقة المعالم لا تُظهر أي تأخير.

تُبقي ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي جميع المعالم المتبقية على تواريخها التعاقدية، بينما يتوقع تحديث P6 لهذا الأسبوع تأخر الشبكات العميقة نحو ستة أشهر، وجميع الشبكات نحو سبعة أشهر، والمشروع 240 يوماً. ويظهر اكتمال التجهيز في P6 بتاريخ 29-ديسمبر-2025، وفي التقرير الأسبوعي بتاريخ 30-مارس-2026.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة للموقع من الكمية الكلية. المصدر: ورقة التوريدات في ملف "الكميات والتوريدات" وورقة الكميات الرئيسية، 02-نوفمبر-2026.



الكهرباء والاتصالات والبردورات والإنترلوك: لم يورّد شيء


لا تزال تمديدات الجهد المتوسط (131,104 م.ط) وإنارة الطرق (67,945 م.ط) والاتصالات (53,637 م.ط) والبردورات مسبقة الصب (130,589 م.ط) والإنترلوك (42,347 م²) كلها بنسبة توريد 0%.

مواد الشبكات الرطبة في الموقع غالباً

ورّد 99% من أطوال مواسير مياه الشرب و99% للصرف الصحي و98% للري. وشبكة السيول عند 89% (45,030 من 50,642 م.ط)، بزيادة 1,000 م.ط عن الأسبوع الماضي. ومناهل المداخل عند 96% (480 من 501) وغرف التجميع عند 91% (906 من 998).

القوى العاملة

عدد العمالة اليدوية الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة، التقرير الأسبوعي 02-نوفمبر-2026.

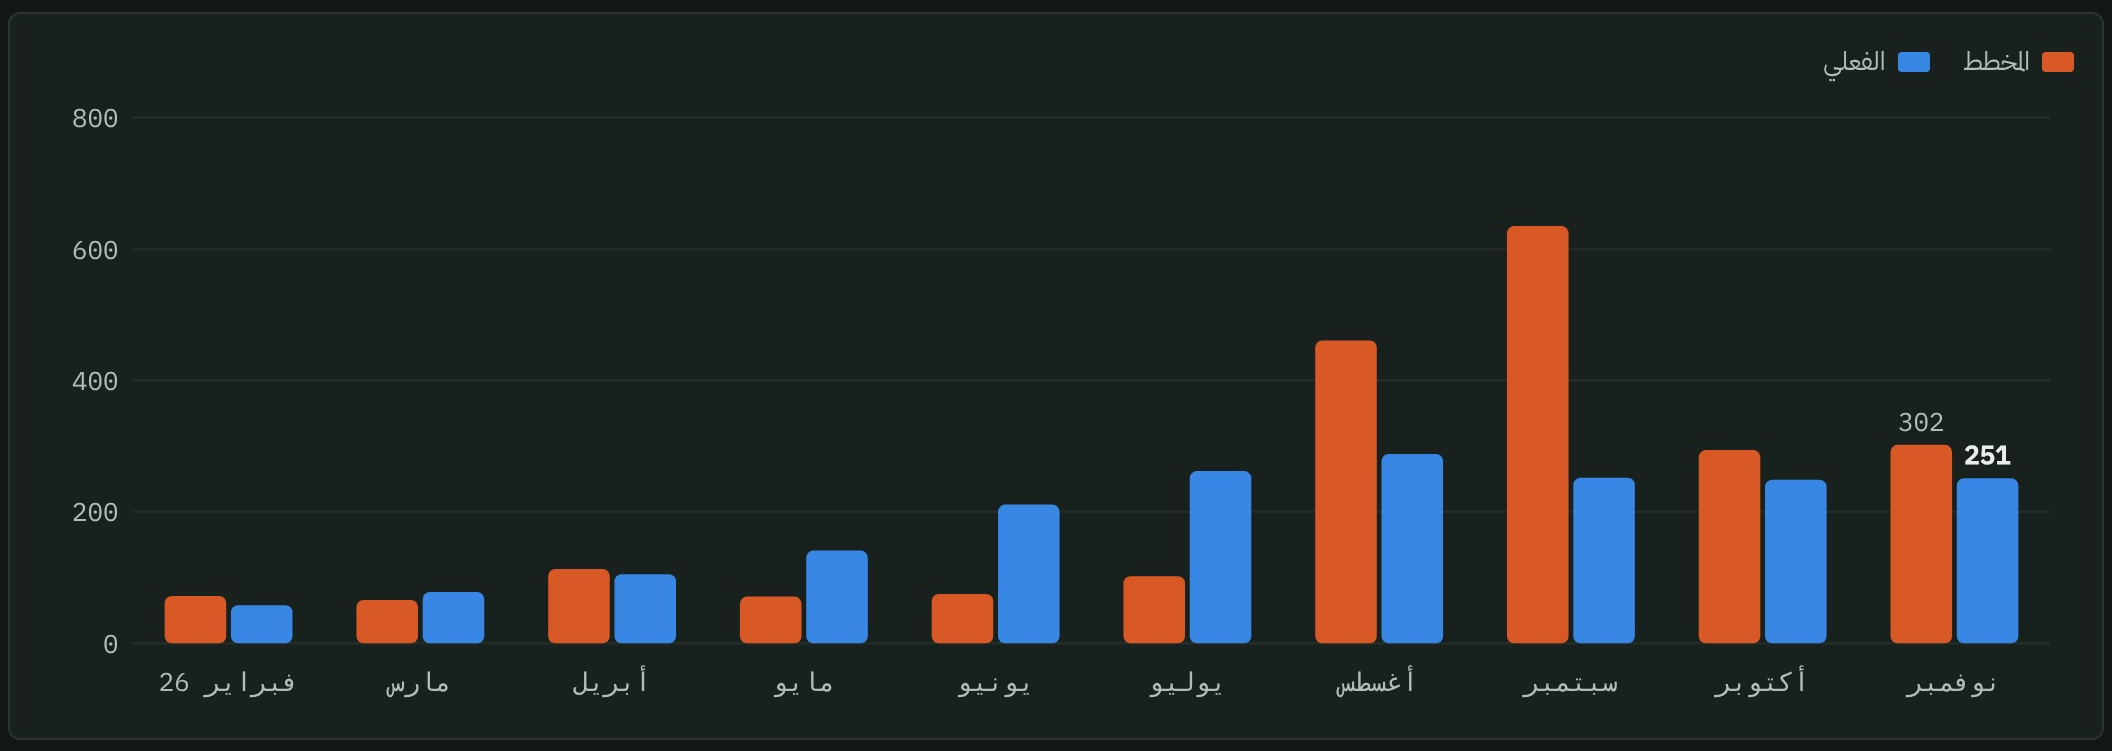

بلغت العمالة اليدوية في نوفمبر حتى الآن 251 مقابل 302 مخطط (−17%)، إضافة إلى 47 من الموظفين غير اليدويين، بإجمالي 298. وترتفع الخطة إلى 1,033 في مارس 2027. وانخفضت المعدات الرئيسية في الموقع من 208 إلى 154، منها 42 حفارة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الجدول 1: أعمال الطرق والموقع	214,146,361
الجدول 2: الأعمال الكهربائية	56,351,312
الجداول 2.1–2.3: الاتصالات وتقنية المعلومات والحماية	26,333,019
الجداول 3–6: المياه والري والصرف الصحي والسيول	98,702,595
الجدول 7: المباني والخدمات والأنفاق	49,466,713
قيمة العقد	**445,000,000**
جدول الكميات المعدل (بدون الضريبة)	352,632,896
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. مجموع الجداول يساوي قيمة العقد 445,000,000. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	8
القيمة الإجمالية	71,001,361
الخصومات والغرامات	380,000
الصافي شاملاً الضريبة	81,271,566
معتمدة من الاستشاري	8
معتمدة من مدير المشروع - مدن / مدفوعة	0 / 0

المستخلصات تمثل 16.0% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 27.4%. لم يُقدَّم مستخلص جديد هذا الأسبوع. ويذكر العرض أن 70,621,360 ريال قد صُرفت.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.68

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	532,860
ساعات العمل هذا الأسبوع	17,880
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	2
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	74 / 504

ارتفع تقييم السلامة من 0.55 إلى 0.68. الأرقام التراكمية من ورقة إحصاءات السلامة.

الجودة التقييم 0.84

تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة / المفتوحة	63 / 50 / 13
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	15 / 10
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	113 / 113
طلبات الفحص المغلقة / المعلقة	1,687 / 236
المخططات التنفيذية المقدمة (رمز A / B)	1,453 (7 / 1,446)
تقديمات اعتماد المواد	118

أعداد تراكمية من ورقة إحصاءات الجودة. ارتفعت تقارير عدم المطابقة من 34 إلى 63 هذا الأسبوع.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
التعارض مع خدمات الرياض الخضراء	المقاول / الرياض الخضراء	يتعارض صمام هواء وحماية كاثودية على الطريق C8 مع الأعمال. ويجري التنسيق مع مقاول الرياض الخضراء للحصول على المخططات وتسعير التعديل. التصنيف: حرج؛ عُدّل الموعد المستهدف إلى 15-نوفمبر-2026.
التعارض مع خطوط غاز أرامكو	المقاول / أرامكو	تتعارض الشبكات الرطبة والجافة على الطريقين C8 وRD-L10 مع خطي غاز تابعين لأرامكو. قُدّمت الحلول الفنية وبانتظار رد أرامكو، وقد اعتُمدت سابقاً حلول شبكات الاتصالات والصرف الصحي والجهد المتوسط وتقنية المعلومات والجهد المنخفض. التصنيف: مرتفع؛ عُدّل الموعد المستهدف إلى 30-نوفمبر-2026.
تأخر التوريدات	المقاول	تطلبت تعديلات التصميم مراجعة أوامر الشراء، كما ارتفعت أسعار المواد. صدرت أوامر الشراء ويجري التوريد. التصنيف: مرتفع؛ ويستهدف العرض 15-نوفمبر-2026.
تأخر الإنجاز عن الخطة	المقاول	الإنجاز متأخر عن الجدول الزمني بسبب تعديل المخطط العام (وادي السلي) ونقص المعدات في بداية المشروع. زيد عدد المعدات وفرق الشبكات، ويستهدف العرض 30-نوفمبر-2026. التصنيف: حرج.
تعارضات كابلات شركة الكهرباء (مغلقة)	المقاول / شركة الكهرباء	أُغلق التعارضان. فعلى الطريق C2 بدأ المقاول المعيّن من شركة الكهرباء أعمال تعليق كابلات الجهد العالي، وعلى الطريق C8 وُقّع محضر بدء الأعمال مع مقاول شركة الكهرباء (Pillar).

أسباب التأخير الواردة في التقرير: تعديل المخطط العام بعد إعادة تصميم وادي السلي مما غيّر تصميم جميع الشبكات، ونقص المعدات في بداية المشروع.

ملاحظات على البيانات

يعتمد هذا التقرير على الملفات المرفوعة بتاريخ 02-نوفمبر-2026 (التقرير الأسبوعي، وعرض التقدم، وملف الكميات والتوريدات، وتحديث P6)، وعلى تقرير 26-أكتوبر-2026 لقيم هذا الأسبوع. جميع نسب التقدم هي نسب الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. لا يوجد قسم منحنى التقدم لأن ورقة بيانات المنحنى الفعلي في الملف فارغة.

- رقم الأسبوع 48 هو أسبوع العقد المذكور في ورقة المعالم ("Current Contract Weeks: 48 of 130").
- يذكر الملف والعرض أيضاً نسبة تقدم مبنية على التكلفة، موصوفة في بعض المواضع بأنها الإنجاز الفعلي. لا يستخدمها هذا التقرير.
- يتفق الآن تاريخ الانتهاء المتوقع بين تحديث P6 ومستخرج P6 وورقة المعلومات العامة (25-يناير-2029، −240 يوماً). ولا تزال ورقة المعالم لا تُظهر تأخيراً في أي معلم.
- اكتمل التجهيز في 29-ديسمبر-2025 وفق P6 والعرض، وفي 30-مارس-2026 وفق التقرير الأسبوعي.
- لم تتغير ساعات العمل المنجزة في الأعمال الترابية هذا الأسبوع (74.0%)، رغم أن الكميات تُظهر +10,000 م³ قطع و+2,110 م³ ردم.
- تكرر شريحة الكميات في العرض كميات 26-أكتوبر-2026؛ ويستخدم هذا التقرير أرقام 02-نوفمبر-2026 من الملف وملف الكميات.
- خرسانة النفق 01 تبلغ 5,243 م³ في ورقة الكميات الرئيسية و3,903 م³ في ورقة Major.
- الجودة: تُظهر طلبات الفحص 490 صادرة مقابل 1,687 مغلقة و236 معلقة، وهي أرقام لا يمكن أن تصح معاً. كما انخفض العدد التراكمي للتعريف بالسلامة من 348 إلى 74، وتساوت ساعات العمل منذ بداية السنة مع الإجمالي التراكمي، مما يشير إلى إعادة ضبط عدادات السلامة.
- المستخلصات: يذكر الملف 8 مستخلصات بقيمة إجمالية 71,001,361 ريال، لم يعتمد مدير المشروع أياً منها ولم يُصرف أي منها؛ بينما يذكر العرض 70,621,360 ريال مستخلصات والمبلغ نفسه مصروفاً. وقيمة العقد 445,000,000 ريال موصوفة بأنها "شاملة الضريبة" في ورقة الخلاصة و"غير شاملة الضريبة" في تفصيل الجداول.
- لا يذكر تحديث P6 الفائض الزمني الإجمالي لأنشطته، لذا لا يظهر الفائض الزمني للمعالم.
- لا تزال عدة لوحات ملخص تُظهر أخطاء `#REF!` أو `#DIV/0!` .
- الصور: خمس منها مختومة بتاريخ 01–02 نوفمبر 2026، وصورة بلاطة النفق بلا ختم. ولم تُستخدم صورة الطبقة التأسيسية المختومة بتاريخ 03-نوفمبر-2026 (بعد تاريخ البيانات).
