إستكمال شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة

Completion of the Infrastructure Development of the First Phase, Third Industrial City, Jeddah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	تاريخ الانتهاء المعدل
مدن	شركة الرواف للمقاولات	إيجيس (Egis)	شعيب الشعيبي	29-Jul-2024	26-Sep-2026

النطاق: شبكات الصرف الصحي وتصريف السيول (مع البحيرات والقنوات المفتوحة) والري ومياه الشرب، وتمديدات جهد 13.8 ك.ف، وإنارة الطرق، وتمديدات الاتصالات، والطرق الداخلية والخارجية بالأسفلت والأرصفة.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في 25-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 99.05% مقابل 99.93% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 0.88% (مؤشر الأداء الزمني 0.99). وأُنجز هذا الأسبوع 0.09% (42 من 48,045 ساعة عمل، في الطرق الرئيسية والمنطقتين Z02 وZ05) مقابل 0.05% في الأسبوع السابق. وقد انقضى تاريخ الانتهاء المعدل 26-سبتمبر-2026.

نسبة الإنجاز الفعلي
99.1% / 99.9% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.99 −0.88%

التقدم هذا الأسبوع
+0.09% / 0.00% مخطط
42 ساعة عمل مكتسبة (25 في الأسبوع الماضي)، ولا يتبقى في الخطة تقدم مخطط لهذا الأسبوع

المدة المنقضية من العقد
104% · اليوم 818 من 789
▼ انتهاء P6: 15-ديسمبر-2026

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
78.3% · 250.2 مليون ريال
24 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 31-أغسطس-2026

انقضى تاريخ الانتهاء المعدل، وتأخر انتهاء P6 أسبوعاً آخر ليصبح التأخير 80 يوماً.

مُدّد تاريخ انتهاء العقد شهرين إلى 26-سبتمبر-2026 (أمر التغيير 2، المعتمد في 29-يونيو-2026). ولا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع الانتهاء في 15-نوفمبر-2026، أي بتأخير 50 يوماً. أما مستخرج P6 فيُنهي المشروع في 15-ديسمبر-2026 بفائض زمني كلي −80 يوماً، أي بعد أسبوع من تاريخ 08-ديسمبر-2026 (−73 يوماً) في التقرير السابق. وتُظهر قائمة الأنشطة المتبقية خطوط غرف التجميع في شبكة السيول التي لا يزال حفرها ومدّها واختبارها وردمها قائماً في المناطق Z02 وZ04 وZ05 وZ08 وZ11 وفي الطرق الرئيسية، إضافة إلى الاختبار والتشغيل واعتماد مخططات حسب التنفيذ، على أن تنتهي جميع الأعمال في 17-نوفمبر-2026 وفق P6.


صور الموقع هذا الأسبوع

أربع من الصور الخمس المرفوعة مع التقرير الأسبوعي بتاريخ 25-أكتوبر-2026، وتحمل ختم الكاميرا من 19 إلى 24 أكتوبر 2026 حيث يظهر الختم. وتُظهر ردم خطوط غرف التجميع وتشطيب غرف التجميع. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



ردم خط غرف التجميع

ردم الخندق على امتداد الخط. ختم بتاريخ 20-أكتوبر-2026، 14:58، بحرة.

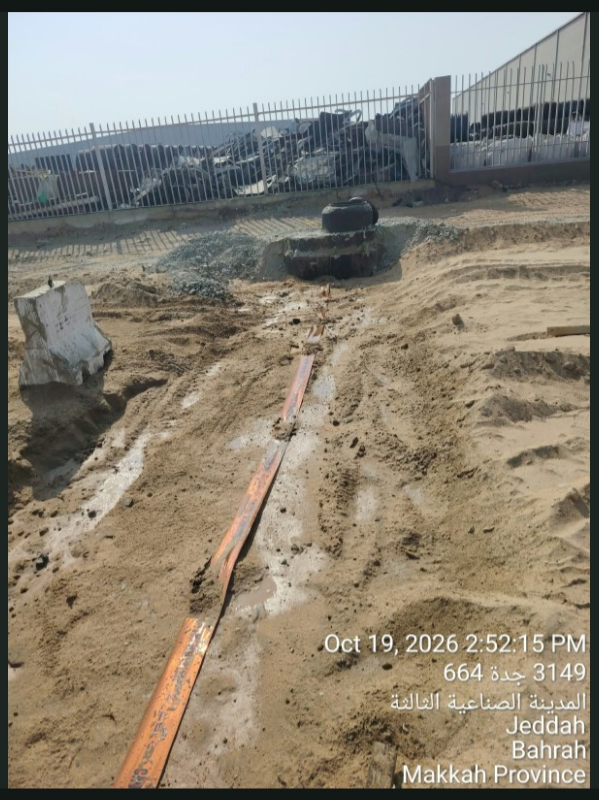

الردم والشريط التحذيري

مدّ الشريط التحذيري فوق الماسورة قبل الردم النهائي. ختم بتاريخ 19-أكتوبر-2026، 14:52، المدينة الصناعية الثالثة بجدة.



غرفة تجميع مزدوجة

تركيب الإطارات وردم المنطقة المحيطة خلف الحواجز المرورية.




التشطيب الداخلي لغرفة التجميع

اكتمل الطلاء الداخلي. ختم بتاريخ 24-أكتوبر-2026، 11:26.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، ونقطة 25-أكتوبر-2026 من ورقة Progress.

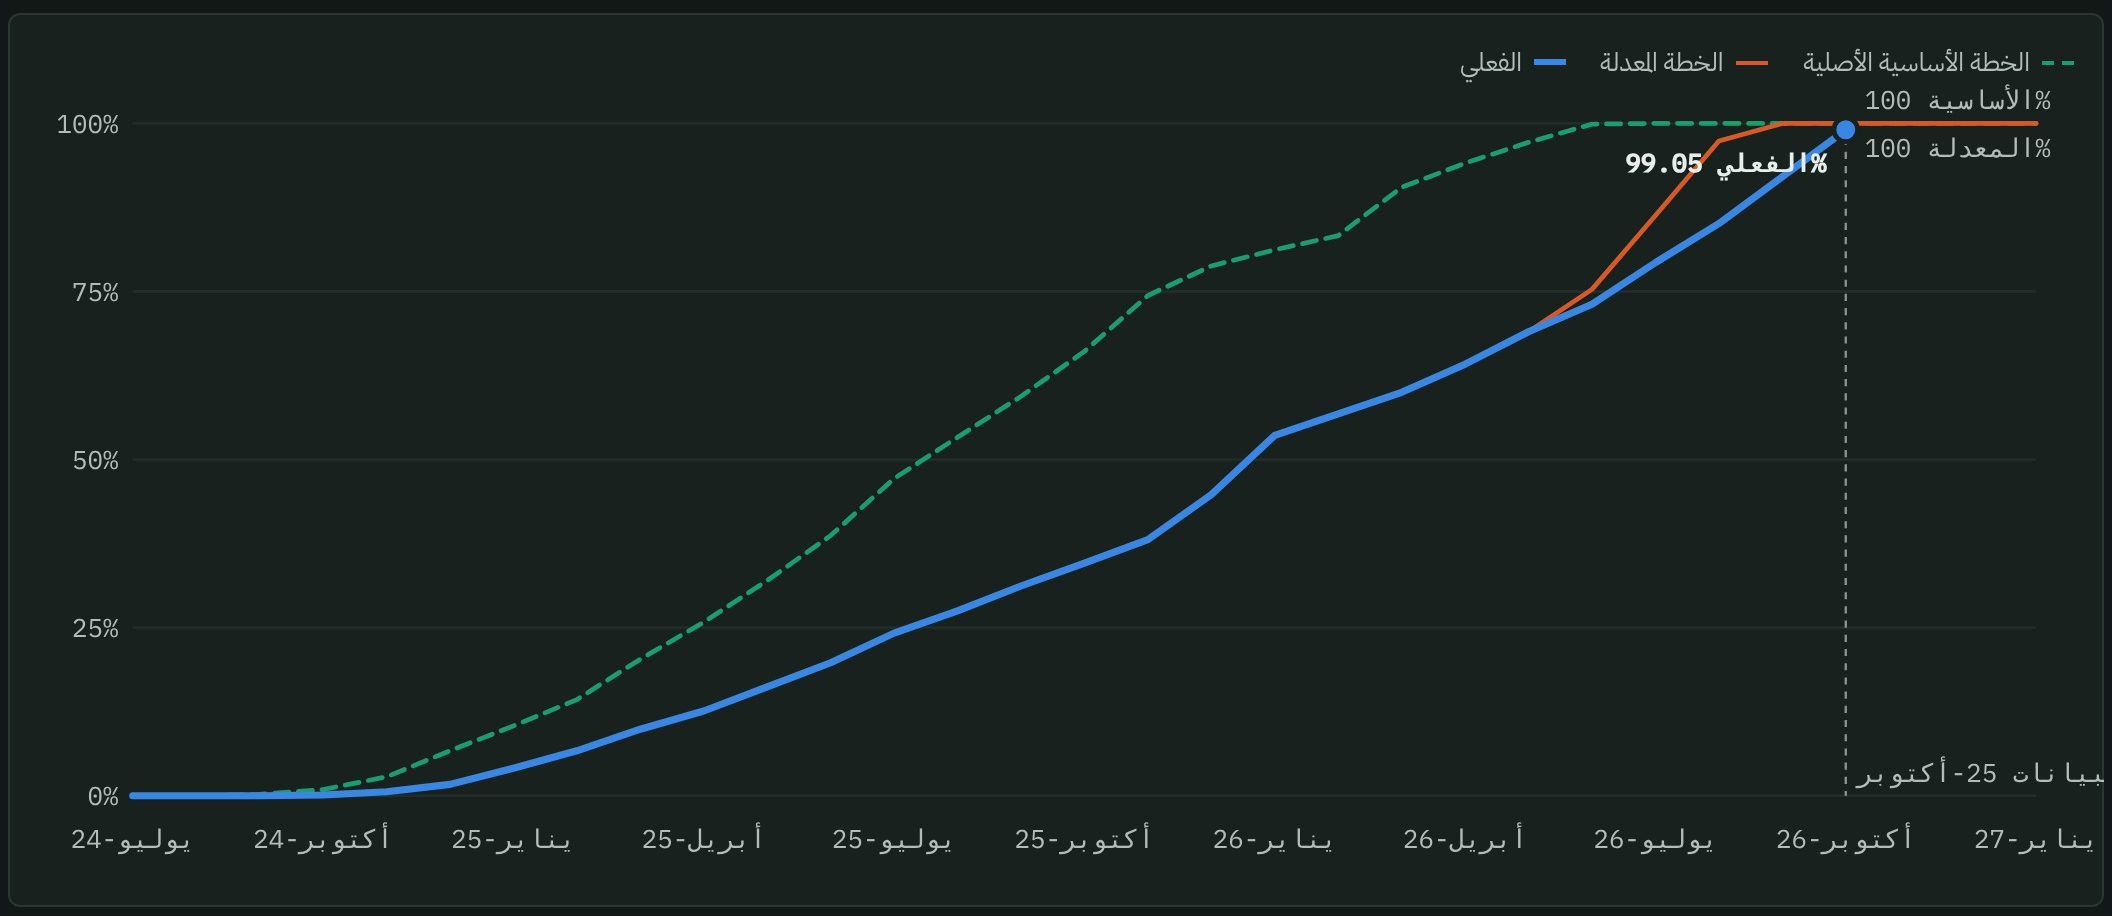

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
18-Oct-2026	99.93	98.96	−0.97	+0.05	0.99
25-Oct-2026	**99.93**	**99.05**	**−0.88**	**+0.09**	**0.99**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 18 و25 أكتوبر 2026 (47,547 و47,589 من 48,045 ساعة عمل مكتسبة). ولم تُستخدم الأسابيع السابقة. ولا تزال ورقة Physical-Chart Data، التي لم تتغير هذا الأسبوع، تُظهر إنجازاً فعلياً 100% في نهاية سبتمبر، وهو ما تناقضه ورقة Progress، لذا حُذفت تلك النقطة.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب حزم أعمال التنفيذ، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (48,045 ساعة إجمالاً).
لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات والإغلاق ساعات عمل، لذا لا توجد لها نسبة إنجاز فعلي.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
MR	36.5%	99.9%	99.5%	−0.4	1.00	▼ متأخر
البحيرات والقنوات العشبية	7.7%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z05	7.7%	100.0%	93.9%	−6.1	0.94	▼ متأخر
Z02-2	6.4%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z06	6.3%	100.0%	99.6%	−0.4	1.00	▼ متأخر
Z01	5.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z02-1	5.6%	99.4%	100.0%	+0.6	1.01	✓ مكتمل
Z07	5.6%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z07-1	4.3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z10	3.2%	100.0%	99.0%	−1.0	0.99	▼ متأخر
الأعمدة العالية (High Mast)	2.5%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z09	1.8%	99.8%	99.2%	−0.6	0.99	▼ متأخر
النطاق الجديد	1.3%	100.0%	96.4%	−3.6	0.96	▼ متأخر

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
Z13	1.1%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z02	1.0%	100.0%	96.7%	-3.3	0.97	▼ متأخر
Z03	0.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z08	0.7%	100.0%	87.3%	-12.7	0.87	▼ متأخر
Z04	0.7%	100.0%	92.0%	-8.0	0.92	▼ متأخر
Z11	0.7%	100.0%	99.7%	-0.3	1.00	▼ متأخر
ELDREES	0.3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
CCTV	0.0%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
الإجمالي	100%	**99.93%**	**99.05%**	**-0.88**	**0.99**	▼ متأخر

تحصي إحصاءات جدول P6 (تاريخ البيانات 25-أكتوبر-2026) عدد 9,236 نشاطاً: 9,026 مكتملاً و85 قيد التنفيذ و125 لم يبدأ، منها 40 نشاطاً متأخراً. ويُنهي مستخرج P6 المشروع في 15-ديسمبر-2026 بفائض زمني كلي −80 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

كمية جدول الكميات المعدل والكمية المركّبة لكل شبكة، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 25-أكتوبر-2026. ويمثل عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير عن تقرير 18-أكتوبر-2026، ولم تتغير الورقة، لذا فهو 0 لجميع البنود. وجميع البنود المدرجة مُبلغ عنها بأنها مركّبة بنسبة 100%.

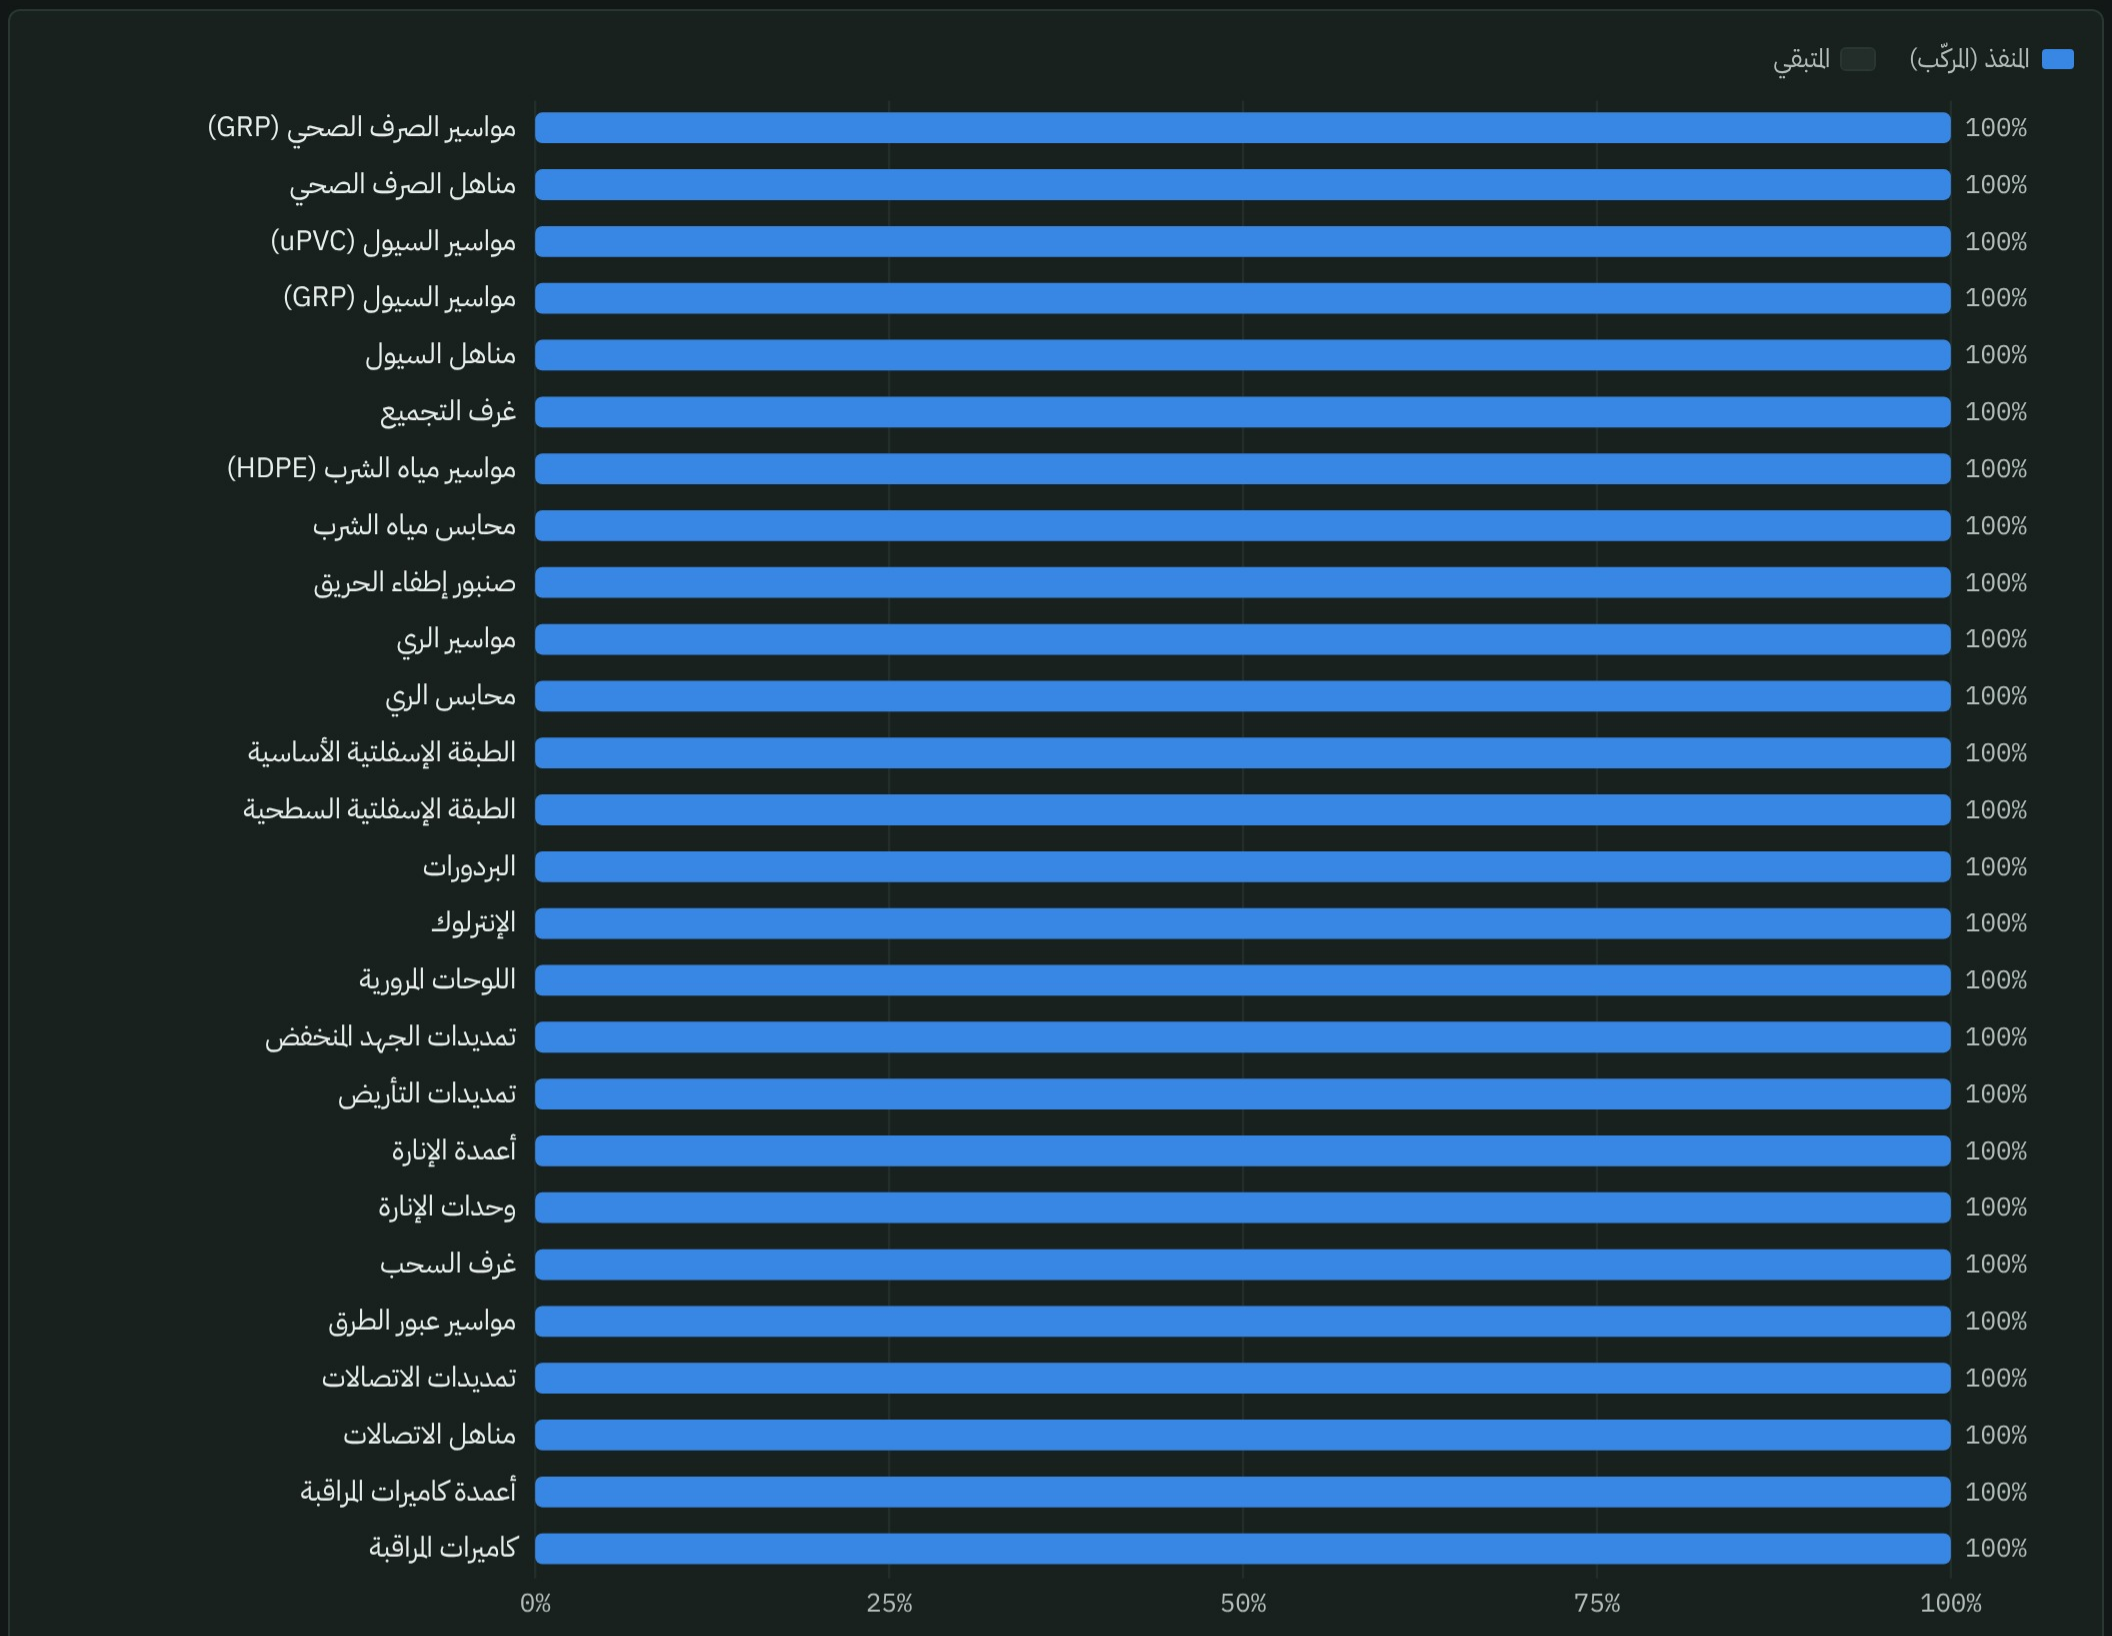

بند النطاق	المقاس / النوع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
مواسير الصرف الصحي (GRP)	DN 200	م.ط	21,379	21,379	0	0	100.0%	–
	DN 250	م.ط	4,579	4,579	0	0	100.0%	–
	DN 300	م.ط	204.6	204.6	0	0	100.0%	–
	DN 400	م.ط	531.9	531.9	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**26,695**	**26,695**	**0**	**0**	**100.0%**	–
مناهل الصرف الصحي	جميع المقاسات	عدد	355	355	0	0	100.0%	–
مواسير السيول (uPVC)	DN 300	م.ط	29,080	29,080	0	0	100.0%	–
مواسير السيول (GRP)	DN 400	م.ط	11,758	11,758	0	0	100.0%	–
	DN 500	م.ط	4,240	4,240	0	0	100.0%	–
	DN 600	م.ط	5,966	5,966	0	0	100.0%	–
	DN 700	م.ط	5,347	5,347	0	0	100.0%	–
	DN 800	م.ط	6,312	6,312	0	0	100.0%	–

بند النطاق	المقاس / النوع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
	DN 900	م.ط	7,736	7,736	0	0	100.0%	–
	DN 1000	م.ط	2,856	2,856	0	0	100.0%	–
	DN 1100	م.ط	1,771	1,771	0	0	100.0%	–
	DN 1200	م.ط	8,972	8,972	0	0	100.0%	–
	DN 1400	م.ط	425.4	425.4	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**55,383**	**55,383**	**0**	**0**	**100.0%**	–
مناهل السيول	DN 1200	عدد	203	203	0	0	100.0%	–
	DN 1500	عدد	418	418	0	0	100.0%	–
	DN 2000	عدد	219	219	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**840**	**840**	**0**	**0**	**100.0%**	–
غرف التجميع	مفردة	عدد	1,007	1,007	0	0	100.0%	–
	مزدوجة	عدد	761	761	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**1,768**	**1,768**	**0**	**0**	**100.0%**	–
مواسير مياه الشرب (HDPE)	DN 160	م.ط	8,045	8,045	0	0	100.0%	–
	DN 225	م.ط	2,000	2,000	0	0	100.0%	–
	DN 315	م.ط	215	215	0	0	100.0%	–
	DN 450	م.ط	1,890	1,890	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**12,150**	**12,150**	**0**	**0**	**100.0%**	–
محابس مياه الشرب	محابس بوابية	عدد	77	77	0	0	100.0%	–
	محابس فراشة	عدد	2	2	0	0	100.0%	–
	محابس غسيل	عدد	3	3	0	0	100.0%	–
	محابس هواء	عدد	1	1	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**83**	**83**	**0**	**0**	**100.0%**	–
صنبور إطفاء الحريق	ULFM 150	عدد	193	193	0	0	100.0%	–
مواسير الري	HDPE DN 125	م.ط	24,479	24,479	0	0	100.0%	–
	HDPE DN 250	م.ط	28,362	28,362	0	0	100.0%	–
	HDPE DN 315	م.ط	7,061	7,061	0	0	100.0%	–
	HDPE DN 450	م.ط	8,870	8,870	0	0	100.0%	–
	HDPE DN 630	م.ط	2,221	2,221	0	0	100.0%	–
	GRP DN 800	م.ط	1,340	1,340	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**72,333**	**72,333**	**0**	**0**	**100.0%**	–
محابس الري	محابس بوابية	عدد	455	455	0	0	100.0%	–
	محابس فراشة	عدد	61	61	0	0	100.0%	–
	محابس غسيل	عدد	29	29	0	0	100.0%	–
	محابس هواء	عدد	44	44	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**589**	**589**	**0**	**0**	**100.0%**	–
الطبقة الإسفلتية الأساسية	تدرج I	م³	1,735	1,735	0	0	100.0%	–
الطبقة الإسفلتية السطحية	تدرج I	م³	1,240	1,240	0	0	100.0%	–

بند النطاق	المقاس / النوع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
البردورات	نوع K1-D	م.ط	15,100	15,100	0	0	100.0%	–
	نوع L1	م.ط	1,972	1,972	0	0	100.0%	–
	منخفضة K2	م.ط	750	750	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**17,822**	**17,822**	**0**	**0**	**100.0%**	–
الإنترلوك	الكل	م²	1,576	1,576	0	0	100.0%	–
اللوحات المرورية	قائم مفرد	عدد	31	31	0	0	100.0%	–
	قائم مزدوج	عدد	4	4	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**35**	**35**	**0**	**0**	**100.0%**	–
تمديدات الجهد المنخفض	4C×6 mm²	م.ط	1,826	1,826	0	0	100.0%	–
	4C×10 mm²	م.ط	2,092	2,092	0	0	100.0%	–
	4C×16 mm²	م.ط	896	896	0	0	100.0%	–
	4C×25 mm²	م.ط	7,396	7,396	0	0	100.0%	–
	4C×35 mm²	م.ط	11,757	11,757	0	0	100.0%	–
	4C×50 mm²	م.ط	120	120	0	0	100.0%	–
	4C×150 mm²	م.ط	1,500	1,500	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**25,587**	**25,587**	**0**	**0**	**100.0%**	–
تمديدات التأريض	6 mm²	م.ط	4,208	4,208	0	0	100.0%	–
	16 mm²	م.ط	20,049	20,049	0	0	100.0%	–
	70 mm²	م.ط	2,700	2,700	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**26,957**	**26,957**	**0**	**0**	**100.0%**	–
أعمدة الإنارة	12 م، ذراعان	عدد	10	10	0	0	100.0%	–
	12 م، ذراع واحد	عدد	220	220	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**230**	**230**	**0**	**0**	**100.0%**	–
وحدات الإنارة	LED 150 W	عدد	240	240	0	0	100.0%	–
	LED 342 W	عدد	88	88	0	0	100.0%	–
	LED 208 W	عدد	102	102	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**430**	**430**	**0**	**0**	**100.0%**	–
غرف السحب	600×600	عدد	783	783	0	0	100.0%	–
	900×900	عدد	151	151	0	0	100.0%	–
	1800×900	عدد	18	18	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**952**	**952**	**0**	**0**	**100.0%**	–
مواسير عبور الطرق	UPVC 160 مم	م.ط	1,116	1,116	0	0	100.0%	–
تمديدات الاتصالات	6 مسارات، 50 مم	م.ط	8,100	8,100	0	0	100.0%	–
مناهل الاتصالات	نوع 1	عدد	90	90	0	0	100.0%	–
أعمدة كاميرات المراقبة	الكل	عدد	18	18	0	0	100.0%	–
كاميرات المراقبة	الكل	عدد	82	82	0	0	100.0%	–

الكميات المعدلة لأعمال الطرق أقل بكثير من جدول الكميات الأصلي

يجعل جدول الكميات المعدل، الذي لا يزال "قيد المراجعة"، كل إجمالي مساوياً للكمية المركّبة. وفي أعمال الطرق يمثل جزءاً صغيراً من جدول الكميات الأصلي: الطبقة الإسفلتية السطحية 1,240 من 63,689 م³، والبردورات مسبقة الصب K1-D بطول 15,100 من 187,209 م، والبردورات L1 بطول 1,972 من 123,805 م، والإنترلوك 1,576 من 59,537 م².

الورقة تتعارض مع قائمة الأنشطة المتبقية

لا تزال قائمة الأنشطة المتبقية في P6 بتاريخ 25-أكتوبر-2026 تتضمن خطوط سيول uPVC قطر 300 مم وGRP قطر 400 مم يلزم حفرها ومدّها واختبارها وردمها في المناطق Z02 وZ04 وZ05 وZ08 وZ11 وفي خطوط الطرق الرئيسية L-17 وL-51 وL-58، إضافة إلى الطبقة الإسفلتية الأساسية في المنطقة Z05. لذا فإن الكميات أعلاه تبالغ في تقدير ما تم تركيبه.

أعمال الجهد المتوسط عُدّلت إلى صفر

تمديدات جهد 13.8 ك.ف (30,720 م في جدول الكميات الأصلي) ووصلاتها ونهاياتها، ومجاري التمديدات بطول 950 م، ووحدات RMU للفتح العادي، والمحطات الفرعية الثلاث للإنارة ووحداتها، جميعها كميتها المعدلة 0، لذا لم تُدرج في الجدول.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتقرير الأسبوعي من ورقة Milestones، وتوقعات P6 من قائمة الأنشطة المتبقية (تاريخ البيانات 25-أكتوبر-2026) ومستخرج P6 في ورقة Progress. ويختلف المصدران، لذا يُعرض كلاهما.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	29-Jul-2024	29-Jul-2024 (فعلي)	–	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	03-Sep-2024	26-Oct-2024 (فعلي)	–	–	✓ منجز
مسح الوضع القائم والتقارير النهائية	07-Sep-2025	23-Jul-2025 (فعلي)	25-Oct-2026	–	؟ يتعارض مع P6
اكتمال الأعمال الميكانيكية	01-Oct-2025	27-Jun-2026	29-Oct-2026	–	▼ متأخر
اكتمال تركيب الهياكل المعدنية	02-Jul-2026	25-Feb-2026	25-Oct-2026	–	▼ متأخر
اكتمال الأعمال الترابية	07-Jul-2026	02-Jul-2026	28-Oct-2026	–	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال المدنية	07-Jul-2026	02-Jul-2026	28-Oct-2026	–	▼ متأخر
اكتمال إخلاء الموقع	23-Jul-2026	20-Jul-2026	25-Oct-2026	–	▼ متأخر
إنهاء البردورات ورصف الطرق	28-Jun-2026	–	25-Oct-2026	–	▼ متأخر
إنهاء شبكات المياه (الشرب والمعالجة)	12-Sep-2026	–	26-Oct-2026	–	▼ متأخر
إنهاء شبكات الصرف الصحي والسيول والكهرباء	26-Sep-2026	–	17-Nov-2026	–	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	28-Jul-2026	28-Jul-2026	17-Nov-2026	–	▼ متأخر
التنفيذ (P6)	26-Sep-2026	–	17-Nov-2026	−52	▼ متأخر
الإغلاق (P6)	26-Sep-2026	–	15-Dec-2026	−69	▼ متأخر
انتهاء المشروع	26-Sep-2026 (الأصلي 28-يوليو-2026)	15-Nov-2026 (+50 يوماً)	15-Dec-2026	−80	▼ متأخر

يفصل بين توقعي الانتهاء الآن 30 يوماً، ولم تُحدَّث ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي.

يتوقع التقرير الأسبوعي الانتهاء في 15-نوفمبر-2026، بينما ينتهي مستخرج P6 في 15-ديسمبر-2026، أي بعد أسبوع من الأسبوع الماضي. ولا تزال ورقة المعالم تعطي تواريخ متوقعة بين فبراير ويوليو 2026، بينما يتوقع P6 المعالم نفسها بين 25 أكتوبر و17 نوفمبر 2026. والتواريخ الأساسية لمعالم الشبكات والرصف الثلاثة هي تواريخ الخطة الأساسية في P6.

توريد المواد الرئيسية

الكمية المورّدة مقابل كمية جدول الكميات المعدل. المصدر: ورقة Major Quantities، التقرير الأسبوعي 18- أكتوبر-2026.



التوريدات مكتملة مقابل الكميات المعدلة


جميع المواد في ورقة Major Quantities مورّدة ومركّبة بنسبة 100% مقابل كمياتها المعدلة. ولا يزال ملخص التوريدات يُظهر إصدار 12 من 20 أمر شراء، ويتبقى 8، و10 مواد في الموقع.

ورقة التوريدات غير محدّثة

لا تزال ورقة التوريدات التفصيلية، المخفية في الملف، تعرض نسب توريد من مرحلة سابقة، مثل البردورات 4.8% والإنترلوك 6.9% وصنبور إطفاء الحريق 79%. وتسعة من بنودها الـ42 موسومة "سيتم حذفها من النطاق".

القوى العاملة

عدد العمالة اليدوية الشهري، المخطط مقابل الفعلي، من أغسطس 2024 إلى يناير 2026، آخر شهر يتوفر فيه رقم فعلي. المصدر: ورقة Manpower.

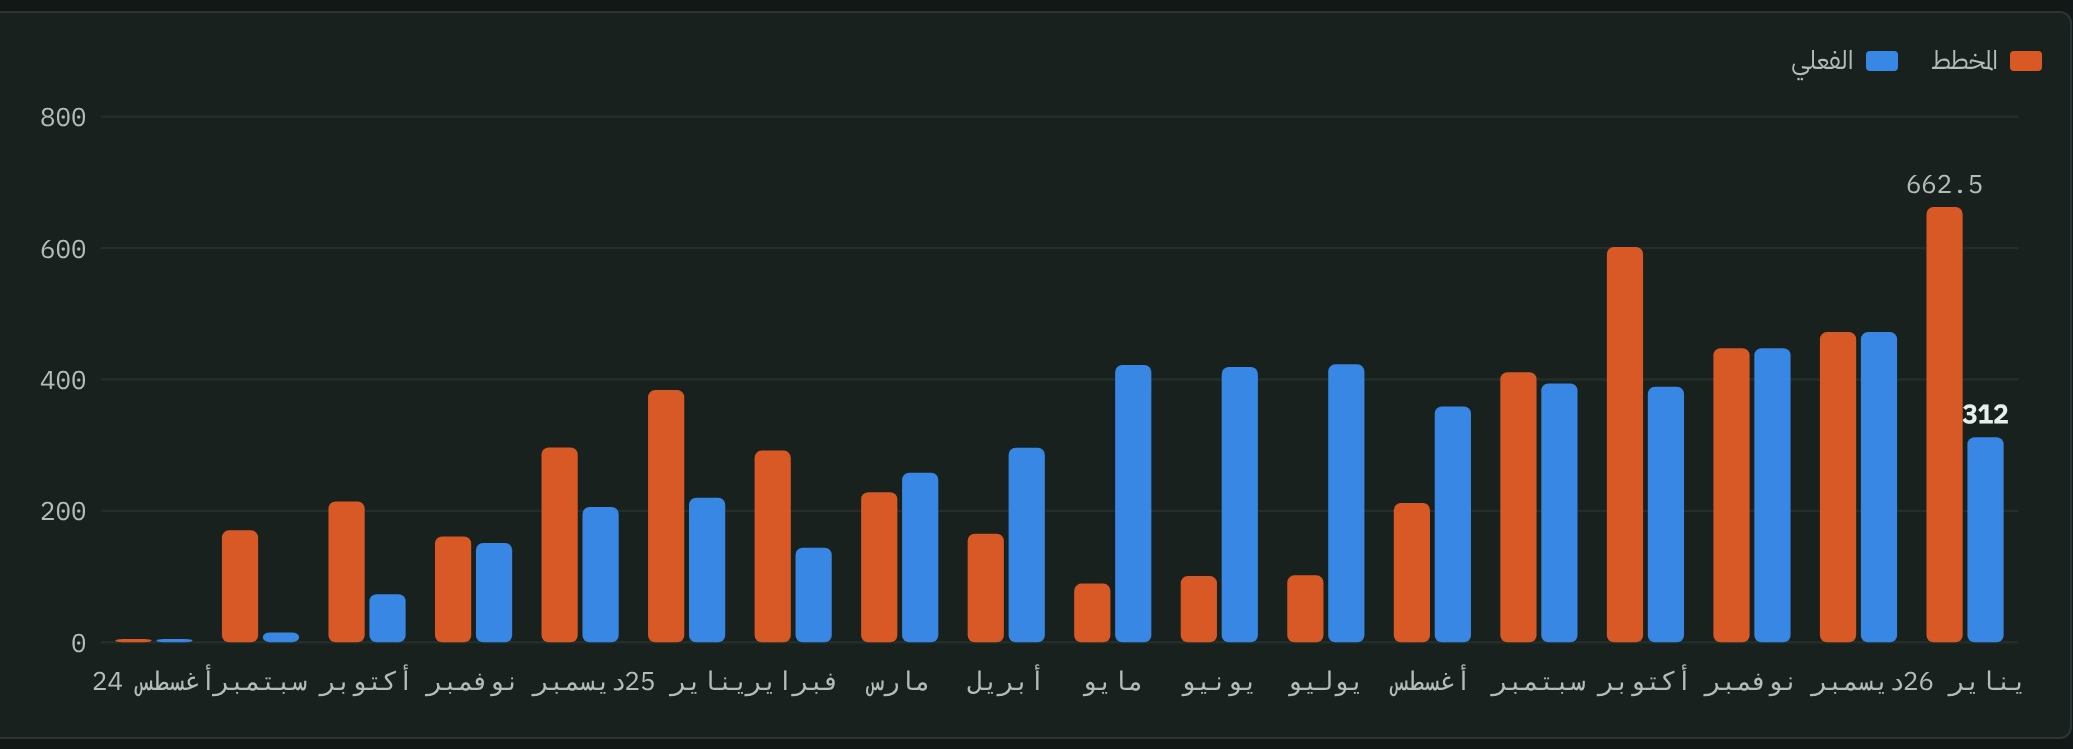

يناير 2026: 312 مقابل 662.5 مخططاً. والأرقام الفعلية لنوفمبر وديسمبر 2025 مطابقة تماماً للقيم المخططة. ولشهر أكتوبر 2026 تذكر لوحة الموارد مجدداً 1,092 عاملاً و92 موظفاً، وتُظهر خانات المخطط والانحراف فيها الآن أخطاء #VALUE!. ويذكر التوزيع حسب المهنة 389 عاملاً مقابل 602 مخططاً. المعدات في الموقع: 135 مقابل 167 مخططة، منها 3 متوقفة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

شبكة تصريف السيول والأمطار	161,546,482
الطرق والرصف والعلامات الأرضية واللوحات	67,012,837
شبكة المياه المعالجة (الري)	49,057,170
شبكة الصرف الصناعي	19,706,041
الأعمال الكهربائية	13,120,144
شبكة مياه الشرب	9,302,202
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**319,744,876**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	367,706,607
أوامر التغيير	2 (دون تكلفة)

جميع القيم بالريال. أمر التغيير 1 (جدول الكميات المعدل، المعتمد في 23-يوليو-2025) وأمر التغيير 2 (تمديد المدة شهرين، المعتمد في 29-يونيو-2026) لا يغيران قيمة العقد.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	24
القيمة الإجمالية	250,214,133
استرداد الدفعة المقدمة	25,021,413
الخصومات والغرامات	260,000
المحتجزات	0
الصافي شاملاً الضريبة	258,711,628
المعتمد من مدير المشروع (23 مستخلصاً)	246,537,903
المدفوع (المسجل)	0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	278,535,718

المفوتر 78.3% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 98.96%. لا يسجل السجل أي دفعات، والمستخلصان #22 و#23 موسومان "قيد المراجعة" رغم إدخال تواريخ اعتماد مدير المشروع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.86

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	2,210,362
ساعات العمل هذا الأسبوع	22,920
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة (تراكمي)	11
حوادث المركبات (تراكمي)	1
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	223 / 3,335

تفتيش السلامة في الموقع بتاريخ 25-أكتوبر-2026. وأرقام هذا الأسبوع (22,920 ساعة عمل، و8 اجتماعات توعية، وتدريبان داخليان) مطابقة لأرقام الأسبوع الماضي.

الجودة التقييم 0.91

تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / مفتوحة	140 / 129 / 11
تعليمات الموقع: صادرة / مفتوحة	187 / 1
طلبات فحص المواد: صادرة / مفتوحة	357 / 2
طلبات الفحص الميداني: صادرة / معلقة	31,756 / 435
طلبات الاستيضاح: صادرة / مغلقة	239 / 238
المخططات التنفيذية: مقدمة / الإجمالي	2,530 / 2,549
اعتمادات المواد المعلقة	35 من 78
مخططات حسب التنفيذ: مقدمة / معتمدة (A) / الإجمالي	655 / 530 / 980

تفتيش مراقبة الجودة 25-أكتوبر-2026. صدر هذا الأسبوع 11 تقرير عدم مطابقة وأُغلق 33. مخططات حسب التنفيذ: 29 قيد المراجعة و22 مرفوضة (الرمزان C وD)، وفق متتبع مخططات حسب التنفيذ بتاريخ 25-أكتوبر-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
مخططات حسب التنفيذ	مدن	مخططات حسب التنفيذ لا تطابق الوضع في الموقع، لذا تحتاج مناطق الربط إلى حفر لتحديد الخدمات.
المقاطع العرضية لممرات الخدمات	مدن	المقطع العرضي في وثائق العقد لا يطابق الموقع، ويحتاج كل طريق إلى مقطع عرضي معتمد خاص به.
مصنع داخل منطقة العمل	مدن	يقع أحد المصانع داخل منطقة العمل، لذا يجب إعادة توزيع الشبكات في هذه الطرق. ولم يصل رد رسمي من الاستشاري بعد.
الخطوط القائمة تغيّر النطاق	مدن	الخطوط القائمة التي كشفها المسح تغيّر توزيع الشبكات وتقلل النطاق، كما حدث في شبكتي الصرف الصناعي والمياه.
خطوط الجهد المتوسط القائمة	مدن	خطوط الجهد المتوسط القائمة تغيّر النطاق، ولم تُسلَّم بيانات حسب التنفيذ للجهد المتوسط إلى المقاول.
العبارة الصندوقية، المنطقة 01	المقاول	خدمات قائمة أكثر من المتوقع، ويستمر العمل ببطء وحذر.
العبارة الصندوقية، المنطقة 06	مدن	يتعارض الحفر مع أحد المصانع ومدخله.

جميع البنود المفتوحة في سجل المشكلات سُجلت بين سبتمبر وديسمبر 2024 ولا تزال موسومة نشطة، ولا يتضمن السجل أي إدخالات أحدث. وغير مدرج في السجل: نسبة اعتماد مخططات حسب التنفيذ 54% (530 من 980)، بينما يخطط P6 لاعتمادها جميعاً بحلول 01-نوفمبر-2026.

ملاحظات على البيانات

- رقم الأسبوع: ورقة Milestones التي ذكرت أسبوع العقد 116 في 18-أكتوبر-2026 تُظهر الآن خطأ #VALUE!. وحساب أسابيع العقد بالطريقة نفسها يعطي 117 في 25-أكتوبر-2026، بينما يعطي حساب الأسابيع الكاملة منذ تسليم الموقع (818 يوماً) الرقم 116 المستخدم لتقرير الأسبوع الماضي.
- ورقة Major Quantities لم تتغير منذ 18-أكتوبر-2026 وتُظهر جميع البنود مركّبة بنسبة 100%، لكن قائمة الأنشطة المتبقية في P6 لا تزال تتضمن خطوط غرف تجميع للسيول في خمس مناطق وفي الطرق الرئيسية، والطبقة الإسفلتية الأساسية في المنطقة Z05.
- ورقة Physical-Chart Data لم تتغير ولا تزال تُظهر إنجازاً فعلياً 100% في 30-سبتمبر-2026، مقابل 99.05% في ورقة Progress في 25-أكتوبر-2026.
- المعلم: يذكر التقرير الأسبوعي أن مسح الوضع القائم انتهى في 23-يوليو-2025، بينما يُدرجه P6 منتهياً في 25-أكتوبر-2026. ولا تطابق توقعاته الأخرى (من فبراير إلى يوليو 2026) توقعات P6 (من 25 أكتوبر إلى 17 نوفمبر 2026). ومعلم "اكتمال تركيب الهياكل المعدنية لجميع المباني" لا يناسب مشروع بنية تحتية.
- القوى العاملة: يُظهر ملخص الموارد #VALUE! في خانتي المخطط والانحراف، ويكرر عدد العمالة (1,092 عاملاً و92 موظفاً) رقم الأسبوع الماضي، وتتوقف الأرقام الفعلية الشهرية عند يناير 2026. كما تكرر أرقام السلامة لهذا الأسبوع أرقام الأسبوع الماضي.
- لا تزال ورقة Testing تُظهر 0% لجميع الأنظمة، بينما يُظهر P6 بدء الاختبار والتشغيل في عدة مناطق في 14-أكتوبر-2026.
- متتبع مخططات حسب التنفيذ: يذكر الملخص عدد المخططات المتبقية مرة 367 ومرة 347، بينما يساوي الإجمالي 980 مطروحاً منه المقدم 655 الرقم 325.
- ملفات أخرى: ملف Progress Layouts مؤرخ 09-أغسطس-2026 ومتتبع التوريدات مؤرخ 23-أغسطس-2026، لذا لم يُستخدم أي منهما، وملف .rar ليس له نسخة نصية. ومن الصور الخمس استُبعدت الصورة التي تكرر لقطة أخرى.
- لا يزال ملخص المستخلصات يُظهر 0 مستخلصات مقدمة بينما يدرج السجل 24 مستخلصاً.
- يعرض الملف أيضاً تقدماً مبنياً على التكلفة ويسميه مخططاً وفعلياً. ويعتمد هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي (بعدد ساعات العمل المخططة) فقط.
