محطة ركاب لسار في سدير

Construction of a SAR Train Passenger Drop-Off Station in Sudair

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة تطوير التقنية للمقاولات (TDC)	إيجيس (EGIS)	زياد الشبات	07-Apr-2026	06-Aug-2027

النطاق: محطة ركاب لقطار سار في مدينة سدير الصناعية (الرصيف والمظلة والتشطيبات والأنظمة الكهربائية وكاميرات المراقبة ونظام الإخلاء الصوتي للمحطة)، مع طريقي الوصول RD-01 وRD-02 وما يتبعهما من شبكات تصريف السيول والصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والاتصالات والجهد المتوسط والمنخفض.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. يضع تقرير 02-نوفمبر-2026 نسبة الإنجاز عند 40.4% مقابل 40.2% مخطط (مؤشر الأداء الزمني 1.01)، بعد أن كانت 27.3% قبل أسبوع. وهذه القفزة البالغة 13.1% في أسبوع واحد لا تدعمها بقية بيانات التقرير، وينبغي التحقق منها قبل اعتمادها.

نسبة الإنجاز الفعلي
40.4% / 40.2% مخطط
؟ مؤشر الأداء 1.01، يحتاج إلى تحقق
+0.2%

التقدم هذا الأسبوع
+13.1% / +0.2%
مخطط
؟ لا تدعمه الكميات

المدة المنقضية من العقد
43.0% · اليوم 209 من 486
انتهاء P6: 06-أغسطس-2027، بلا فائض

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
22.2% · 7.34 مليون ريال
3 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 28-أكتوبر-2026

القفزة البالغة 13.1% في أسبوع واحد تحتاج إلى تحقق.

معظمها من أعمال الطرق 1 التي ارتفعت ساعات العمل المكتسبة فيها من 79,097 إلى 161,207. ويُظهر الطريق Road-01 الآن 122,462 ساعة مكتسبة مقابل ميزانية 106,900 (114.6%)، في حين لم تتغير ورقة الكميات الرئيسية عن الأسبوع الماضي. كما ارتفعت ميزانية ساعات العمل من 638,468 إلى 659,762، وتعيد ورقة Physical-Chart Data تقدير الفعلي لشهر أكتوبر من 174,266 إلى 246,525 ساعة. وفي المقابل انخفضت ساعات التوريدات المكتسبة من 17,130 إلى 15,033 (16.3% مقابل 80.1% مخطط)، ولا تزال حزمة المحطة عند 0%.

صور الموقع هذا الأسبوع

صورتان من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026، أما الصور الأربع الأخرى فعرضها أقل من 600 بكسل. تستمر أعمال طبقة الأساس وطبقة ما تحت الأساس على الطريق 1. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




فرش طبقة الأساس، الطريق 1
فرّادة تفرش طبقة الأساس على الطريق 1.



دمك طبقة ما تحت الأساس، الطريق 1
هراس يدمك طبقة ما تحت الأساس على الطريق 1.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

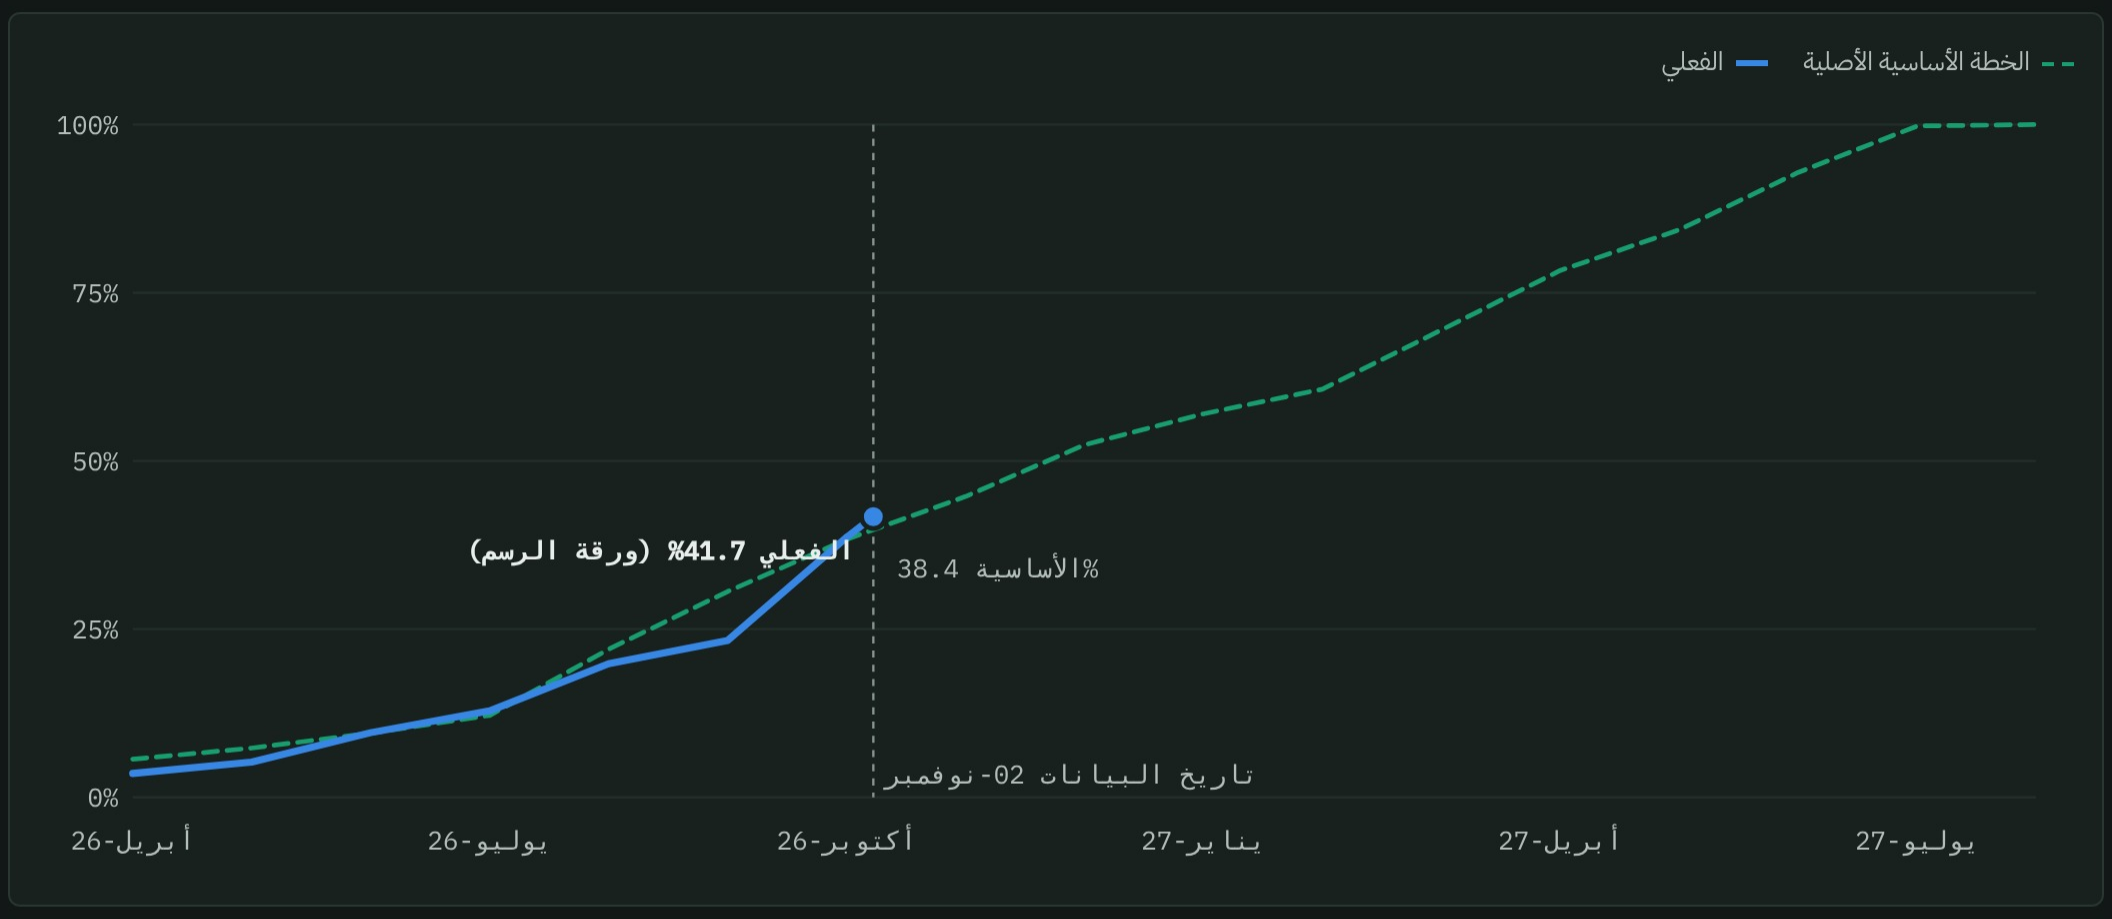

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
19-Oct-2026	38.1	26.1	-12.0	–	0.69
26-Oct-2026	40.0	27.3	-12.7	+1.2	0.68
02-Nov-2026	**40.2***	**40.4***	**+0.2**	**+13.1**	**1.01**

قيم 19 و26 أكتوبر من تقرير 26-أكتوبر-2026، وقيم 02 نوفمبر من تقرير هذا الأسبوع. * يستخدم تقرير 02 نوفمبر ميزانية 659,762 ساعة عمل بدلاً من 638,468. ويحتفظ المنحنى بميزانية ورقة الرسم البالغة 638,468، لذا نقطته عند 02 نوفمبر هي 41.7%، ونقطة أكتوبر هي القيمة المعاد تقديرها 38.6%.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5%	100.0%	95.0%	-5.0	0.95	▼ متأخر
التوريدات	14%	80.1%	16.3%	-63.8	0.20	▼ متأخر كثيراً
التنفيذ	75%	27.9%	40.5%	+12.6	1.45	؟ يحتاج إلى تحقق
· الحزمة 1: الطرق والخدمات	53.9%	35.3%	56.3%	+21.0	1.60	؟ يحتاج إلى تحقق
· الحزمة 3: المحطة (الرصيف والمظلة والأنظمة)	21.1%	9.1%	0.0%	-9.1	0.00	▼ لم يبدأ
الاختبار والتشغيل	2%	0.0%	0.0%	0.0	–	● لم يحن موعده
الإغلاق	1%	0.0%	0.0%	0.0	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**40.2%**	**40.4%**	**+0.2**	**1.01**	؟ يحتاج إلى تحقق

يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 01-نوفمبر-2026) عدد 855 نشاطاً: 258 مكتملاً و49 قيد التنفيذ و548 لم يبدأ.
تاريخ الانتهاء المجدول 06-أغسطس-2027، وهو تاريخ العقد، دون فائض زمني.

نطاق العمل: الكميات

الكميات الرئيسية في جدول الكميات من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026: الإجمالي والمنفذ حتى تاريخه والمتبقي. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير منذ تقرير 26-أكتوبر-2026، ولم تتغير أي كمية.

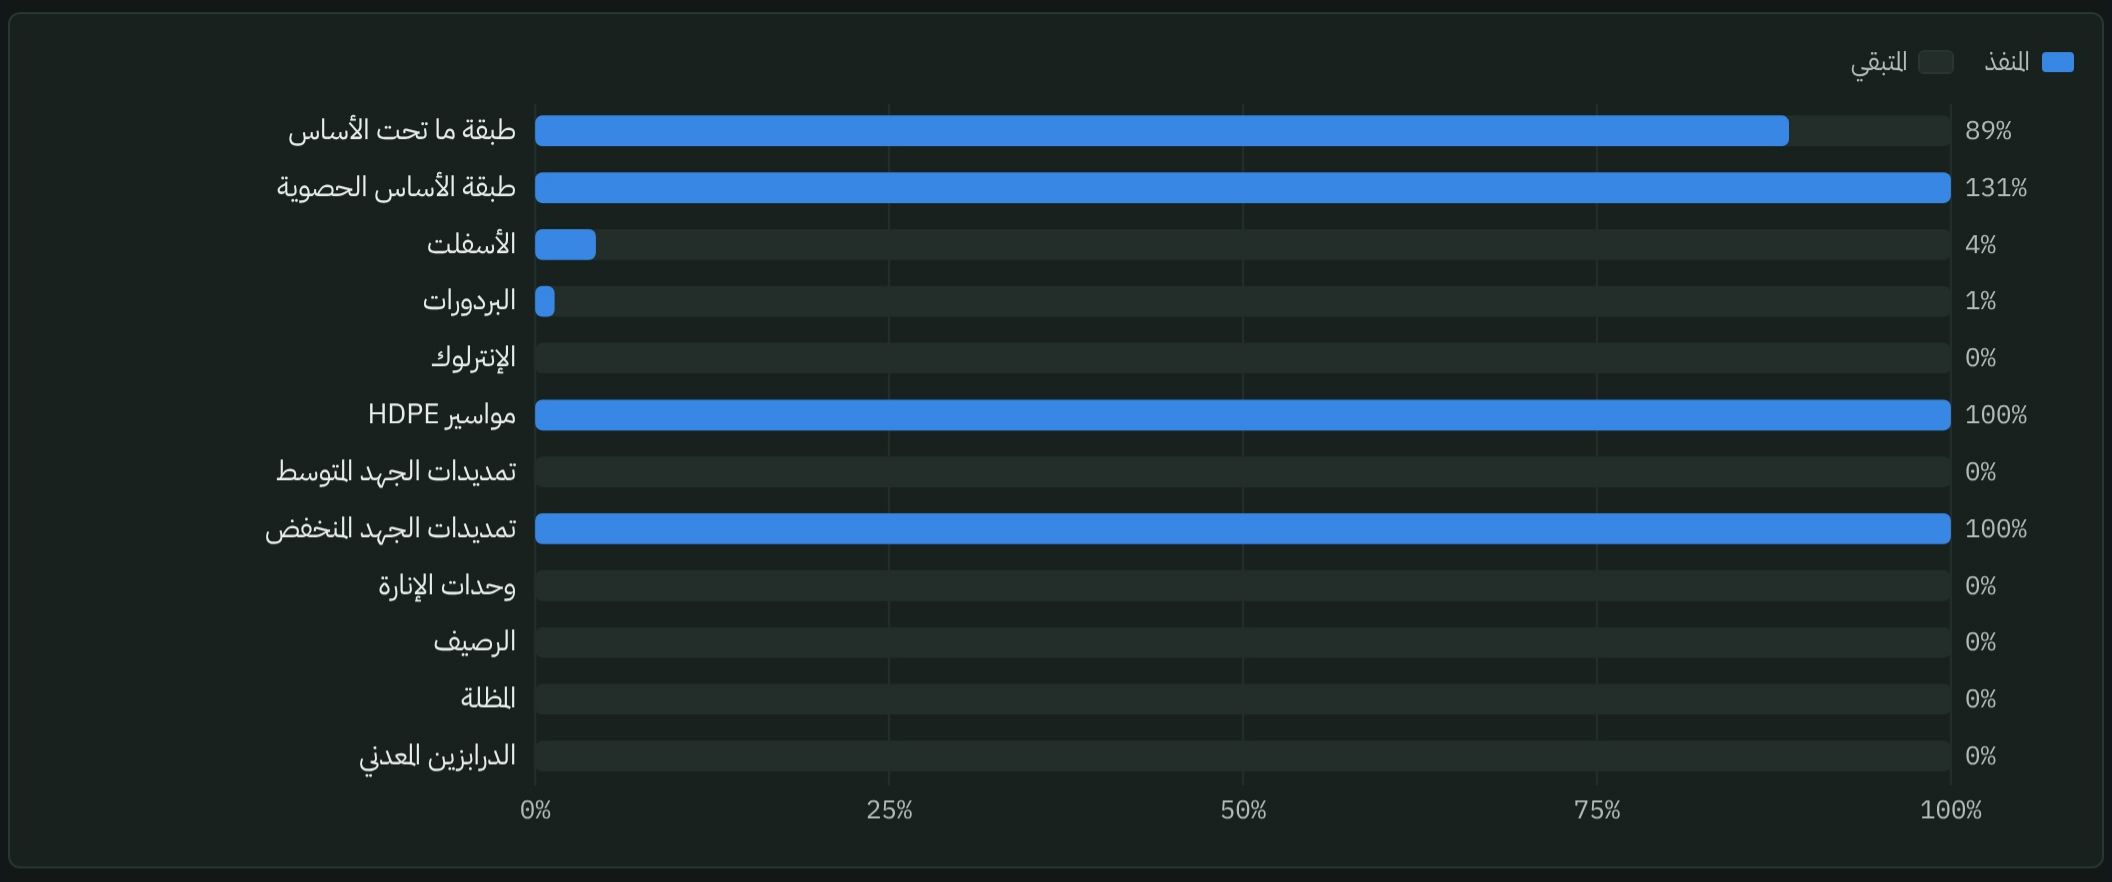

بند النطاق	رقم البند	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
طبقة ما تحت الأساس	B1.32 11 13.01	م³	20,530	18,182	0	2,348	88.6%
طبقة الأساس الحصوية	B1.32 11 23.01	م³	16,376	21,459	0	5,083.2-	131.0%
الأسفلت	B1.32 12 16.01	م³	13,360	573	0	12,787	4.3%
البردورات	B1.32 16 13.23.01	م²	20,555	282	0	20,273	1.4%
الإنترلوك	B1.32 14 13.13.01	م²	27,900	0	0	27,900	0.0%
مواسير HDPE	B4.33 31 23.01	م.ط	5,808	5,808	0	0	100.0%
تمديدات الجهد المتوسط	B2.31 23 00.01	م.ط	7,120	0	0	7,120	0.0%
تمديدات الجهد المنخفض	B2.33 71 00 02.01	م.ط	7,500	7,500	0	0	100.0%
وحدات الإنارة	B2.26 56 19.01	عدد	116	0	0	116	0.0%
الرصيف	00 00 03	م²	4,000	0	0	4,000	0.0%
المظلة	00 00 31	م.ط	4,000	0	0	4,000	0.0%
الدرابزين المعدني	B4.05 52 00.01	م.ط	440	0	0	440	0.0%

أعمال المحطة لم تبدأ

الرصيف (4,000 م²) والمظلة (4,000 م) والدرابزين المعدني (440 م) ووحدات الإنارة (116) جميعها عند 0%. ويتوقف الرصيف والمظلة على تصريح سياج سار وتصميم المالك.

أرقام تحتاج إلى مراجعة

الكميات مطابقة لكميات الأسبوع الماضي، رغم أن سجل طلبات الفحص يسجل أعمالاً في طبقة ما تحت الأساس ومياه الشرب هذا الأسبوع، وأن ساعات عمل الطرق تضاعفت تقريباً. ولا تزال طبقة الأساس الحصوية 21,459 م³ مقابل إجمالي 16,376 م³ (131%)، ومواسير HDPE وتمديدات الجهد المنخفض مسجلة منفذة بنسبة 100%.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث جدول P6 توقعات مختلفة للمعالم المرحلية. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	07-Apr-2026	07-Apr-2026	07-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
انتهاء التجهيز	06-May-2026	06-May-2026	06-May-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم خطة العمل والبرنامج الأساسي	06-May-2026	16-Aug-2026 (+102 يوماً)	15-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
انتهاء مرحلة التصميم	06-May-2026	21-Sep-2026 (+138 يوماً)	02-Nov-2026	59	▼ متأخر
أعمال الطرق والرصف	06-Dec-2026	31-Dec-2026 (+25 يوماً)	02-Feb-2027	6	▼ متأخر
انتهاء مرحلة التوريدات	15-Apr-2027	09-Jun-2027 (+55 يوماً)	21-Mar-2027	54	؟ التوقعات مختلفة
أعمال الجهد المتوسط	12-May-2027	05-May-2027	01-Jun-2027	7	▼ معرّض للتأخير
أعمال الموقع والرصيف	20-Jul-2027	05-Aug-2027 (+16 يوماً)	22-Apr-2027	85	؟ التوقعات مختلفة
أعمال التشطيبات والأعمال العامة للموقع	20-Jul-2027	06-Aug-2027 (+17 يوماً)	06-Aug-2027	0.5	▼ معرّض للتأخير
انتهاء المشروع	06-Aug-2027	06-Aug-2027	06-Aug-2027	0	● بلا فائض

يختلف التقرير الأسبوعي وP6 على معالم الطرق والتوريدات والرصيف.

يتوقع التقرير الأسبوعي اكتمال أعمال الطرق والرصف في 31-ديسمبر-2026، بينما يحدده P6 الآن في 02-فبراير-2027 بفائض 6 أيام. ويُنهي P6 أعمال الموقع والرصيف في 22-أبريل-2027 بفائض 85 يوماً، رغم أن أعمال الرصيف لم تبدأ وتنتظر تصريح سياج سار. ومرحلة التصميم التي توقع التقرير الأسبوعي انتهاءها في 21-سبتمبر-2026 ما زالت مفتوحة في P6. ويُنهي P6 المشروع الآن في تاريخ العقد، قبل يوم من توقع الأسبوع الماضي، دون فائض.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المورّدة من الكمية المطلوبة، من عمود Completion Rate. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 02-نوفمبر-2026، دون تغيير عن 26-أكتوبر-2026.



ثمانية بنود طويلة التوريد لم تُقدَّم بعد


الدرابزين المعدني والمظلة ومجاري كابلات الجهد المتوسط وتمديدات الجهد المتوسط والمحطات الفرعية وأعمدة الإنارة ووحدات إنارة الشوارع ووحدات الإنارة الخارجية جميعها مسجلة "لم تُقدَّم". وقد انقضت مواعيد أوامر الشراء المطلوبة للدرابزين (25-أغسطس-2026) ومجاري وتمديدات الجهد المتوسط (12-أكتوبر-2026) والمحطات الفرعية (19-أكتوبر-2026).

بنود بلا نسبة توريد

الإنترلوك والعزل المائي ولوحة توزيع الجهد المنخفض ولوحات تغذية الإنارة وكاميرات المراقبة ونظام الإخلاء الصوتي وأغطية المناهل والمحابس لا توجد لها نسبة توريد بعد. وتُظهر أعمدة الإنارة أمر شراء (PO 12725 بتاريخ 01-يوليو-2026) لكنها ما زالت مسجلة "لم تُقدَّم". ويحصي الملخص إصدار 22 من 27 أمر شراء.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

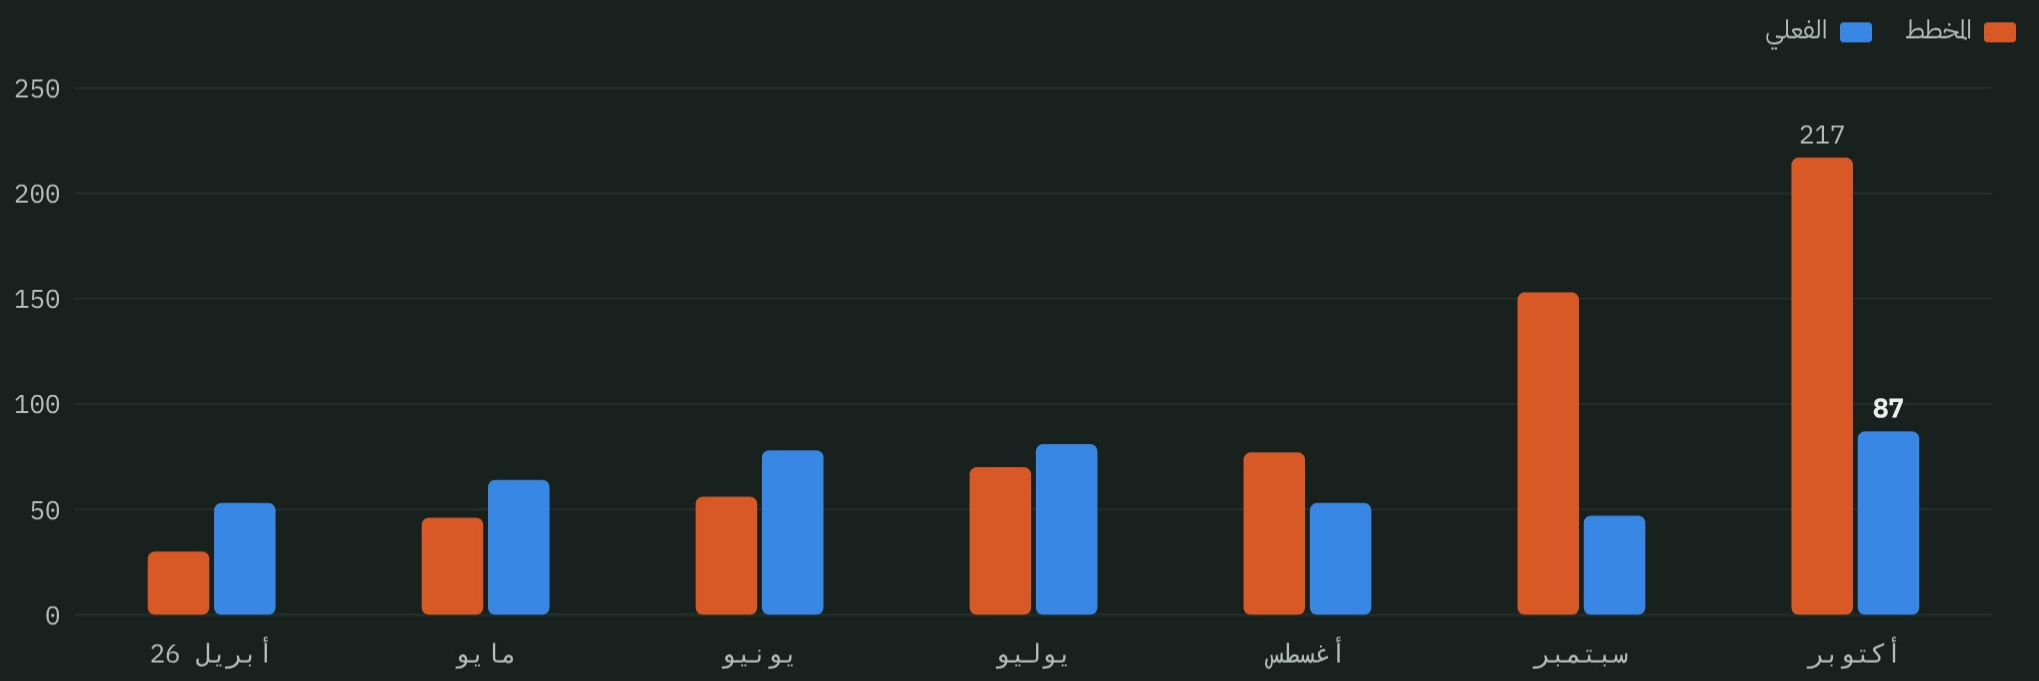

عدد العمالة اليدوية وغير اليدوية معاً. بلغ في أكتوبر 87 مقابل 217 مخططاً (−60%). ويضيف تقرير 02 نوفمبر عموداً لشهر نوفمبر يكرر رقم أكتوبر (87) مقابل 232 مخططاً، لذا لم يُعرض نوفمبر. وتبلغ الخطة ذروتها عند 263 في ديسمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	33,090,825
أوامر التغيير	0
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	33,090,825

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير خالٍ. إجمالي جدول الكميات في ورقة Progress هو 33,090,852، أي أعلى من قيمة العقد بـ27 ريالاً.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	3
القيمة الإجمالية	7,337,445
ضريبة القيمة المضافة	1,100,617
الخصومات والغرامات	10,000
الصافي شاملاً الضريبة	8,428,062
المعتمد من مدير المشروع / المدفوع	0 / 0

المفوتر 22.2% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي مُعلن 40.4%. يغطي المستخلص الثالث (4,289,046 ريال إجمالي) الفترة من 31-أغسطس-2026 إلى 28-أكتوبر-2026. ولم يُعتمد أي من المستخلصات الثلاثة من مدير المشروع ولم يُصرف بعد.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.83

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	87,370
ساعات العمل هذا الأسبوع	5,220
التدريبات الداخلية (تراكمي)	24
اجتماعات التوعية (تراكمي)	22
ملاحظات السلامة المسجلة / المفتوحة	19 / 0

الجودة التقييم 0.89

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة / المعلقة	176 / 173 / 3
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	16 / 15
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	4 / 4
تعليمات الموقع	0
المخططات التنفيذية المقدمة (من 229)	229
اعتمادات المواد المقدمة (من 45)	45

أُضيف هذا الأسبوع 19 طلب فحص وطلب فحص مواد واحد. المخططات التنفيذية: 174 معتمدة (A) و42 معتمدة بملاحظات (B) و13 (C). اعتمادات المواد: 1 (A) و41 (B) و3 (C).

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
تصريح سياج سار	مدن / سار	تصريح العمل داخل منطقة الرصيف ما زال معلقاً، لذا لا يمكن بدء أعمال الرصيف والمظلة. مصنف عالياً جداً (5 × 5) في سجل المخاطر، ومفتوح منذ 16-سبتمبر-2026.
تصميم المظلة والرصيف	مدن (المالك)	لم يُصدر المالك بعد تصميم المظلة والرصيف، لذا لا يمكن إنهاء المخططات التنفيذية والتوريدات والتنفيذ المرتبطة بهما. مصنف عالياً جداً (5 × 5)، بقيمة 9,867,379 ريال.
تقاطعات مجاري الجهد المتوسط	مدن (المالك)	اعتماد المالك لتقاطعات مجاري الجهد المتوسط المقترحة ما زال معلقاً، ويتوقف عليه تركيب تمديدات الجهد المتوسط. مصنف عالياً (4 × 4).
التوريدات طويلة الأجل	المقاول	ثمانية بنود طويلة التوريد لم تُقدَّم للاعتماد بعد، وتجاوز عدد منها مواعيد أوامر الشراء المطلوبة. التوريدات عند 16.3% مقابل 80.1% مخطط.
رصد التقدم	المقاول / الاستشاري	تحتاج القفزة البالغة 13.1% في التقدم المُعلن هذا الأسبوع، وإعادة تقدير الفعلي لشهر أكتوبر، والميزانية الجديدة لساعات العمل إلى مراجعة واعتماد من الاستشاري.

يضم سجل المشكلات 19 ملاحظة سلامة من 02-سبتمبر-2026 إلى 01-نوفمبر-2026، جميعها مغلقة. وهناك خطران قديمان مسجلان مغلقين: تصريح سار للتقرير الجيوتقني ومخطط المناقصة للرصيف.

ملاحظات على البيانات

- قيم هذا الأسبوع مقارنة بالتقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026 (مجلد الأسبوع السابق). ولم تُحدَّث أعمدة الأسبوع السابق في تقرير 02 نوفمبر، فما زالت تحمل قيم 19-أكتوبر-2026، لذا تغطي أعمدته الأسبوعية (21,907 ساعة مخططة و99,941 ساعة مكتسبة) أسبوعين.
- ارتفعت ميزانية ساعات العمل من 638,468 إلى 659,762. فأصبحت ميزانية التجهيز 19,793 (لذا يظهر عند 100%)، والتوريدات 92,367، والتنفيذ 494,821. ولا يشرح التقرير سبب هذا التعديل.
- يُظهر الطريق Road-01 عدد 122,462 ساعة مكتسبة مقابل ميزانية 106,900 (114.6%)، وارتفعت أعمال الطرق 1 من 79,097 إلى 161,207 ساعة مكتسبة، بينما لم تتغير أي من الكميات الرئيسية منذ 26-أكتوبر-2026.
- تعيد ورقة Physical-Chart Data تقدير الفعلي لشهر أكتوبر من 174,266 إلى 246,525 ساعة، وتحتفظ بميزانية 638,468، مما يعطي 41.7% في 02 نوفمبر مقابل 40.4% في ورقة Progress.
- انخفضت ساعات العمل المكتسبة هذا الأسبوع في التوريدات (من 17,130 إلى 15,033) والاتصالات (من 3,538 إلى 2,983) والجهد المنخفض (من 651 إلى 0).
- قيمة "Earn Value" في الصفحة الأولى ومؤشرها الزمني مبنيان على التكلفة (قيمة جدول الكميات) لا على الإنجاز الفعلي، ولا يُستخدمان في هذا التقرير.
- ساعات العمل المخططة أسبوعياً لأعمال الطرق 1 (19,229) لا تساوي مجموع Road-01 و(4,419) Road-02، ويُظهر بند الجهد المنخفض Road-02 قيمة −11,263 مخططة هذا الأسبوع.
- الكميات الرئيسية: طبقة الأساس الحصوية 21,459 م³ مقابل إجمالي 16,376 م³، ومواسير HDPE وتمديدات الجهد المنخفض منفذة 100%. وإجمالي الأسفلت 13,360 م³ هناك لكنه 3,420 م³ في ورقة Procurement. وتُظهر ورقة Procurement نسبة توريد البردورات 1.4 (140%).
- القوى العاملة: المخطط لشهر أكتوبر 217 في المخطط الشهري لكنه 60 في الملخص الأسبوعي، والفعلي لشهر نوفمبر يكرر رقم أكتوبر.
- تذكر الصفحة الأولى "Revised Completion" بتاريخ 07-أبريل-2026، وهو تاريخ تسليم الموقع، و"Total Deduction" بقيمة 2,000 ريال، بينما يبلغ إجمالي الخصومات في سجل المستخلصات 10,000 ريال.
- تاريخ بيانات تحديث P6 هو 01-نوفمبر-2026، أي قبل التقرير الأسبوعي بيوم.
- تغيّر اسم المشروع هذا الأسبوع إلى "Construction of a SAR Train Passenger Drop-Off Station in Sudair". ولا تزال ورقة تفتيش السلامة وملخص طلبات الفحص تحملان رقم المشروع SUD1-02-011، وتصف ورقة Conclusion مشروعاً آخر. وإجمالي ملخص طلبات الفحص 3,633,969 ريال في أعلاه و3,921,134 ريال في أسفله.
- يصف سجل المخاطر المشروع بأنه متقدم عن الجدول. والخطران 3120-4 و3120-5 مسجلان مفتوحين في عمود ومغلقين في عمود آخر.
- أربع من صور الأسبوع الست عرضها أقل من 600 بكسل ولم تُعرض.
