تسوير المنطقة المطورة بوعد الشمال

Improvement of Waad Al Shamal Industrial City Fence & Gates

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	Hamza Mohammad Alderi Construction Co.	Consolidated Consultants Group	محمد العيسى	06-May-2026	05-Oct-2026

النطاق: 35,400 م من السور الشبكي المجلفن مع البوابات والحواجز الكهربائية، ونظام كشف التسلل على تمديدات الألياف البصرية، وثلاث غرف حراسة، والأعمال الخارجية.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. كان مخططاً إنجاز جميع الأعمال بحلول تاريخ انتهاء العقد 05-أكتوبر-2026، لذا فإن نسبة الإنجاز المخططة 100%. بلغت نسبة الإنجاز 91.9%، أي أن المشروع متأخر بنسبة 8.1%، بزيادة 14.8% عن تقرير 26-أكتوبر-2026.

نسبة الإنجاز الفعلي
91.9% / 100% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.92 −8.1%

التقدم هذا الأسبوع
+14.8% / +0.0%
مخطط
● التقرير نفسه يذكر +2.0%

المدة المنقضية من العقد
119.1% · اليوم 181 من 152
▼ انتهاء P6: 26-نوفمبر-2026

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
55.3% · 8.80 مليون ريال
4 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 05-أكتوبر-2026

انقضى تاريخ انتهاء العقد ولا يزال 8.1% من الأعمال غير منجز.

كان موعد انتهاء العقد 05-أكتوبر-2026، أي قبل تاريخ البيانات بأربعة أسابيع. ولا يزال تحديث P6 المرفوع مع تقرير هذا الأسبوع (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026) يحدد انتهاء المشروع في 26-نوفمبر-2026، أي بعد التاريخ التعاقدي بـ 52 يوماً، بفائض زمني −44.2 يوماً. ولا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع الانتهاء في 05-أكتوبر-2026 دون أي انحراف. ولم تبدأ أعمال الاختبار والتشغيل، التي تمثل 4% من ساعات العمل.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ورقة "Weekly Photos" في التقرير الأسبوعي بتاريخ 03-نوفمبر-2026. لا تحمل الصور ختم تاريخ أو GPS. وتُظهر السلم الخارجي، والرصف أمام غرفة حراسة، والتشطيب النهائي للأعمال الكهروميكانيكية والأثاث داخل الغرف. اضغط على صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



تركيب السلم الخارجي
تثبيت سلم معدني على جدار غرفة الحراسة.



أعمال تنسيق المواقع
رصف بالإنترلوك أمام غرفة حراسة بجانب السور.



التشطيب النهائي للأعمال الكهروميكانيكية في الغرف

تركيب ألواح الإنارة السقفية في غرفة الحراسة.




أعمال الأثاث

توريد المكاتب والكراسي إلى غرفة الحراسة.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

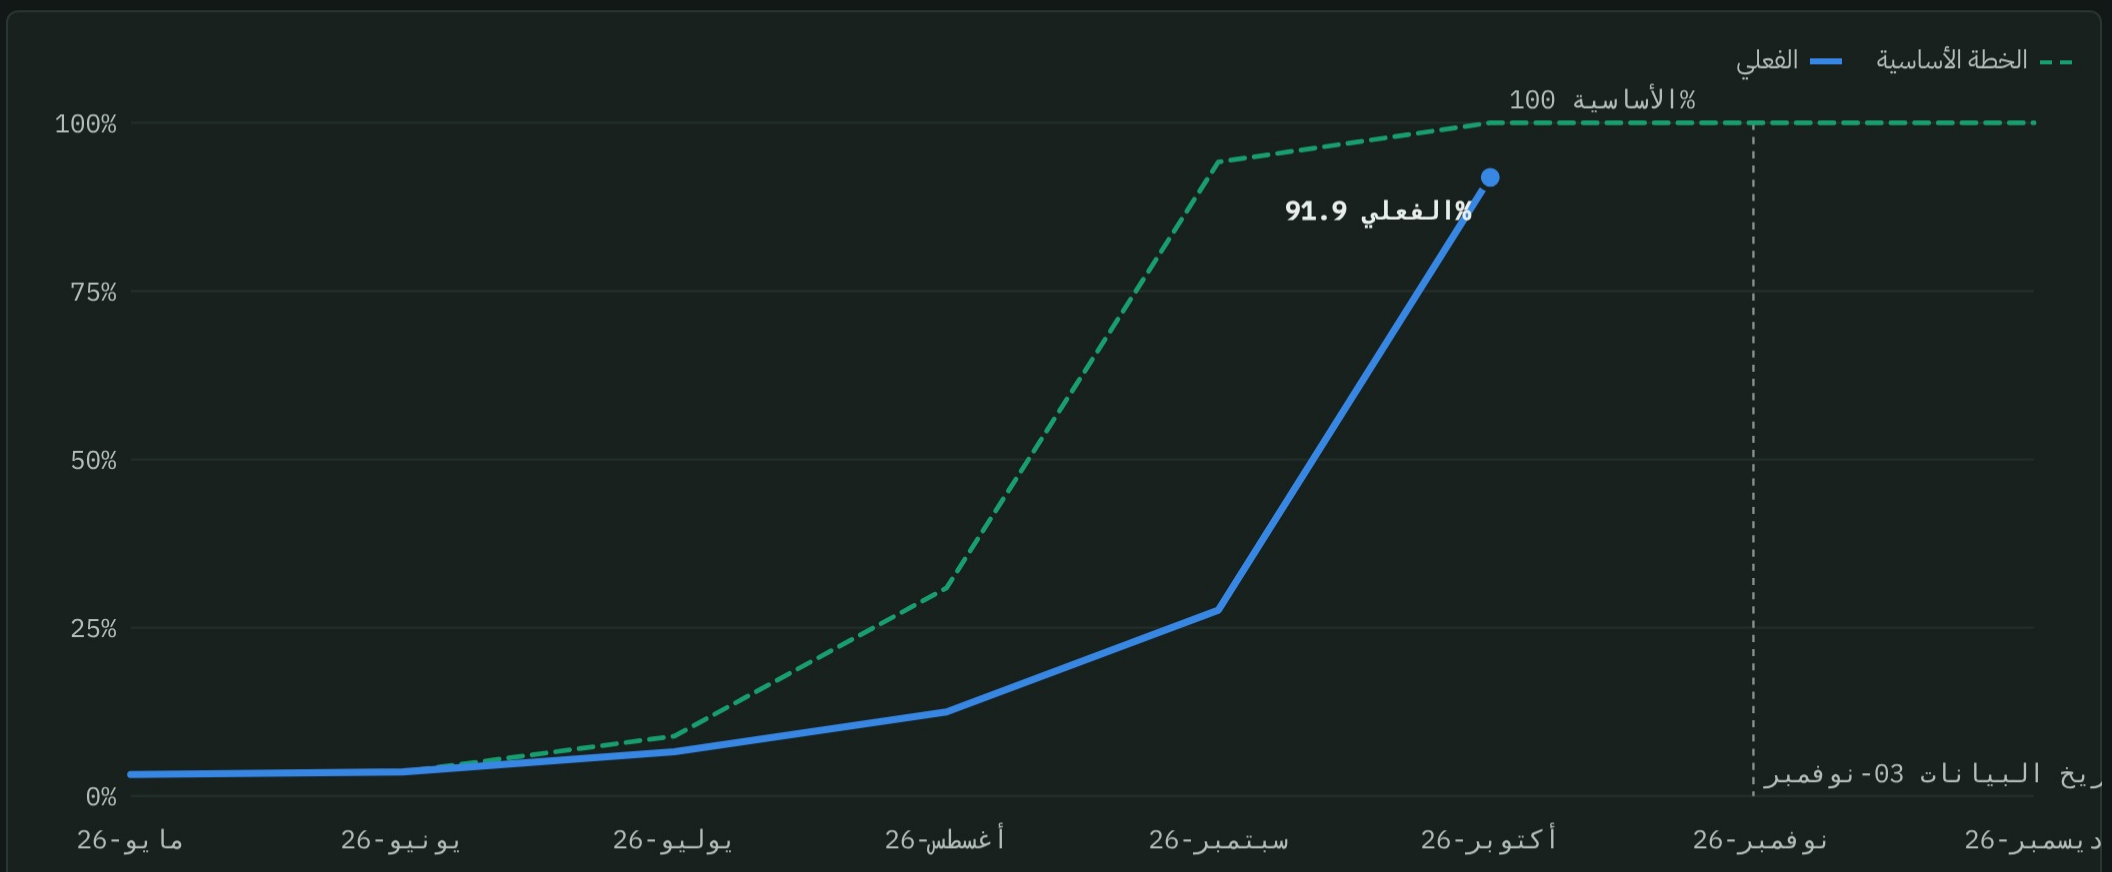

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
26-Oct-2026	100.0	77.1	−22.9%	+20.2%	0.77
03-Nov-2026	**100.0**	**91.9**	**−8.1%**	**+14.8%**	**0.92**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 26-أكتوبر-2026 و03-نوفمبر-2026. "المنجز خلال الأسبوع" هو الفرق بين التقريرين، وتقدم 26-أكتوبر هو الرقم الوارد في ذلك التقرير. ولا تظهر الأسابيع السابقة.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	13%	100.0%	98.9%	-1.1%	0.99	▼ متأخر
التنفيذ	75%	100.0%	94.8%	-5.2%	0.95	▼ متأخر
· الأسوار	5.0%	100.0%	85.8%	-14.2%	0.86	▼ متأخر
· غرفة الحراسة 1	22.6%	100.0%	92.8%	-7.2%	0.93	▼ متأخر
· غرفة الحراسة 2	22.6%	100.0%	96.4%	-3.6%	0.96	▼ متأخر
· غرفة الحراسة 3	22.6%	100.0%	96.7%	-3.3%	0.97	▼ متأخر
· الأعمال الخارجية	2.2%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
الاختبار والتشغيل	4%	100.0%	0.0%	-100.0%	0.00	▼ لم يبدأ
الإجمالي	100%	**100.0%**	**91.9%**	**-8.1%**	**0.92**	▼ متأخر

الأوزان حصص من 98,544 ساعة عمل مخططة؛ وبنود التنفيذ (·) جزء من التنفيذ. منذ تقرير 26-أكتوبر تقدم التصميم الهندسي بنسبة 25.2%، والتنفيذ بنسبة 16.6%، والتوريدات بنسبة 8.5% من ساعات عمل كل منها. يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026) 554 نشاطاً: 465 مكتملة، و62 قيد التنفيذ، و27 لم تبدأ.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية من مطبوعة جدول P6، وتوقعات التقرير الأسبوعي من ورقة المعالم فيه، وتوقعات P6 والفائض الزمني من تحديث P6 (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026).


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	06-May-2026	06-May-2026	07-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	31-May-2026	06-May-2026	09-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال الأسوار	26-Aug-2026	–	03-Nov-2026	-24.0	▼ متأخر
اكتمال غرفة الحراسة 1	26-Aug-2026	–	03-Nov-2026	-24.0	▼ متأخر
اكتمال التصميم الهندسي	22-Sep-2026	22-Sep-2026	03-Nov-2026	-24.0	▼ متأخر
اكتمال الأعمال الخارجية	27-Sep-2026	–	03-Nov-2026	-24.2	▼ متأخر
اكتمال التوريدات	28-Sep-2026	28-Sep-2026	03-Nov-2026	-24.0	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	05-Oct-2026	05-Oct-2026	14-Nov-2026	-33.2	▼ متأخر
انتهاء المشروع	05-Oct-2026	05-Oct-2026	26-Nov-2026	-44.2	▼ متأخر

توقعات التقرير الأسبوعي أصبحت في الماضي.

يتوقع التقرير الأسبوعي اكتمال التصميم الهندسي والتوريدات والمشروع في تواريخ الخطة الأساسية (22-سبتمبر و28-سبتمبر و05-أكتوبر-2026)، وجميعها قبل تاريخ البيانات 03-نوفمبر، ولم يُسجَّل أي منها منجزاً. أما تحديث P6 فيتوقع خمسة معالم في 03-نوفمبر-2026، والاختبار والتشغيل في 14-نوفمبر-2026، وانتهاء المشروع في 26-نوفمبر-2026، بفائض زمني من -24 إلى -44.2 يوماً، كما يسجل تسليم الموقع في 07-يوليو-2026 وليس 06-مايو-2026.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي (الموظفون والعمالة). المصدر: ورقة Manpower.

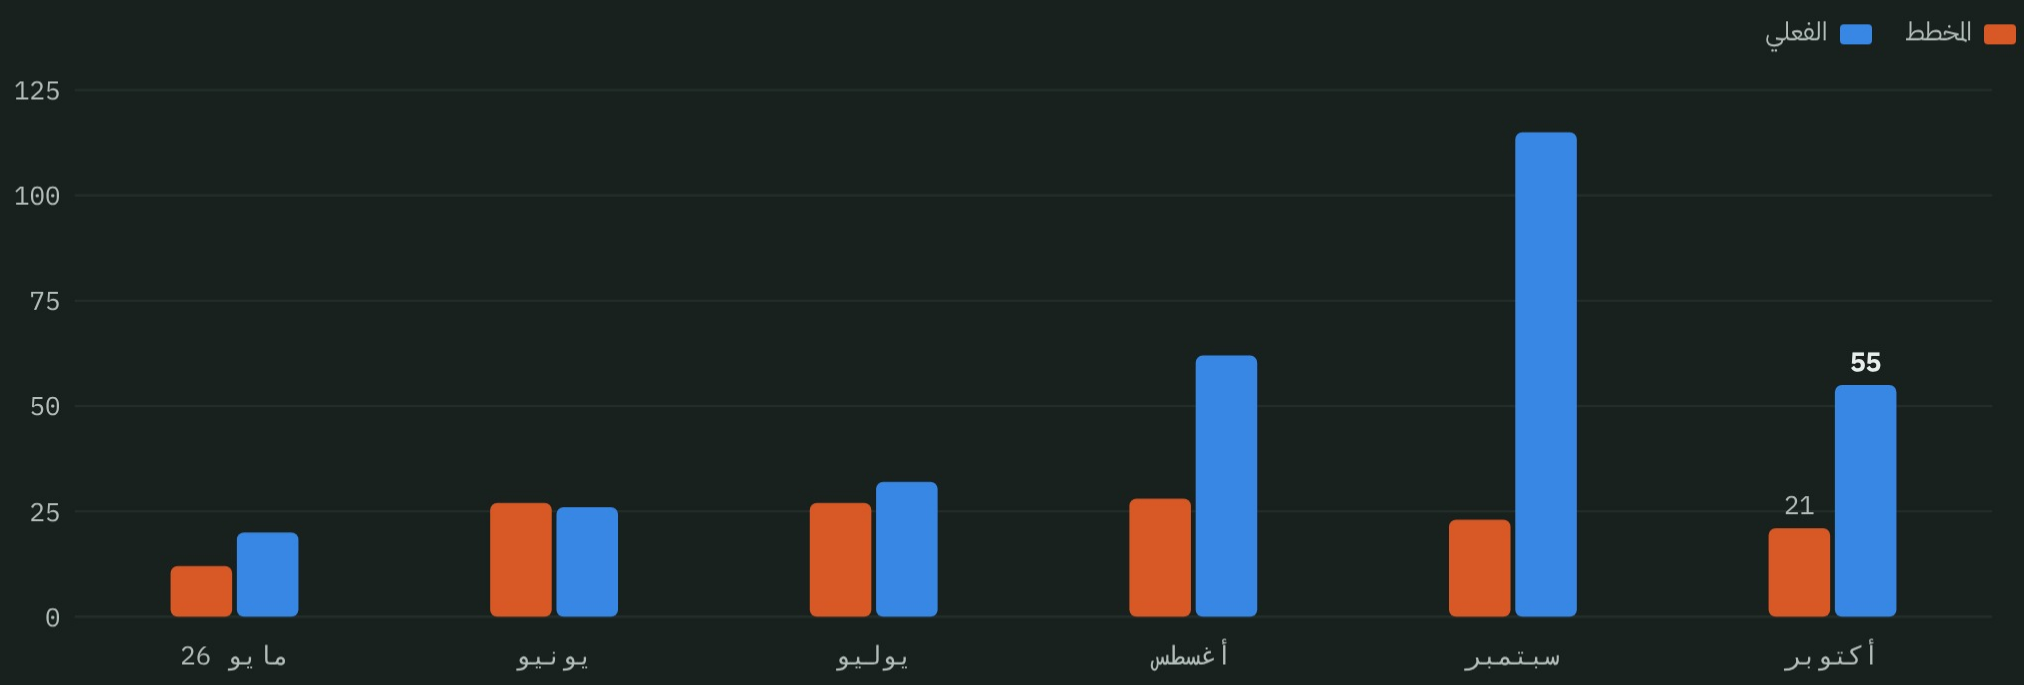

بلغ عدد العاملين في أكتوبر 55 (10 موظفين و45 عاملاً) مقابل 21 مخططاً، بينما ذكر تقرير الأسبوع الماضي 60 لشهر أكتوبر. ولا يوجد عمود لشهر نوفمبر بعد. وظل العدد الفعلي أعلى من المخطط منذ يوليو، وبلغ ذروته 115 في سبتمبر.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	15,898,659
قيمة العقد المعدلة	15,898,659
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ. ويُظهر رأس سجل المستخلصات قيماً مختلفة؛ انظر ملاحظات على البيانات.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	4
القيمة الإجمالية	8,797,318
معتمدة من إدارة الإنشاء / البرنامج	4
معتمدة من مدير المشروع - مدن	0
المدفوعة	0
الصافي شاملاً الضريبة	9,756,785

تبلغ المستخلصات 55.3% من قيمة العقد مقابل نسبة إنجاز فعلي 77.1%. يغطي آخر مستخلص الفترة من 25-سبتمبر إلى 05-أكتوبر-2026. ولا توجد محتجزات أو دفعة مقدمة أو خصومات مسجلة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.86

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	45,776
ساعات العمل هذا الأسبوع	3,660
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	24 / 26

الجلسات حتى تاريخه: حضر 150 شخصاً جلسات التعريف بالسلامة و380 اجتماعات التوعية.

الجودة التقييم 0.86

تقارير عدم المطابقة (تراكمي)	0
تعليمات الموقع	0
طلبات الفحص الميداني الصادرة / المغلقة	573 / 545
طلبات الفحص الميداني المعلقة	28
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	68 / 63
طلبات فحص المواد المعلقة	5
المخططات التنفيذية: الرمز A / B / D	11 / 26 / 1
اعتمادات المواد المقدمة	94

ملاحظات مراقبة الجودة من الاستشاري رقم 18، بتاريخ 31-أكتوبر-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
انقضاء التاريخ التعاقدي	المقاول	كان موعد انتهاء العقد 05-أكتوبر-2026. وفي 03-نوفمبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 91.9%، ويحدد P6 الانتهاء في 26-نوفمبر-2026 بفائض زمني −44.2 يوماً.
اعتماد المواد وتوريدها	المقاول	خطر قائم في السجل منذ 06-يونيو-2026: تأخر اعتماد المواد وتوريدها قد يؤخر الانتهاء. كان موعد إجراء المعالجة (تسريع الاعتمادات والتوريدات) 23-أكتوبر-2026 ولا يزال مفتوحاً، وتقييمه مرتفع جداً.
التوريدات المتبقية	المقاول	في P6 لا يزال 18 من أصل 147 نشاط توريد قيد التنفيذ، بفائض زمني بين −24.1 و−44.2 يوماً. ويذكر التقرير الأسبوعي أن التوريدات بلغت 98.9%.
الاختبار والتشغيل	المقاول	لم يبدأ. كان مخططاً من 26-سبتمبر إلى 05-أكتوبر-2026، ويتوقع P6 الآن هذا المعلم في 14-نوفمبر-2026.
اعتماد المستخلصات	مدن	أربعة مستخلصات (8.80 مليون ريال إجمالي) معتمدة من إدارة الإنشاء / البرنامج، ولم يُسجَّل أي منها معتمداً من مدير المشروع في مدن أو مدفوعاً. ولم يُضف أي مستخلص جديد هذا الأسبوع.

سجل المشكلات وأهم 5 مشكلات في التقرير الأسبوعي فارغان. ويضم سجل المخاطر خطراً واحداً قائماً.

ملاحظات على البيانات

- ارتفعت نسبة الإنجاز من 77.1% في تقرير 26-أكتوبر-2026 إلى 91.9% في هذا التقرير (+14.8%)، لكن العمود الأسبوعي في هذا التقرير يُظهر +2.0% (1,965 ساعة عمل) ويذكر أن الأسبوع السابق 90.0%. وارتفعت ساعات العمل التراكمية لكل غرفة حراسة بين 3,271 و4,248 ساعة بينما يُظهر عمودها الأسبوعي 0، ويكرر الرقم الأسبوعي للتصميم الهندسي (830) رقم الأسبوع الماضي. التقريران غير متطابقين؛ يرجى التأكيد.
- تاريخ البيانات في ملف التقرير 03-نوفمبر-2026، بينما يذكر تحديث P6 وأسماء الملفات 02-نوفمبر-2026. ولا تزال مطبوعة "Two Weeks Look Ahead" (بتاريخ 03-11-2026) تغطي الفترة من 28-سبتمبر إلى 05-أكتوبر-2026.
- لا يزال التقرير الأسبوعي يذكر 05-أكتوبر-2026 تاريخاً متوقعاً للانتهاء بانحراف 0 يوم. ويحدد تحديث P6 تاريخ 26-نوفمبر-2026.
- تاريخ تسليم الموقع 06-مايو-2026 في التقرير الأسبوعي و07-يوليو-2026 في تحديث P6. ويُحسب رقم الأسبوع (25) من 06-مايو-2026.
- يسجل تحديث P6 تواريخ بدء أو انتهاء فعلية بعد تاريخ بياناته 02-نوفمبر-2026 لعدد 183 نشاطاً (حتى 24-نوفمبر-2026)، مقابل 107 الأسبوع الماضي، لذا فإن حالة التقدم فيه غير موثوقة.
- أعداد الأنشطة في التقرير الأسبوعي (195 مكتملة و123 قيد التنفيذ و236 لم تبدأ) لم تتغير عن الأسبوع الماضي، بينما يُظهر تحديث P6 465 و62 و27.
- التصميم الهندسي 100% في التقرير الأسبوعي، لكن معلم "Completion of Engineering Works" في P6 لم يبدأ ومتوقع في 03-نوفمبر-2026.
- تصف مطبوعة P6 نسبة تقدم مبنية على التكلفة بأنها "Actual %". يعتمد هذا التقرير على نسبة الإنجاز الفعلي (ساعات العمل) فقط.
- لا تزال عدة أوراق تحتوي على بيانات مشروع آخر: Major Quantities (بنود صرف صحي وسيول ومياه مؤرخة 2024)، والجدول السفلي في ورقة Milestones (SUD1-05-015)، و(KUMT-05-001) Sheet1. كما يُظهر عمود نشاط P6 في ورقة Procurement الرمز KHJ1-05010. لذلك حُذف قسم كميات نطاق العمل.
- تُظهر ورقة Procurement أن 156 من أصل 166 بنداً موّردة دون ذكر الكميات الموّردة، بينما يُظهر P6 أن 18 نشاط توريد لا تزال قيد التنفيذ. لذلك حُذف قسم التوريدات حتى يتطابق المصدران.
- يُظهر رأس سجل المستخلصات قيمة عقد معدلة 21,100,000 ريال، وتكلفة متوقعة عند الإنجاز 20,900,000 ريال، وتغييرات محتملة 200,000 ريال، بينما تُظهر بقية الأوراق 15,898,659.13 ريال و0. كما أن صافي المستخلص 4 شاملاً الضريبة يكرر صافي المستخلص 3 (2,864,258.52 ريال).
- أصبحت العمالة في الموقع لشهر أكتوبر 45 (الأسبوع الماضي 50). ومجموع العمالة حسب المهنة 45 في ورقة Weekly Progress Report و109 في ورقة Manpower.
- تُظهر ورقة Weekly Progress Report أرقام طلبات فحص المواد والفحص الميداني مُزاحة بعمود واحد (63 / 5 و545 / 28)، بينما تذكر ورقة Quality-Stat 68 صادرة و63 مغلقة و5 معلقة، و573 و545 و28.
- ساعات العمل التراكمية 45,776، وهي ساعات الأسبوع الماضي 42,166 مضافاً إليها 3,660 لهذا الأسبوع ناقص 50. وتقييم السلامة 0.86 في الملخص، و0.90 في تفتيش الاستشاري بتاريخ 31-أكتوبر، و0.8977 في تفتيش السلامة بتاريخ 01-نوفمبر.
- إحدى الصور الست في ورقة "Weekly Photos" أقل عرضاً من 600 بكسل، لذا لم تُدرج.
- تُظهر ورقة DB القيمة #REF! لنطاق المشروع ولعدة تواريخ رئيسية.

أُعدّ في 08-نوفمبر-2026 من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 ومطبوعات الجدول الزمني المرفوعة لأسبوع 05-نوفمبر-2026 (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026)، مقارنةً بتقرير 26-أكتوبر-2026.
