# إنشاء 44 مصنع جاهز (900 متر مربع) في المدينة الصناعية بالدمام الثالثة

## 44 Ready-Built Factories (900 m²), Dammam 3rd Industrial City

| المالك | المقاول | الاستشاري | مدير المشروع - مدن | تسليم الموقع | انتهاء العقد |
|---|---|---|---|---|---|
| مدن | زاس السعودية للإنشاءات | إيجيس (EGIS) | م. عفات العنزي | 07-Jan-2026 | 06-Mar-2027 |

النطاق: 44 مصنعاً جاهزاً مساحة كل منها 900 م² في 11 مبنى (B1–B11)، مع المرافق الخارجية والطرق ومواقف السيارات والإنارة.

---

## ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة (225,761 ساعة عمل إجمالاً). في تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026 بلغ الإنجاز 81.4% مقابل 80.6% مخطط، أي متقدم بنسبة 0.8%. وأُنجز هذا الأسبوع 1.3% مقابل 1.4% مخطط. ولا يزال تنفيذ مباني المصانع متأخراً بنسبة 0.9%، والمبنيان B4 وB5 متأخران بنسبة 21% و20% تقريباً عن خطتهما.

نسبة الإنجاز الفعلي
**81.4%** / 80.6% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.01 +0.8%

التقدم هذا الأسبوع
**+1.3%** / +1.4% مخطط
▼ أقل قليلاً من الخطة الأسبوعية

المدة المنقضية من العقد
**70.9%** · اليوم 300 من 423
● انتهاء P6 في 03-مارس-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
**52.1%** · 50.1 مليون ريال
7 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 31-أكتوبر-2026

**المشروع ضمن الخطة إجمالاً، لكن لم يتبقَّ تقريباً أي فائض زمني عند الانتهاء.**

يُنهي تحديث P6 المشروع في 03-مارس-2027، قبل تاريخ الانتهاء التعاقدي 06-مارس-2027 بثلاثة أيام، بفائض صفري على تاريخ انتهاء المشروع. وجميع الأنشطة الجارية وعددها 100 متأخرة عن الجدول، و229 نشاطاً فاتها موعد البدء. وبلغ إنجاز التنفيذ 75.8% مقابل 76.7% مخطط، وتأخر معلم الأعمال المدنية في P6 أسبوعاً آخر إلى 28-نوفمبر-2026.


---

## صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من أصل 20 صورة رُفعت هذا الأسبوع. لا تحمل الصور ختم تاريخ؛ وتذكر ورقة الصور في التقرير الأسبوعي أعمال مضخات الحريق والألواح الشمسية في المبنى 6 والجدران الفاصلة في المبنى 9 والكسوة في المبنى 5. اختر صورة لعرضها مكبّرة، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



**أعمال مضخات الحريق**
المضخات ومواسير مكافحة الحريق الحمراء، مع سقالات عند الخزان.

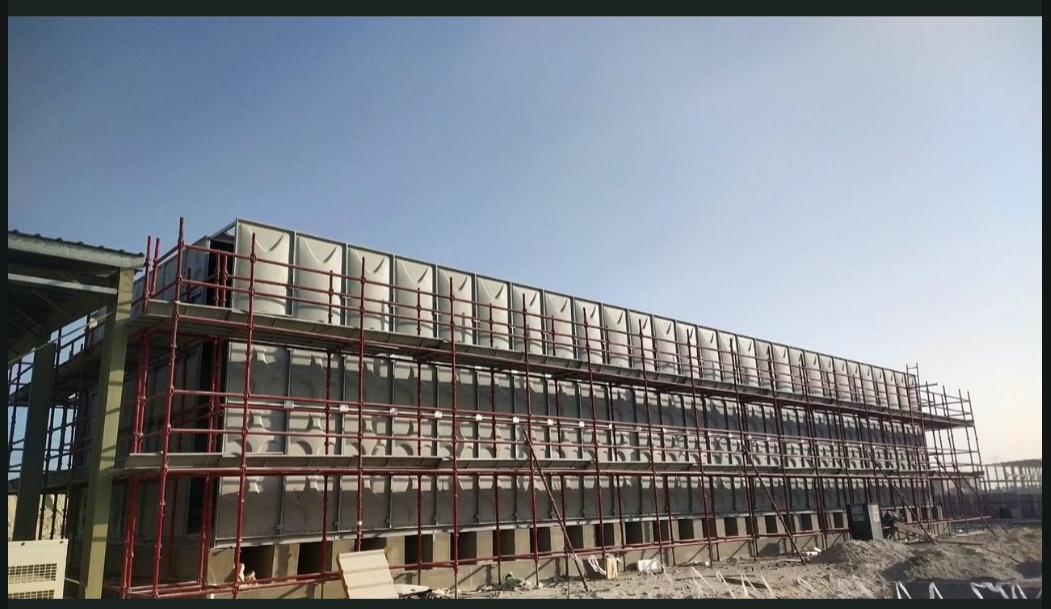

**خزان المياه**
خزان من ألواح مجمّعة تحيط به السقالات.




**أعمال الجدران الفاصلة**

جدار فاصل من البلوك داخل صالة مصنع.



**الكسوة**

كسوة الجدران والسقف عند زاوية أحد المصانع.

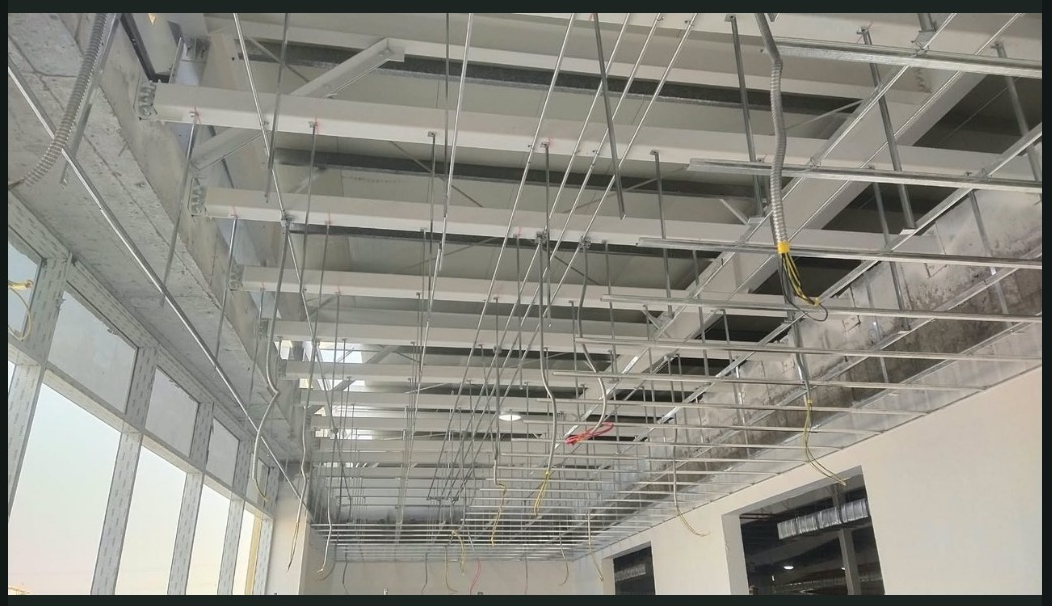

**هيكل سقف المكاتب**

العلّاقات والهيكل لسقف ألواح الجبس.




**صالة المصنع**

الإنارة ومواسير مكافحة الحريق مركّبة؛ والمواد مجهّزة على الأرض.

## منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

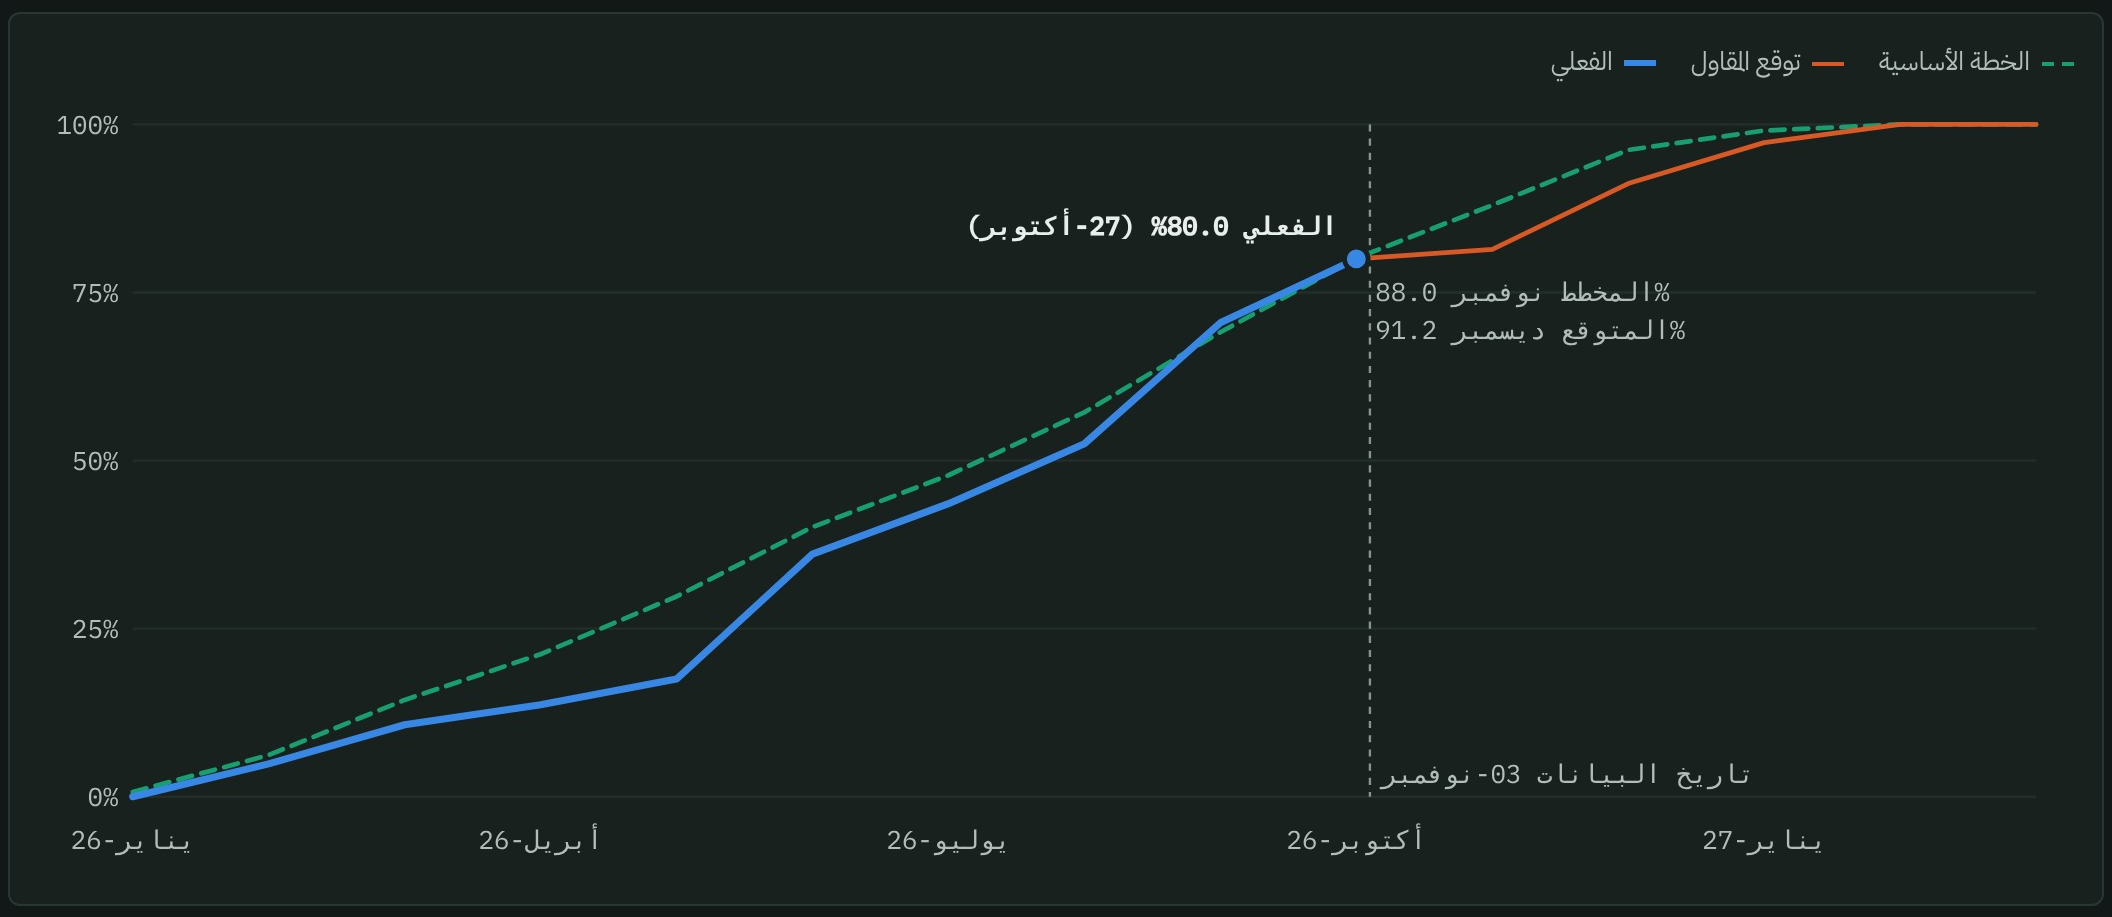


| نهاية الفترة | المخطط % | الفعلي % | الانحراف | المنجز خلال الفترة | مؤشر الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jul-2026 | 47.8 | 43.6 | −4.2% | +7.5 | 0.91 |
| 31-Aug-2026 | 57.2 | 52.5 | −4.7% | +8.9 | 0.92 |
| 30-Sep-2026 | 69.1 | 70.5 | +1.4% | +18.0 | 1.02 |
| 27-Oct-2026 | 79.2 | 80.0 | +0.8% | +9.5* | 1.01 |
| **03-Nov-2026** | **80.6** | **81.4** | **+0.8%** | **+1.3** | **1.01** |

قيم نهاية الشهر من ورقة Physical-Chart Data؛ وصفّا 27-أكتوبر-2026 و03-نوفمبر-2026 من جداول التقدم في التقريرين الأسبوعيين (WPR #36 و#37). الخطة الأساسية والخطة المعدلة في الملف متطابقتان، لذا يظهر خط خطة واحد؛ وينتهي خط الفعلي في المنحنى عند قيمة أكتوبر، ويبدأ خط التوقع من الفعلي في 03-نوفمبر. * المنجز من 01 إلى 27 أكتوبر. ومنجز 03-نوفمبر هو منجز هذا الأسبوع: 3,015 ساعة عمل مكتسبة مقابل 3,061 مخططة.

## التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

| المرحلة | الوزن | المخطط | الفعلي | الانحراف | مؤشر الأداء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التجهيز | 0.4% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 1.00 | ✓ مكتمل |
| التصميم الهندسي | 5.4% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 1.00 | ✓ مكتمل |
| التوريدات | 25.5% | 99.9% | 100.0% | +0.1% | 1.00 | ✓ مكتمل |
| التنفيذ | 63.4% | 76.7% | 75.8% | −0.9% | 0.99 | ▼ متأخر قليلاً |
| الاختبار والتشغيل | 5.1% | 13.6% | 40.6% | +27.0% | 2.99 | ? يحتاج تحقق |
| إغلاق المشروع | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | ● لم يحن موعده |
| **الإجمالي** | 100% | **80.6%** | **81.4%** | **+0.8%** | **1.01** | ▲ في المسار |

يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) 2,517 نشاطاً: 1,796 مكتملاً و100 جارية و621 لم تبدأ. وتاريخ انتهائه المجدول 03-مارس-2027، قبل التاريخ التعاقدي بثلاثة أيام. وانخفضت أنشطة المسار الحرج من 85 إلى 74 هذا الأسبوع. ولم يُكتسب أي تقدم في الاختبار والتشغيل هذا الأسبوع.

## نطاق العمل: الكميات


التقدم الفعلي لكل مبنى من مباني المصانع وللأعمال الخارجية، ثم الكميات الرئيسية المتابعة في التقرير الأسبوعي.
المصدر: التقرير الأسبوعي 03-نوفمبر-2026، جدول التقدم وورقة Major Quantities؛ و«هذا الأسبوع» هو التغير منذ تقرير 27-أكتوبر-2026.

### التقدم الفعلي حسب المبنى

| المبنى | ساعات العمل | المخطط | الفعلي | الانحراف | مؤشر الأداء | المكتسب هذا الأسبوع (ساعات عمل) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المبنى B1 | 11,840 | 74.8% | 73.6% | −1.3% | 0.98 | 104 |
| المبنى B2 | 11,584 | 78.3% | 75.4% | −2.9% | 0.96 | 176 |
| المبنى B3 | 11,824 | 76.3% | 75.5% | −0.8% | 0.99 | 256 |
| المبنى B4 | 11,824 | 99.1% | 77.5% | −21.6% | 0.78 | 248 |
| المبنى B5 | 11,728 | 99.0% | 78.8% | −20.2% | 0.80 | 382 |
| المبنى B6 | 11,824 | 95.5% | 3.7%* | −91.8% | 0.04 | 0 |
| المبنى B7 | 11,840 | 79.9% | 81.8% | +1.9% | 1.02 | 152 |
| المبنى B8 | 11,840 | 72.8% | 80.9% | +8.1% | 1.11 | 209 |
| المبنى B9 | 11,840 | 71.9% | 79.8% | +7.9% | 1.11 | 68 |
| المبنى B10 | 11,840 | 70.7% | 78.7% | +8.0% | 1.11 | 224 |
| المبنى B11 | 11,840 | 69.5% | 77.9% | +8.5% | 1.12 | 247 |
| الأعمال الخارجية | 13,232 | 37.4% | 52.8% | +15.5% | 1.41 | 507 |
| **إجمالي التنفيذ** | **143,056** | **76.7%** | **75.8%** | **−0.9%** | **0.99** | **3,015** |

* لا يزال المبنى B6 مسجلاً بـ437 ساعة عمل مكتسبة من 11,824، بينما تُظهر ورقة متابعة التقدم اكتمال الهيكل والجدران وأعمال التمديدات الأولى فيه، ويذكر التقرير الأسبوعي أعمال الألواح الشمسية فيه هذا الأسبوع. والرقم على الأرجح خطأ إدخال؛ انظر ملاحظات على البيانات.

### الكميات الرئيسية

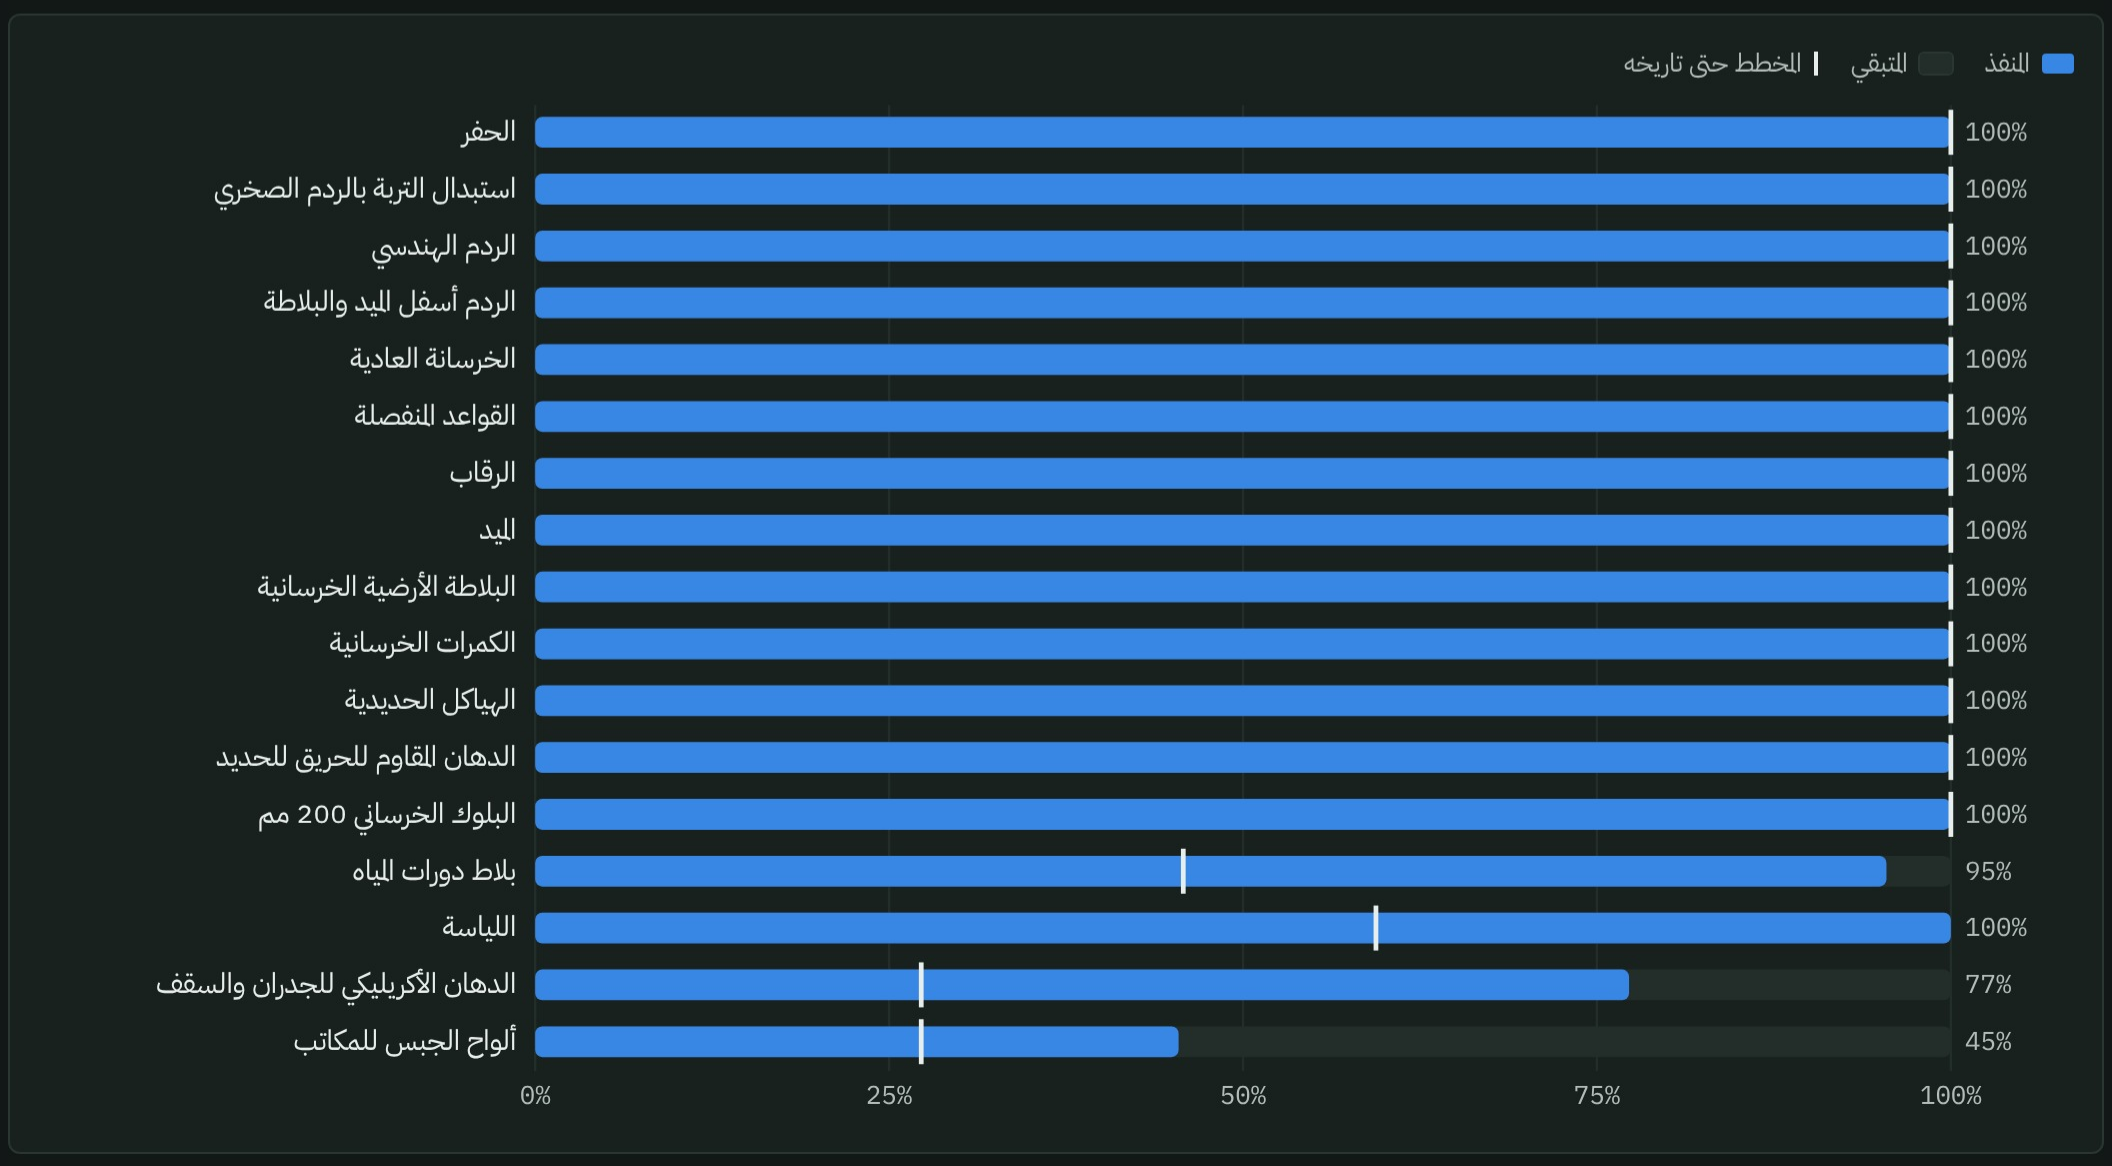


| بند النطاق | المنطقة | الوحدة | الإجمالي | المنفذ | المنفذ هذا الأسبوع | المتبقي | % المنفذ | المخطط حتى تاريخه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| بند النطاق | المنطقة | الوحدة | الإجمالي | المنفذ | المنفذ هذا الأسبوع | المتبقي | % المنفذ | المخطط حتى تاريخه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحفر | جميع المباني | م³ | 40,940 | 40,940 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| استبدال التربة بالردم الصخري | جميع المباني | م³ | 48,560 | 48,560 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| الردم الهندسي | جميع المباني | م³ | 12,727 | 12,727 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| الردم أسفل الميد والبلاطة | جميع المباني | م³ | 11,559 | 11,559 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| الخرسانة العادية | جميع المباني | م² | 8,010 | 8,010 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| القواعد المنفصلة | جميع المباني | م³ | 2,807 | 2,807 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| الرقاب | جميع المباني | م³ | 395 | 395 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| الميد | جميع المباني | م³ | 540 | 540 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| البلاطة الأرضية الخرسانية | جميع المباني | م³ | 7,260 | 7,260 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| الكمرات الخرسانية | جميع المباني | م³ | 255 | 255 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| الهياكل الحديدية | جميع المباني | عدد | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| الدهان المقاوم للحريق للحديد | جميع المباني | بند | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| البلوك الخرساني 200 مم | جميع المباني | م² | 9,630 | 9,630 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| بلاط دورات المياه | جميع المباني | م² | 782.7 | 820 | 55.8+ | 37.3 | 95.5% | 45.8% |
| اللياسة | جميع المباني | م² | 16,770 | 16,770 | 0 | 0 | 100.0% | 59.4% |
| الدهان الأكريليكي للجدران والسقف | جميع المباني | م² | 12,958 | 16,770 | 1,982+ | 3,812 | 77.3% | 27.3% |
| ألواح الجبس للمكاتب | جميع المباني | م² | 2,011 | 4,425 | 603.1+ | 2,414 | 45.4% | 27.3% |

**اكتمال الأعمال تحت الأرض والهيكل الحديدي والبلوك**

أُفيد باكتمال الحفر واستبدال التربة بالردم الصخري والردم الهندسي والقواعد والرقاب والميد والبلاطة الأرضية والهياكل الحديدية الأحد عشر مع الدهان المقاوم للحريق و9,630 م² من البلوك بنسبة 100%. واكتملت اللياسة أيضاً (16,770 م²). ولا تغيير في هذه البنود هذا الأسبوع.

**التشطيبات الجارية**

أُضيف هذا الأسبوع 1,982 م² من الدهان الأكريليكي (الآن 77.3%، والمتبقي 3,812 م²)، و603 م² من ألواح الجبس للمكاتب (45.4%، والمتبقي 2,414 م²)، و56 م² من بلاط دورات المياه (95.5%، والمتبقي 37 م²).

## المعالم الرئيسية

المعالم من التقرير الأسبوعي، مع توقع تحديث P6 والفائض الزمني. وحيث لا يتضمن التقرير الأسبوعي المعلم، تظهر الخطة الأساسية في P6 مع الإشارة (P6).

| المعلم | الخطة الأساسية | توقع التقرير الأسبوعي | توقع تحديث P6 | الفائض في P6 (أيام) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| تسليم الموقع | 07-Jan-2026 | 07-Jan-2026 | 07-Jan-2026 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| مسح الوضع القائم والتقارير النهائية | 14-Jan-2026 | 14-Jan-2026 | 12-Feb-2026 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| اكتمال التجهيز | 16-Feb-2026 | 16-Feb-2026 | 18-Jan-2026 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| التقديمات وطلبات المواد طويلة التوريد | 14-May-2026 | 22-Mar-2026 (−53 يوماً) | 05-Jul-2026 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| توريد جميع المعدات والمواد | 07-Nov-2026 | 27-Sep-2026 (−41 يوماً) | – | – | ✓ منجز |
| تسوية الموقع والطرق الداخلية ومواقف السيارات | 12-Feb-2026 (P6) | – | 03-Nov-2026 | 9 | ▼ متأخر |
| الأعمال المدنية | 21-Feb-2027 | 21-Feb-2027 | 28-Nov-2026 | 43 | ؟ اختلاف الخطط الأساسية |
| الاختبار والتشغيل | 06-Feb-2027 (P6) | – | 27-Dec-2026 | 56 | ● يوجد فائض زمني |
| الأعمال الميكانيكية | 27-Jan-2027 | 27-Jan-2027 | 27-Dec-2026 | 51 | ● يوجد فائض زمني |
| الأعمال الترابية | 01-Feb-2027 | 21-Jan-2027 (−11 يوماً) | – | – | ● في الموعد |
| الأعمال الكهربائية | 18-Feb-2027 | 13-Feb-2027 (−5 أيام) | 02-Feb-2027 | 19 | ● يوجد فائض زمني |

| المعلم | الخطة الأساسية | توقع التقرير الأسبوعي | توقع تحديث P6 | الفائض في P6 (أيام) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| اكتمال التنفيذ | 21-Feb-2027 (P6) | – | 23-Feb-2027 | 7 | ▼ معرّض للتأخير |
| اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم | 06-Mar-2027 | 03-Mar-2027 (−3 أيام) | 03-Mar-2027 | 0 | ● في الموعد، بلا فائض |

**يستخدم التقرير الأسبوعي وتحديث P6 خططاً أساسية مختلفة لمعالم التخصصات.**

للأعمال المدنية، الخطة الأساسية في التقرير الأسبوعي 21-فبراير-2027، بينما الخطة الأساسية في P6 هي 01-أكتوبر-2026 والتوقع في P6 أصبح 28-نوفمبر-2026، أي بعد خطته الأساسية بـ58 يوماً وبعد توقع الأسبوع الماضي بأسبوع. وتأخرت الأعمال الميكانيكية ستة أيام إلى 27-ديسمبر-2026. وبقيت الأعمال الكهربائية والمعمارية عند 02-فبراير-2027، بعد خطتها الأساسية 21-ديسمبر-2026 بـ43 يوماً. أما المعلم التعاقدي لتسوية الموقع والطرق الداخلية ومواقف السيارات (وخطته الأساسية في P6 هي 12-فبراير-2026) فلم يبدأ بعد، وتوقعه مرة أخرى هو تاريخ البيانات نفسه.

## توريد المواد الرئيسية

نسبة المواد الموّردة إلى الموقع حسب التخصص. المصدر: ملخص التقرير الأسبوعي، 03-نوفمبر-2026.




**جميع المواد الـ83 معتمدة ومطلوبة وموجودة في الموقع**


يسجّل التقرير الأسبوعي اعتماد 83 من 83 مادة، وإصدار 83 أمر شراء، وتوريد 83 مادة، واكتمال التوريدات في 13-أكتوبر-2026. بينما تذكر ورقة المعالم فيه تاريخ 27-سبتمبر-2026 للحدث نفسه.

**التركيب جارٍ الآن**

بدأ تركيب محطة الطاقة الشمسية هذا الأسبوع، وأُغلقت مشكلة المحابس المدفونة (سجل المخاطر والمشكلات، 03-نوفمبر-2026). ولا يزال متتبع التوريدات يُظهر حالة أمر الشراء «ISSUED» لـ20 بنداً فقط من أصل 83.

## القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (الموظفون والعمالة)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة.

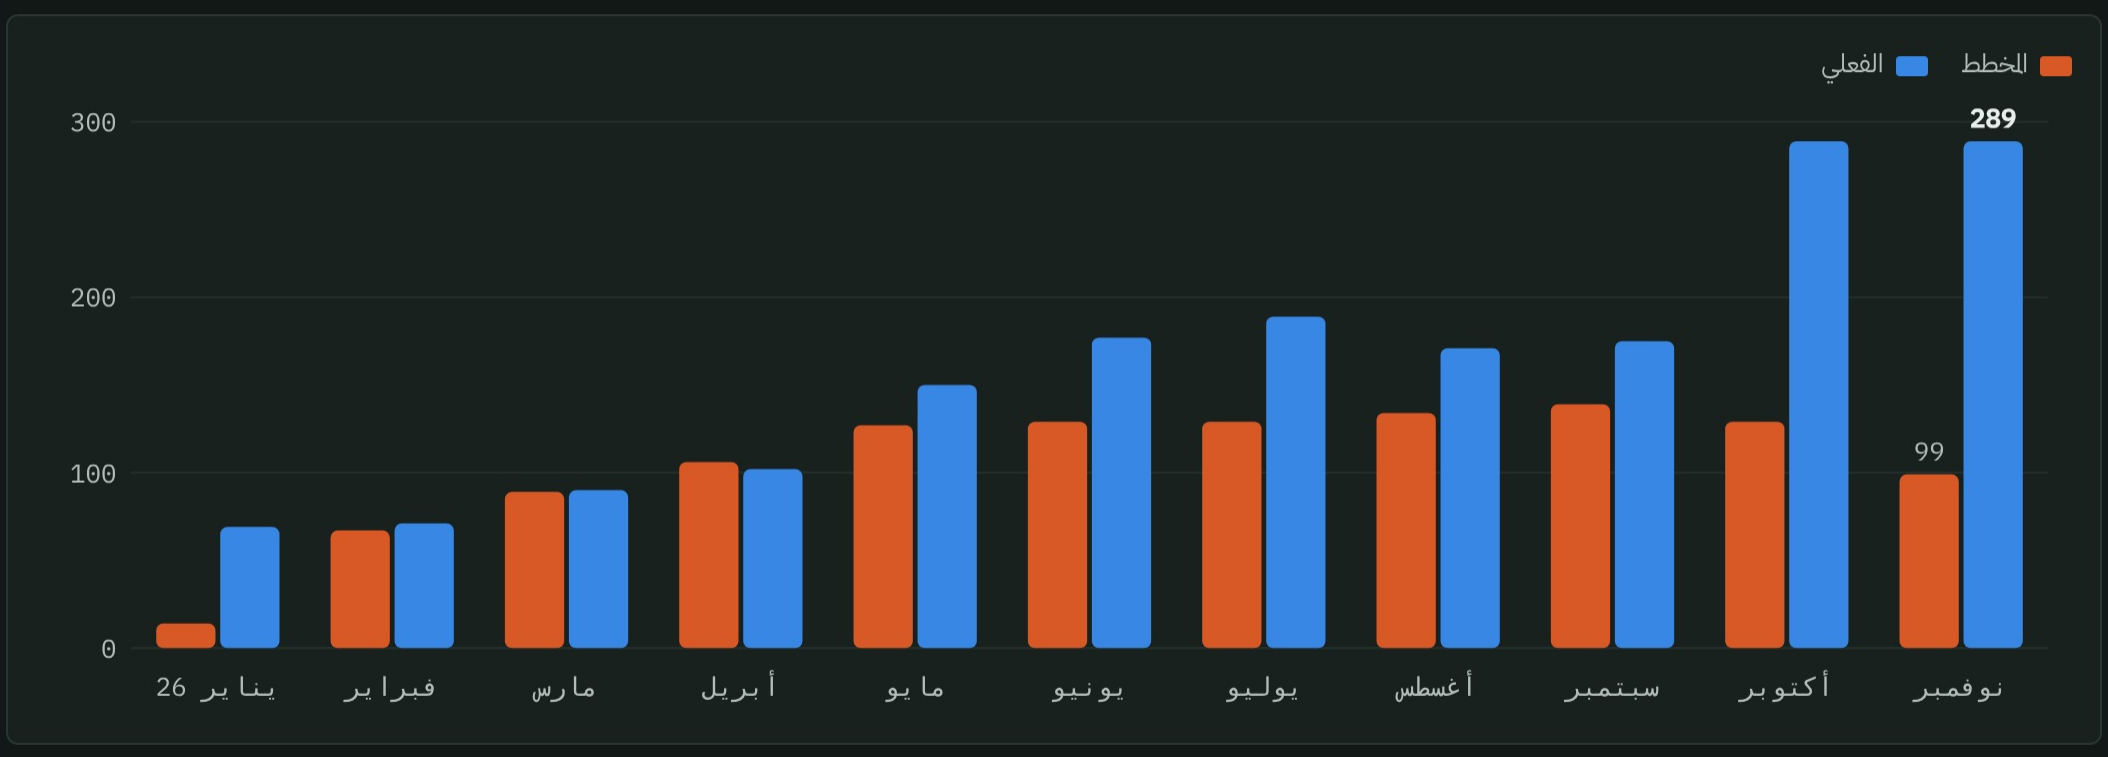


بلغ عدد العاملين في نوفمبر 289 مقابل 99 مخطط: 267 عاملاً مقابل 95، و22 موظفاً مقابل 4، وهي الأرقام الفعلية نفسها لشهر أكتوبر. والمعدات في الموقع 20 مقابل 4 مخطط.

## التكلفة والمستخلصات

### قيمة العقد

| | |
|---|---|
| قيمة العقد الأصلية | 95,996,525 |
| قيمة العقد المعدلة | 95,996,525 |
| التكلفة المتوقعة عند الإنجاز | 95,996,525 |
| التغييرات المحتملة | 0 |
| أوامر التغيير | 0 |

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ.

### المستخلصات

| | |
|---|---|
| المستخلصات المقدمة | 7 |
| القيمة الإجمالية | 50,050,337 |
| استرداد الدفعة المقدمة (10%) | 5,005,034 |
| القيمة الصافية | 45,045,303 |
| المستخلصات المدفوعة | 6 |
| المبلغ المدفوع | 37,076,227 |

بلغت المستخلصات 52.1% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 81.4%. وصُرف المستخلص 6 في 29-أكتوبر-2026. وقُدّم المستخلص 7 (أكتوبر، 8,854,529 إجمالي) في 01-نوفمبر-2026 واعتمده الاستشاري في اليوم نفسه، وهو بانتظار اعتماد مدير المشروع.

## الصحة والسلامة والجودة

### السلامة التقييم 0.87

| | |
|---|---|
| ساعات العمل الآمنة (تراكمي) | 304,980 |
| ساعات العمل هذا الأسبوع | 16,440 |
| إصابات مضيعة للوقت | 0 |
| الوفيات | 0 |
| حالات الإسعافات الأولية (تراكمي) | 1 |
| حوادث وشيكة (تراكمي) | 1 |
| أضرار الممتلكات | 0 |
| جلسات التعريف بالسلامة / التوعية (تراكمي) | 81 / 95 |

### الجودة التقييم 0.93

| | |
|---|---|
| طلبات الفحص: صادرة / مغلقة / معلقة | 999 / 969 / 30 |
| طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة | 95 / 87 / 8 |
| تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / معلقة | 24 / 23 / 1 |
| تعليمات الموقع | 0 |
| المخططات التنفيذية المعتمدة | 158 من 158 |
| اعتمادات المواد | 83 من 83 |

تراكمي حتى 03-نوفمبر-2026.

## المشكلات والمخاطر القائمة

| المشكلة | المسؤول | التفاصيل |
|---|---|---|
| خزائن خراطيم الحريق (خطر عالٍ) | المقاول | التركيب جارٍ؛ وأي تأخير سيؤخر اختبار وفحص أنظمة الحماية من الحريق. |
| المبنيان B4 وB5 | المقاول | إنجاز B4 بنسبة 77.5% مقابل 99.1% مخطط، وB5 بنسبة 78.8% مقابل 99.0%، أي متأخران بنسبة 21% و20% تقريباً. |
| حفريات الري (خطر متوسط) | المقاول | لم تبدأ بعد حفريات مواسير الري HDPE؛ ويلزم تأكيد تاريخي البدء والانتهاء. |
| تسوية الموقع والطرق الداخلية ومواقف السيارات | المقاول | لم يبدأ المعلم التعاقدي، ويستمر P6 في توقعه بتاريخ البيانات. |
| الفائض الزمني عند الانتهاء | المقاول | فائض صفري على انتهاء المشروع، وجميع الأنشطة الجارية وعددها 100 متأخرة عن الجدول. |
| المستخلص 7 | مدن | قُدّم في 01-نوفمبر-2026 واعتمده الاستشاري؛ بانتظار اعتماد مدير المشروع. |

مخاطر منخفضة أخرى قائمة في السجل: ألواح الجبس للأسقف، وألواح الألمنيوم المركبة، ومحطة الطاقة الشمسية التي بدأ تركيبها. وأُغلقت هذا الأسبوع: المنصة الخارجية (اكتملت في 03-نوفمبر-2026)، وحفريات تغذية المياه (اكتملت)، والمحابس المدفونة. ولم تعد في السجل أي مشكلة قائمة.

## ملاحظات على البيانات

- ملف التقرير الأسبوعي (WPR #37، بصيغة xlsb.) ليس له نسخة نصية في MD Files، لذا قُرئت أرقامه من الملف الأصلي في All Files. وقيم هذا الأسبوع هي التغير عن WPR #36 (27-أكتوبر-2026، في مجلد W05).
- لا تطابق الأعمدة الأسبوعية في الملف التغير في الأرقام التراكمية: تذكر صفحة التقرير 3,317 ساعة عمل مخططة و3,606 مكتسبة هذا الأسبوع، بينما ارتفعت الإجماليات التراكمية بمقدار 3,061 و3,015. ويُستخدم هنا التغير التراكمي.
- مجموع صفوف المباني 99,461 ساعة عمل مكتسبة مقابل إجمالي تنفيذ 108,367؛ والفرق 8,906 يتسق مع نقص تسجيل المبنى B6 (437 من 11,824 ساعة عمل، مقابل 95.5% مخطط)، دون تغيير منذ الأسبوع الماضي.

- لا يزال الاختبار والتشغيل مسجلاً بنسبة 40.6% مكتسب مقابل 13.6% مخطط، بينما تُظهر ورقة Testing اكتمال الاختبارات الميكانيكية بنسبة 8% وعدم بدء اختبارات الكهرباء والحريق.
- قيم المخطط والمكتسب الرئيسية في صفحة التقرير وسجل المخاطر والمشكلات مبنية على التكلفة؛ ويصف السجل هذه النسبة بأنها التقدم الفعلي. ويعتمد هذا التقرير أرقام الإنجاز الفعلي (ساعات العمل) فقط.
- تذكر ورقة المعلومات العامة في التقرير الأسبوعي تاريخ انتهاء متوقعاً 06-مارس-2027 (دون انحراف)، بينما تذكر ورقة المعالم فيه وتحديث P6 تاريخ 03-مارس-2027. كما تختلف الخطط الأساسية للمعالم فيه عن الخطة الأساسية في P6 (مثلاً الأعمال المدنية 21-فبراير-2027 مقابل 01-أكتوبر-2026).
- تكرر الأرقام الفعلية للقوى العاملة والمعدات في نوفمبر (22 موظفاً و267 عاملاً و20 معدة) أرقام أكتوبر. وتذكر ورقة السلامة 16,440 ساعة عمل هذا الأسبوع، وهو رقم الأسبوع الماضي نفسه، مقابل 13,700 فقط للشهر حتى تاريخه.
- الأنشطة التي فاتها موعد البدء: يذكر هذا التقرير 272 للأسبوع الماضي، بينما ذكر تقرير الأسبوع الماضي 270.
- لا يزال رمز المشروع في ملف P6 هو DAM3-02-3 بتاريخ بدء مخطط 14-مارس-2023، وتحمل أوراق التوريدات رقم المشروع DAM-05-009. ولا يزال ملخص المستخلصات يُظهر 0 مستخلصات مقدمة رغم إدراج سبعة.
- يذكر سجل المخاطر والمشكلات م. حمدي مديراً للمشروع في مدن، بينما يذكر التقرير الأسبوعي م. عفات العنزي. وتُظهر لوحة السجل 244 خطراً قائماً و128 مشكلة قائمة، مقابل 5 مخاطر قائمة ولا مشكلات قائمة في السجلات.
- لم يُرفع ملف PDF لجدول P6 هذا الأسبوع؛ وتواريخ P6 مأخوذة من ملف XER. ولا تحمل الصور ختم تاريخ أو موقع.

---

أُعدّ في 04-نوفمبر-2026 من التقرير الأسبوعي WPR #37 (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) وتحديث P6 وسجل المخاطر والمشكلات المرفوعة للأسبوع المنتهي في 05-نوفمبر-2026، مقارنة بـWPR #36 (27-أكتوبر-2026).
