استكمال شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بمكة

Completion of Infrastructure Works, Second Industrial City in Makkah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عبدالله الجليفي	15-Feb-2026	14-Aug-2027

النطاق: أعمال الطرق، والعبارات الصندوقية، وقنوات الصرف المكشوفة والسدود، وإنارة الشوارع وتمديدات الجهد المنخفض، والمجاري الخرسانية عند تقاطعات الطرق. قيمة العقد 52,025,516 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 18 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بلغ الإنجاز 82.1% مقابل 52.3% مخططاً، فالمشروع متقدم على الخطة بنسبة 29.8%. وحقق هذا الأسبوع 0.79% مقابل 1.20% مخططاً، أي دون الخطة الأسبوعية.

نسبة الإنجاز الفعلي
82.1% / 52.3% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.57 +29.8%

التقدم هذا الأسبوع
+0.79% / +1.20% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.41%

المدة المنقضية من العقد
47.9% · اليوم 261 من 545
▼ الانتهاء المتوقع 11-سبتمبر-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
73.6% · 38.3 مليون ريال
8 مستخلصات، والمستخلص 8 لم تعتمده مدن بعد؛ آخر فترة تنتهي في 26-أكتوبر-2026

المشروع متقدم كثيراً على الخطة، لكن الانتهاء المتوقع تأخر إلى 28 يوماً بعد تاريخ العقد.

يتوقع التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (UP 35، تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) كلاهما الانتهاء في 11-سبتمبر-2027، أي بعد 28 يوماً من تاريخ انتهاء العقد 14-أغسطس-2027، وبعد ستة أيام من توقع الأسبوع السابق. وانخفض الفائض الزمني الكلي من −19 إلى −24 يوماً. ويمر الفائض السالب الآن بتوريد دهانات الطرق، وأعمال الأسفلت والتشطيبات في وصلة الطريق الدائري الخامس، ثم الاختبار والتشغيل والإغلاق. ولا تزال الأعمال الإضافية في الطريق التجميعي 9 والطريق 52 مفتوحة.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من عرض Tracking Sheet (الملف 11) في التقرير الأسبوعي بتاريخ 03-نوفمبر-2026، مختومة بتاريخي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 حيث يظهر الختم. لا تحمل الصور ختم GPS. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال القطع، الطريق التجميعي 9

حفار يحمّل شاحنة قلابة. مختومة 31-أكتوبر-2026، 11:41.



طبقة الأساس، الطريق المحلي 62

فرادة تعمل على طبقة أساس الطريق. مختومة 31-أكتوبر-2026، 10:25.




تركيب البردورات، الطريق الشرياني 4

خط بردورات بمحاذاة الأسفلت مع خلاطة خرسانة. مختومة 31-أكتوبر-2026، 10:53.



بلاط الإنترلوك، الدوار 5

عمال يركّبون الإنترلوك على الرصيف. مختومة 31-أكتوبر-2026، 11:45.

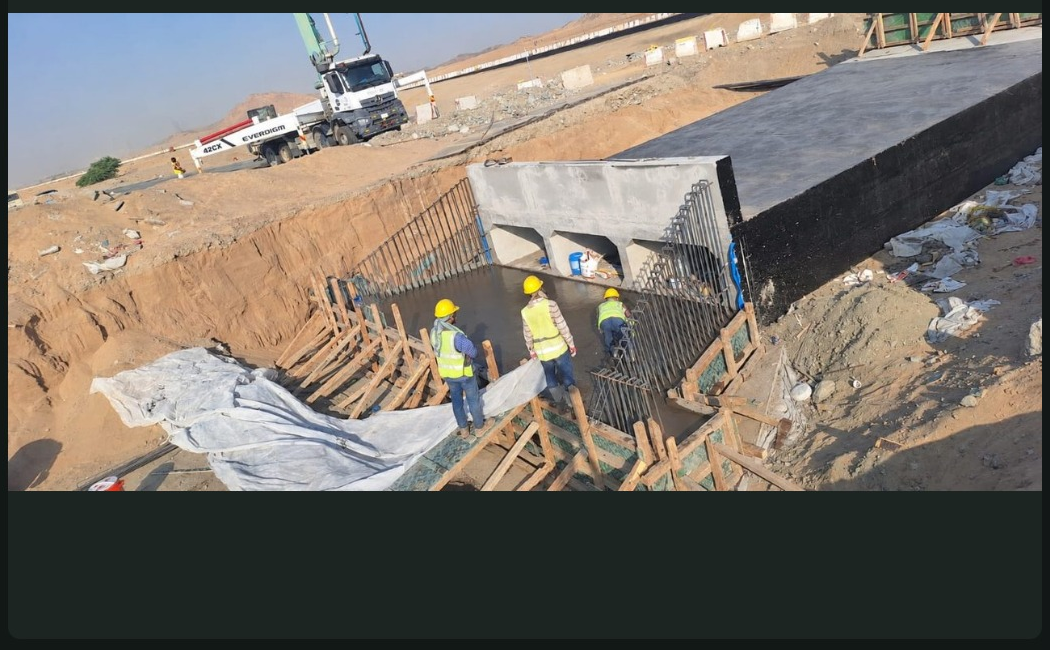

الأرضية الأمامية للعبارة الصندوقية 5

صب الخرسانة للأرضية الأمامية للعبارة. بدون ختم زمني.




الحماية بالأحجار، القناة المكشوفة 3A

تكسية حجرية مثبتة بالمونة على ميول القناة. مختومة 01-نوفمبر-2026، 12:00.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

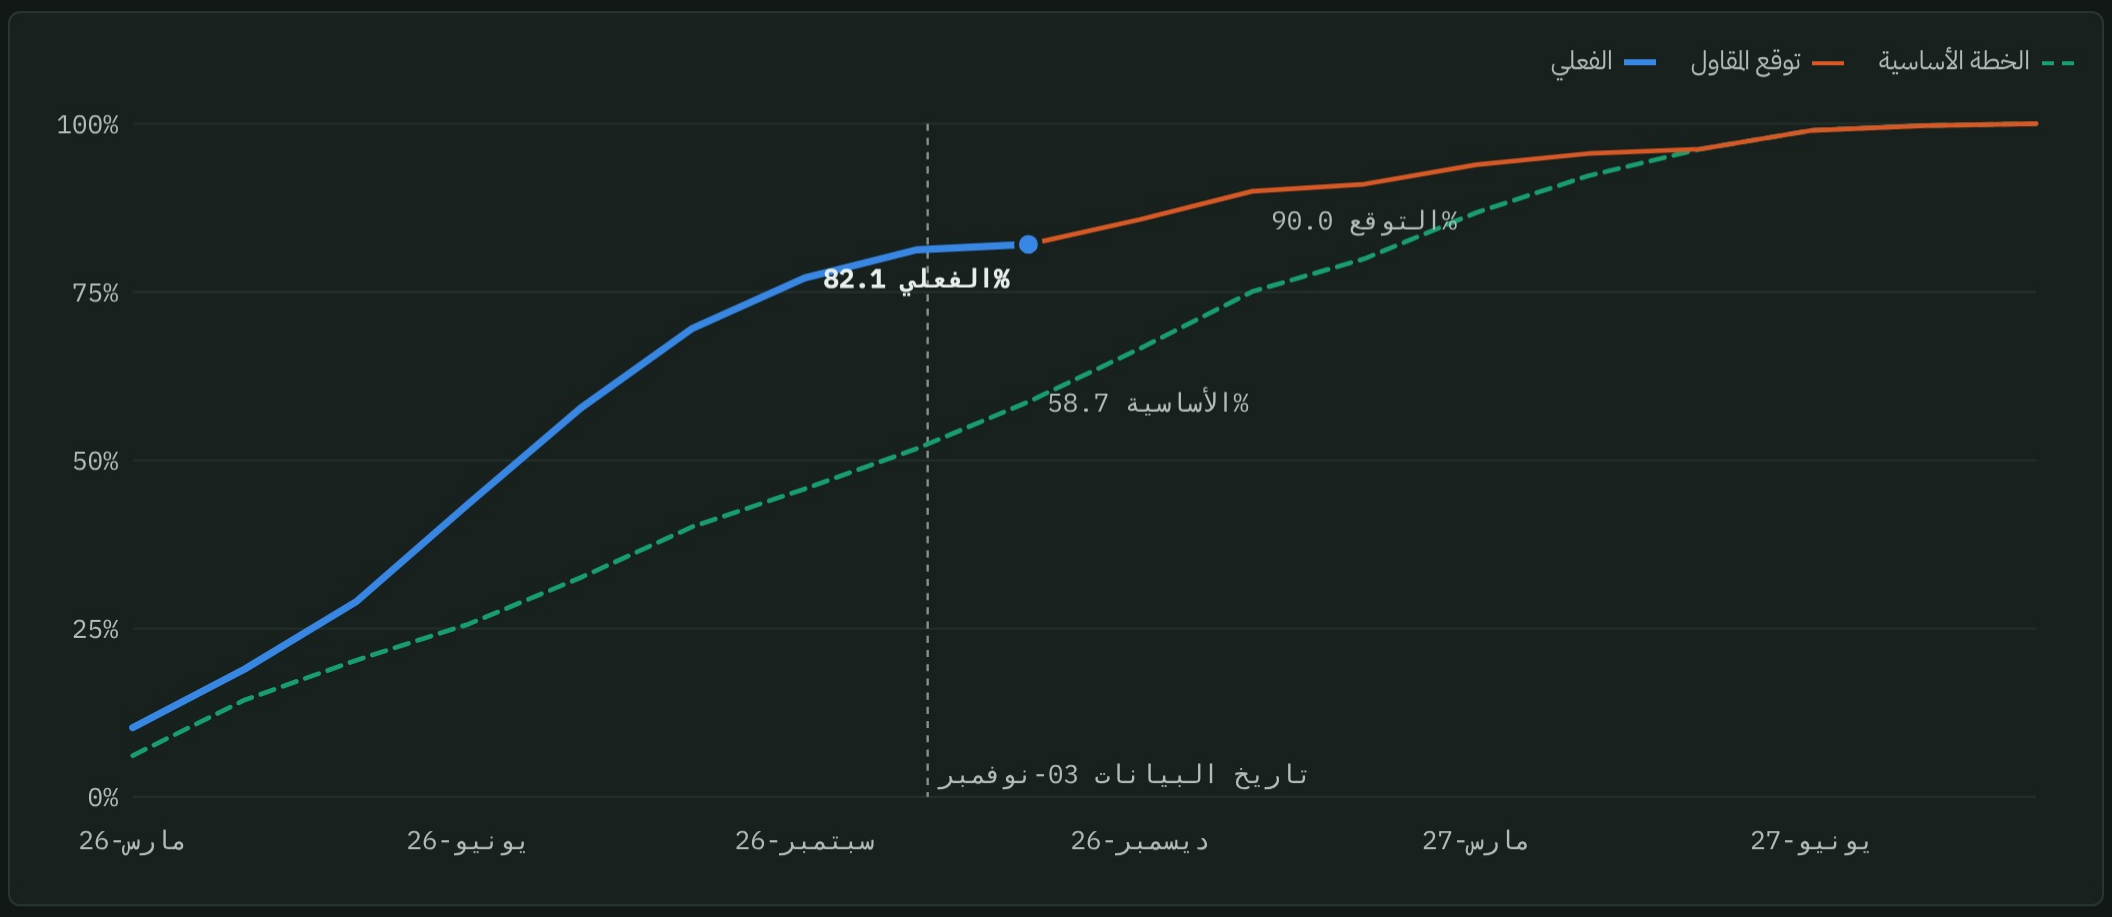

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026	48.66	79.31	+30.65	—	1.63
20-Oct-2026	49.99	80.05	+30.06	+0.74	1.60
27-Oct-2026	51.12	81.28	+30.16	+1.23	1.59
03-Nov-2026	**52.32**	**82.08**	**+29.75**	**+0.79**	**1.57**

نسبة الإنجاز الفعلي محسوبة من مجاميع ساعات العمل في التقارير الأسبوعية بتواريخ 20 أكتوبر و27 أكتوبر و3 نوفمبر 2026، ويعطي تقرير 20 أكتوبر أيضاً القيم التراكمية حتى 13 أكتوبر. الخطة المعدلة في المصدر مطابقة للخطة الأساسية، لذا يعرض الخط البرتقالي توقع المقاول: الفعلي حتى أكتوبر، ثم التوقع ابتداءً من نوفمبر.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	12.0%	100.0%	92.8%	−7.2%	0.93	▼ متأخر
أعمال الطرق	24.0%	52.1%	65.4%	+13.3%	1.26	▲ متقدم
الأعمال الكهربائية	8.3%	31.8%	71.8%	+39.9%	2.25	▲ متقدم
أعمال الإزالة	1.3%	100.0%	67.6%	−32.4%	0.68	▼ متأخر
العبّارات الصندوقية	3.5%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
قنوات الصرف المكشوفة	37.6%	33.0%	96.6%	+63.6%	2.93	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	3.0%	0.0%	21.1%	+21.1%	–	▲ بدأ مبكراً
الإغلاق وتسريح الموارد	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**52.3%**	**82.1%**	**+29.8%**	**1.57**	▲ متقدم

يضم تحديث P6 رقم 35 UP (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) 399 نشاطاً: 318 مكتملاً و27 قيد التنفيذ و54 لم تبدأ. وتاريخ الانتهاء المجدول 11-سبتمبر-2027، أي بعد 28 يوماً من تاريخ العقد. وعدد أنشطة المسار الحرج 34 (42 في الأسبوع السابق). وبلغ اختبار الشبكات الكهربائية، الذي بدأ في 20-أكتوبر-2026، نسبة 75% في ورقة Testing.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الكلية والمنفذة والمتبقية لكل شبكة وبند رئيسي. إجماليات الشبكات من ورقة Progress Summary، وكميات البنود من ورقة Major Quantities في تقرير 03-نوفمبر-2026. «المنفذ هذا الأسبوع» هو الكمية المنفذة هذا الأسبوع مطروحاً منها كمية تقرير 27-أكتوبر-2026.

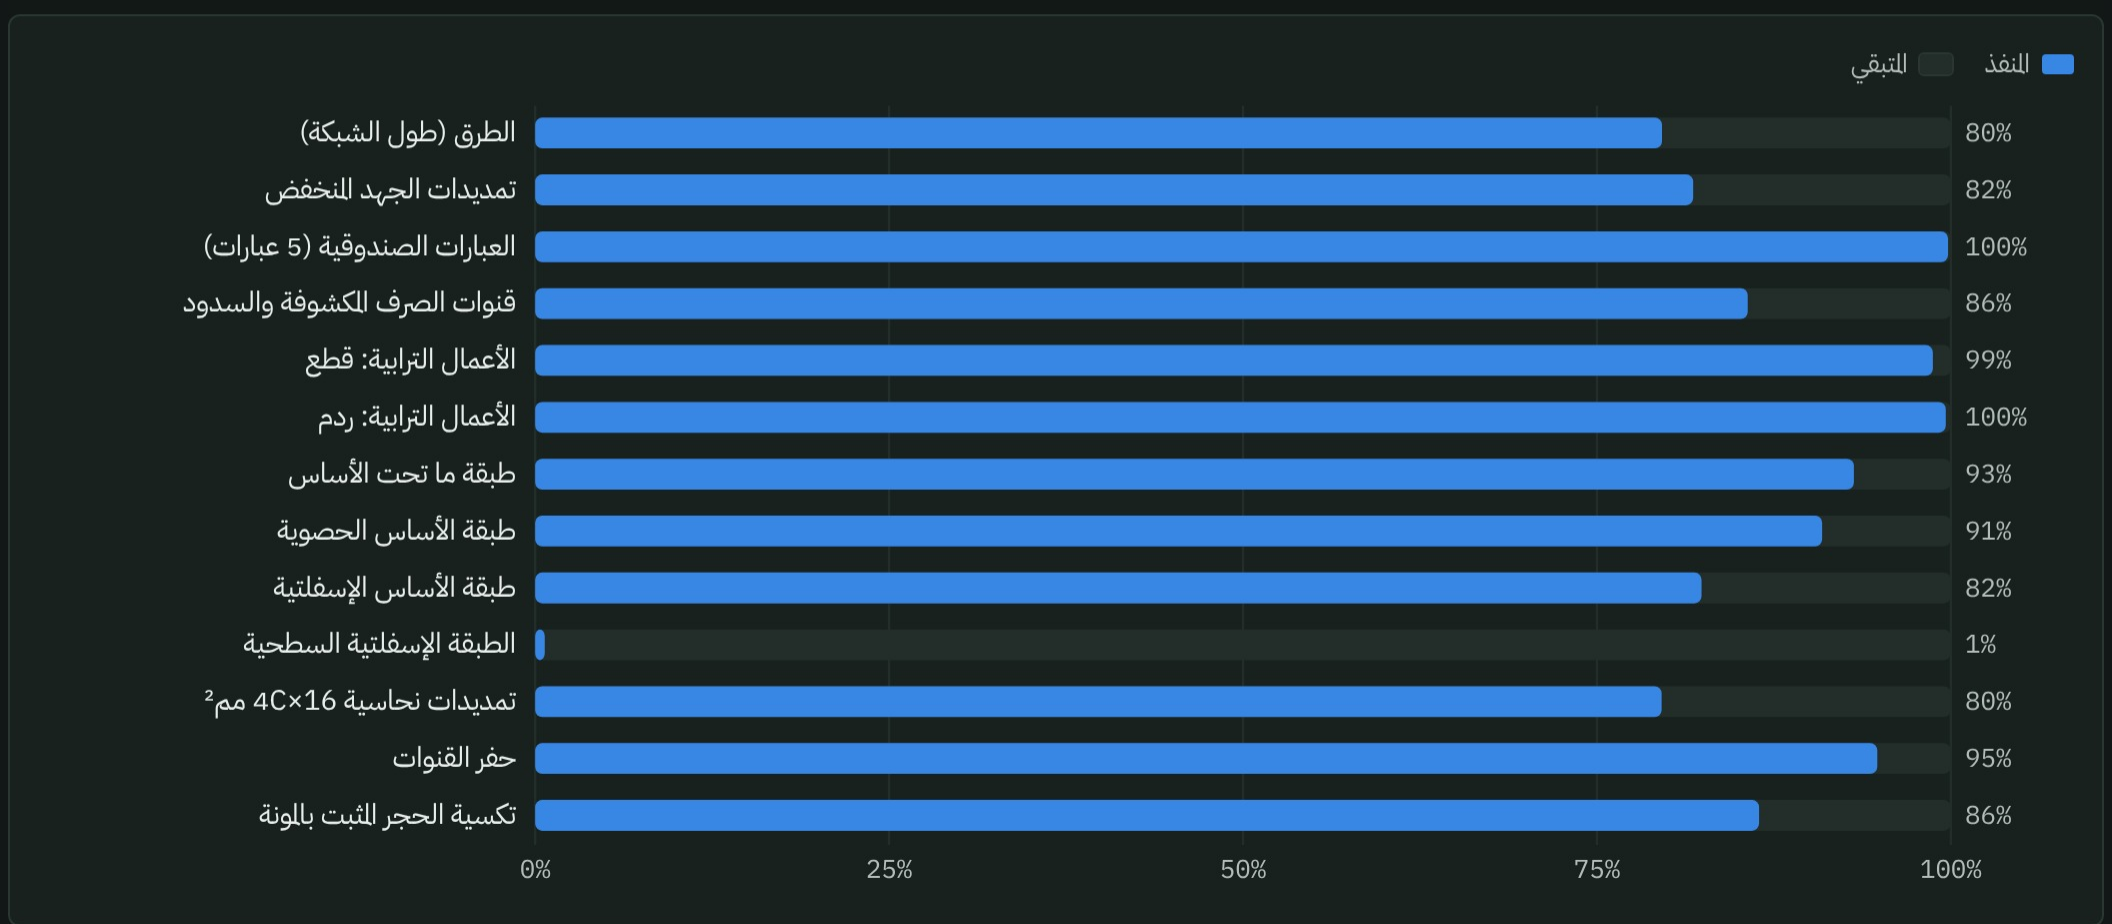

بند النطاق	المصدر	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
الطرق (طول الشبكة)	ملخص التقدم	م.ط	3,754	2,988	0	766	79.6%
تمديدات الجهد المنخفض	ملخص التقدم	م.ط	8,464	6,923	0	1,541	81.8%
العبارات الصندوقية (5 عبارات)	ملخص التقدم	%	100	99.8	0	0.2	99.8%
قنوات الصرف المكشوفة والسدود	ملخص التقدم	م.ط	3,921	3,358	0	562.6	85.6%
الأعمال الترابية: قطع	B1.31 22 00.01	م³	537,044	530,209	8,999+	6,835	98.7%
الأعمال الترابية: ردم	B1.31 22 00.02	م³	438,397	436,820	443.7+	1,577	99.6%
طبقة ما تحت الأساس	B1.31 22 00.03	م³	37,334	34,776	820.5+	2,558	93.1%
طبقة الأساس الحصوية	B1.32 11 23.01	م³	24,889	22,626	1,008+	2,264	90.9%
طبقة الأساس الإسفلتية	B1.32 11 26.01	م³	11,676	9,619	0	2,056	82.4%
الطبقة الإسفلتية السطحية	B1.32 12 16.01	م³	5,253	35.6	0	5,218	0.7%
تمديدات نحاسية 4C×16 مم²	B2.26 05 19.01	م	8,007	6,371	0	1,636	79.6%
حفر القنوات	B6.31 22 00.04	م³	115,262	109,271	0	5,991	94.8%
تكسية الحجر المثبت بالمونة	B6.31 25 00.02	م²	49,594	42,875	0	6,719	86.5%

العبارات الصندوقية والقنوات المكشوفة

اكتملت العبارات الصندوقية الخمس بنسبة 99.8%، وصُبّت الأرضية الأمامية للعبارة 5 هذا الأسبوع. وبقيت قنوات الصرف المكشوفة والسدود عند 85.7% من طولها، وتكسية الحجر عند 86.5%، ولم يتغير أي منهما في ورقة Major Quantities، مع أن ملخص طلبات الفحص يذكر 999.9 م² من تثبيت تكسية الحجر بالمونة في جدار السد 1.

لم تبدأ أو بالكاد بدأت

لا تزال الطبقة الإسفلتية السطحية عند 0.7% (35.6 من 5,253 م³)، ولم تتقدم طبقة الأساس الإسفلتية ولا تمديدات الجهد المنخفض النحاسية ولا حفر القنوات هذا الأسبوع. وتذكر ملفات الملخص 611 م² من بلاط الإنترلوك في الطريق الشرياني 4، لكن التقرير لا يتضمن إجمالياً محدثاً للإنترلوك.

المعالم الرئيسية

التواريخ الأساسية والمتوقعة من ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي، مع التوقع والفائض الزمني من تحديث P6 رقم UP 35.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	15-Feb-2026	15-Feb-2026	15-Feb-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد البرنامج الزمني الأساسي	14-Mar-2026	01-Mar-2026	01-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	14-Mar-2026	06-Jun-2026 (+84 يوماً)	06-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
التأهيل المسبق واعتماد المواد	14-Mar-2026	06-Jun-2026 (+84 يوماً)	06-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
توريد المواد طويلة الأجل	16-Aug-2026	29-Aug-2026 (+13 يوماً)	29-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
إنجاز أعمال الطرق	14-Dec-2026	14-Jan-2027 (+31 d)	14-Jan-2027	42	▼ بعد الموعد الأساسي
إنجاز قنوات الصرف المكشوفة	14-Jun-2027	16-Jun-2027 (+2 d)	16-Jun-2027	14	▼ بعد الموعد الأساسي
إنجاز جميع الأعمال	14-Aug-2027	11-Sep-2027 (+28 d)	11-Sep-2027	−24	▼ متأخر
التسليم النهائي	14-Aug-2027	11-Sep-2027 (+28 d)	11-Sep-2027	−24	▼ متأخر

يتفق التقرير الأسبوعي وتحديث P6 على جميع التواريخ المتوقعة: تحسنت المعالم المرحلية، لكن موعد الإنجاز تأخر مجدداً.

انتقل إنجاز جميع الأعمال والتسليم النهائي من 05-سبتمبر إلى 11-سبتمبر-2027، أي بعد 28 يوماً تقويمياً من تاريخ العقد (فائض P6 −24 يوماً). وتقدّم موعد أعمال الطرق من 18-يناير إلى 14-يناير-2027 (فائض 42 يوماً)، وقنوات الصرف المكشوفة من 06-يوليو إلى 16-يونيو-2027، أي بعد يومين من الموعد الأساسي (فائض 14 يوماً).

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المطلوبة التي تم توريدها لكل مادة. المصدر: سجل التوريدات (Procurement Log)، التقرير الأسبوعي 03-نوفمبر-2026.



دهانات الطرق: لا يوجد أمر شراء


المطلوب 5,712 م² والمورّد 0%. ويبدأ تحديث P6 رقم UP 35 تصنيع المادة في 04-نوفمبر-2026 والتوريد الأول في 02-ديسمبر-2026، أي بعد 199 يوماً من الموعد الأساسي، وفائض بند التوريدات −24 يوماً.

توريد الأسفلت والبردورات مستمر

تم توريد 57% من طبقتي الأساس والسطح الإسفلتيتين (9,655 من 16,929 م³) و83% من البردورات مسبقة الصب (18,155 من 21,915 م). ويُظهر التقرير وجود 17 من 18 مادة مخططة في الموقع، وأصبحت آخر مواد أعمال الطرق مستحقة بحلول 14-نوفمبر-2026 بدلاً من 10-نوفمبر-2026.

القوى العاملة

متوسط عدد العاملين الشهري في الموقع، العمالة والموظفون معاً، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

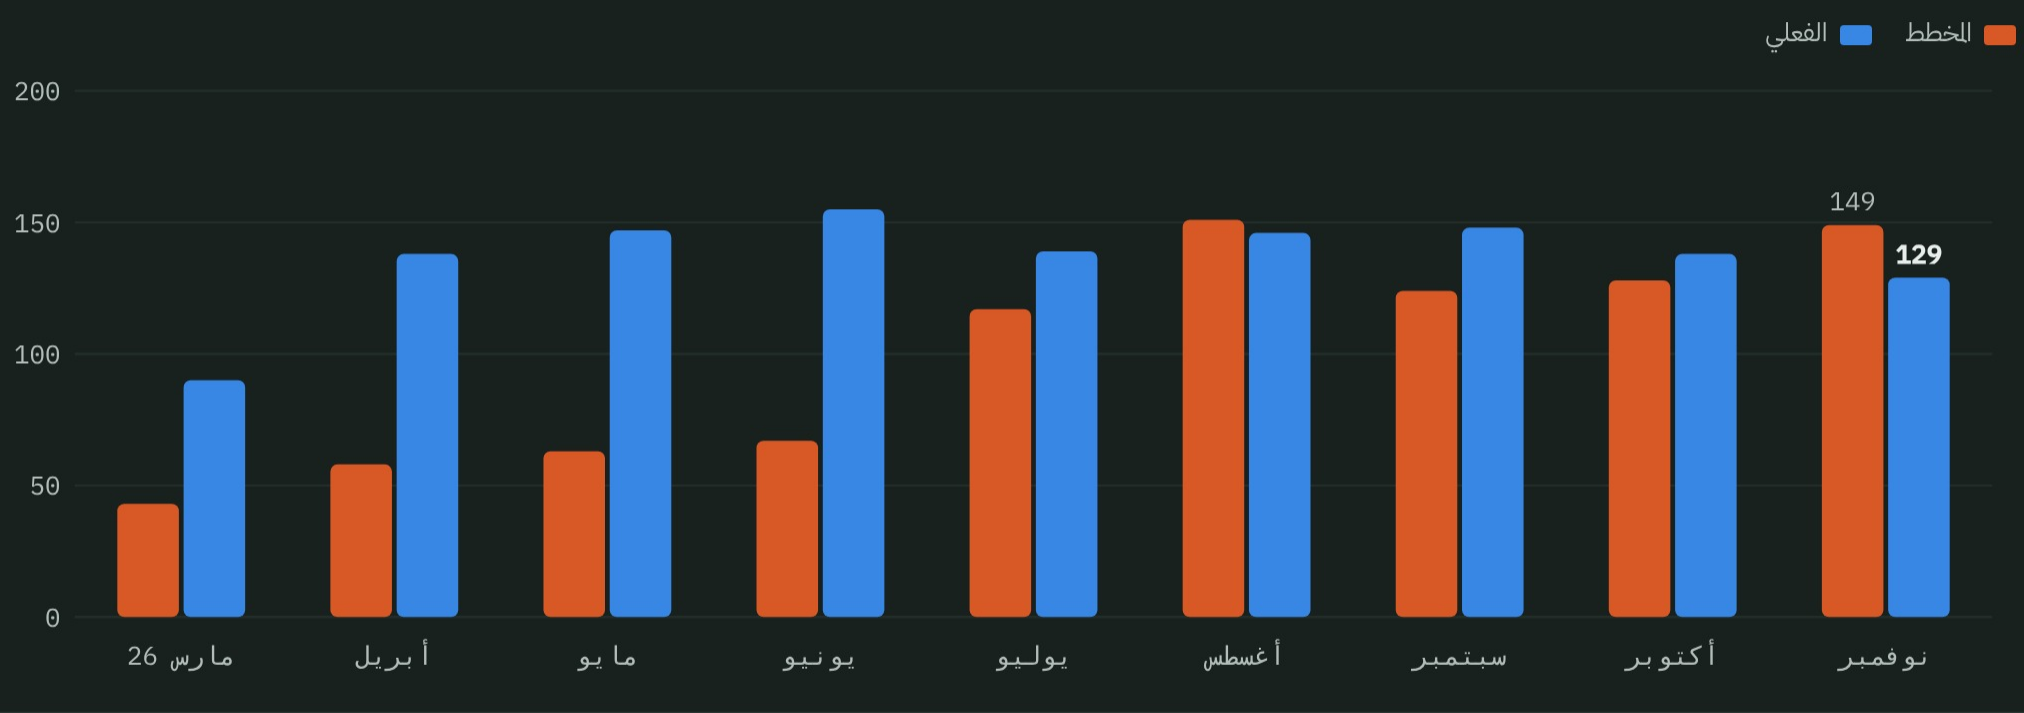

متوسط عدد العاملين في نوفمبر حتى الآن 129 مقابل 149 مخططاً: 107 عمال (137 مخططاً) و22 موظفاً (12 مخططاً)، أي أن العمالة أقل من الخطة بـ 30 عاملاً. وكان متوسط أكتوبر 138 مقابل 128. ومتوسط المعدات في الموقع 63 مقابل 50 مخططاً. وتبلغ خطة العمالة ذروتها 161 في يناير 2027.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)	52,025,516
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	59,829,343
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	52,025,516
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	41,515,115

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	8
القيمة الإجمالية	38,305,734
الخصومات والغرامات	2,000
الصافي شاملاً الضريبة	44,053,595
المدفوع (7 مستخلصات)	34,269,317
المستخلص 8 بانتظار اعتماد مدن	9,784,277

بلغت المستخلصات 73.6% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 82.1%. واعتمد الاستشاري المستخلص 8 (من 28-سبتمبر إلى 26-أكتوبر-2026، بقيمة إجمالية 8,508,067) في 27-أكتوبر-2026، وهو بانتظار اعتماد مدن والصرف. ولا توجد محتجزات أو دفعة مقدمة مسجلة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 87.5%

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	205,780
ساعات العمل هذا الأسبوع	4,560
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة (تراكمي)	1
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	12 / 53

تفتيش الاستشاري للصحة والسلامة، 03-نوفمبر-2026. متوسط التقييم حتى تاريخه 85.3%.

الجودة التقييم 90.3%

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	972 / 949
طلبات الفحص المعلقة	23
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	2 / 2
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	25 / 25
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	31 / 31
المخططات التنفيذية المعتمدة / المقدمة	35 / 38
اعتمادات المواد المعتمدة / المقدمة	63 / 65

تراكمي حتى 03-نوفمبر-2026. تقييم تفتيش الجودة من الاستشاري 90.31% هذا الأسبوع، والمتوسط حتى تاريخه 85.0%. وزادت طلبات الفحص 19 طلباً هذا الأسبوع، وهناك 3 مخططات تنفيذية جديدة معلقة (2 لأعمال الطرق و1 للأعمال الكهربائية).

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
أعمال إضافية، الطريق التجميعي 9	المقاول / مدن	تغيير في النطاق بإضافة أعمال في الطريق التجميعي 9. مفتوح في سجل المخاطر، والتاريخ المستهدف 14-نوفمبر-2026.
الطريق الجديد 52	المقاول / مدن	تغيير في النطاق لإنشاء الطريق 52، بتصنيف مرتفع جداً (25 بعد المعالجة). مفتوح، والتاريخ المستهدف 28-ديسمبر-2026.
طريق الجلود الجديد	المقاول / مدن	مدرج ضمن تحديات المشروع في ملخص التقدم. يظهر مفتوحاً في سجل المخاطر ومغلقاً في ملف المخاطر، والتاريخ المستهدف 01-ديسمبر-2026.
دهانات الطرق	المقاول	لا يوجد أمر شراء. وتُظهر قائمة الأنشطة المتأخرة في البدء أن تصنيع المادة يبدأ في 04-نوفمبر-2026 والتوريد الأول في 02-ديسمبر-2026، أي بعد 199 يوماً من الموعد الأساسي.
كشط الأسفلت القائم	المقاول	تأخر في البدء: كان البدء مخططاً في 23-يونيو-2026، وأصبح 04-نوفمبر-2026 (متأخراً 134 يوماً).
الوصلة إلى الطريق الدائري الخامس	المقاول	بدأت أعمال الأسفلت في 08-أكتوبر-2026 ونسبة إنجازها الفعلي 35.0% بساعات العمل (3,792 من 10,830) دون تقدم هذا الأسبوع، ولها مع أعمال التشطيب فائض −24 يوماً.

سجل المشكلات وجدول أهم خمس مشكلات في التقرير الأسبوعي فارغان هذا الأسبوع، وملف المخاطر (الملف 17) لم يتغير. وبقية بنود السجل (تصميم القناة المكشوفة 3A، والعبارة 3، وتصاريح موسم الحج) مغلقة.

ملاحظات على البيانات

- يعرض ملفا الملخص (15 و16) نسبة تقدم محسوبة على أساس التكلفة بوصفها «الفعلي»، ويعطيان نسبة مخططة على الأساس نفسه. يستخدم هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي المقاسة بساعات العمل فقط.
- يعطي الملفان 15 و16 تغير التقدم لهذا الأسبوع بإشارتين متعاكستين (سالبة في الملف 15 وموجبة في الملف 16).
- يذكر الملف 15 مدير المشروع باسم عبد الله الجليفي والملف 16 باسم عبد الله الشنيفي. كما يعطي الملف 16 بداية المشروع 24-نوفمبر-2025 ونهاية العقد 23-مايو-2026، بينما تذكر بقية الملفات تسليم الموقع 15-فبراير-2026 والانتهاء 14-أغسطس-2027.
- تتطابق كميات هذا الأسبوع في ملفي الملخص (15 و16) مع التغير في ورقة Major Quantities للقطع (8,999 م³) وطبقة ما تحت الأساس (820 م³) وطبقة الأساس الحصوية (1,008 م³)، لكنها تعطي الردم 950 م³ مقابل +443.7 م³. ويعتمد التقرير التغير في ورقة Major Quantities. ولا يظهر في الجدول الأسبوعي منجز لأسبوع 13-أكتوبر-2026 لعدم استخدام التقارير الأقدم.
- يكرر عرض Tracking Sheet (الملف 11) أرقام التقدم على أساس التكلفة للأسبوع السابق، ولا يعطي نسبة الإنجاز الفعلي.
- الخطة المعدلة في ورقة Physical-Chart Data مطابقة للخطة الأساسية.
- تحتوي ورقة Major Quantities على مجموعة قديمة من البنود بقيم صفرية (طبقة ما تحت الأساس 21,604 م³، طبقة الأساس 14,403 م³، البردورات 23,250 «م³»، تمديدات 15 ك.ف 5,632 «م²»، المحطة الفرعية، وحدة RMU، أعمدة إنارة 7 م وغيرها) بجانب البنود الحالية ذات التقدم. استُخدمت البنود الحالية فقط.
- تمديدات الجهد المنخفض: تعطي ورقة Major Quantities 6,371 من 8,007 م منفذة، بينما يعطي ملخص التقدم 6,923 من 8,463.65 م.
- عدد وحدات الإنارة 264 في ورقة Procurement و247 في ملخص التقدم، ووحدات التأريض 17 و15. ونسبة إنجاز التوريدات 92.8% بساعات العمل رغم الإفادة بوجود 17 من 18 مادة في الموقع.
- يُظهر ملخص المستخلصات 0 مستخلصات مقدمة رغم تسجيل 8، وقيمة مقدمة (44,051,595) أقل بـ 2,000 ريال من القيمة المعتمدة من الاستشاري (44,053,595). كما تحتوي خانتا قيمة العقد المعدلة والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز على 21,100,000 و20,900,000 بجانب 52,025,516.
- تؤرخ ورقة General Information اعتماد البرنامج الأساسي في 01-مارس-2025، أي قبل ترسية العقد، بينما تعطي ورقة المعالم وP6 التاريخ 01-مارس-2026. ويسرد ملخص طلبات الفحص للفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الطلب FIR-0960 المؤرخ 27-أكتوبر-2026، أي قبل الفترة.
- عدد العمالة في نوفمبر 107 مقابل 137 مخططاً في ورقة Manpower، بينما يستخدم توزيع المهن في ورقة Weekly Progress Report خطة قدرها 105 (والفعلي 107).
- تُظهر لوحة المخاطر (الملف 17) 240 خطراً مفتوحاً و133 مشكلة مفتوحة لكن الصفر في كل فئة، ويسرد السجل 8 مخاطر منها 3 مفتوحة. والعبارة 4 وطريق الجلود مفتوحان في سجل مخاطر التقرير الأسبوعي ومغلقان في الملف 17.
- جدول معالم P6 داخل ورقة Milestones (مثل التجهيز 02-أبريل-2026) غير محدث؛ أُخذت توقعات المعالم والفائض من ملف P6 رقم 35 UP.

- يقيس التقرير الأسبوعي التأخير بـ 28 يوماً تقويمياً، بينما يعطي P6 فائضاً −24 يوماً. وفي P6 لمعلم قنوات الصرف المكشوفة فائض 14 يوماً، بينما فائض بند قنوات الصرف المكشوفة −2. وتُظهر ورقة Testing أن اختبار الشبكات الكهربائية بلغ 75% منذ 20-أكتوبر-2026، بينما كان البدء المخطط في 08-مايو-2027، ولبند الاختبار والتشغيل 3,105 ساعات عمل مكتسبة دون أي ساعات مخططة.

أُعد في 04-نوفمبر-2026 من التقرير الأسبوعي بتاريخ 03-نوفمبر-2026 (التقرير رقم 38) وتحديث P6 رقم 35 UP، مع تقرير 27-أكتوبر-2026 لحساب تغيرات هذا الأسبوع.
