مشروع تطوير اراضي بواحة جدة

Land Development of Jeddah Oasis

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	محمد الشنيفي	24-Nov-2025	23-May-2027

النطاق: الطرق، وشبكة مواسير السيول مع غرف التجميع والمناهل والعبارة الصندوقية والقنوات، وشبكة الصرف الصحي مع محطة رفع، وشبكتا مياه الشرب والمياه المعالجة مع صنبور إطفاء الحريق، وتمديدات الجهد المتوسط 36 ك.ف مع وحدات RMU، وإنارة الشوارع. مدة العقد 18 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بنسبة 97.2% مقابل 79.0% مخطط وفق الخطة المعدلة، المشروع متقدم بنسبة 18.2%. حقق هذا الأسبوع 0.69% مقابل 1.21% مخطط. ولا يزال معلما الأعمال الترابية للأراضي وأعمال الطرق مفتوحين، وتوقعهما الآن 27-أكتوبر-2026.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
97.2% / 79.0% مخطط	+0.69% / +1.21% مخطط	61.8% · اليوم 337 من 545	80.3% · 46.0 مليون ريال
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.23 · +18.2%	▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.52%	● الإنجاز المتوقع 27-ديسمبر-2026	10 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 18-أكتوبر-2026

المشروع متقدم بوضوح إجمالاً، لكن معلمين تأخرا مجدداً وجاء هذا الأسبوع دون الخطة.

معلما الأعمال الترابية للأراضي وأعمال الطرق، اللذان كان توقعهما الأسبوع الماضي 13-أكتوبر-2026، أصبح توقعهما الآن 27-أكتوبر-2026، ولا يزال تحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) يُظهرهما كأنهما لم يبدآ في ذلك التاريخ. أصبح الانتهاء المتوقع للمشروع 27-ديسمبر-2026 في التقرير الأسبوعي وفي P6 معاً، أي قبل تاريخ العقد 23-مايو-2027 بـ 147 يوماً، بينما يعطي مطبوع الأعمال المتبقية (Remaining Work) تاريخ 21-يناير-2027.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026، مختومة بتاريخ 25-أكتوبر-2026 حيث يظهر الختم. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




دهانات الطرق، طريق الخيام (Tent Road)

دهانات حارات جديدة على طريق الخيام المنحني. لا يوجد ختم تاريخ.



أعمال حواجز الحماية، طريق الخيام

طاقم يثبّت حاجز الحماية على امتداد طريق الخيام. مختومة 25-أكتوبر-2026، 08:26.

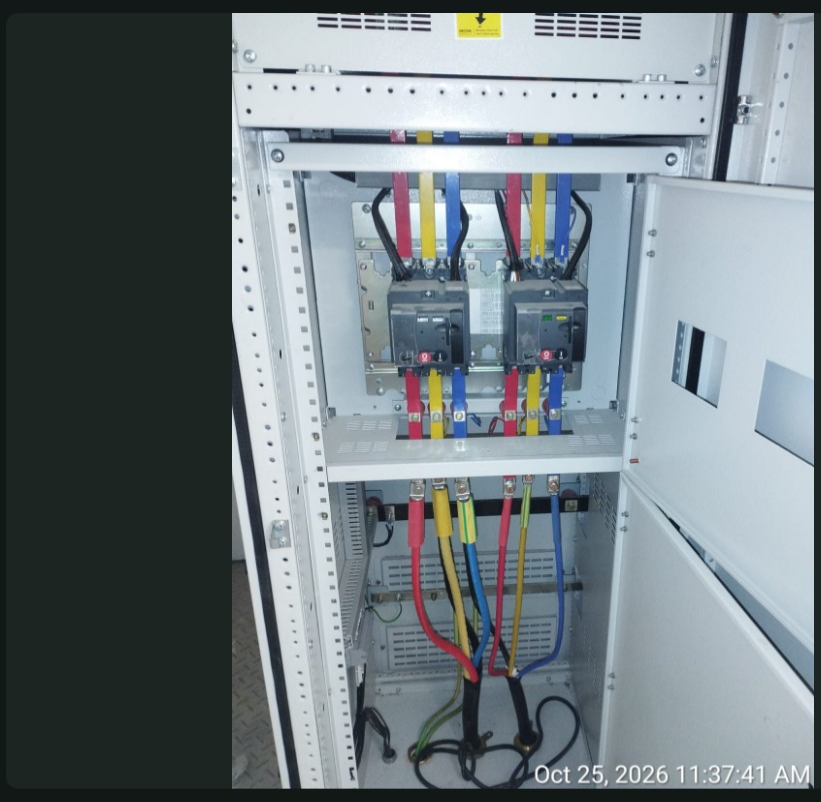

توصيل نهايات التمديدات، محطة الرفع

توصيل نهايات التمديدات في لوحة بمحطة الرفع. مختومة 25-أكتوبر-2026، 11:37.



الردم الصخري، الأرض 6

دحّالات وشاحنات على الردم الصخري للأرض 6. ختم GPS بتاريخ 25-أكتوبر-2026، 16:08.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data؛ ونقطة أكتوبر هي القيمة حتى 27-أكتوبر-2026.



نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026	76.4	96.1	+19.7%	–	1.26
20-Oct-2026	77.8	96.5	+18.7%	+0.36%	1.24
27-Oct-2026	**79.0**	**97.2**	**+18.2%**	**+0.69%**	**1.23**

القيم الأسبوعية من ورقتي Progress (2) في تقريري 20 أكتوبر و27-أكتوبر-2026، اللتين تعطيان ساعات العمل التراكمية لهذا الأسبوع والأسبوع الماضي. القيم المخططة وفق الخطة المعدلة / خطة الاستدراك؛ وكانت الخطة الأساسية الأصلية تستهدف 85.3% بنهاية أكتوبر.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Weekly Progress Report.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الأعمال التمهيدية	2.1%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	4.5%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	20.2%	98.9%	102.2%	+3.3%	1.03	▲ متقدم
أعمال الطرق	13.1%	76.8%	106.5%	+29.7%	1.39	▲ متقدم
الأعمال الكهربائية	14.4%	42.6%	84.0%	+41.4%	1.97	▲ متقدم
أعمال الإزالة	3.6%	109.5%	109.5%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
شبكة تصريف السيول	7.2%	93.6%	102.8%	+9.1%	1.10	▲ متقدم
الأراضي	3.1%	82.5%	113.9%	+31.4%	1.38	▲ متقدم
شبكة الصرف الصحي	6.0%	84.2%	84.2%	0.0%	1.00	● وفق الخطة
شبكة المياه المعالجة	9.7%	87.8%	94.1%	+6.2%	1.07	▲ متقدم
شبكة مياه الشرب	7.7%	76.1%	86.8%	+10.7%	1.14	▲ متقدم
محطة رفع الصرف الصحي	3.8%	15.9%	92.6%	+76.6%	5.81	▲ متقدم
العبارة الصندوقية	0.5%	114.3%	114.3%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
قناة التصريف المفتوحة	1.2%	128.1%	128.1%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
النفق	0.3%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
الاختبار والتشغيل	2.4%	13.1%	85.5%	+72.5%	6.54	▲ متقدم
الإجمالي	100%	**79.0%**	**97.2%**	**+18.2%**	**1.23**	▲ متقدم

ثماني مراحل تُظهر ساعات عمل مكتسبة أكثر من الموازنة (أعلى من 100%). يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) 1,218 نشاطاً: 1,182 مكتملاً و28 قيد التنفيذ و8 لم تبدأ؛ منها 17 نشاط تركيب قيد التنفيذ في محطة رفع الصرف الصحي. الانتهاء المجدول 27-ديسمبر-2026، أي قبل تاريخ العقد بـ 147 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والكمية المنفذة حتى تاريخه والكمية المتبقية لبنود جدول الكميات الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026. عمود "المنفذ هذا الأسبوع" هو الفرق عن تقرير 20-أكتوبر-2026، ولم يتغير إلا ردم الأراضي.



بند النطاق	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
ردم الطرق	م³	329,707	329,707	0	0	100.0%
ردم الأراضي	م³	718,628	692,513	38,199+	26,115	96.4%
طبقة ما تحت الأساس	م³	30,812	30,812	0	0	100.0%
طبقة الأساس الحصوية	م³	19,162	19,162	0	0	100.0%
طبقة الأساس الإسفلتية	م³	7,129	7,129	0	0	100.0%
الطبقة الإسفلتية السطحية	م³	4,052	4,052	0	0	100.0%
البردورات مسبقة الصب (K1)	م³	22,496	22,496	0	0	100.0%
بلاط الإنترلوك	م²	12,677	12,677	0	0	100.0%
مواسير مياه الشرب HDPE	م	4,025	4,025	0	0	100.0%
مواسير المياه المعالجة HDPE	م	4,209	4,209	0	0	100.0%
المحابس	عدد	77	77	0	0	100.0%
مواسير الصرف الصحي GRP	م	2,735	2,735	0	0	100.0%
مناهل الصرف الصحي	عدد	45	45	0	0	100.0%
مواسير السيول GRP	م	3,971	3,971	0	0	100.0%

بند النطاق	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
مناهل السيول	عدد	42	42	0	0	100.0%
غرف التجميع	عدد	77	77	0	0	100.0%
تمديدات الجهد المتوسط 15 ك.ف	م²	5,632	5,632	0	0	100.0%
تمديدات الجهد المنخفض	م	6,457	6,457	0	0	100.0%
أعمدة الإنارة	عدد	258	258	0	0	100.0%
تمديدات الاتصالات، 6 مسارات 50 مم	م	6,424	6,424	0	0	100.0%
تمديدات الاتصالات، 2 × 32 مم	م	4,604	4,604	0	0	100.0%
المضخات الغاطسة	عدد	2	0	0	2	0.0%
كاميرات المراقبة	عدد	7	1	0	6	14.3%
كابل الألياف الضوئية	م	20	1	0	19	5.0%

الشبكات: جميع الأطوال منفذة

تُظهر ورقة Progress Summary اكتمال تنفيذ جميع الشبكات: الطرق 5,657 م، والجهد المتوسط 13,171 م، وإنارة الشوارع 9,910 م، والاتصالات 11,025 م، ومياه الشرب 4,025 م، والمياه المعالجة 4,209 م، والصرف الصحي 2,735 م، وتصريف السيول 3,791 م.

ما زال مفتوحاً

ارتفع ردم الأراضي هذا الأسبوع بمقدار 38,199 م³ إلى 96.4% (المتبقي 26,115 م³). في محطة الرفع، لا تزال المضختان الغاطستان مُبلغاً عنهما كغير مركبتين، وكاميرا مراقبة واحدة من 7 مركبة، و1 من 20 م من كابل الألياف الضوئية.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث جدول P6 توقعات مختلفة لبعض المعالم. يُعرض الاثنان ليُحسم الفرق مع المقاول.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	24-Nov-2025	24-Nov-2025	24-Nov-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	23-Dec-2025	23-Dec-2025	23-Dec-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
طلب المواد طويلة التوريد	21-Nov-2026	14-Jul-2026	–	–	✓ منجز
شبكة الصرف الصحي	22-Jul-2026	–	26-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
شبكة المياه المعالجة	23-Nov-2026	–	30-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
شبكة مياه الشرب	23-Nov-2026	02-Nov-2026	05-Sep-2026 (فعلي)	–	؟ التوقعات متعارضة
توريد جميع المعدات والمواد	31-Dec-2026	06-Oct-2026	–	–	؟ يتعارض مع سجل التوريدات
الأعمال الترابية وتسوية الأراضي	23-Mar-2026	27-Oct-2026	27-Oct-2026	118	▼ متأخر
أعمال الطرق	22-Sep-2026	27-Oct-2026	27-Oct-2026	154	▼ متأخر
الشبكات الكهربائية (الجهد المتوسط)	06-May-2027	27-Oct-2026 (فعلي)	03-Nov-2026	154	؟ التوقعات متعارضة
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للاستلام الابتدائي	23-May-2027	27-Dec-2026	27-Dec-2026	118	● في الموعد
انتهاء المشروع / إخلاء الموقع	23-May-2027	27-Dec-2026	27-Dec-2026	118	● في الموعد

تأخر معلما الأعمال الترابية للأراضي وأعمال الطرق من 13 أكتوبر إلى 27-أكتوبر-2026 وما زالا مفتوحين.

يضع P6 المعلمين مجدداً في تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026 كأنهما لم يبدآ. ويسجل التقرير الأسبوعي الآن اكتمال الشبكات الكهربائية في 27-أكتوبر-2026، بينما يخططها P6 في 03-نوفمبر-2026. والعكس في مياه الشرب: لم يعد التقرير الأسبوعي يسجلها منجزة ويتوقعها في 02-نوفمبر-2026، بينما يُظهرها P6 مكتملة في 05-سبتمبر-2026. تواريخ الخطة الأساسية من ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي؛ وخطتا الصرف الصحي والمياه المعالجة الأساسيتان من نهايات الخطة الأساسية في P6.

توريد المواد الرئيسية

المواد طويلة التوريد الموجودة في الموقع حسب التخصص. المصدر: Procurement Summary، التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026.



معدات محطة الرفع: 9 بنود ما زالت "قيد التصنيع"


المضخات، وقواطع MCCB (VFD)، ولوحات التحكم المحلية، والمولد، ومكثفات تحسين معامل القدرة، ووحدة PLC، وأجهزة القياس، وعداد التدفق، ومفتاح التحويل ATS. كان معظمها مستحق الوصول إلى الموقع بحلول 15-سبتمبر-2026. ويُظهر P6 تركيب هذه البنود في محطة الرفع منجزاً بنسبة 70%، لذا قد لا يكون السجل، الذي لم يتغير منذ الأسبوع الماضي، محدّثاً.

المفاتيح والقواطع المغلقة: 4 من 7

البند الوحيد دون 100% في سجل التوريدات، وحالته قيد التنفيذ. البنود الـ 26 الأخرى مكتملة.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمالة والإداريون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

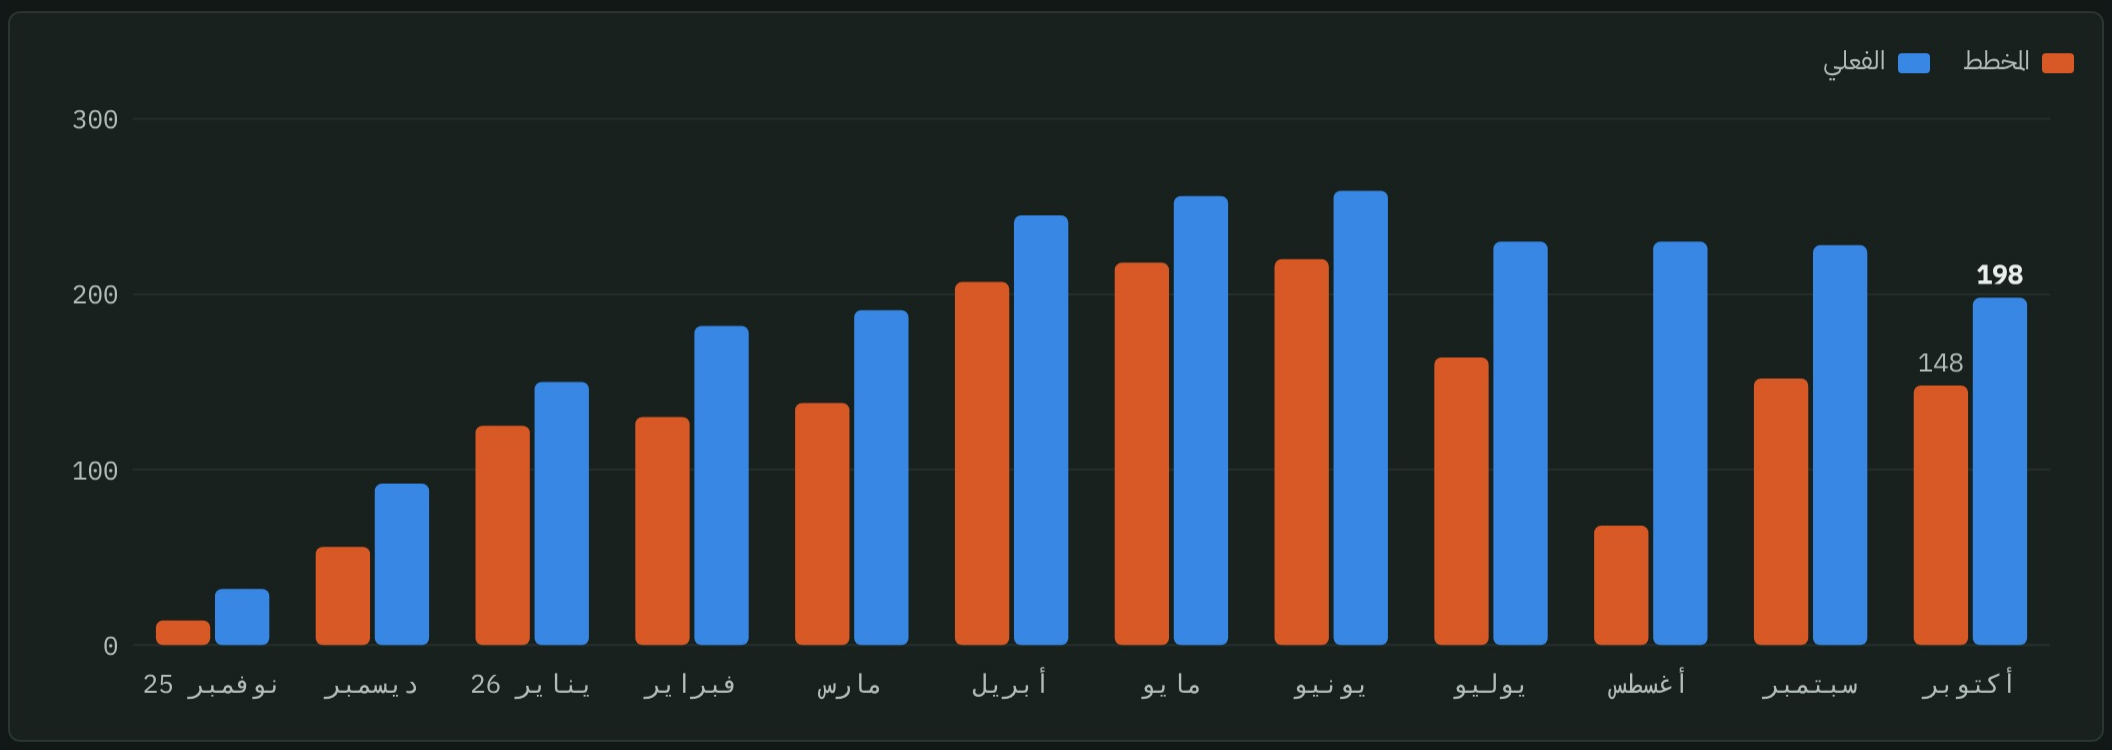

عدد العمالة في أكتوبر 198 (49 إدارياً و149 عاملاً) مقابل 148 مخططاً. المعدات في الموقع في أكتوبر: 82 مقابل 75 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الطرق	31,180,897
شبكتا الكهرباء والاتصالات	8,774,396
شبكة تصريف السيول	5,894,425
محطة الرفع	3,284,426
شبكة المياه المعالجة	2,885,131
شبكة الصرف الصحي	2,756,313
شبكة مياه الشرب	2,528,760
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**57,304,348**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	65,900,000
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. التوزيع من ورقة Progress Summary. لا توجد أوامر تغيير أو تغييرات محتملة مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	10
القيمة الإجمالية	45,992,129
الصافي شاملاً الضريبة	52,890,948
المعتمد من مدير المشروع - مدن (7)	33,617,268
المدفوع حتى تاريخه	27,469,389
المحتجزات / الخصومات	0 / 0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	56,768,603

الفوترة الإجمالية 80.3% من قيمة العقد مقابل تقدم فعلي 97.2%. لم يُضف أي مستخلص هذا الأسبوع. والمستخلصات 8 إلى 10 لم تعتمدها مدن بعد، والمبلغ المدفوع يساوي المستخلصات 1 إلى 6.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.88

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	515,278
ساعات العمل هذا الأسبوع	10,512
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	81 / 44

هذه الإحصاءات مطابقة لتقرير 20-أكتوبر-2026، ولم تزد ساعات العمل التراكمية.

الجودة التقييم 0.85

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة (تراكمي)	1,571 / 1,551
طلبات الفحص المعلقة	20
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	43 / 43
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	10 / 10
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	116 / 116
المخططات التنفيذية المعالجة	394
المواد المعتمدة	146

اعتُمد هذا الأسبوع آخر مخطط تنفيذي معلق (أعمال الطرق). اكتملت اختبارات شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والسيول والمياه المعالجة. اختبارات الطرق عند 10%، ويُظهر P6 اختبار محطة الرفع عند 50%.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	الحالة	التفاصيل
تقليص النطاق، الطريق رقم 6	مغلقة 25-يناير-2026	حُذف الطريق رقم 6 وشبكات المرافق فيه من النطاق، وصدر نطاق عمل جديد يشمل جميع الأنشطة الجارية.
الحماية الصخرية، قناة الوادي والعبارة الصندوقية	مغلقة 25-يناير-2026	لم يتضمن النطاق حماية صخرية عند مدخل العبارة ومخرجها أو على امتداد الوادي، وكان مطلوباً قرار بشأن التكسية الحجرية المحقونة.
عرض قناة الوادي مقابل العبارة	مغلقة 30-ديسمبر-2025	قاع الوادي بعرض 15 م أعرض بكثير من العبارة CU-02 بعرض 6.7 م، ويُتبع ما في مخططات IFC.
الأنفاق القائمة	مغلقة 25-يناير-2026	لتجنب التسرب والروائح، تُزال خرسانة النفق بالكامل ثم يُردم.
مواد وكميات شبكة الجهد المتوسط	مغلقة 30-أبريل-2026	اعتماد مواد وكميات الجهد المتوسط من الشركة السعودية للكهرباء ومدن.
السلامة: الفتحات العميقة والإجهاد الحراري والمرور	مغلقة	حواجز صلبة، واستراحة العمل الصيفية، ومنظمو حركة ولوحات إرشادية.

جميع البنود في سجل المشكلات (8 مشكلات) وسجل المخاطر (7 مخاطر) مغلقة، ولم يتغير السجلان عن الأسبوع الماضي. ما يبقى مفتوحاً وفق الأوراق الأخرى: معلما الأعمال الترابية للأراضي وأعمال الطرق، ومعدات محطة الرفع وتركيبها، و20 طلب فحص معلقاً، واختبارات الطرق ومحطة الرفع.

ملاحظات على البيانات

- يصف العنوان الرئيسي للتقرير الأسبوعي وورقة الملخص وملفا "الأعمال المنفذة خلال الأسبوع" نسبة تقدم مبنية على التكلفة بأنها "فعلية". يعتمد هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي (ساعات العمل) فقط.
- رقم الأسبوع: تذكر ورقة Milestones "Current Contract Weeks: 49 of 79"، وهو المستخدم هنا. أما حساب الأسابيع الكاملة من تسليم الموقع (24-نوفمبر-2025 إلى 27-أكتوبر-2026، 337 يوماً) فيعطي الأسبوع 48.
- تُظهر ورقة Physical-Chart Data نسبة 97.7% لشهر أكتوبر (396,939 ساعة عمل)، بينما تعطي أوراق التقدم 97.2% حتى تاريخه (394,817 ساعة عمل). يعتمد هذا التقرير 97.2%.
- تتجاوز ساعات العمل المكتسبة الموازنة في ثماني مراحل (حتى 128% لقناة التصريف المفتوحة)، وتتجاوز الساعات المخططة الموازنة أيضاً في ثلاث منها. وتستخدم الخطة الأساسية والخطة المعدلة إجماليين مختلفين (406,229 و406,774 ساعة عمل).
- تختلف المعالم بين التقرير الأسبوعي وP6: الشبكات الكهربائية مسجلة مكتملة في 27-أكتوبر-2026 في التقرير لكنها لم تبدأ (03-نوفمبر-2026) في P6؛ ومياه الشرب كانت مسجلة مكتملة في 05-سبتمبر-2026 الأسبوع الماضي وأصبح توقعها الآن 02-نوفمبر-2026، بينما لا يزال P6 يُظهرها مكتملة.
- تختلف تواريخ الانتهاء بين الملفات: 27-ديسمبر-2026 (التقرير الأسبوعي وملف P6)، و21-يناير-2027 لانتهاء المشروع و06-يناير-2027 لاكتمال المشروع بالكامل في مطبوع الأعمال المتبقية، و23-نوفمبر-2026 كنهاية متوقعة في ملفي "الأعمال المنفذة خلال الأسبوع"، و23-مايو-2026 كنهاية للعقد في أحدهما (نهاية العقد 23-مايو-2027).

- تحسب ورقة Schedule 1,176 نشاطاً مكتملاً و28 قيد التنفيذ و8 لم تبدأ (1,212 إجمالاً)، بينما يضم ملف P6 1,182 نشاطاً مكتملاً (1,218 إجمالاً). وتنتهي عدة أنشطة مفتوحة في محطة الرفع والأعمال الإضافية في P6 بين يناير وأبريل 2027، أي بعد انتهاء المشروع في 27-ديسمبر-2026.
- عدة ملفات وأوراق لم تتغير عن الأسبوع الماضي: ملف Tracking Progress مطابق، وكذلك سجل التوريدات وسجل المشكلات وسجل المخاطر وسجل المستخلصات وإحصاءات السلامة وأعداد طلبات الفحص (FIR وNCR وMIR).
- معلم "اكتمال توريد جميع المعدات والمواد" مسجل كمنجز في 06-أكتوبر-2026، لكن سجل التوريدات يضم 9 بنود "قيد التصنيع" وبنداً عند 4 من 7، ويُظهر ملخص التوريدات 27 من 34 مادة في الموقع.
- تختلف قيم طلبات الفحص لهذا الأسبوع: 2,421,817 في ملخص طلبات الفحص و1,886,072 للأسبوع 49 في سجلها. وتغيرت التواريخ المخططة في ورقة Testing عن الأسبوع الماضي (مثلاً انتقل اختبار أعمال الطرق من 30-مارس-2027 إلى 12-يوليو-2026)، ونهاية اختبار الطرق المتوقعة مسجلة فعلية رغم أن الإنجاز 10% فقط.
- تختلف كميات النطاق بين الأوراق: السيول 3,791 م (Progress Summary) مقابل 3,971 م من مواسير GRP (Major Quantities)؛ وشبكة الجهد المتوسط 13,171 م مقابل 5,632 من تمديدات 15 ك.ف. وتعطي ورقة Major Quantities البردورات بوحدة م³ وتمديدات الجهد المتوسط بوحدة م². وإجمالي المخططات التنفيذية 394 في لوحة المؤشرات و703 في ورقة Quality-Stat.
- القوى العاملة لشهر أكتوبر: تُظهر لوحة المؤشرات 61 عاملاً مخططاً و181 فعلياً (حسب المهنة)، وورقة Manpower تُظهر 136 و149؛ وكان تقرير الأسبوع الماضي قد أعطى 156 فعلياً لشهر أكتوبر.
- يذكر ملفا "الأعمال المنفذة خلال الأسبوع" مدير المشروع باسم عبد الله الشنيفي ويضعان المشروع في القطاع الأوسط. ويحسب ملخص المستخلصات 3 مستخلصات مدفوعة، لكن المبلغ المدفوع يساوي المستخلصات 1 إلى 6. وتُظهر عدة خلايا #REF! (مسؤولو المشكلات، والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز).
