مبادرة الملاعب بالمنطقة الوسطى (حائل, واحة القصيم, تبوك)

Playgrounds Initiative: Qassim Oasis, Hail and Tabuk Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنشاء المتقدم للمقاولات	إيجيس (Egis)	بدر الرويضان	17-Feb-2026	16-Dec-2026

النطاق: ملاعب في ثلاثة مواقع (واحة القصيم وحائل والمدينة الصناعية بتبوك) تشمل الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وتنسيق المواقع وأعمال الموقع العامة، ومنها قباب هوائية في القصيم وتبوك ومبنى دورات مياه في كل موقع.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (التقرير الأسبوعي، جدول التقدم الفعلي). في 08-نوفمبر-2026 بلغ الإنجاز 82.22% مقابل 87.77% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 5.55% (مؤشر الأداء الزمني 0.94). وحقق هذا الأسبوع 2.16% مقابل 2.31% مخطط، فاتسعت الفجوة قليلاً.

نسبة الإنجاز الفعلي
82.22% / 87.77%
مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.94 متأخر بنسبة 5.55%

التقدم هذا الأسبوع
+2.16% / +2.31%
مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.15%

المدة المنقضية من العقد
87.4% · اليوم 264 من 302
▼ انتهاء P6: 02-مارس-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
11.9% · 4.24 مليون ريال
3 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 31-أكتوبر-2026

الجدول الزمني يُنهي المشروع الآن بعد تاريخ العقد بـ76 يوماً.

يتوقع تحديث P6 (تاريخ البيانات 06-نوفمبر-2026) والتقرير الأسبوعي التسليم في 02-مارس-2027 مقابل تاريخ انتهاء العقد 16-ديسمبر-2026، بفائض زمني −64.8 يوماً، وكان التوقع الأسبوع الماضي 23-فبراير-2027. لدى 176 من أصل 284 نشاطاً مفتوحاً فائض سالب، وتعثر بدء 36 نشاطاً. والقباب الهوائية هي الأكثر تأخراً: القصيم 39.96% مقابل 87.01% مخطط، وتبوك 35.13% مقابل 81.77%، دون أي تقدم للأسبوع الرابع على التوالي.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من التقرير الأسبوعي بتاريخ 08-نوفمبر-2026، تحمل اثنتان منها ختم 07-نوفمبر-2026 في تبوك. تستمر أعمال الإنترلوك والتارتان ومجاري الهواء وتشطيبات دورات المياه وخزان GRP والعزل المائي للأسطح. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




تركيب بلاط الإنترلوك

تركيب البلاط على امتداد المشى. بلا ختم تاريخ.




تركيب أرضية التارتان

تثبيت بلاط التارتان على منطقة لعب دائرية. بلا ختم تاريخ.

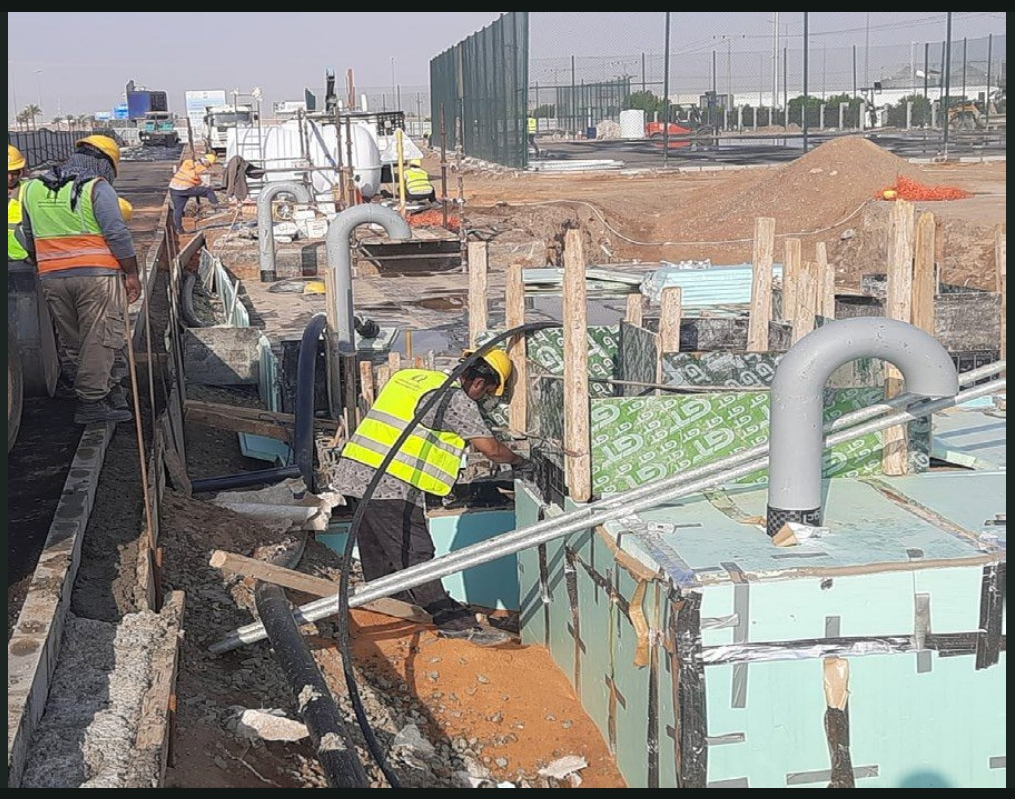

أعمال مجاري الهواء

ربط مقاطع مجاري الهواء المعزولة مسبقاً في خندق. بلا ختم تاريخ.

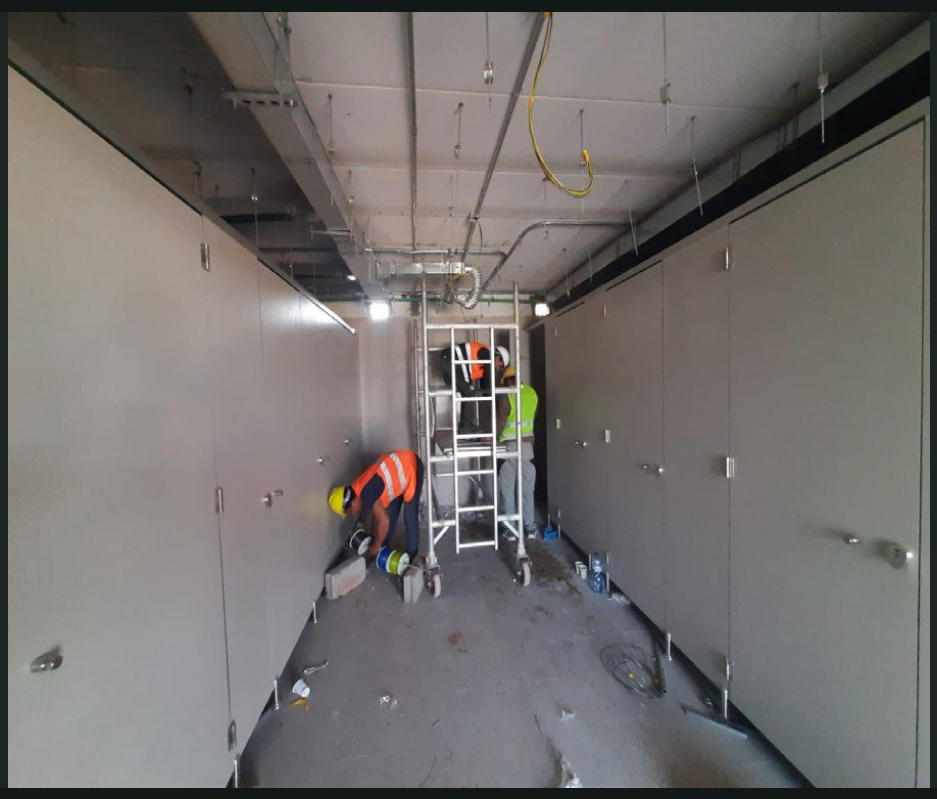


تركيب الأبواب الفينولية

قواطع وأبواب مركّبة في مبنى دورات المياه. بلا ختم تاريخ.



إطار قاعدة خزان GRP، تبوك

الإطار مركّب على قاعدة الخزان. ختم 07-نوفمبر-2026، 09:18، المدينة الصناعية بتبوك.

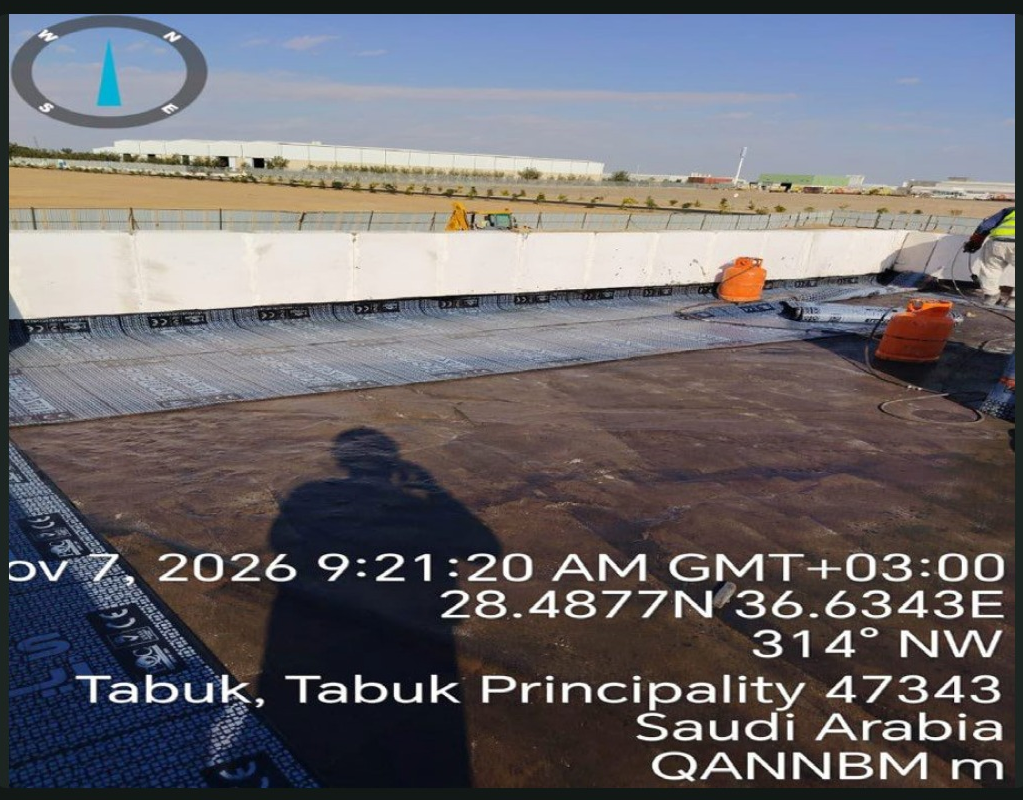


العزل المائي للسطح، تبوك

الغشاء مفروش على السطح. ختم GPS بتاريخ 07-نوفمبر-2026، 09:21، تبوك.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data في التقرير الأسبوعي.

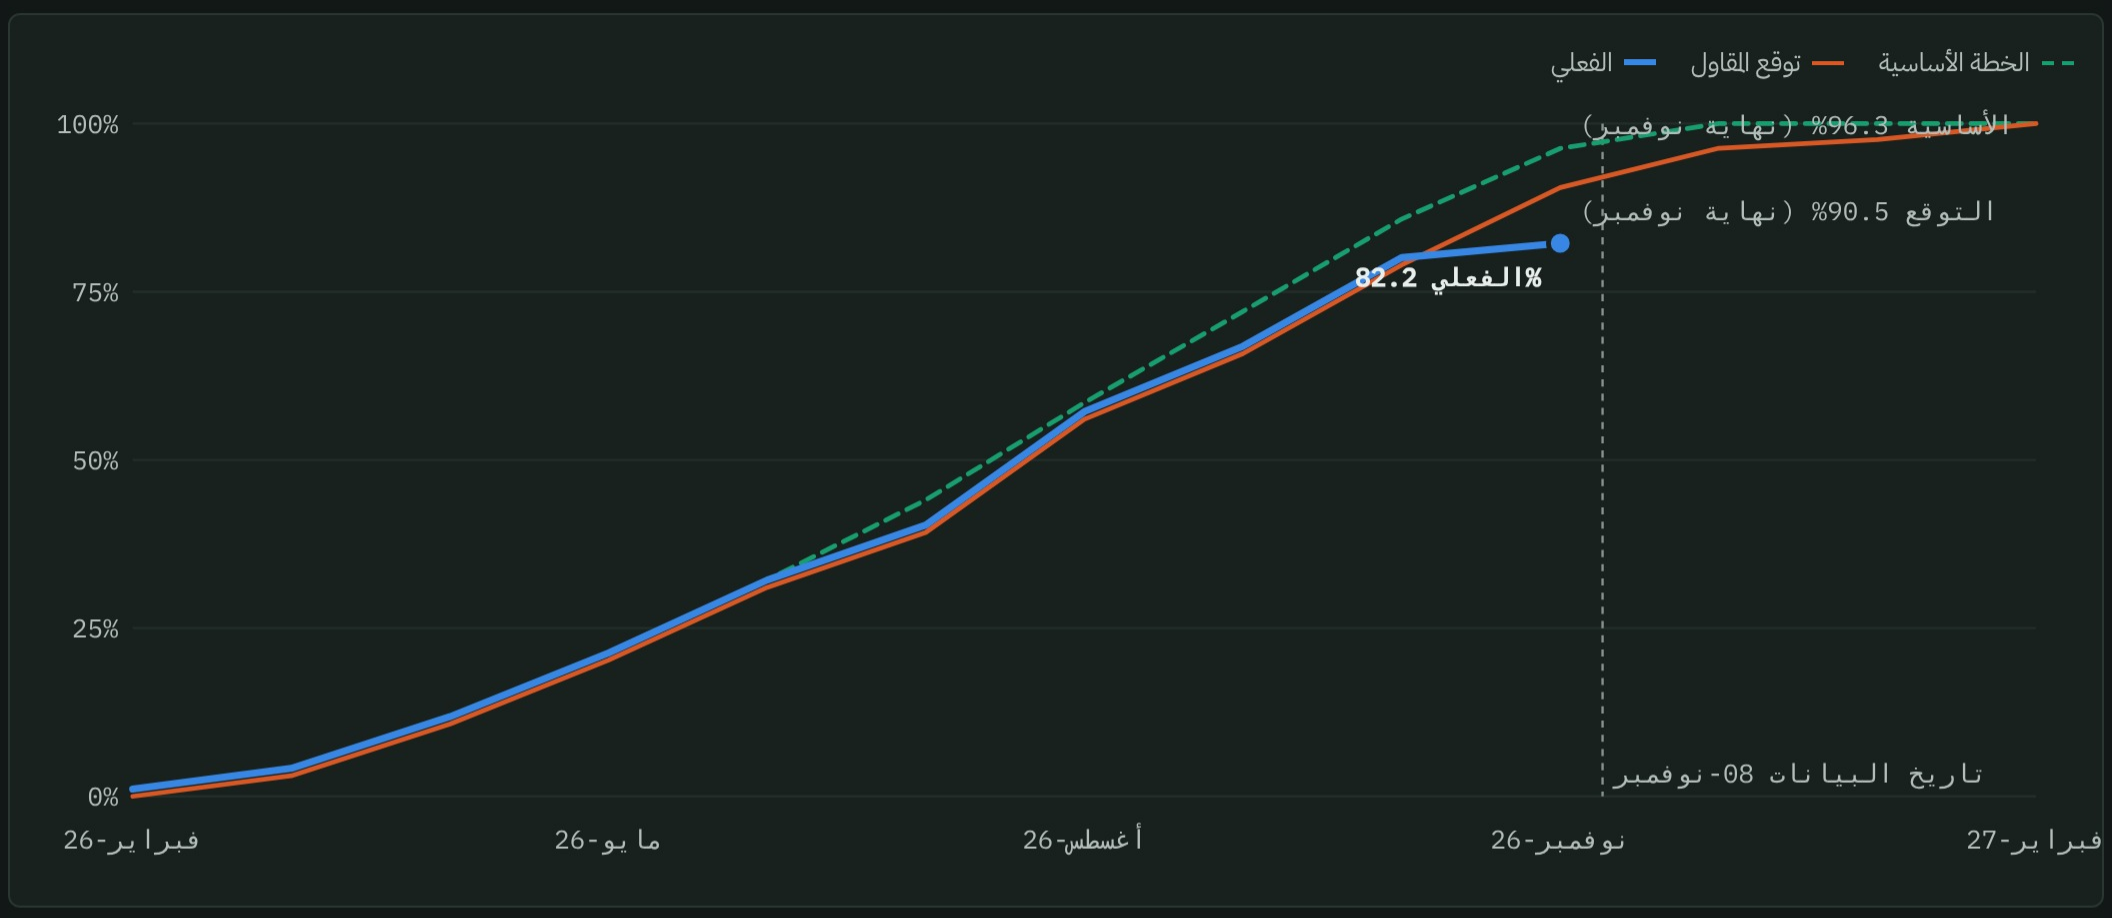

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
18-Oct-2026	80.25	74.79	-5.46	–	0.93
25-Oct-2026	83.26	77.64	-5.62	+2.85	0.93
01-Nov-2026	85.46	80.06	-5.40	+2.42	0.94
08-Nov-2026	**87.77**	**82.22**	**-5.55**	**+2.16**	**0.94**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقارير الأسبوعية من 18 أكتوبر إلى 08 نوفمبر 2026، وهي التقارير الأسبوعية الوحيدة المرفوعة حتى الآن. تبلغ الخطة الأساسية الشهرية في المنحنى 96.29% بنهاية نوفمبر و100% بنهاية ديسمبر، ويبلغ توقع المقاول 90.49% و96.35%.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (التقرير الأسبوعي، ورقة Progress). لا يحمل التصميم الهندسي والتوريدات ساعات عمل في التقرير، لذا لا يُعرضان.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
معلم المشروع (وقت الإدارة)	**30.0%**	**86.45%**	**86.43%**	**-0.02%**	**1.00**	▼ متأخر
التنفيذ	**66.6%**	**92.60%**	**83.55%**	**-9.04%**	**0.90**	▼ متأخر
واحة القصيم	24.3%	91.23%	83.43%	-7.81%	0.91	▼ متأخر
حائل	17.9%	96.32%	86.22%	-10.10%	0.90	▼ متأخر
تبوك	24.3%	91.22%	81.73%	-9.49%	0.90	▼ متأخر
الإغلاق	**3.5%**	**6.42%**	**19.98%**	**+13.56%**	**3.11**	▲ متقدم
الإجمالي	100%	**87.77%**	**82.22%**	**-5.55%**	**0.94**	▼ متأخر

داخل التنفيذ، القباب الهوائية هي الأكثر تأخراً: القصيم 446 من 1,116 ساعة عمل منجزة مقابل 971 مخططة، وتبوك 392 مقابل 912.57، ولم تُنجز فيهما أي ساعات عمل منذ أربعة أسابيع. ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 06-نوفمبر-2026) عدد 1,929 نشاطاً: 1,645 مكتملاً و221 قيد التنفيذ و63 لم يبدأ.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية للمواقع الثلاثة معاً، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 08-نوفمبر-2026. يُظهر العمود الأخير الكمية المخططة حتى تاريخه. ويُقارن عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بتقرير 01-نوفمبر-2026.

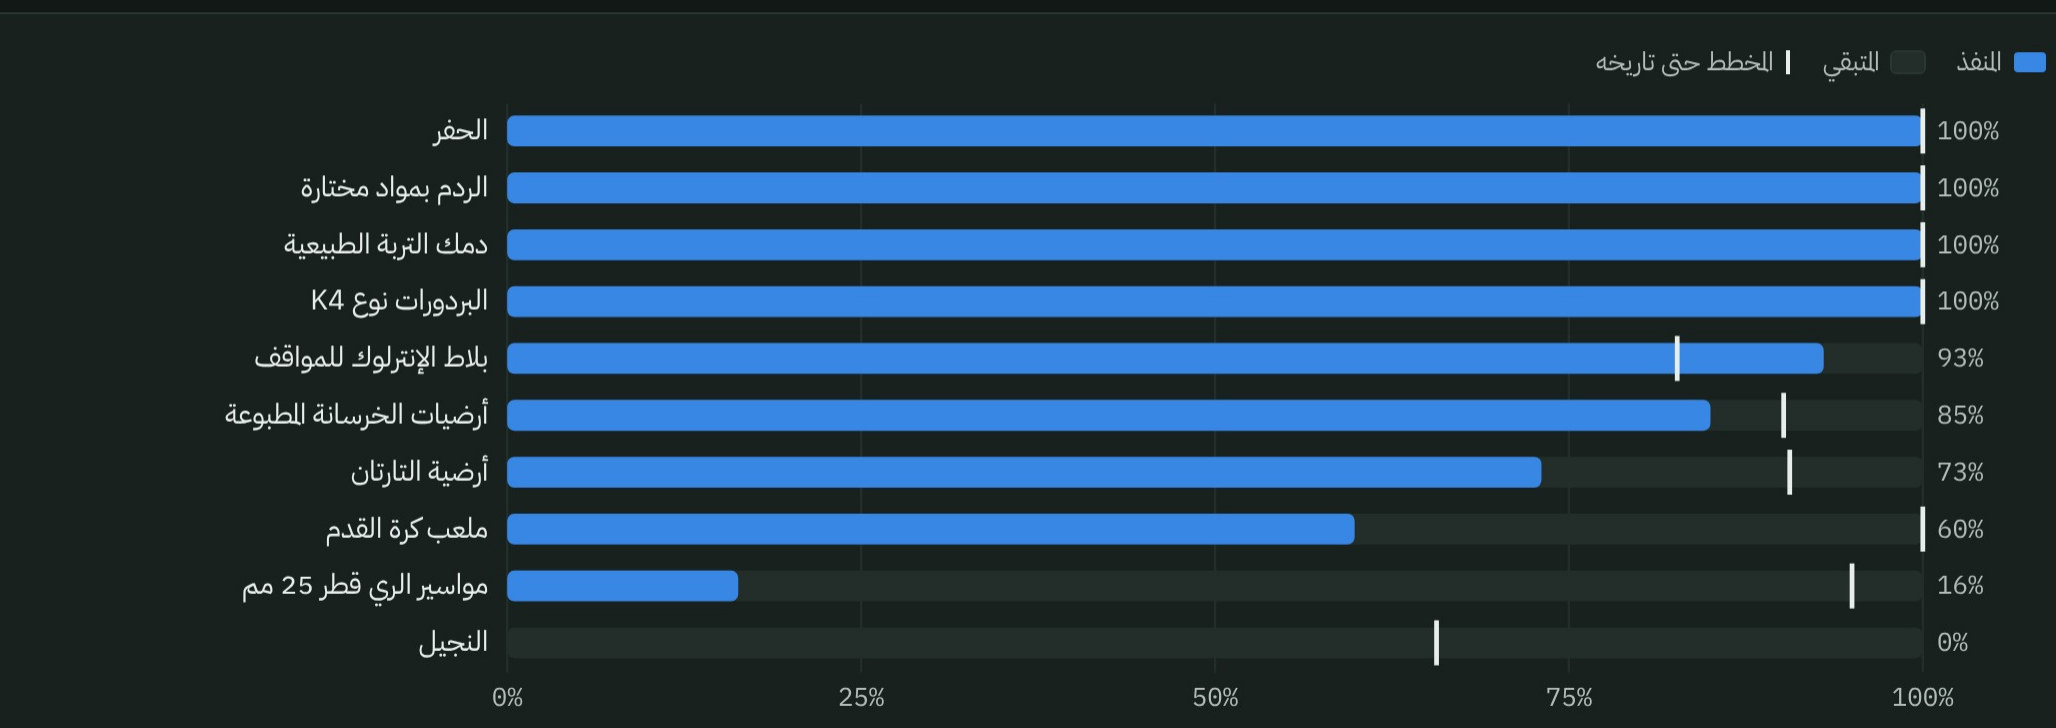

بند النطاق	المواقع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	المخطط %
الحفر	الكل	م³	29,400	29,400	0	0	100.0%	100.0%
الردم بمواد مختارة	الكل	م³	29,400	29,400	0	0	100.0%	100.0%
دمك التربة الطبيعية	الكل	م²	33,300	33,300	0	0	100.0%	100.0%
البردورات نوع K4	الكل	م.ط	27,100	27,100	0	0	100.0%	100.0%
بلاط الإنترلوك للمواقف	الكل	م²	7,140	6,640	0	499.8	93.0%	82.7%
أرضيات الخرسانة المطبوعة	الكل	م²	7,800	6,630	0	1,170	85.0%	90.2%
أرضية التارتان	الكل	م²	10,950	8,000	0	2,950	73.1%	90.6%
ملعب كرة القدم	الكل	م²	7,350	4,400	0	2,950	59.9%	100.0%
مواسير الري قطر 25 مم	الكل	م	11,100	1,812	0	9,288	16.3%	95.0%
النجيل	الكل	م²	19,100	0	0	19,100	0.0%	65.6%

المنجز المُبلغ عنه هذا الأسبوع

بلاط الإنترلوك، والحفر للبردورات، والأبواب الفينولية، وخزان GRP، ومجاري الهواء، وبوابات ملعب كرة القدم، وأرضيات الإيبوكسي، والكسوة الحجرية لمبنى دورات المياه، والتارتان، والردم فوق خطوط الري (الملخص التنفيذي الأسبوعي). الأسبوع القادم: التارتان، وسحب الكابلات لمنطقة دورات المياه، والري، والبردورات، وقواعد أعمدة الإنارة، وبلاط الإنترلوك.

النجيل ومواسير الري والملاعب متأخرة

النجيل عند 0 من 12,539 م² مخططة حتى تاريخه، ومواسير الري قطر 25 مم عند 1,812 من 10,545 م، وملعب كرة القدم عند 4,400 من 7,350 م²، وأرضية التارتان عند 8,000 من 9,921 م². ولم تتغير أي من الكميات الرئيسية للأسبوع الثالث على التوالي رغم الإبلاغ عن أعمال في الإنترلوك والتارتان والبردورات والري.

المعالم الرئيسية

تختلف بعض تواريخ ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي عن تحديث P6. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول. الفائض من تحديث P6 بتاريخ بيانات 06-نوفمبر-2026.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	17-Feb-2026	17-Feb-2026	17-Feb-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	18-Mar-2026	14-Apr-2026	–	–	✓ منجز متأخراً
اكتمال التصميم الهندسي	16-Aug-2026	10-Nov-2026 (+86 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال التوريدات	27-Aug-2026	12-Nov-2026 (+77 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال مبنى دورات المياه	28-Oct-2026	–	19-Nov-2026	+5.5	▼ معرّض للتأخير

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
اكتمال أعمال الملاعب	07-Dec-2026	–	06-Dec-2026	+9.1	▼ معرّض للتأخير
اكتمال التنفيذ	14-Dec-2026	13-Feb-2026 (0 يوم كما ورد)	13-Feb-2027	–	؟ يتعارض مع P6
اكتمال أعمال تنسيق المواقع	16-Dec-2026	–	12-Jan-2027	−23.0	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	16-Dec-2026	25-Feb-2027 (+71 يوماً)	02-Mar-2027	−64.8	▼ متأخر
اكتمال التسريح	16-Dec-2026	01-Mar-2027 (+75 يوماً)	–	–	▼ متأخر
تسليم المشروع	16-Dec-2026	02-Mar-2027 (+76 يوماً)	02-Mar-2027	−64.8	▼ متأخر

يذكر التقرير الأسبوعي "اكتمال التنفيذ" في 13-فبراير-2026، وهو تاريخ مضى.

يُنهي P6 مرحلة التنفيذ في 10-فبراير-2027 في القصيم و27-ديسمبر-2026 في حائل و13-فبراير-2027 في تبوك، لذا فالمقصود على الأرجح 13-فبراير-2027. وانتقل توقع التسليم هذا الأسبوع من 23-فبراير-2027 إلى 02-مارس-2027، وهو الانزلاق الأسبوعي الثالث على التوالي (07-فبراير ثم 14-فبراير ثم 23-فبراير ثم 02-مارس-2027). ومن المعالم التعاقدية، لا يحتفظ بفائض موجب سوى مبنى دورات المياه (+5.5 يوماً) وأعمال الملاعب (+9.1 يوماً).

توريد المواد الرئيسية

نسبة الإنجاز الفعلي لأنشطة "التوريد إلى الموقع" المفتوحة الأقل تقدماً (تحديث P6، تاريخ البيانات 06-نوفمبر-2026). جميع أنشطة التوريد المفتوحة الأخرى عند 85–95%.



مواد القبة الهوائية: 80% موزّدة


في كل من القصيم وتبوك دون تغيير، بفائض −64.8 و−61.0 يوماً، وفائض القصيم يساوي فائض إنجاز المشروع. ولا يزال سجل التوريدات يُظهر أمر شراء القبة الهوائية "قيد الإجراء" بمدة توريد 150 يوماً.

أوامر الشراء والمواد في الموقع

يضم ملخص التوريدات في التقرير الأسبوعي 57 مادة: صدر 33 أمر شراء، ويتبقى 25، و8 مواد في الموقع، دون تغيير. الجزء المتبقي من الحائط الستائري عند 80% في القصيم (70% الأسبوع الماضي) وحائل، و70% في تبوك.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (يدوية وغير يدوية)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower في التقرير الأسبوعي.

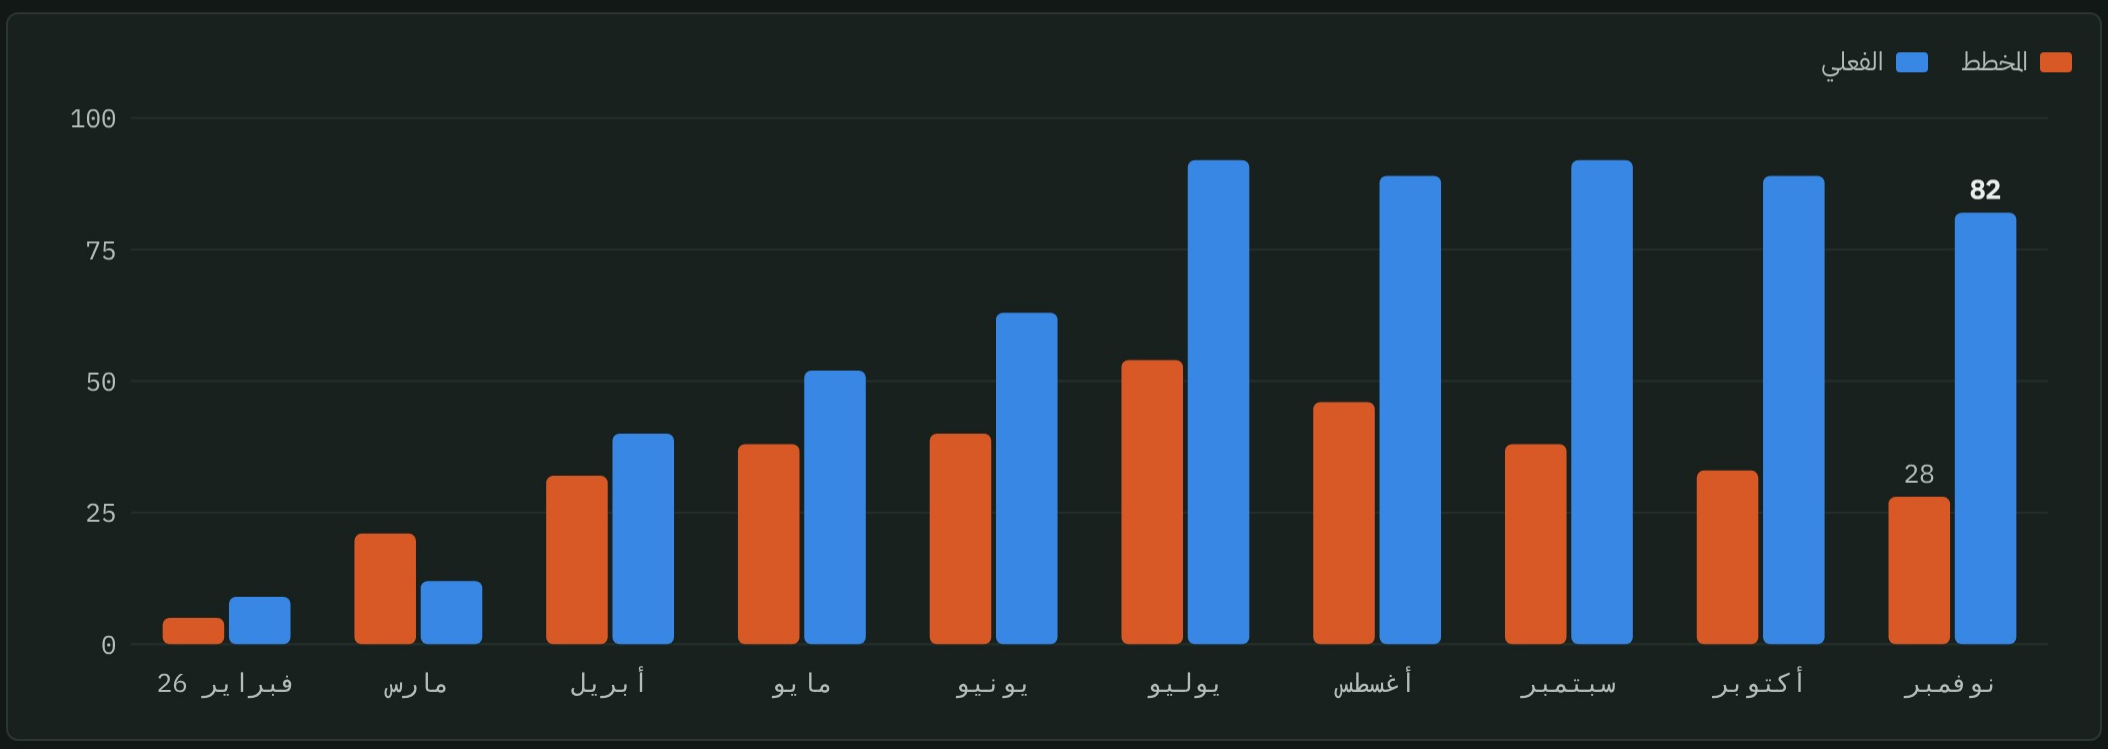

عدد العمالة في نوفمبر 82 مقابل 28 مخططاً (17 غير يدوية و65 يدوية). وتُظهر لوحة المؤشرات في تقرير 08-نوفمبر-2026 عدد 46 عاملاً يدوياً مقابل 24 مخططاً و17 غير يدوي مقابل 8، أي 63 إجمالاً مقابل 32. المعدات في الموقع في نوفمبر: 20 مقابل 3 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)	35,709,993
قيمة العقد المعدلة	35,709,993
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات في السجل	3
القيمة الإجمالية	4,244,771
استرداد الدفعة المقدمة	−424,477
الخصومات والغرامات	−45,000
المعتمد من مدير المشروع - مدن	0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	4,244,771

المفوتر 11.9% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 82.22%. المستخلصات (2,317,493) IPC-01 و(1,039,612) IPC-02 وIPC-03، 887,665، للفترة 16–31 أكتوبر 2026) معتمدة من الاستشاري، ولم يُعتمد أي منها من مدير المشروع في مدن.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.95

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	129,170
ساعات العمل هذا الأسبوع	11,640
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	710 / 277

تفتيش مدن للسلامة رقم 31 (05-نوفمبر-2026): 18 بنداً ممارسة جيدة، و5 بحاجة إلى تحسين، و0 إخفاق.

الجودة التقييم 0.91

طلبات الفحص الميداني: صادرة / مغلقة / معلقة	776 / 656 / 120
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	99 / 77 / 22
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / معلقة	22 / 10 / 12
تعليمات الموقع: صادرة / مغلقة	7 / 6
المخططات التنفيذية المعتمدة (A+B) / الإجمالي	333 / 445
اعتمادات المواد (A+B) / الإجمالي	138 / 156

25 مخططاً تنفيذياً و6 تقديمات للمواد قيد الانتظار.

المشكلات والمخاطر القائمة

يضم سجل المشكلات في التقرير الأسبوعي مشكلة واحدة أُغلقت (تصريح العمل في حائل، أُغلقت 19-أبريل-2026). البنود أدناه مأخوذة من أوراق التقدم والكميات والجدول الزمني والمخاطر.

المشكلة	الموقع	التفاصيل
أعمال القبة الهوائية	القصيم، تبوك	الإنجاز الفعلي 39.96% (القصيم) و35.13% (تبوك) مقابل 87.01% و81.77% مخطط، ولم تُنجز أي ساعات عمل في القباب الهوائية للأسبوع الرابع على التوالي، وتعثر بدء تركيب نظام الكابلات الفولاذية والغشاء في الموقعين. مواد القباب مورّدة بنسبة 80%.
انزلاق الجدول الزمني	جميع المواقع	انتقل توقع التسليم من 07-فبراير-2027 (تقرير 18 أكتوبر) إلى 14-فبراير ثم 23-فبراير ثم 02-مارس-2027 الآن. لدى 176 من 284 نشاطاً مفتوحاً فائض سالب، و176 نشاطاً على المسار الحرج، وتعثر بدء 36 نشاطاً (القصيم 14، حائل 6، تبوك 16).
تنسيق المواقع والري	جميع المواقع	لم يبدأ النجيل مقابل 12,539 م² مخططة حتى تاريخه، ومواسير الري قطر 25 مم عند 1,812 من 10,545 م مخططة. ويُتوقع اكتمال تنسيق المواقع في 12-يناير-2027 (فائض −23.0 يوماً).
أرضيات الملاعب	جميع المواقع	ملعب كرة القدم عند 4,400 من 7,350 م²، وأرضية التارتان عند 8,000 من 9,921 م² مخططة حتى تاريخه.
التوريدات	جميع المواقع	يتبقى إصدار 25 من 57 أمر شراء، و8 مواد في الموقع، والجزء المتبقي من الحائط الستائري عند 70–80%.
فحص التربة (سجل المخاطر)	تبوك	خطر قائم: تستغرق نتائج اختبار الجسات 7–10 أيام من المختبر، مما قد يؤخر بدء أعمال الحفر.

ملاحظات على البيانات

- أرقام التقدم هي التقدم الفعلي (الجهد) في التقرير الأسبوعي، ويُقاس بـ33,340 ساعة عمل مخططة، منها 10,000 ساعة (30%) على نشاطي "Project Durations" الزمنيين (بند الإدارة)، اللذين يكتسبان التقدم بمرور الوقت وبلغا 86.43% (8,643 ساعة). وبدونهما يكون الإنجاز 80.42% مقابل 88.34% مخطط، أي متأخراً بنسبة 7.92% بدلاً من 5.55%. ولا تحمل القبتان الهوائيتان سوى 1,116 ساعة عمل لكل منهما (6.7% من إجمالي الساعات) رغم أنهما تمثلان 23.4% من قيمة العقد، لذا لا يكاد توقفهما يؤثر في نسبة الإنجاز الفعلي. وللمقارنة، تبلغ قيمة المستخلصات وقيمة طلبات الفحص (FIR) حتى تاريخه 4,244,771 ريالاً لكل منهما، أي 11.9% من قيمة العقد. ولم تغيّر ملفات هذا الأسبوع ذلك، ولا يزال التقرير يعرض نسبة الإنجاز الفعلي كما وردت من المقاول. وتعرض لوحة مؤشرات التقرير تقدماً محسوباً بالتكلفة بعنوان الفعلي، ويستخدم هذا التقرير التقدم الفعلي فقط.
- يذكر التقرير "Current Contract Weeks: 0 of 0"، لذا حُسب رقم الأسبوع من تاريخ تسليم الموقع (17-فبراير-2026): 264 يوماً، الأسبوع 37.
- تحمل أعمدة "Weekly Physical Progress" نسبة 79.55% مخطط و71.94% منجز، ولا تطابق أرقام أي من الأسبوعين حتى تاريخه. لذا اعتُبر التقدم هذا الأسبوع الفرق في التقدم حتى تاريخه منذ تقرير 01-نوفمبر-2026.
- جميع الكميات الرئيسية متطابقة في تقارير 18 و25 أكتوبر و01 و08 نوفمبر 2026 رغم الإبلاغ عن أعمال في الإنترلوك والتارتان والبردورات والري، ويبدو أن الورقة لم تُحدَّث.
- ساعات العمل حسب الموقع: لا يزال مبنى دورات المياه في تبوك يُظهر 0 من 1,708 ساعة منجزة مع 40 ساعة مخططة فقط، ولا تحمل أعمال الإغلاق في تبوك أي ساعات مخططة رغم إنجاز 76.72 ساعة.
- تذكر ورقة المعالم اكتمال التنفيذ في 13-فبراير-2026 دون تغيير في الأيام، واكتمال التجهيز في 14-أبريل-2026 مقابل 18-مارس-2026 دون تغيير في الأيام.
- التوريدات: يذكر الملخص 8 مواد من 57 في الموقع دون تغيير منذ ثلاثة أسابيع، بينما أنشطة التوريد في P6 منجزة بنسبة 70–95%. ولا يتضمن سجل التوريدات كميات أو تواريخ توريد.
- المستخلصات: يُظهر الملخص 0 مستخلصات مقدمة بينما يضم السجل IPC-01 إلى IPC-03. والمدفوع (4,348,338 ريالاً) يتجاوز القيمة الإجمالية المقدمة رغم عدم اعتماد أي منها من مدير المشروع. وأصبح إجمالي ملخص طلبات الفحص مساوياً تماماً لقيمة المستخلصات (كان 3,688,354 الأسبوع الماضي)، ويتكرر فيه الطلب FIR-0630 مرتين. وتجمع الغرامات في لوحة المؤشرات (−469,477) بين استرداد الدفعة المقدمة والخصومات.
- القوى العاملة والسلامة: تُظهر لوحة المؤشرات 46 عاملاً يدوياً بينما تذكر ورقة Manpower عدد 65 لشهر نوفمبر، وتذكر إحصاءات السلامة 10,000 ساعة آمنة هذا الأسبوع مقابل 11,640 ساعة عمل، بينما الإجمالي التراكمي لكليهما 129,170. ولا تزال ورقة DB تحمل بيانات مشروع آخر (HAL1-02-005).
- تاريخ بيانات تحديث P6 هو 06-نوفمبر-2026 مقابل 08-نوفمبر-2026 للتقرير الأسبوعي، ولدى 131 نشاطاً قيد التنفيذ تاريخ انتهاء يسبق تاريخ البيانات. وثلاثة ملفات PDF مسماة MLTX-05-047 رغم أنها تخص MLTX-02-003.
- يبدأ توقع المقاول في ورقة Physical-Chart Data من 0 في فبراير، أي أقل من الفعلي بـ365 ساعة عمل، لذا يبقى أدنى من الفعلي قليلاً حتى أكتوبر.

أُعدّ في 10-نوفمبر-2026 من التقارير الأسبوعية من 18 أكتوبر إلى 08 نوفمبر 2026 وتحديث P6 بتاريخ بيانات 06-نوفمبر-2026.
