تطوير شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام المرحلة الثانية الجزء الثاني - المنطقة J

Development of Infrastructure Networks, 3rd Industrial City in Dammam, Phase 2 Part 2, Zone J

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة أنساب للمقاولات العامة	إيجيس (EGIS)	المهندس محمد العيسى	12-Jan-2025	11-Jan-2027

النطاق: الطرق التجميعية والمحلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والجهد المتوسط وإنارة الشوارع والاتصالات، ومحطة رفع للصرف الصحي وبحيرات لتصريف السيول في البلوك J. قيمة العقد 117.4 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 24 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بالجهد المخطط (أيام العمل، وفق ما يعتمده التقرير المحدّث). في تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026 بلغ الإنجاز 78.5% مقابل 86.6% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 8.1% (مؤشر الأداء الزمني 0.91). ويذكر التقرير إنجاز 0.92% خلال هذا الأسبوع. وقد غيّر الملف المحدّث أساس قياس التقدم، فلا تصح مقارنة هذه الأرقام بالتقرير 92 (54.8% على أساس ساعات العمل).

نسبة الإنجاز الفعلي
78.5% / 86.6% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.91 −8.1%

التقدم هذا الأسبوع
+0.92% / 14.1% مخطط
؟ رقم الخطة الأسبوعية يبدو خاطئاً

المدة المنقضية من العقد
89.6% · اليوم 653 من 729
▼ انتهاء P6 في 07-سبتمبر-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
43.1% · 50.6 مليون ريال
20 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

يتوقع التقرير الأسبوعي المحدّث الآن الانتهاء متأخراً 7 أيام فقط، بينما لا يزال تحديث P6 يُظهر تأخيراً يقارب ثمانية أشهر.

يتوقع التقرير الأسبوعي المحدّث الانتهاء في 18-يناير-2027، أي بعد تاريخ العقد (11-يناير-2027) بـ7 أيام، وقدّم جميع معالم الشبكات بأربعة إلى ستة أشهر. أما تحديث P6 المرفوع معه (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) فلم يتغير ولا يزال ينتهي في 07-سبتمبر-2027، بتأخير 239 يوماً وفائض −195.5 يوماً. ولا يوجد ملف جدول زمني يدعم التواريخ الجديدة. وبعد انقضاء 89.6% من مدة العقد، يتبقى 21.5% من الأعمال.

صور الموقع هذا الأسبوع

الصور الست الجديدة المرفوعة مع التقرير 94، ولا يظهر عليها ختم تاريخ. تُظهر دمك قاع الطرق، وأعمال العزل على الجدران الخرسانية لمحطة الرفع، ومناولة مواد الردم. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



تجهيز قاع الطريق

قاع طريق مدموك، والدحّال يعمل في الأمام.



دمك قاع الطريق

دحّالات تعمل على امتداد القاع المدموك.



عزل جدران محطة الرفع

غشاء الحماية مثبت على الجدار المصبوب، وأشاير التسليح أعلاه.



جدران محطة الرفع

مقطع جدار معزول وحديد التسليح جاهز للصبة التالية.



جلبة ماسورة في الجدار

جلبة ماسورة GRP مصبوبة في الجدار المعزول.




مناولة مواد الردم

لودر ينقل مواد الردم.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بالجهد المخطط) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

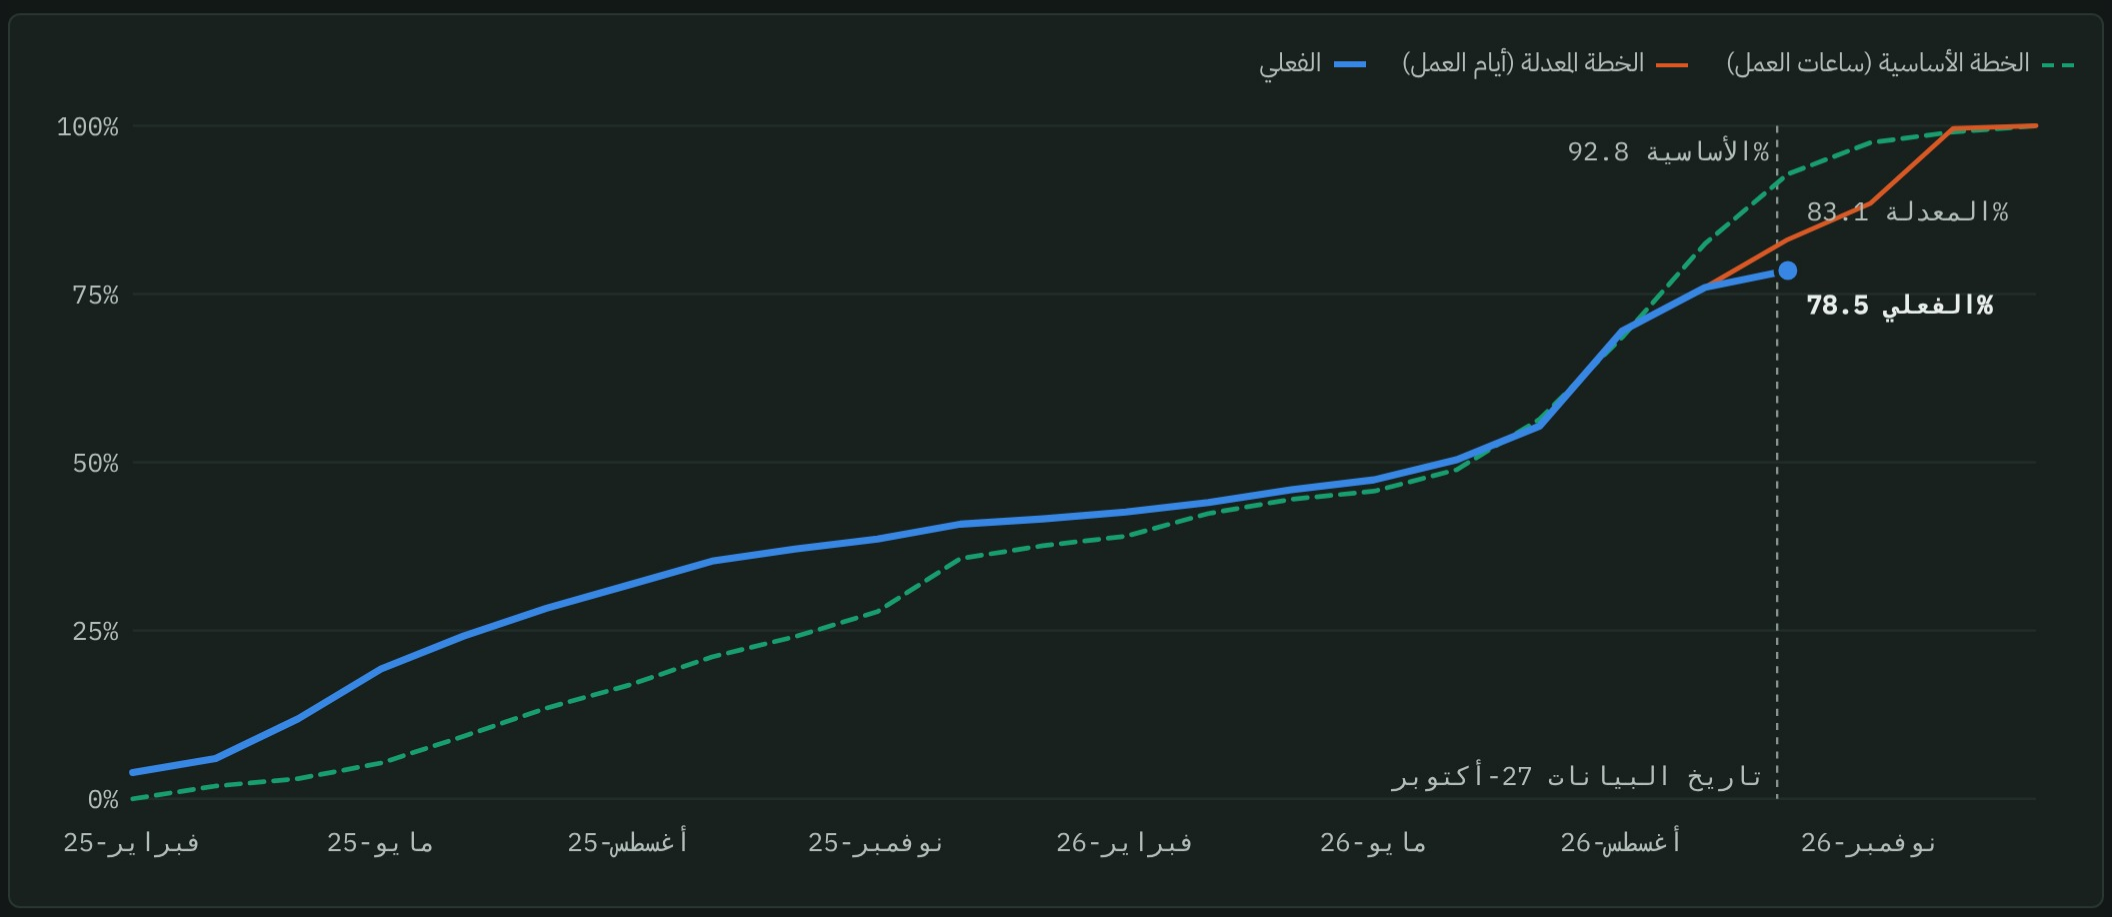

نهاية الفترة	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الفترة	مؤشر الأداء
يونيو-2026	50.4	50.4	0.0	+3.0	1.00
يوليو-2026	55.4	55.4	0.0	+5.0	1.00
أغسطس-2026	69.5	69.5	0.0	+14.1	1.00
سبتمبر-2026	76.0	76.0	0.0	+6.5	1.00
27-Oct-2026	**86.6***	**78.5**	**-8.1**	**+2.5**	**0.91**

قيم نهاية الشهر مقابل الخطة المعدلة (أيام العمل) من ورقة Physical-Chart Data. وحتى سبتمبر يساوي الفعلي في الورقة الخطة المعدلة تماماً، لذا يظهر مؤشر الأداء 1.00. * القيمة المخططة في تاريخ البيانات من غلاف التقرير، بينما الخطة المعدلة لنهاية أكتوبر 83.1% وهي أقل منها. وكانت الخطة الأساسية الأصلية (ساعات العمل) تستهدف 92.8% بنهاية أكتوبر.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بالجهد المخطط (أيام العمل). المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	0.3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	2.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	20.3%	100.0%	95.4%	−4.6	0.95	▼ متأخر
شبكة الأعمال الترابية	6.7%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
شبكة الري	1.9%	99.9%	53.3%	−46.6	0.53	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	2.9%	99.2%	68.4%	−30.9	0.69	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	1.6%	99.8%	94.3%	−5.5	0.94	▼ متأخر
شبكة إنارة الشوارع	3.7%	100.0%	9.2%	−90.8	0.09	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	1.5%	100.0%	61.2%	−38.8	0.61	▼ متأخر
شبكة الطرق	23.9%	84.6%	65.2%	−19.5	0.77	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	12.6%	96.6%	86.8%	−9.8	0.90	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	12.7%	98.4%	83.9%	−14.5	0.85	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	9.1%	0.0%	70.3%	+70.3	–	؟ لا يوجد مخطط حتى تاريخه
الإجمالي	100%	**86.6%**	**78.5%**	**−8.1**	**0.91**	▼ متأخر

يقيس الملف المحدّث الجهد بأيام العمل (65,420 إجمالاً)، ويشمل الآن التجهيز والتصميم والتوريدات والاختبار، وهي بنود لم يتضمنها قياس ساعات العمل السابق. وتحقق هذا الأسبوع 604.9 يوم عمل، معظمها في الطرق (205) والصرف الصحي (112) وتصريف السيول (109) والأعمال الترابية (64). ويُظهر الاختبار والتشغيل 70.3% مكتسباً دون قيمة مخططة ودون بدء أي اختبار، وهذا يحتاج إلى تحقق. يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) عدد 1,921 نشاطاً: 1,227 مكتملاً و64 قيد التنفيذ و630 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 07-سبتمبر-2027، أي بعد تاريخ العقد بـ239 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

الأطوال الإجمالية والمنفذة والمتبقية لكل شبكة، من ملخص التنفيذ في ورقة ملخص سير الأعمال. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير منذ الورقة نفسها في مجلد الأسبوع السابق (التقرير 92، 13-أكتوبر-2026)، أي أنه يغطي 14 يوماً.

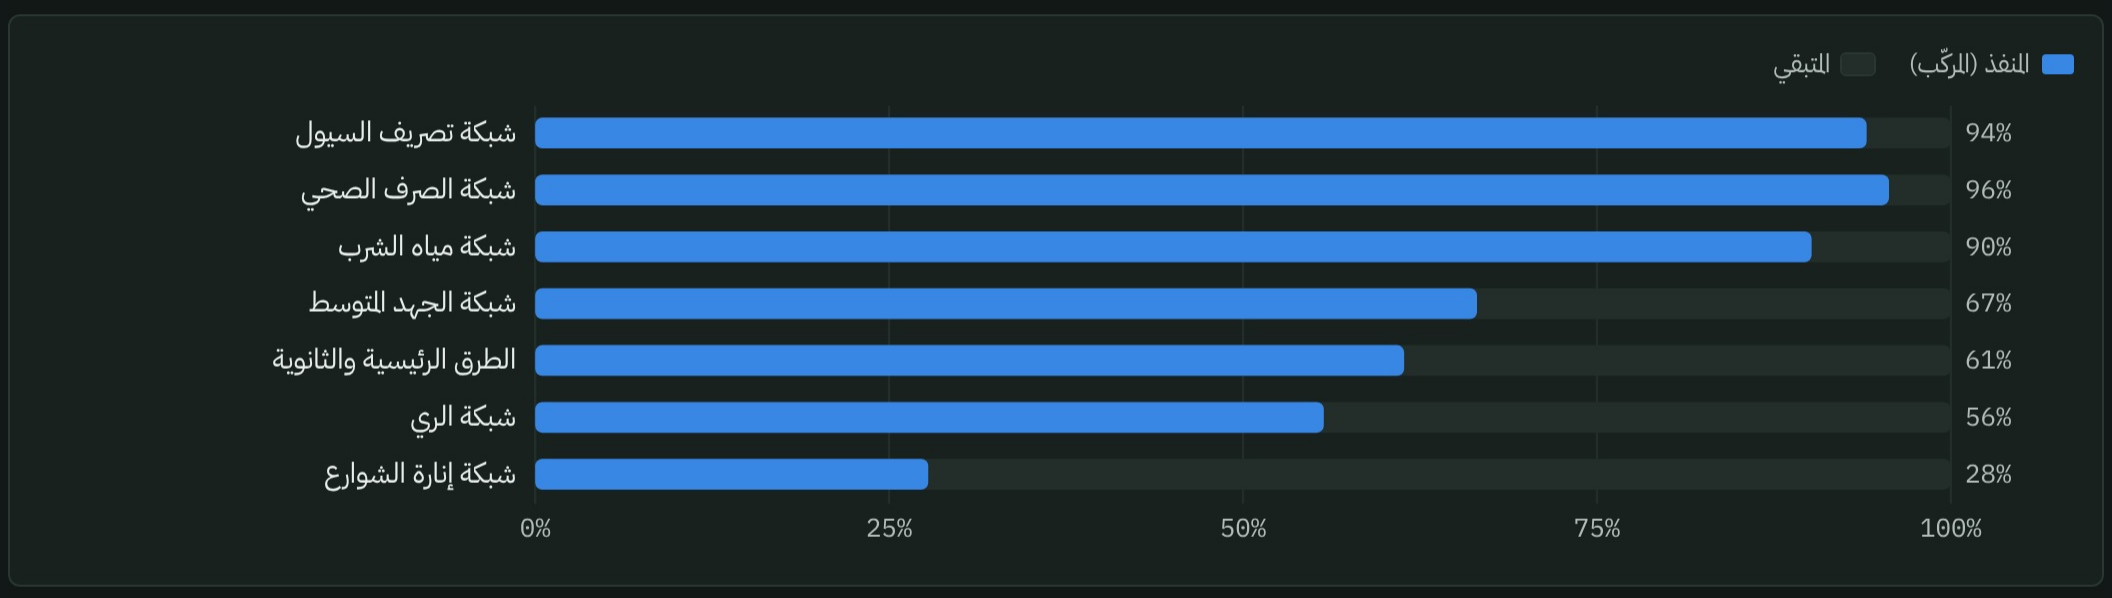

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
شبكة تصريف السيول	البلوك J	م.ط	18,554	17,450	0	1,104	94.0%	–
شبكة الصرف الصحي	البلوك J	م.ط	9,152	8,752	0	400	95.6%	–
شبكة مياه الشرب	البلوك J	م.ط	12,200	11,000	200+	1,200	90.2%	–

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
شبكة الجهد المتوسط	البلوك J	م.ط	17,328	11,528	200+	5,800	66.5%	–
الطرق الرئيسية والثانوية	البلوك J	م.ط	8,146	5,000	0	3,146	61.4%	–
شبكة الري	البلوك J	م.ط	14,494	8,074	0	6,420	55.7%	–
شبكة إنارة الشوارع	البلوك J	م.ط	12,786	3,550	0	9,236	27.8%	–

الأعمال المنفذة هذا الأسبوع

الشبكة	النشاط	الوحدة	المنفذ هذا الأسبوع	المصدر
مياه الشرب	المنفذ من الشبكة (10,800 ← 11,000)	م.ط	200	ورقة الملخص
الجهد المتوسط	المنفذ من الشبكة (11,328 ← 11,528)	م.ط	200	ورقة الملخص
الطرق	التقدم الفعلي المكتسب	أيام عمل	205	ورقة Progress
الصرف الصحي	التقدم الفعلي المكتسب	أيام عمل	112	ورقة Progress
تصريف السيول	التقدم الفعلي المكتسب	أيام عمل	109	ورقة Progress
الأعمال الترابية	التقدم الفعلي المكتسب	أيام عمل	64	ورقة Progress
الري	التقدم الفعلي المكتسب	أيام عمل	34	ورقة Progress
مياه الشرب	التقدم الفعلي المكتسب	أيام عمل	30	ورقة Progress
محطة رفع الصرف الصحي	صب الجدران	–	–	ورقة أنشطة الأسبوع

تكرر ورقة أنشطة الأسبوع قائمة أنشطة التقرير 92، وجدول كمياتها فارغ هذه المرة. المخطط لاحقاً: استكمال خط المياه 630 مم وخط الري 500 مم وخط 800 مم، ونحو 1,000 م من تمديدات الجهد المتوسط في الشارع 9، وأعمال الطرق في الشارع 10، وأسفلت الطريق 14.

الأكثر تأخراً

نُفذ 27.8% من إنارة الشوارع (3,550 من 12,786 م.ط)، ولم تُركّب أي وحدات إنارة LED أو تأريض أو تمديدات عبور الطرق أو غرف السحب. ونسبة المنفذ في الري 55.7% وفي الطرق 61.4%. ولم تبدأ أعمال الدهانات المرورية واللوحات وصنبور إطفاء الحريق (0 من 55).

قريبة من الاكتمال

نُفذ 95.6% من أطوال الصرف الصحي و94.1% من تصريف السيول و90.2% من مياه الشرب. واكتملت العبارة الصندوقية لتصريف السيول (2,051 م). ولا تزال مصائد الأمطار عند 207 من 505، وبحيرات تصريف السيول ومحطة رفع الصرف الصحي قيد الإنشاء.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتواريخ المتوقعة من جدول المعالم في التقرير الأسبوعي المحدّث، مقابل تحديث P6 بتاريخ 27-أكتوبر-2026. الأيام بين القوسين هي التأخير عن الخطة الأساسية كما يذكره التقرير الأسبوعي.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	12-Jan-2025	12-Jan-2025	12-Jan-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	12-Mar-2025	12-Mar-2025	09-Mar-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد المخططات التنفيذية والمواد	10-Feb-2025	11-Feb-2025	24-May-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
شبكة الأعمال الترابية	24-May-2026	31-May-2025	–	–	✓ منجز
شبكة الاتصالات	28-Sep-2026	27-Dec-2026 (+90 يوماً)	18-Mar-2027	−165	▼ متأخر
شبكة الري	23-Aug-2026	24-Dec-2026 (+123 يوماً)	11-May-2027	−163	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	05-Oct-2026	02-Jan-2027 (+89 يوماً)	27-Jun-2027	−180	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	06-Oct-2026	31-Dec-2026 (+86 يوماً)	21-Jun-2027	−184	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	17-Oct-2026	29-Dec-2026 (+73 يوماً)	07-Apr-2027	−134	▼ متأخر
أعمال الطرق	21-Oct-2026	05-Jan-2027 (+76 يوماً)	24-Aug-2027	−195.5	▼ متأخر
شبكة إنارة الشوارع	20-Dec-2026	12-Jan-2027 (+23 يوماً)	30-Jun-2027	−212	▼ متأخر


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
شبكة تصريف السيول	–	29-Dec-2026	11-Jul-2027	-172	▼ متأخر
بحيرات تصريف السيول	–	–	02-May-2027	-110	▼ متأخر
محطة رفع الصرف الصحي	–	–	30-May-2027	-129	▼ متأخر
الربط بالشبكات القائمة	–	–	24-Aug-2027	-192.5	▼ متأخر
انتهاء المشروع	11-Jan-2027	18-Jan-2027 (+7 أيام)	07-Sep-2027	-195.5	▼ متأخر

يختلف التقرير الأسبوعي وتحديث P6 الآن بنحو ثمانية أشهر.

يتوقع التقرير الأسبوعي المحدّث الانتهاء في 18-يناير-2027، واكتمال جميع الشبكات بين 24-ديسمبر-2026 و12-يناير-2027. أما تحديث P6 المرفوع، ولم يتغير، فيُنهي الشبكات بين 18-مارس و24-أغسطس-2027، والمشروع في 07-سبتمبر-2027. ويتضمن التقرير الأسبوعي مستخلصاً من جدول زمني ينتهي في 18-يناير-2027 لا يطابق ملف P6 المرفوع. ويجب تقديم جدول معدّل قبل قبول التواريخ الجديدة. ولا تزال شهادة عدم الممانعة من المالك لشبكة الجهد المتوسط المعلم الرقابي الوحيد الذي لم يتحقق (P6: 22-ديسمبر-2026، بفائض −46 يوماً).

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الكمية المطلوبة. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026، دون تغيير منذ التقرير 92. جميع المواد المدرجة معتمدة.

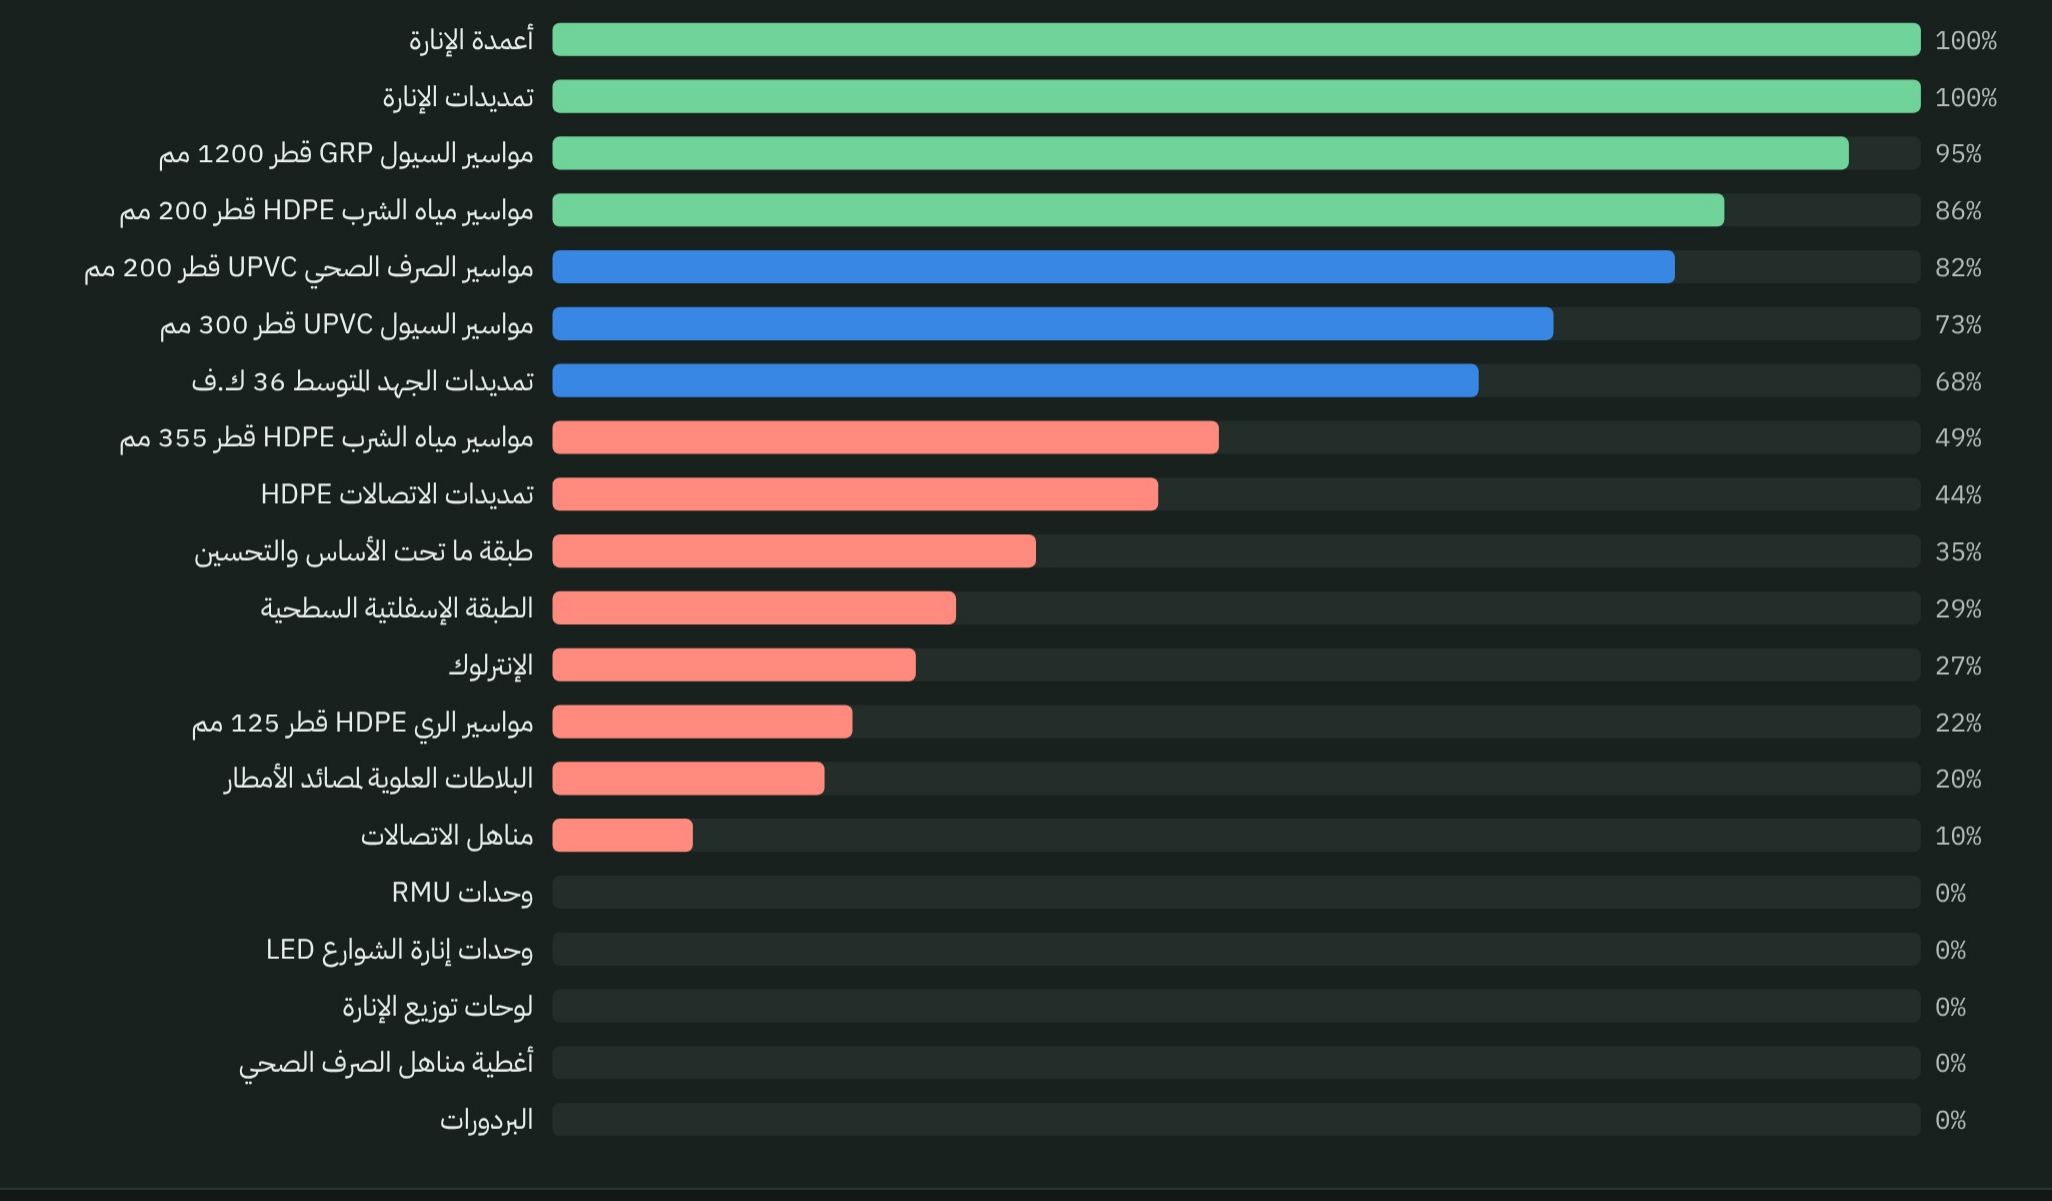

لم يُورّد شيء بعد لعدة بنود في الشبكات الحرجة


وحدات RMU (0 من 9)، ووحدات إنارة الشوارع LED (0 من 363)، ولوحات توزيع الإنارة (0 من 6)، والبردورات (0 من 42,552 قطعة)، وأغطية مناهل الصرف الصحي (0 من 129)، وأغطية وشبكات السيول. ويصنف سجل المخاطر تأخر المواد طويلة الأجل كخطر مرتفع.

تأخر مواد الاتصالات والري وطبقات الطرق

ورُد 44% من تمديدات الاتصالات و8 من 78 من مناهل الاتصالات. وورُد 22% من مواسير الري 125 مم، و20% من البلاطات العلوية لمصائد الأمطار، و17–35% من مواد طبقات الطرق (طبقة التحسين وما تحت الأساس والأساس والأسفلت والإنترلوك). وتمديدات الجهد المتوسط عند 8,378 من 12,378 م.

القوى العاملة

عدد العمالة في الموقع هذا الشهر حسب المهنة، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower. لا يتضمن التقرير سجلاً شهرياً.

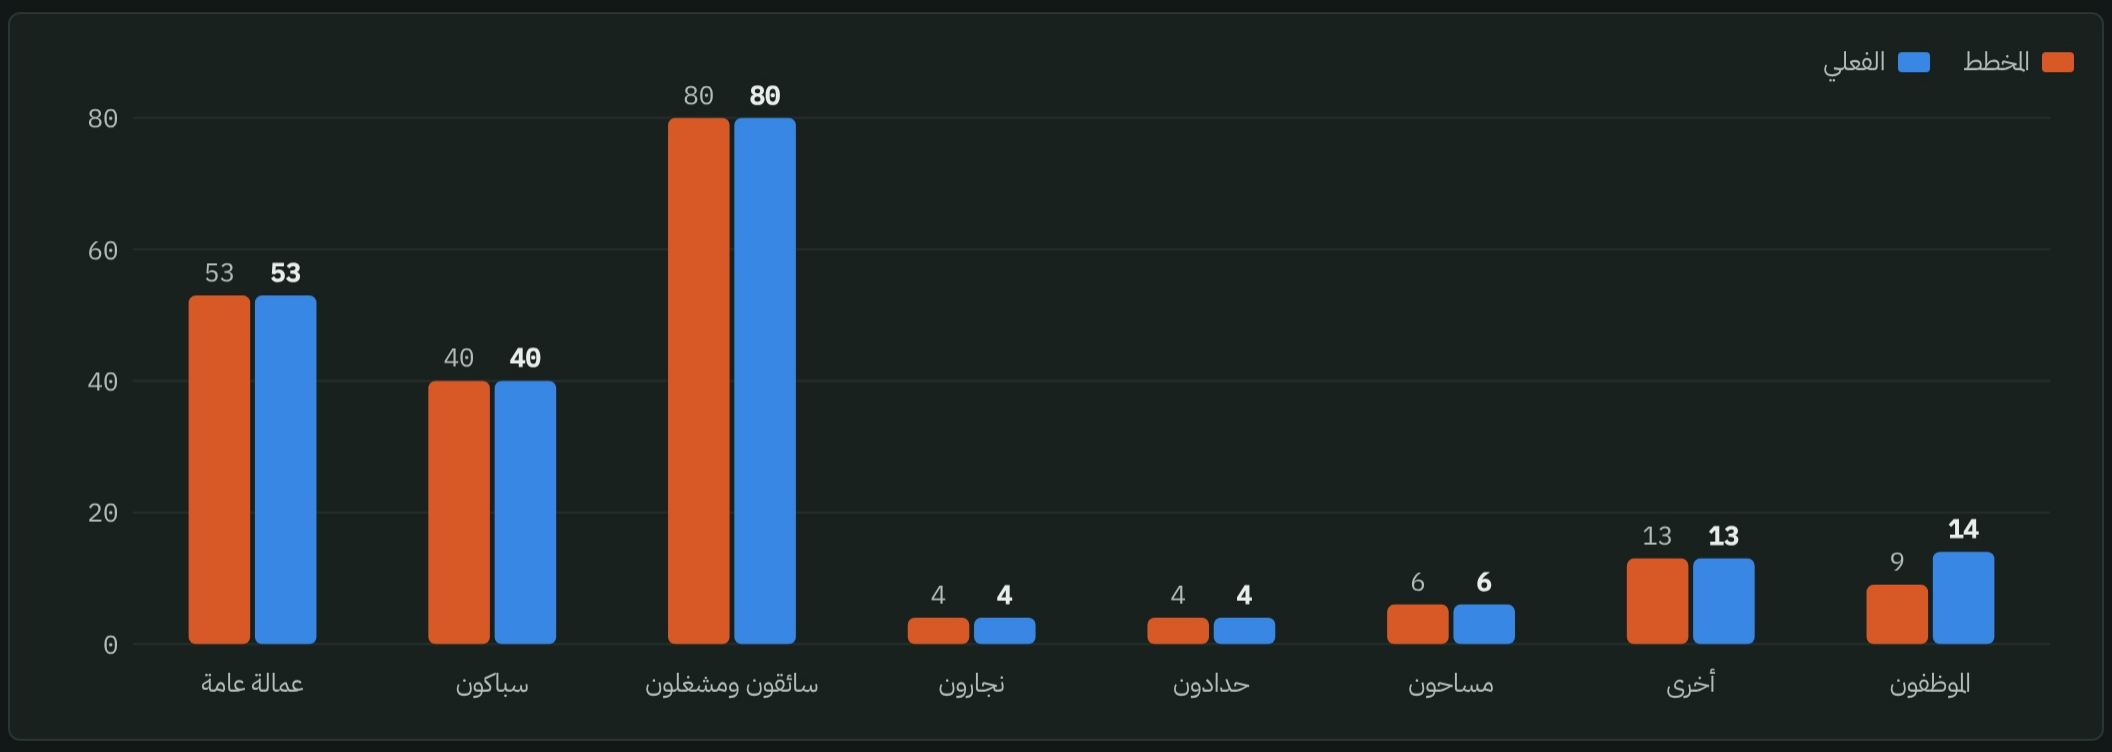

إجمالي العمالة 214 مقابل 209 مخططاً: 200 عامل مقابل 200، و14 موظفاً مقابل 9. وفي الملف المحدّث أصبحت الخطة لكل مهنة مساوية للفعلي (مثلاً 4 نجارين و4 حدادين و80 سائقاً ومشغلاً)، لذا لم تعد خطة المهن تُظهر أي عجز. والمعدات في الموقع 100 وحدة مقابل 78 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الطرق والرصف	31,308,119
تصريف مياه الأمطار	33,717,595
الصرف الصحي ومحطات الرفع	24,177,287
مياه الشرب	10,220,942
الري	6,738,491
إنارة الشوارع والاتصالات	6,440,353
الجهد المتوسط	4,788,987
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**117,391,774**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	135,000,540
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. سجل أوامر التغيير فارغ، ويذكر التقرير تغييراً محتملاً واحداً.

المستخلصات

الدفعة المقدمة (10%)	11,739,177
المستخلصات الجارية المقدمة	20
القيمة الإجمالية	50,649,221
استرداد الدفعة المقدمة	5,064,922
المحتجزات / الغرامات	0 / 0
المعتمد من مدير المشروع - مدن	50,649,221
المدفوع (19 مستخلصاً)	43,414,468

المفوتر 43.1% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 78.5%. وأصبح المستخلص 19 مسجلاً كمدفوع. أما المستخلص 20 (من 01-سبتمبر إلى 30-سبتمبر-2026، بقيمة إجمالية 7,234,753 ريال) فمعتمد وبانتظار الدفع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.82

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	398,698
ساعات العمل هذا الأسبوع	9,600
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	5
حوادث وشيكة	1
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	96 / 320
تفتيش السلامة من الاستشاري، 27-أكتوبر-2026	0.84

أرقام تراكمية. هذا الأسبوع: جلستا تعريف بالسلامة و6 اجتماعات توعية.

الجودة التقييم 0.90

طلبات الفحص الميداني الصادرة (تراكمي)	1,881
طلبات الفحص المغلقة	1,791
طلبات الفحص المعلقة (0–10 أيام)	90
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	21 / 21
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	13 / 12
طلبات فحص المواد الصادرة	0
المخططات التنفيذية المقدمة (جميعها بالرمز B)	23
اعتمادات المواد (A / B / C / D)	1 / 72 / 2 / 1

تُغلق تقارير عدم المطابقة خلال 7 أيام في المتوسط. ولا يزال 7 من طلبات اعتماد المواد بانتظار الاعتماد.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
التأخر في الجدول الزمني	المقاول	يتوقع P6 الانتهاء في 07-سبتمبر-2027 بتأخير 239 يوماً، بينما يذكر التقرير الأسبوعي المحدّث 18-يناير-2027 دون ملف جدول زمني مطابق. والتقدم الفعلي متأخر عن الخطة بنسبة 8.1%. وإحصائيات الجدول في الملف (406 أنشطة متعثرة البدء و281 نشاطاً على المسار الحرج) تكرر قيم التقرير 92. ولا يوجد تسجيل لاعتماد جدول تعافٍ.
المواد طويلة الأجل	المقاول	الخطر 05، مرتفع وقائم: قد يؤدي تأخر توريد المواد طويلة الأجل إلى توقف العمل. المعالجة: متابعة الموردين والحصول على موافقة مدن على مصادر بديلة. الموعد المستهدف 20-نوفمبر-2026.
الربط بالشبكات القائمة	المقاول / مدن	الخطر 01، منخفض وقائم: قد لا تكون البنية التحتية القائمة جاهزة للربط، مما يؤخر التشغيل والتسليم. معلم الربط في P6 بتاريخ 24-أغسطس-2027 بفائض −192.5 يوماً.
الاختبار والتشغيل	المقاول	كان مخططاً بدء الاختبارات في 12-أكتوبر-2026 (الاتصالات) و18-أكتوبر-2026 (الري) و26-أكتوبر-2026 (إنارة الشوارع والجهد المتوسط). لم يبدأ أي منها، وتمتد تواريخ البدء المتوقعة من 12-نوفمبر-2026 إلى 04-يناير-2027.
شهادة عدم الممانعة لشبكة الجهد المتوسط	المقاول	شهادة عدم الممانعة من المالك لشبكة الجهد المتوسط لم تصدر بعد (P6: 22-ديسمبر-2026، بفائض −46 يوماً).

المغلق في السجلات: المياه الجوفية ونزحها (مرتفع)، وتأخر أو فشل الاختبارات، والمشكلتان المسجلتان (نقطة توصيل الري، وخط الضخ لمحطة الرفع). وسُجلت وفورات إعادة قياس جدول الكميات كفرصة متحققة.

ملاحظات على البيانات

أُعدّ من ملف التقرير 94 المحدّث (مجلد W05)، واستُخدم مجلد الأسبوع السابق (التقرير 92) فقط لحساب تغيرات الكميات هذا الأسبوع.

- غيّر الملف المحدّث مقياس التقدم من 43,571 ساعة عمل مخططة (لشبكات التنفيذ فقط) إلى 65,420 يوم عمل مخطط، يشمل الآن التجهيز والتصميم والتوريدات والاختبار. وانتقل التقدم الفعلي من 54.98% إلى 78.47%، والمخطط من 89.38% إلى 86.60%، بسبب تغيير الأساس وليس بسبب أعمال منفذة.
- يتوقع التقرير الأسبوعي المحدّث الانتهاء في 18-يناير-2027 (تأخير 7 أيام، وكان في النسخة الأولى 07-سبتمبر-2027 بتأخير 239 يوماً)، وتقدّمت معالم الشبكات أربعة إلى ستة أشهر. أما ملف P6 في المجلد نفسه فلم يتغير ولا يزال ينتهي في 07-سبتمبر-2027.
- في ورقة Physical-Chart Data يساوي الجهد المكتسب حتى سبتمبر الخطة المعدلة شهراً بشهر، والمخطط في الغلاف عند تاريخ البيانات (86.60%) أعلى من الخطة المعدلة لنهاية أكتوبر (83.11%).
- الجهد المخطط الأسبوعي 9,253 يوم عمل في ورقة Progress و9,189 في الغلاف (نحو 14% من الإجمالي في أسبوع واحد)، ويبدو ذلك خاطئاً. والمكتسب هذا الأسبوع 604.9 يوم عمل (0.92%).
- يُظهر الاختبار والتشغيل 4,173 يوم عمل مكتسباً (70.3%) دون أي قيمة مخططة، رغم أن ورقة الاختبارات لا تُظهر بدء أي اختبار.
- تكرر إحصائيات الجدول الآن قيم التقرير 92 (406 أنشطة متعثرة البدء مقابل 411 الأسبوع الماضي؛ 245 متقدماً و123 في الموعد و367 متأخراً)، وتغيّر عدد أنشطة المسار الحرج من 674 إلى 281، بينما لم يتغير ملف P6.

- القوى العاملة: أصبحت خطة كل مهنة مساوية للفعلي، والخطة اليدوية 200 (130 في النسخة الأولى)، وخطة المعدات 78 (11). وإجمالي المهن في الغلاف 120 مقابل 200 عامل، ولا يزال توقع الشهر القادم 1,148.
- لا يزال التقدم حسب هيكل العمل في الغلاف مزاحاً بصف واحد، وأُخذت الأرقام من ورقة Progress. ولا تزال ورقة الملخص العربية تعرض أرقاماً مبنية على التكلفة بوصفها "نسبة الإنجاز"، ويعتمد هذا التقرير التقدم الفعلي فقط.
- لم يُرفع التقرير 93، لذا تغطي تغيرات الكميات مقابل مجلد الأسبوع السابق (التقرير 92) 14 يوماً. ولا تزال ورقة أنشطة الأسبوع تكرر قائمة التقرير 92 بجدول كميات فارغ، وورقة Major Quantities وسجل التوريدات دون تغيير منذ التقرير 92.
- الأسبوع 93 هو أسبوع العقد المذكور في ورقة المعالم بالتقرير ("93 من 104")، ويطابق المدة من 12-يناير-2025 إلى 27-أكتوبر-2026 = 653 يوماً؛ ورقم ملف التقرير 94.
- تذكر ورقة الملخص تاريخ استلام الموقع 12-فبراير-2025 (12-يناير-2025 في التقرير الأسبوعي)؛ وقيمة تصريف السيول فيها 33,717,565 ريال مقابل 33,717,595 ريال في المستخلص؛ وتاريخ معلم الأعمال الترابية في الخطة الأساسية (24-مايو-2026) لاحق لانتهائه الفعلي (31-مايو-2025).
- لا يزال سجل التوريدات يتضمن كميات أعلى من المطلوبة (مواسير GRP للصرف الصحي 400 مم SN5000 بكمية 1,060 من 261 م) وأخطاء في الوحدات ("m132" و"m133"). ولا تزال ورقة تفتيش الصحة والسلامة تغطي الفترة من 26-أغسطس إلى 01-سبتمبر-2026.
- رمز المشروع في ملف P6 هو MOD3-J-1 (وكان MOD3-J-2 في تحديث 20-أكتوبر-2026)، ولا يزال اسم قائمة الأنشطة متعثرة البدء يحمل تاريخ 20-10-2026.
- تُظهر عدة حقول في الغلاف الخطأ !REF# (التكلفة المتوقعة عند الإنجاز، وأهم المشكلات)، ولا يزال سجل المستخلصات يحتوي على القيم الشاذة 21,100,000 و20,900,000.
- الصور: الصور الست المرفوعة مع التقرير 94 دون تغيير، ولا يظهر عليها ختم تاريخ.

أُعدّ في 02-نوفمبر-2026 من ملف التقرير الأسبوعي 94 المحدّث وتحديث P6، وكلاهما بتاريخ بيانات 27-أكتوبر-2026.
