شبكات البنية التحتية للمنطقة اللوجستية لمساحة 1 كم مربع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

Infrastructure Networks for the 1 km² Logistics Zone, 2nd Industrial City, Dammam

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة شبه الجزيرة للمقاولات	إيجيس (Egis)	محمد العيسى	30-Jul-2025	29-Jan-2027

النطاق: المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية. الشبكات الرطبة (الصرف الصحي، وتصريف السيول، ومياه الشرب، ومكافحة الحريق، والمياه المعالجة، بما فيها خط الضخ الرئيسي)، والشبكات الجافة (الجهد المتوسط، والجهد المنخفض، والإنارة، والاتصالات)، ومحطة ضخ مياه الشرب، ومحطة رفع الصرف الصحي، وغرف الحراسة، وجميع طبقات الطرق حتى الطبقة الإسفلتية السطحية، وتنسيق المواقع.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026 بلغ الإنجاز 60.7% مقابل 76.0% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 15.3% عن الخطة (مؤشر الأداء الزمني 0.80). وأنجز هذا الأسبوع مقابل 4.9% مخططاً، فاتسعت الفجوة من 13.2% إلى 15.3%. 2.8%

نسبة الإنجاز الفعلي
60.7% / 76.0% مخطط
مؤشر الأداء الزمني 0.80 ▼ −15.3%

التقدم هذا الأسبوع
2.8% / 4.9% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 2.1%

المدة المنقضية من العقد
82.8% · اليوم 454 من 548
▼ التسليم المتوقع 08-مارس-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
31.6% · 62.9 مليون ريال
7 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 15-سبتمبر-2026

مع انقضاء 82.8% من مدة العقد، يتبقى 39.3% من الأعمال.

يتطلب الإنهاء بحلول تاريخ انتهاء العقد 29-يناير-2027 نحو 3.0% أسبوعياً خلال الأسابيع الثلاثة عشر الكاملة المتبقية، مقابل 2.8% تحققت هذا الأسبوع. وتتوقع ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي وتحديث P6 الآن تسليم المشروع في 08-مارس-2027، أي بتأخير 38 يوماً، وبعد توقع الأسبوع الماضي بأسبوع. والتنفيذ هو المرحلة الأضعف: 50.0% منجز مقابل 78.2% مخطط.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من الموقع رُفعت مع التقرير الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026، وتحمل ختم الكاميرا من 22 إلى 25 أكتوبر 2026 حيث يظهر الختم. تُظهر الصور طبقات الطرق وتمديد المواسير وأعمال العزل والمنشآت. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




رش الطبقة التأسيسية (Prime Coat)

رشاشة البيتومين على طبقة أساس الطريق. ختم الكاميرا 24-أكتوبر-2026، 16:32، الدمام.



اختبار عينات الأسفلت

أخذ عينة لبّية من طبقة الأسفلت الجديدة. ختم الكاميرا 22-أكتوبر-2026، 09:19، الدمام.

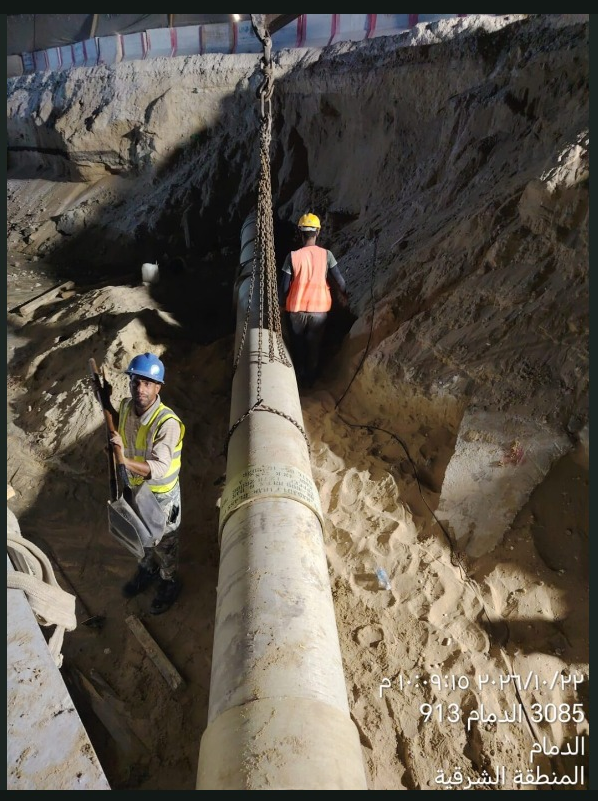

تمديد المواسير في خندق عميق

إنزال ماسورة كبيرة وضبط استقامتها. ختم الكاميرا 22-أكتوبر-2026، 21:15، الدمام.



أعمال العزل

طلاء بيتوميني على منشأ خرساني مدفون. ختم الكاميرا 25-أكتوبر-2026، 07:44، الدمام.



تسليح بلاطة المحطة

شبكة حديد التسليح مثبتة داخل الجدران الخرسانية. لا يوجد ختم تاريخ.




جدار بلوك

جدار بلوك مبني بين أعمدة داخل القوالب. لا يوجد ختم تاريخ.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) بقيم نهاية كل شهر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data. قيمة أكتوبر الفعلية هي قيمة 27 أكتوبر.

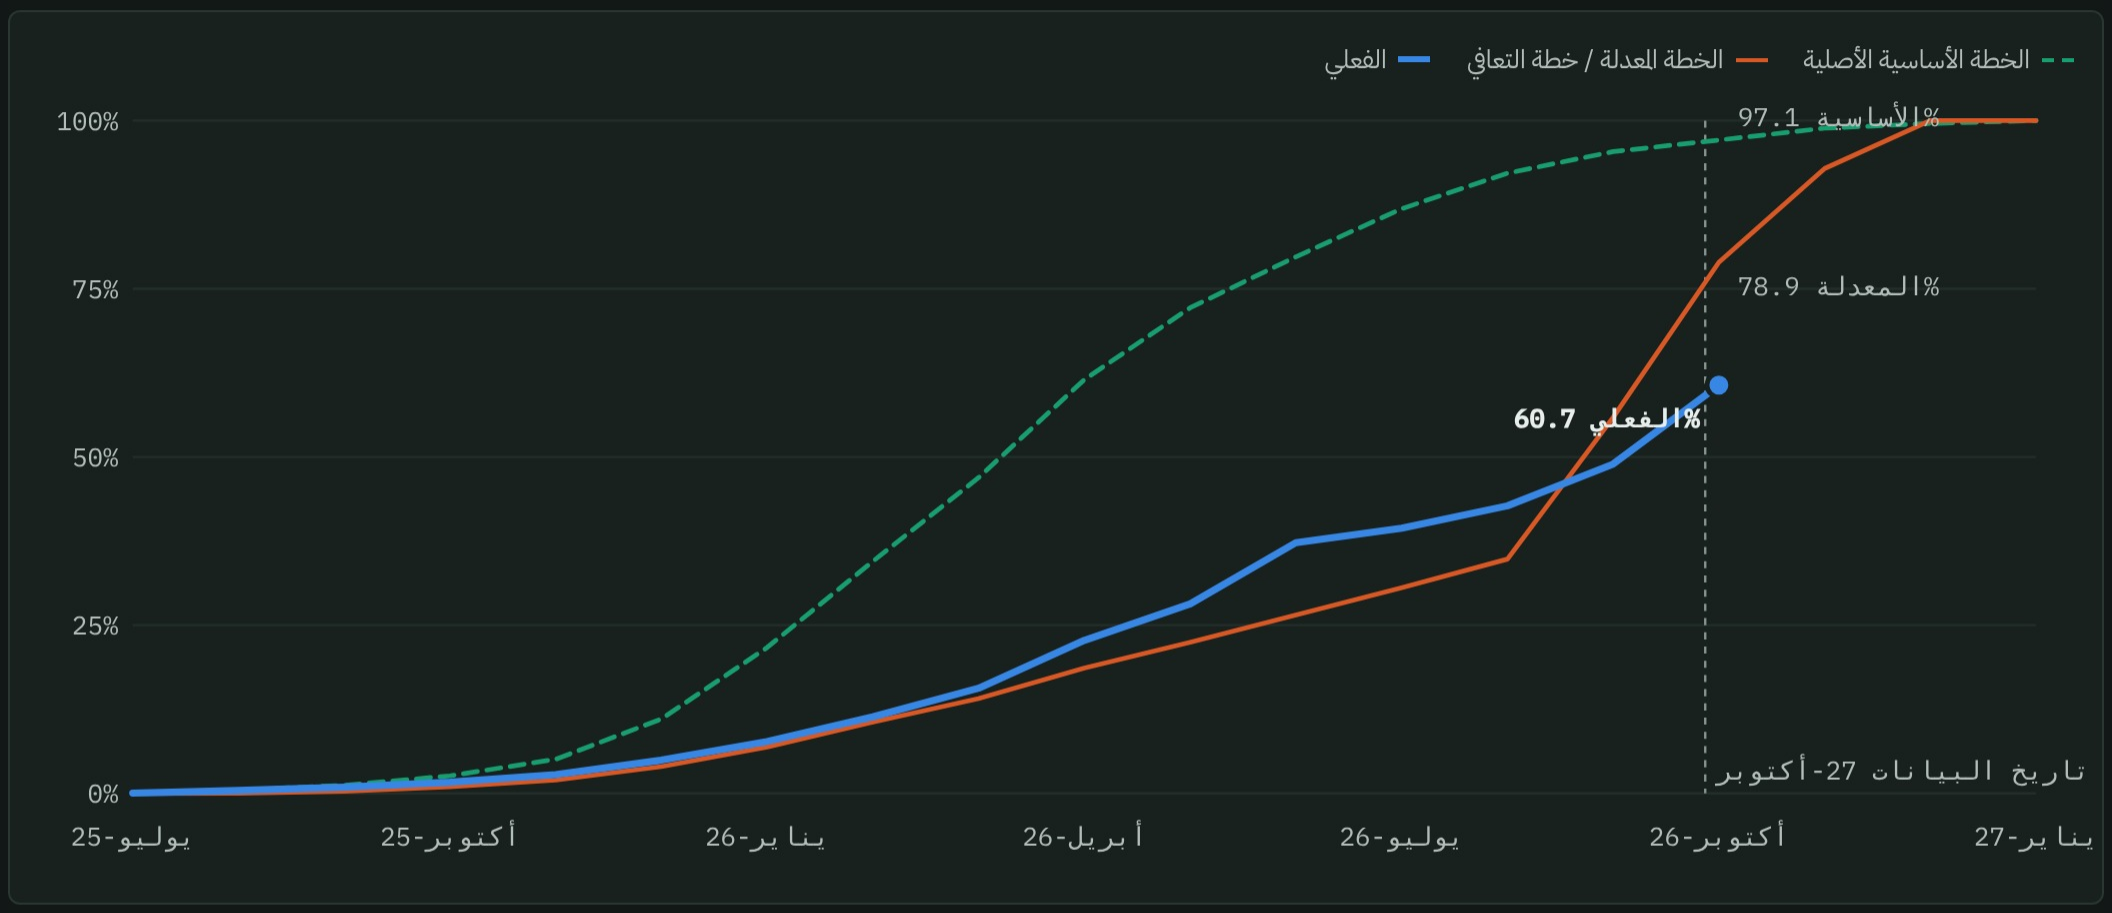

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026*	65.6	55.8	-9.7	—	0.85
20-Oct-2026	71.1	57.9	-13.2	+2.1	0.81
27-Oct-2026	**76.0**	**60.7**	**-15.3**	**+2.8**	**0.80**

القيم الأسبوعية من التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 20 و27 أكتوبر. * صف 13 أكتوبر مشتق من تقرير 20 أكتوبر: القيم حتى تاريخه مطروحاً منها قيم ذلك الأسبوع. ويعدّل تقرير هذا الأسبوع بعض القيم الفعلية الشهرية (سبتمبر 2026: 48.9% بعد أن كانت 49.7%). ويبلغ توقع المقاول 81.8% بنهاية نوفمبر و100% في يناير 2027.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب المرحلة، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة، مجموعاً لكل الشبكات من ورقة Progress.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الإزالة والأعمال الترابية	2.9%	100.0%	96.7%	-3.3	0.97	▼ متأخر قليلاً
التصميم الهندسي	3.0%	100.0%	97.3%	-2.7	0.97	▼ متأخر قليلاً
التوريدات	27.0%	94.3%	92.7%	-1.6	0.98	▼ متأخر قليلاً
التنفيذ	57.1%	78.2%	50.0%	-28.2	0.64	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	10.0%	0.0%	14.1%	+14.1	-	▲ بدأ مبكراً
الإجمالي	100%	**76.0%**	**60.7%**	**-15.3**	**0.80**	▼ متأخر

الشبكة / حزمة العمل	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الإزالة وتنظيف الموقع	0.4%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
الأعمال الترابية وتسوية الموقع	2.5%	100.0%	96.2%	-3.8	0.96	▼ متأخر قليلاً
شبكة الصرف الصحي	8.1%	86.4%	85.9%	-0.4	1.00	▲ في المسار
شبكة تصريف السيول	15.6%	89.7%	84.4%	-5.4	0.94	▼ متأخر قليلاً
شبكة مياه الشرب	6.3%	81.0%	62.4%	-18.6	0.77	▼ متأخر
شبكة مكافحة الحريق	6.9%	76.0%	58.6%	-17.4	0.77	▼ متأخر
شبكة المياه المعالجة	5.2%	67.2%	45.2%	-22.0	0.67	▼ متأخر
محطة ضخ مياه الشرب	7.8%	81.3%	68.0%	-13.2	0.84	▼ متأخر
محطة رفع الصرف الصحي	7.7%	86.5%	70.1%	-16.4	0.81	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	3.7%	75.3%	46.9%	-28.5	0.62	▼ متأخر
شبكة الجهد المنخفض	3.4%	68.9%	35.5%	-33.4	0.51	▼ متأخر
شبكة الإنارة	8.3%	54.1%	38.1%	-16.0	0.70	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	6.8%	67.6%	48.1%	-19.6	0.71	▼ متأخر
أعمال الطرق	8.7%	70.0%	34.4%	-35.7	0.49	▼ متأخر
تنسيق المواقع	4.9%	31.4%	31.6%	+0.1	1.00	▲ في المسار
غرف الحراسة	3.7%	92.2%	76.9%	-15.3	0.83	▼ متأخر
الإجمالي	100%	**76.0%**	**60.7%**	**-15.3**	**0.80**	▼ متأخر

الأوزان هي ساعات العمل المخططة. ولم تُكتسب هذا الأسبوع أي ساعات عمل في شبكات المياه المعالجة والجهد المتوسط والجهد المنخفض وأعمال الطرق ومحطة الضخ وتنسيق المواقع. ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) عدد 4,851 نشاطاً: 2,667 مكتملاً و400 قيد التنفيذ و1,784 لم يبدأ. وارتفعت الأنشطة المتأخرة عن موعد بدئها من 1,047 إلى 1,092.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026. تعطي الورقة إجماليات الموقع كاملاً فقط، دون مناطق ودون أرقام الردم. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير منذ تقرير 20-أكتوبر-2026.

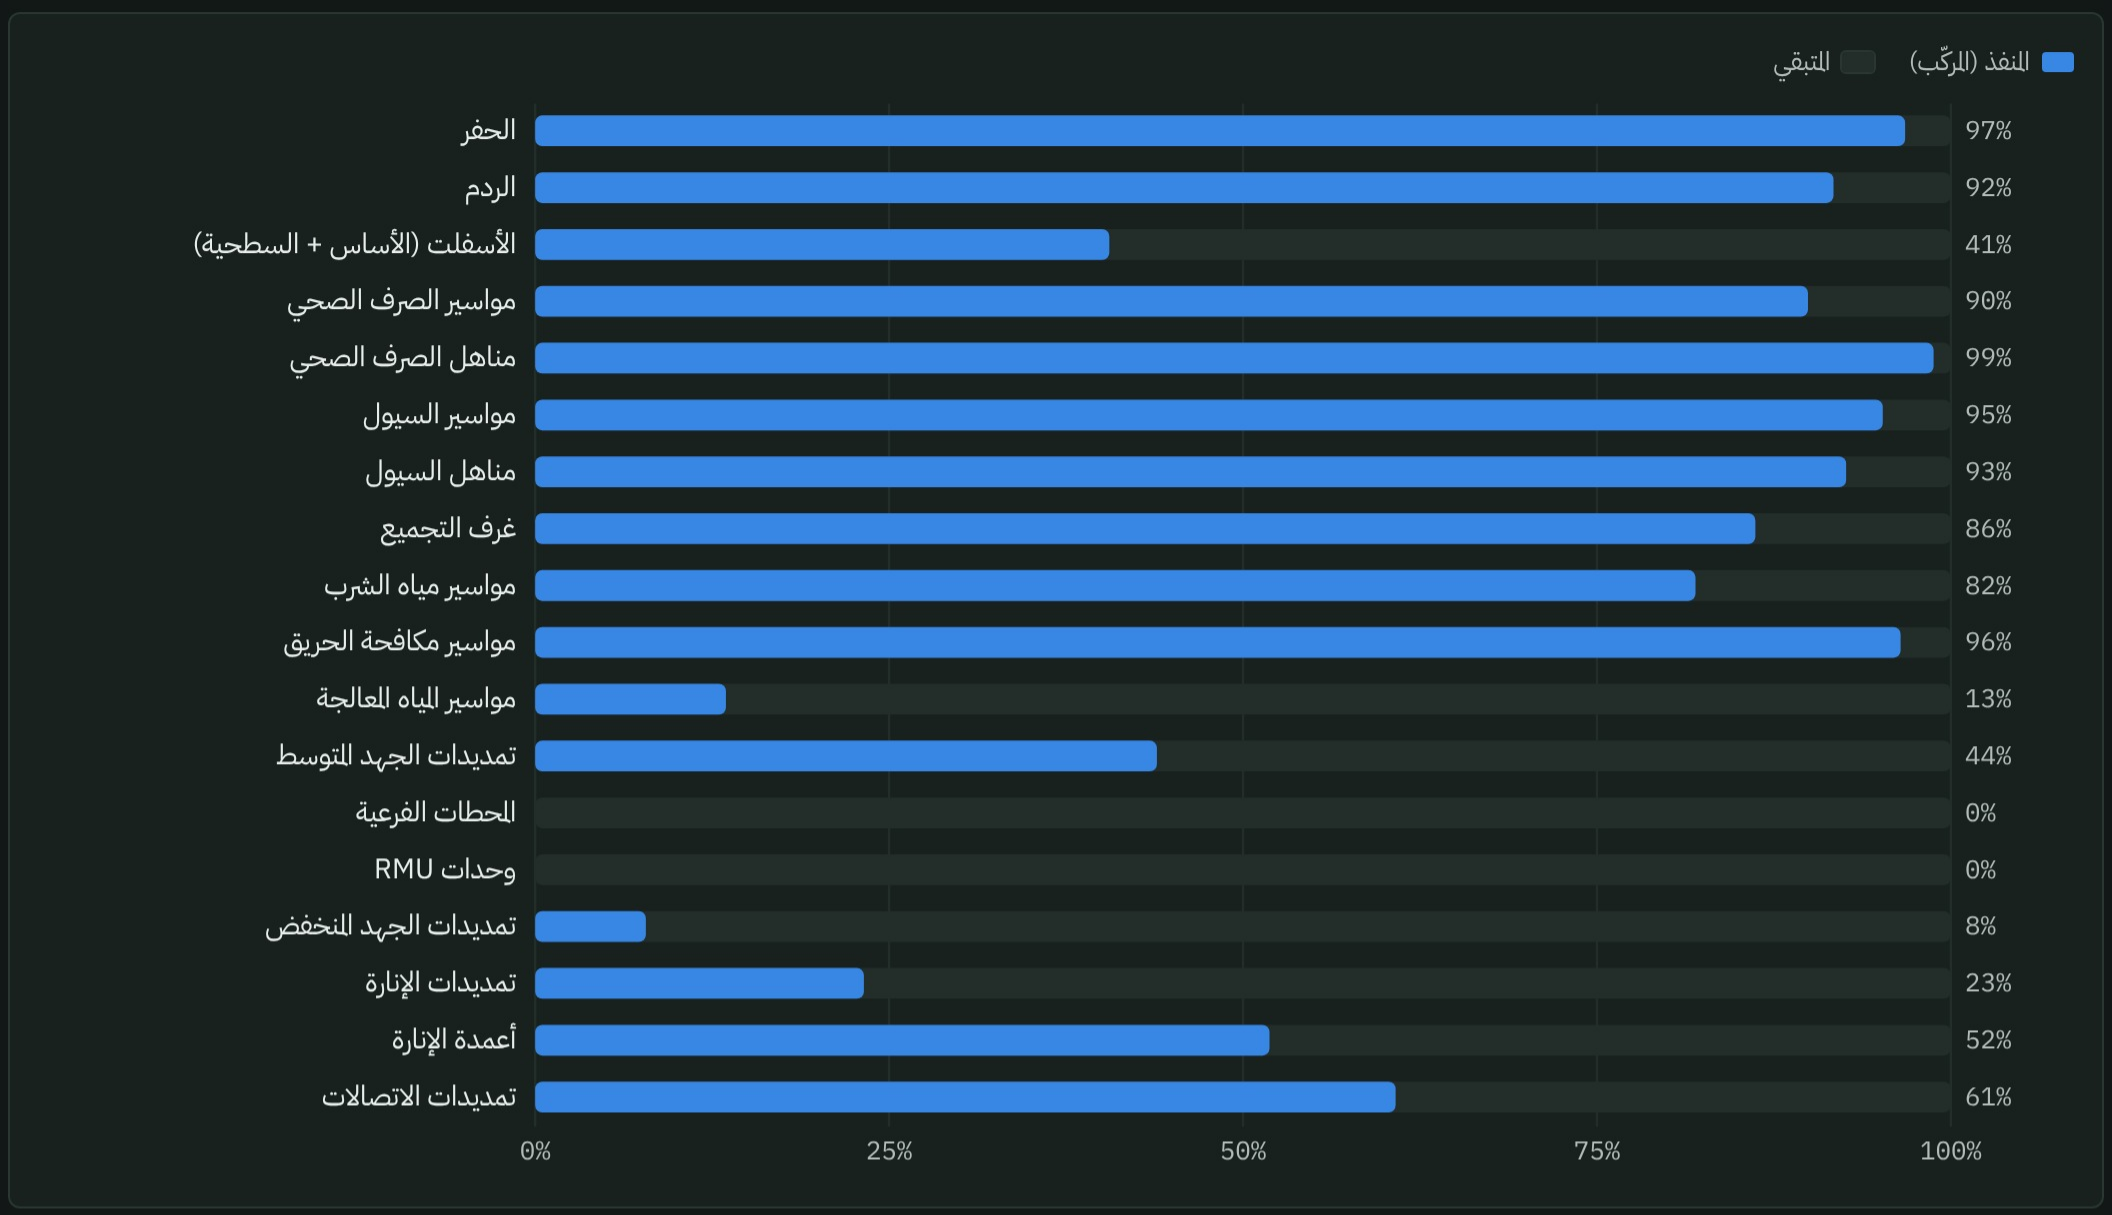

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر	الكل	م³	853,395	825,821	0	27,574	96.8%	–
الردم	الكل	م³	1,481,028	1,358,225	2,184+	122,803	91.7%	–
الأسفلت (الأساس + السطحية)	الكل	م³	64,334	26,091	235.3+	38,243	40.6%	–
مواسير الصرف الصحي	الكل	م.ط	7,567	6,803	29.4+	763.9	89.9%	–
مناهل الصرف الصحي	الكل	عدد	136	134.3	3.1+	1.7	98.8%	–
مواسير السيول	الكل	م.ط	14,821	14,108	194.2+	713	95.2%	–
مناهل السيول	الكل	عدد	160	148.2	2.1+	11.8	92.6%	–
غرف التجميع	الكل	عدد	338	291.3	10.9+	46.7	86.2%	–
مواسير مياه الشرب	الكل	م.ط	7,214	5,913	235.2+	1,301	82.0%	–
مواسير مكافحة الحريق	الكل	م.ط	6,355	6,129	378.3+	225.7	96.4%	–
مواسير المياه المعالجة	الكل	م.ط	57,419	7,737	0	49,682	13.5%	–
تمديدات الجهد المتوسط	الكل	م.ط	12,559	5,516	390.8+	7,043	43.9%	–
المحطات الفرعية	الكل	عدد	3	0	0	3	0.0%	–
وحدات RMU	الكل	عدد	3	0	0	3	0.0%	–
تمديدات الجهد المنخفض	الكل	م.ط	14,370	1,124	440.1+	13,246	7.8%	–
تمديدات الإنارة	الكل	م.ط	21,525	4,998	1,791+	16,527	23.2%	–
أعمدة الإنارة	الكل	عدد	565	293.1	45.8+	271.9	51.9%	–
تمديدات الاتصالات	الكل	م.ط	11,057	6,720	4,362+	4,337	60.8%	–

تمديدات الاتصالات والشبكات الرطبة الأكثر تقدماً

زادت تمديدات الاتصالات بمقدار 4,362 م.ط لتبلغ 60.8%، وتمديدات الإنارة بمقدار 1,791 م.ط لتبلغ 23.2%، ومواسير مكافحة الحريق بمقدار 378 م.ط لتبلغ 96.4%. ومواسير السيول مركّبة بنسبة 95.2%، ومواسير الصرف الصحي 89.9%، ومواسير مياه الشرب 82.0%.

المياه المعالجة والجهد المنخفض والأسفلت متأخرة كثيراً

الأسفلت المنفذ 26,091 م³ مقابل 57,014 م³ مخططاً حتى تاريخه (40.6% من الإجمالي)، ولم يُضف هذا الأسبوع سوى 235 م³. ومواسير المياه المعالجة دون تغيير عند 13.5%، وتمديدات الجهد المنخفض عند 7.8%. ولم تُركّب أي من المحطات الفرعية الثلاث أو وحدات RMU الثلاث.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية والتوقع من ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي، وتواريخ P6 والفائض الكلي من تحديث P6 بتاريخ بيانات 27-أكتوبر-2026.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	30-Jul-2025	30-Jul-2025	30-Jul-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	30-Aug-2025	30-Aug-2025	25-Nov-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال الأعمال الترابية	15-Sep-2026	01-Sep-2026 (−14 يوماً)	–	–	؟ تاريخ التوقع انقضى
اكتمال التقديمات وطلبات المواد طويلة الأجل	24-Sep-2026	31-Oct-2026 (+37 يوماً)	–	–	▼ متأخر
توريد جميع المعدات والمواد	03-Dec-2026	31-Oct-2026 (−33 يوماً)	–	–	؟ يتعارض مع التوريدات
جميع الشبكات الرطبة	22-Nov-2026	24-Dec-2026 (+32 يوماً)	24-Dec-2026	63	▼ متأخر
الأعمال الكهربائية	24-Nov-2026	14-Dec-2026 (+20 يوماً)	06-Jan-2027	53	▼ متأخر
محطة ضخ مياه الشرب	–	–	09-Dec-2026	26	● مجدول
محطة رفع الصرف الصحي	–	–	22-Dec-2026	40	● مجدول
أعمال الطرق والطبقة الإسفلتية السطحية	–	–	29-Dec-2026	5	▼ معرّض للتأخير
انتهاء التنفيذ	–	–	14-Jan-2027	11	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	14-Jan-2027	21-Feb-2027 (+38 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال إخلاء الموقع	25-Jan-2027	03-Mar-2027 (+37 يوماً)	–	–	▼ متأخر
تسليم المشروع	29-Jan-2027	08-Mar-2027 (+38 يوماً)	08-Mar-2027	0	▼ متأخر

يُنهي تحديث P6 المشروع في 08-مارس-2027، أي بعد تاريخ انتهاء العقد بـ38 يوماً.

تأخرت جميع معالم P6 عدا الاتصالات 7 أيام، بمقدار تقدم تاريخ البيانات نفسه، فلا يُظهر التحديث أي تعافٍ. ولا يتضمن الجدول قيداً للانتهاء عند تاريخ العقد، لذا يُقاس الفائض مقابل تاريخ انتهائه المتأخر. وللطبقة الإسفلتية السطحية فائض 5 أيام فقط، ولانتهاء التنفيذ 11 يوماً. وتوقعات أخرى في ملفات هذا الأسبوع: 21-فبراير-2027 (ورقة المعلومات العامة)، و20-ديسمبر-2026 (برنامج التعافي في عرض التقدم)، و30-نوفمبر-2026 (ورقة الأعمال القادمة).

توريد المواد الرئيسية

نسبة ما ورد إلى الموقع من كل مادة طويلة الأجل. المصدر: تحديث التوريدات الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026.
وحسب التخصص (ورقة Quality-Stat) وصلت إلى الموقع 114 من 155 مادة: المدني والطرق 61 من 77،
والكهرباء 22 من 30، والميكانيكا 31 من 48.



المحطات الفرعية ووحدات RMU ولوحات المحطات لم تُورَّد


لم تصل إلى الموقع أي من المحطات الفرعية الثلاث أو وحدات RMU الخمس، وكان موعد توريدها 30-أكتوبر-2026 "خلال أسبوعين من الدفع". ومكثفات تحسين القدرة ومراكز التحكم في المحركات ولوحات التحكم المحلية مستحقة بحلول 11-نوفمبر-2026، ونظام PLC ومقاييس المنسوب بحلول 19-نوفمبر-2026. وكان الموعد المخطط لاكتمال توريد مواد الكهرباء والميكانيكا 27 و28 سبتمبر 2026.

صنبور إطفاء الحريق والمحابس وتمديدات الإنارة

لم يُورَّد سوى 13 من 82 صنبور إطفاء حريق رغم أن موعد التوريد كان 07-يوليو-2026. والمحابس 61 من 121، وتمديدات الإنارة 6,054 من 20,000 م.ط، وكلاهما مستحق بحلول 15-نوفمبر-2026. وخزانات التضاغط الثلاثة والرافعتان مستحقة بحلول 15 و20 نوفمبر 2026.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (الموظفون والعمالة)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

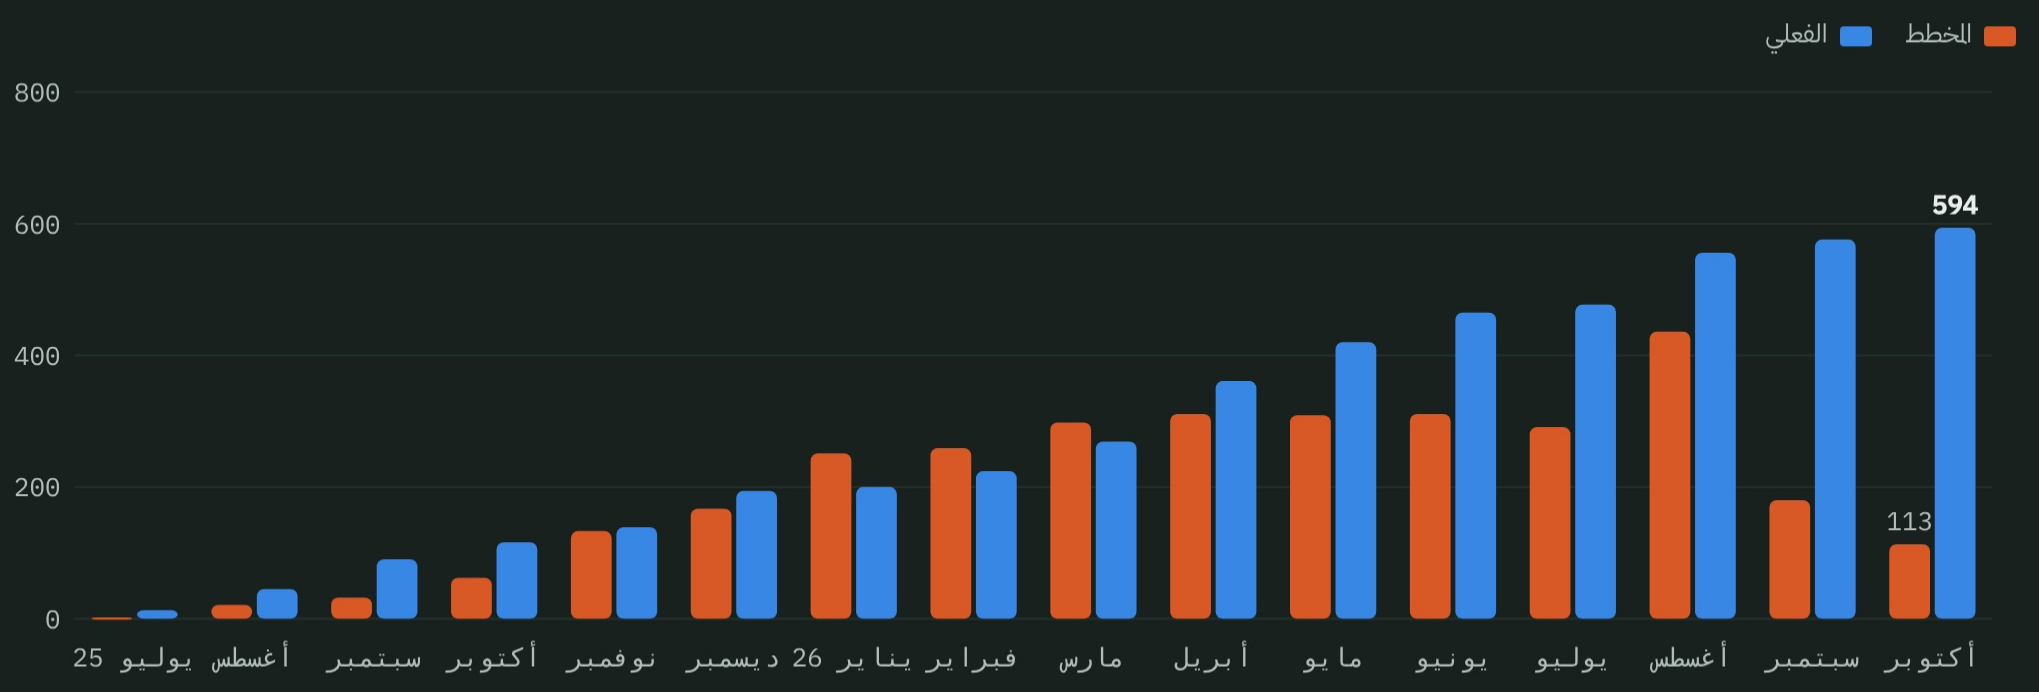

عدد العاملين في أكتوبر 594 (57 موظفاً و537 عاملاً) مقابل 113 مخططاً، دون تغيير عن الأسبوع الماضي. بلغت خطة القوى العاملة ذروتها عند 436 في أغسطس 2026 وهي تنخفض رغم تأخر الأعمال، فلم تعد تعكس الأعمال المتبقية. ويتوقع المقاول 675 في نوفمبر. والمعدات في الموقع 328 مقابل 166 مخططاً.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	198,906,162.61
قيمة العقد المعدلة	198,906,162.61
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ والتغييرات المحتملة 0.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	7
القيمة الإجمالية	62,889,673.53
الخصومات والغرامات	−104,500
الصافي شاملاً الضريبة	72,218,624.56
معتمدة من الاستشاري	7
معتمدة من مدير المشروع - مدن / مدفوعة	0 / 0

المفوتر 31.6% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 60.7%. لم يُقدَّم مستخلص جديد هذا الأسبوع. والمستخلصات السبعة جميعها معتمدة من الاستشاري، لكن لم يُسجَّل أي منها معتمداً من مدير المشروع في مدن أو مدفوعاً. يجب تأكيد حالة الدفع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.93

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	909,462
ساعات العمل هذا الأسبوع	34,740
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة (تراكمي)	148 (895)
اجتماعات التوعية (تراكمي)	57 (9,091)

تفتيش الاستشاري للسلامة بتاريخ 27-أكتوبر-2026. الأرقام بين الأقواس كما وردت في التقرير.

الجودة التقييم 0.93

طلبات الفحص: صادرة / مغلقة / معلقة	4,914 / 4,687 / 227
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	120 / 117 / 3
تعليمات الموقع: صادرة / مغلقة	52 / 42
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة	51 / 50
المخططات التنفيذية المعتمدة	1,774 من 1,774
المواد المعتمدة	140 من 155

تفتيش الاستشاري للجودة بتاريخ 27-أكتوبر-2026. أُضيف هذا الأسبوع 215 طلب فحص و4 طلبات فحص مواد. وتُظهر الصفحة الأولى من التقرير 4 تقارير عدم مطابقة صادرة و3 مغلقة، انظر ملاحظات على البيانات.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
قلة عدد العمالة والمعدات وتوقف مقاول الباطن	المقاول	أُسند جزء من المشروع لمقاول آخر وتوفّر الشركة عمالة من لديها، ويذكر عرض التقدم وجود 537 عاملاً و304 معدات و24 مضخة نزح في الموقع. ويجب استمرار زيادة العمالة والمعدات لتحقيق مستهدفات مدن. مفتوحة منذ 01-أبريل-2026 (209 أيام).
تأخر أعمال العبّارة بالطريق الشرياني	المقاول	تم صب أسقف 32 فاصلاً وحفر الفاصل الأخير المتبقي، والعمل الآن بانتظار اعتماد الشركة السعودية للكهرباء لمقترح حماية الكابل القائم. مفتوحة منذ 01-يونيو-2026 (148 يوماً).
ضرورة الانتهاء من الشبكات قبل أعمال الطرق	أخرى	تم استبعاد مقاول الباطن يوناسكو وسحب اعتماده لعدم وفائه بمستهدفات مدن، ويعمل المقاول على الشبكات مباشرة، وقد انقضى موعده المستهدف لإنهائها في 19-سبتمبر-2026. مفتوحة منذ 01-يونيو-2026 (148 يوماً).

يتضمن سجل المخاطر البنود الثلاثة نفسها، وجميعها مفتوحة ومصنفة عالية الاحتمال وعالية الأثر بعد المعالجة.

ملاحظات على البيانات

- أسبوع التقرير: يذكر التقرير الأسبوعي "Current Contract Weeks: 65 of 78" (ورقة Milestones). ورقم التقرير التسلسلي (WPR 047) ورقم تفتيش الاستشاري (47) ليسا رقم الأسبوع.
- قيم هذا الأسبوع ناتجة عن مقارنة هذا التقرير بتقرير 20-أكتوبر-2026 (مجلد الأسبوع السابق). وصف 13 أكتوبر في منحنى التقدم مشتق من تقرير 20 أكتوبر.
- أربعة توقعات مختلفة للانتهاء: 21-فبراير-2027 (ورقة المعلومات العامة، −23 يوماً)، و08-مارس-2027 (ورقة المعالم وتحديث P6، −38 يوماً)، و20-ديسمبر-2026 (برنامج التعافي في عرض التقدم)، و30-نوفمبر-2026 (ورقة الأعمال القادمة والتاريخ "المستهدف" في العرض).
- لا يتضمن تحديث P6 قيداً للانتهاء، لذا لا يظهر أي نشاط بفائض سالب رغم أنه ينتهي بعد تاريخ العقد. وتأخرت جميع المعالم عدا الاتصالات 7 أيام، بمقدار تقدم تاريخ البيانات. و215 نشاطاً قيد التنفيذ لها تواريخ انتهاء قبل تاريخ البيانات.
- تخفض ورقة Physical-Chart Data هذا الأسبوع قيماً فعلية شهرية سابقة (مايو من 28.9% إلى 28.2%، ويوليو من 40.1% إلى 39.4%، وسبتمبر من 49.7% إلى 48.9%).
- تتعارض الكميات وساعات العمل هذا الأسبوع: تضيف ورقة Major Quantities عدد 391 م.ط من تمديدات الجهد المتوسط و440 م.ط من تمديدات الجهد المنخفض و235 م³ من الأسفلت، بينما لم تُكتسب أي ساعات عمل في حزم الجهد المتوسط والجهد المنخفض وأعمال الطرق.
- التجهيز: يذكر التقرير الأسبوعي 30-أغسطس-2025 تاريخاً فعلياً، بينما يذكر معلم P6 "Mobilization - Finish" تاريخ 25-نوفمبر-2025.
- انقضى تاريخ توقع "اكتمال الأعمال الترابية" 01-سبتمبر-2026 ولا يزال مسجلاً كتوقع، والأعمال الترابية عند 96.2%. ويتعارض توقع "توريد جميع المواد" في 31-أكتوبر-2026 مع عدم وصول 41 من 155 مادة إلى الموقع.
- لا يزال سجل التوريدات في ملف التقرير غير صالح للاستخدام (كميات مورّدة تتجاوز المطلوبة، وخلايا #DIV/0! و#VALUE!، ورقم المشروع DAM2-01-029)، ولا يزال إجمالي التوريدات في الصفحة الأولى يكرر صف الميكانيكا. ويذكر عرض التوريدات 5 وحدات RMU بينما تذكر الكميات وشريحة الجهد المتوسط 3، ويذكر 377 عمود إنارة مورّداً مقابل 380 في شريحة الإنارة، و13 صنبور إطفاء حريق مقابل 12. كما يتضمن تواريخ غير صحيحة (15/111/26 و31/09/2026).
- تقارير عدم المطابقة: تُظهر الصفحة الأولى 4 صادرة و3 مغلقة، بينما تُظهر ورقة Quality-Stat عدد 51 صادرة و50 مغلقة.
- العمالة: تُظهر الصفحة الأولى 360 مخططاً و483 فعلياً، بينما تُظهر ورقة Manpower عدد 78 مخططاً و537 فعلياً لشهر أكتوبر.
- تختلف كميات الصرف الصحي بين الملفات: ورقة Major Quantities تذكر 6,803 من 7,567 م.ط (89.9%)، وورقة Conclusion تذكر 6,803 من 6,146 م.ط (110.7%)، والعرض يذكر 6,135 من 6,257 م.ط (98.1%). والمخططات التنفيذية: 1,774 معتمداً في ملف التقرير و1,818 في العرض.
- قيمة العقد 198,906,162.61 في الصفحة الأولى و198,906,162.312 "شاملة الضريبة" في ورقة Conclusion. ويتضمن سجل المستخلصات قيماً شاردة (21,100,000 و20,900,000 و200,000)، وتُظهر خلية التكلفة المتوقعة عند الإنجاز #REF!.
- تواريخ التقديمات الرئيسية في فبراير–مارس 2024، أي قبل ترسية العقد في 30-يونيو-2025. وتتضمن ورقة الأعمال القادمة بيانات P6 من مشروع المدينة الصناعية بحائل - المرحلة الثانية، ويستخدم سجل المخاطر رقم المشروع DAM2-01-029 ويذكر المدينتين الصناعيتين الثالثة والسادسة.
- لا يزال نص المشكلة 1 في ملف التقرير يذكر 304 عمال و184 معدة، بينما يذكر العرض 537 عاملاً و304 معدات.
- تعرض الصفحة الأولى من ملف التقرير وخطة التسريع في العرض تقدماً مبنياً على القيمة المالية أيضاً، ويعتمد هذا التقرير على التقدم الفعلي فقط.

أُعدّ في 01-نوفمبر-2026 من التقرير الأسبوعي بتاريخ بيانات 27-أكتوبر-2026 وتحديث P6 المرفق به، وعرضي التقدم والتوريدات بتاريخ 27-أكتوبر-2026، وتقرير 20-أكتوبر-2026 لقيم هذا الأسبوع.
