تطوير المناطق التقنية - الظهران

Development of the Technology City in Dhahran

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة أنساب للمقاولات العامة	إيجيس (EGIS)	م. عفات العنزي	06-Jan-2026	05-Mar-2027

النطاق: الطرق التجميعية والمحلية؛ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والمياه المعالجة والجهد المتوسط والإنارة والاتصالات؛ محطة رفع للصرف الصحي وبحيرات لتصريف السيول؛ السور وغرفة الحارس ومباني المرافق.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 20.8% مقابل 36.4% مخطط في الخطة الأساسية (مؤشر الأداء الزمني 0.57)، ومقابل 32.1% في خطة الاستعادة المقدمة من المقاول (مؤشر الأداء الزمني 0.65). أُنجز هذا الأسبوع 0.34% مقابل 0.54% مخطط.

نسبة الإنجاز الفعلي
20.8% / 36.4% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.57 −15.6%

التقدم هذا الأسبوع
+0.34% / +0.54% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.20%

المدة المنقضية من العقد
69.3% · اليوم 293 من 423
▼ انتهاء P6: 15-يوليو-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
11.3% · 10.5 مليون ريال
4 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 15-أكتوبر-2026

تحديث البرنامج الزمني ينهي المشروع متأخراً أكثر من أربعة أشهر.

يحدد تحديث P6 بتاريخ بيانات 26-أكتوبر-2026 انتهاء المشروع في 15-يوليو-2027، أي بعد 132 يوماً من تاريخ الانتهاء التعاقدي 05-مارس-2027. ولا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع الانتهاء في 05-مارس-2027 دون أي تغيير في المعالم. ويتطلب الانتهاء في الموعد إنجازاً فعلياً بنحو 4.4% أسبوعياً خلال الأسابيع الثمانية عشر المتبقية، مقابل 0.34% هذا الأسبوع.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور مضمّنة في ملف التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026، ولا تحمل أي منها ختم تاريخ أو إحداثيات. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




حفر الخنادق

حفّارة تفتح خندقاً للمواسير في أرض رملية.




خرسانة النظافة

عامل يسوّي خرسانة النظافة في حفرة قاعدة، مع تركيب أشاير التسليح.

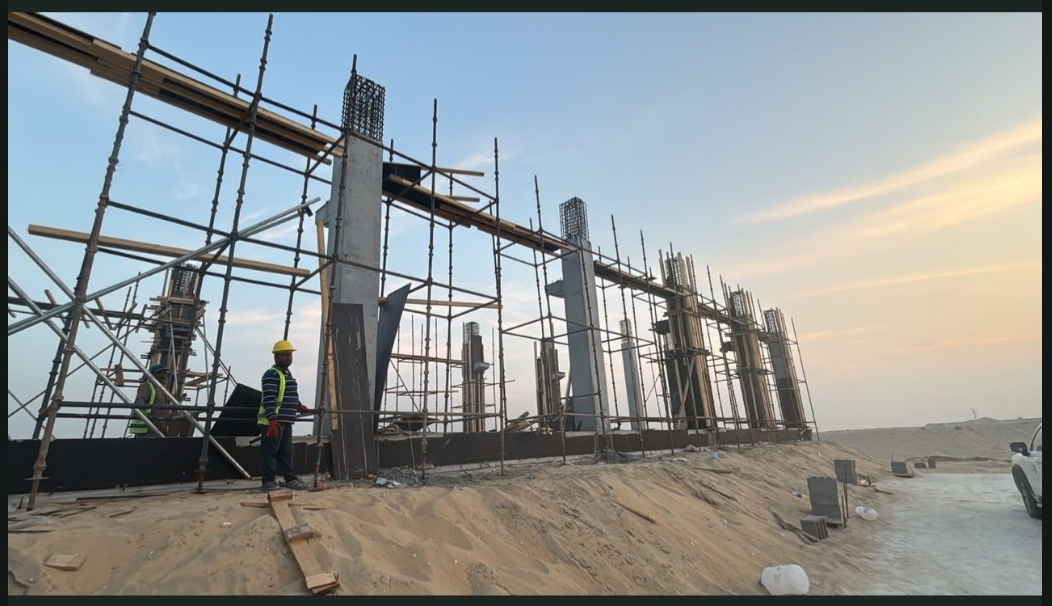

الأعمدة والسقالات

أعمدة خرسانية مسلحة مصبوبة على امتداد خط السور، مع السقالات.

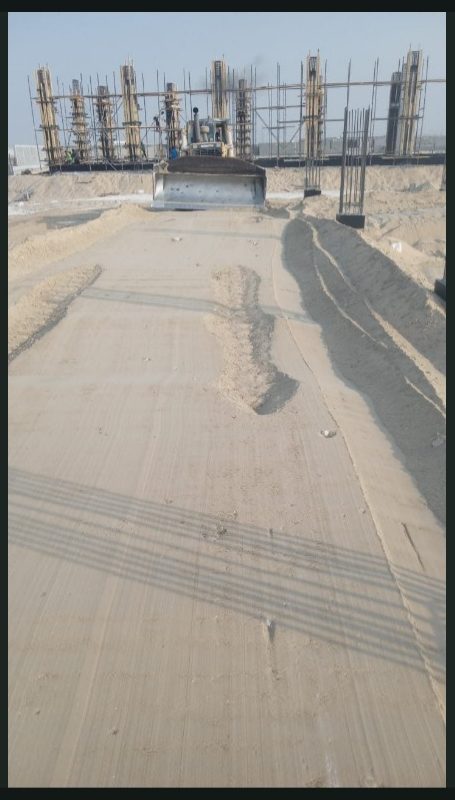


أعمال الردم

بلدوزر يفرد مواد الردم ويسوّيها، وخلفه صف الأعمدة.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

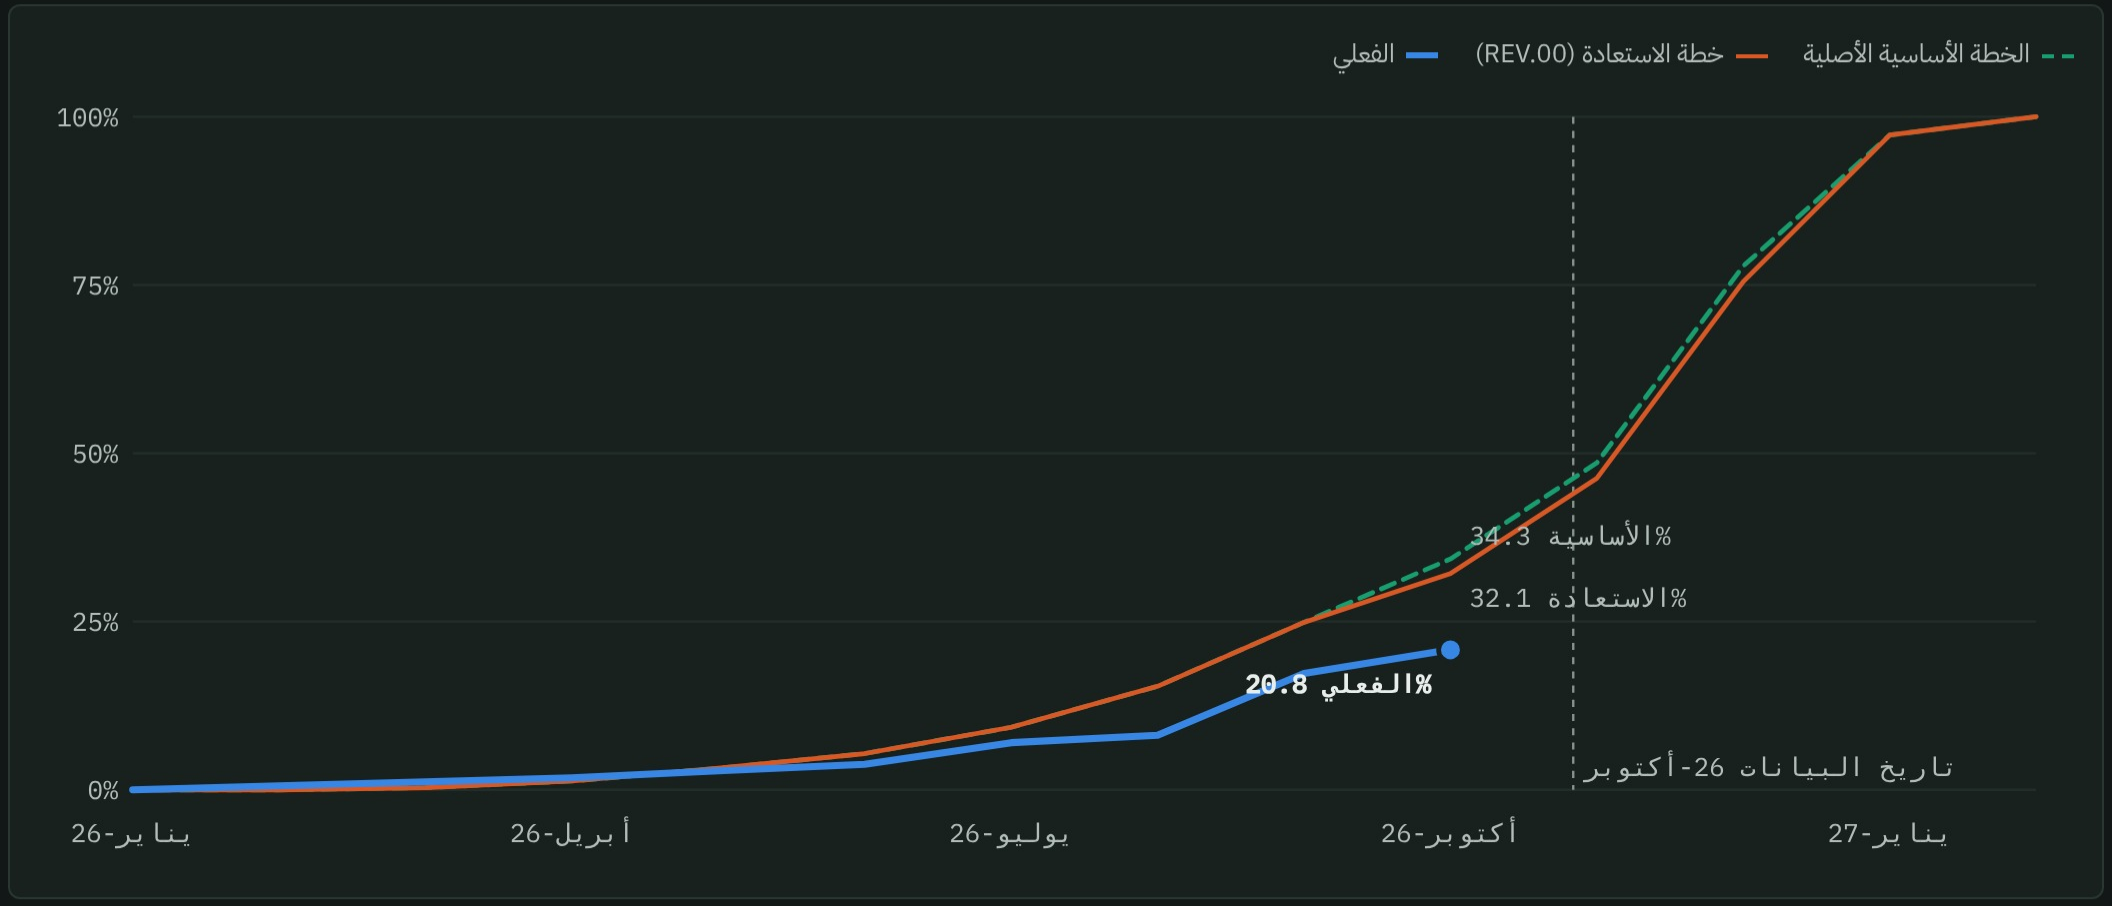

الشهر	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الشهر	مؤشر الأداء
مايو-2026	3.2	2.8	−0.5%	+1.0%	0.86
يونيو-2026	5.4	3.8	−1.6%	+1.0%	0.70
يوليو-2026	9.3	7.0	−2.3%	+3.2%	0.75
أغسطس-2026	15.4	8.1	−7.3%	+1.1%	0.52
سبتمبر-2026	24.9	17.3	−7.5%	+9.2%	0.70
26-Oct-2026	**36.4***	**20.8**	**−15.6%**	**+3.5%**	**0.57**

القيم المخططة من الخطة الأساسية الأصلية. لم تُرفع تقارير أسبوعية سابقة، لذا جاء الجدول شهرياً؛ أما إنجاز هذا الأسبوع (0.34%) فمأخوذ من الأعمدة الأسبوعية في التقرير. * يذكر ملخص التقدم أن المخطط حتى تاريخه 36.4%، بينما تعطي بيانات المنحنى الشهرية 34.3% لشهر أكتوبر. وتتطابق خطة الاستعادة مع الخطة الأساسية حتى سبتمبر وتعطي 32.1% لشهر أكتوبر.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة (131,328 ساعة إجمالاً). جميع ساعات العمل مدرجة تحت التنفيذ، ولا توجد ساعات للتصميم أو التوريدات أو الاختبار.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
السور وغرفة الحارس	28.5%	56.3%	51.1%	−5.2%	0.91	▼ متأخر قليلاً
شبكة الطرق	17.2%	0.0%	0.8%	+0.8%	–	▲ بدأ مبكراً
مباني المرافق	14.1%	59.6%	28.8%	−30.8%	0.48	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	10.6%	80.4%	19.3%	−61.0%	0.24	▼ متأخر
الزراعة والتشجير	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
شبكة الجهد المنخفض	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
شبكة مياه الشرب	4.1%	10.4%	0.0%	−10.4%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الصرف الصحي	3.1%	65.4%	0.0%	−65.4%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الإنارة	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
شبكة المياه المعالجة	2.6%	19.7%	0.0%	−19.7%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الري	2.2%	4.2%	0.0%	−4.2%	0.00	▼ لم يبدأ
كاميرات المراقبة (CCTV)	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
شبكة الجهد المتوسط	1.3%	23.9%	0.0%	−23.9%	0.00	▼ لم يبدأ
شبكة الاتصالات	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
التأثيث	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**36.4%**	**20.8%**	**−15.6%**	**0.57**	▼ متأخر

المخطط من الخطة الأساسية الأصلية. ومقابل خطة الاستعادة (32.1% حتى تاريخه) يبلغ مؤشر الأداء الزمني 0.65؛ وتقدّم خطة الاستعادة أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب والمياه المعالجة والري، وتؤخر أعمال تصريف السيول ومباني المرافق والجهد المتوسط. ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026) عدد 1,065 نشاطاً: 302 مكتملة و21 قيد التنفيذ و742 لم تبدأ.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الكلية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية، من ورقة الكميات الرئيسية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026. لم يُرفع تقرير أسبوعي سابق، لذا لا يمكن بعد تعبئة عمود "المنفذ هذا الأسبوع".



بند النطاق	الموقع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
الردم	الموقع العام	م³	1,050,000	428,344	–	621,656	40.8%
الحفر	الموقع العام	م³	61,715	35,987	–	25,728	58.3%
طبقة ما تحت الأساس	الطرق	م³	45,731	6,605	–	39,126	14.4%
طبقة الأساس الحصوية	الطرق	م³	22,866	0	–	22,866	0.0%
الطبقات الإسفلتية	الطرق	م³	15,254	0	–	15,254	0.0%
البردورات	الطرق	م.ط	46,423	0	–	46,423	0.0%
الإنترلوك	الطرق	م²	90,979	0	–	90,979	0.0%
التكسية الحجرية للبحيرات	بحيرات السيول	م²	7,985	3,594	–	4,391	45.0%
مواسير السيول	الشبكات	م.ط	7,221	0	–	7,221	0.0%
مناهل السيول وغرف التجميع	الشبكات	عدد	283	0	–	283	0.0%
مواسير الصرف الصحي وخط الضخ	الشبكات	م.ط	3,897	0	–	3,897	0.0%
مواسير مياه الشرب	الشبكات	م.ط	4,183	0	–	4,183	0.0%
مواسير الري	الشبكات	م.ط	8,954	0	–	8,954	0.0%

بند النطاق	الموقع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
مواسير المياه المعالجة	الشبكات	م.ط	5,421	0	–	5,421	0.0%
تمديدات الجهد المنخفض	الشبكات	م.ط	13,353	0	–	13,353	0.0%
تمديدات الاتصالات	الشبكات	م.ط	5,770	0	–	5,770	0.0%
أعمدة الإنارة	الشبكات	عدد	139	0	–	139	0.0%
خرسانة النظافة	السور وغرفة الحارس	م³	1,933	1,914	–	19	99.0%
	مباني المرافق	م³	248	111	–	137	44.8%
الإجمالي		م³	**2,181**	**2,025**	**–**	**156**	**92.8%**
القواعد	السور وغرفة الحارس	م³	2,119	2,102	–	17	99.2%
	مباني المرافق	م³	781	246	–	535	31.5%
الإجمالي		م³	**2,900**	**2,348**	**–**	**552**	**81.0%**
الأعمدة	السور وغرفة الحارس	م³	440	328	–	112	74.5%
	مباني المرافق	م³	137	33	–	104	24.1%
الإجمالي		م³	**577**	**361**	**–**	**216**	**62.6%**
الجدران	السور وغرفة الحارس	م³	1,328	996	–	332	75.0%
الميد	مباني المرافق	م³	460	460	–	0	100.0%
البلاطة الأرضية	مباني المرافق	م³	119	119	–	0	100.0%
أعمال الطوب	السور وغرفة الحارس	م²	11,754	4,260	–	7,494	36.2%
الدهان البيتوميني	السور وغرفة الحارس	م²	51,678	12,532	–	39,146	24.3%

المباني والأعمال الترابية

اكتملت قواعد السور وغرفة الحارس تقريباً، ووصلت الجدران إلى 75%. واكتملت الميد والبلاطات الأرضية لمباني المرافق، لكن أعمدتها عند 24%. ووصل الردم إلى 41% وطبقة ما تحت الأساس إلى 14%، والتكسية الحجرية لبحيرات السيول إلى 45%.

لم تُركّب أي شبكة بعد

لا توجد مواسير أو مناهل أو تمديدات مسجلة كمركّبة لأي شبكة. وتخطط الورقة لتركيب 5,698 م من مواسير السيول و1,768 م من مواسير الصرف الصحي حتى هذا التاريخ، ولم تبدأ أي من طبقات رصف الطرق.

المعالم الرئيسية

يُبقي التقرير الأسبوعي جميع المعالم على تواريخها في الخطة الأساسية، بينما يؤخر تحديث P6 معظمها من ثلاثة إلى تسعة أشهر. يُعرض الاثنان معاً لحسم الفرق مع المقاول.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	فرق P6 عن الخطة الأساسية (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	06-Jan-2026	06-Jan-2026	06-Jan-2026 (فعلي)	0	✓ منجز
خطة التنفيذ والبرنامج الزمني الأساسي	05-Feb-2026	05-Feb-2026	05-Feb-2026 (فعلي)	0	✓ منجز
اعتماد المخططات التنفيذية والمواد	16-Feb-2026	16-Feb-2026	22-Nov-2026	+279	▼ متأخر
التجهيز والتعبئة	08-Mar-2026	08-Mar-2026	07-Mar-2026 (فعلي)	−1	✓ منجز
شبكة مياه الشرب	14-Dec-2026	14-Dec-2026	12-May-2027	+149	▼ متأخر
شبكة الري	27-Dec-2026	27-Dec-2026	12-May-2027	+136	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	07-Jan-2027	07-Jan-2027	17-Apr-2027	+100	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	11-Jan-2027	11-Jan-2027	12-May-2027	+121	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	13-Jan-2027	13-Jan-2027	11-May-2027	+118	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	26-Jan-2027	26-Jan-2027	04-Mar-2027	+37	▼ معرّض للتأخير
شبكة المياه المعالجة	26-Jan-2027	26-Jan-2027	05-Jun-2027	+130	▼ متأخر

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	فرق P6 عن الخطة الأساسية (أيام)	الحالة
شبكة الإنارة	09-Feb-2027	09-Feb-2027	11-May-2027	+91	▼ متأخر
أعمال الطرق	–	–	12-May-2027	–	▼ بعد التاريخ التعاقدي
بحيرات تصريف السيول	–	–	05-May-2027	–	▼ بعد التاريخ التعاقدي
محطتا ضخ الصرف الصحي والمياه	–	–	23-Jun-2027	–	▼ بعد التاريخ التعاقدي
غرفة التحكم	–	–	12-Jul-2027	–	▼ بعد التاريخ التعاقدي
انتهاء المشروع	05-Mar-2027	05-Mar-2027	15-Jul-2027	+132	▼ متأخر

يختلف التقرير الأسبوعي وتحديث P6 في جميع المعالم غير المنجزة.

يعرض التقرير الأسبوعي جميع المعالم على تواريخها الأساسية دون أي تغيير، بما فيها اعتماد المخططات التنفيذية والمواد (16-فبراير-2026) الذي لم يُنجز بعد. أما تحديث P6 فيؤخر جميع الشبكات عن تواريخها الأساسية وينهي المشروع في 15-يوليو-2027. ولا يتضمن ملف P6 قيم الفائض الزمني، لذا لم يُعرض الفائض.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 26-أكتوبر-2026.



بدأ توريد المواسير فقط


وُرّد من مواسير مياه الشرب والمياه المعالجة والسيول ما بين 14% و26%. ولا تزال مواسير الصرف الصحي وجميع المناهل وغرف التجميع والأغطية والمحابس وصنبور إطفاء الحريق، وجميع بنود مواد المباني والخزانات (107 بنود) عند 0%.

توريدات مستحقة خلال الأسابيع القادمة

مناهل السيول مستحقة بين 28-أكتوبر و08-نوفمبر-2026، ومواسير السيول والصرف الصحي بحلول 25 و28-نوفمبر-2026، وغرف تجميع السيول بحلول 01-ديسمبر-2026.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (العمالة والموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة.

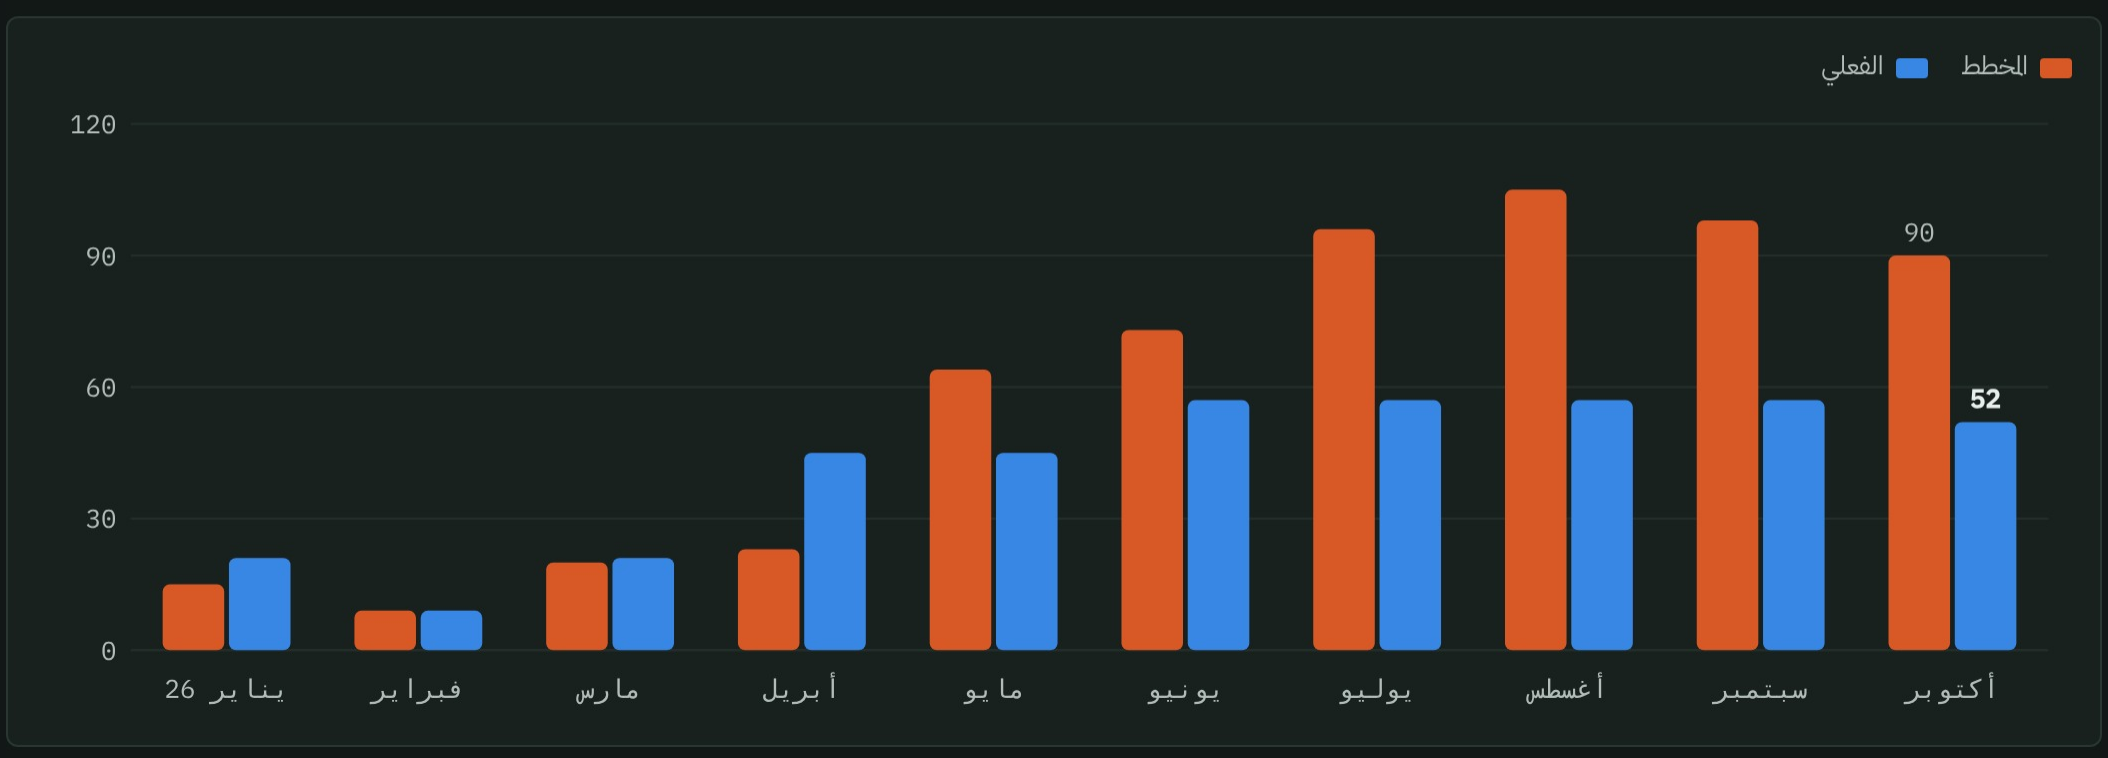

بلغ عدد العاملين في أكتوبر 52 مقابل 90 مخططاً (أقل بنسبة 42%): 30 عاملاً مقابل 81 مخططاً، و22 موظفاً مقابل 9 مخططين. وتبلغ العمالة المخططة ذروتها عند 96 في أغسطس 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	93,388,079
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0
الدفعة المقدمة (10%)	9,338,808

جميع القيم بالريال السعودي. ويذكر ملخص المشروع في الملف نفسه 93,388,697 شاملة ضريبة القيمة المضافة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	4
القيمة الإجمالية	10,524,342
المحتجزات	0
الخصومات والغرامات	165,500
الصافي	10,358,842
المعتمد من مدير المشروع / المصروف	0 / 0

بلغت المستخلصات 11.3% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 20.8%. ولم يُسجَّل أي من المستخلصات الأربعة كمعتمد من مدير المشروع أو مصروف.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.89

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	123,030
ساعات العمل هذا الأسبوع	3,900
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	28 / 9

الجودة التقييم 0.84

تقارير عدم المطابقة الصادرة / المفتوحة	4 / 4
تعليمات الموقع المفتوحة	5
طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	3 / 3
طلبات فحص المواد الصادرة	0
المخططات التنفيذية المقدمة	53
طلبات اعتماد المواد	19
طلبات اعتماد المواد لدى الاستشاري	5

ثلاثة تقارير عدم مطابقة مفتوحة منذ 31–60 يوماً. والتقييمان مأخوذان من قائمة تدقيق جودة بتاريخ 14-أبريل-2026 ومن تفتيش سلامة للفترة من 27-يناير إلى 03-فبراير-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
الدفعة المقدمة والمستخلصات	المالك	درجة الخطر 25 من 25. لا يزال تحديث P6 يُظهر استلام الدفعة المقدمة كنشاط لم يبدأ، ولم يُعتمد أو يُصرف أي من المستخلصات الأربعة.
اختبار الأعمال المنفذة	المقاول	درجة الخطر 20. قد يؤدي تأخر الاختبارات أو إخفاقها إلى إعادة العمل وتأخير التسليم.
الربط مع الشبكات القائمة	المالك / الاستشاري	درجة الخطر 16. قد لا تكون البنية التحتية القائمة جاهزة للربط، مما يؤخر التشغيل.
المياه الجوفية	المقاول	درجة الخطر 16. قد تحتاج الحفريات إلى نزح مستمر للمياه، مما يبطئ أعمال الخنادق والقواعد.
توريد المواد	المقاول	درجة الخطر 15. معظم مواد الشبكات لم تُورَّد بعد، في حين يُفترض حسب الخطة أن يكون التركيب قد تقدم كثيراً.

المصدر: ورقة سجل المخاطر. البندان الواردان في سجل المشكلات (المخلفات في الموقع والدفعة المقدمة) مسجلان كمغلقين. ويتضمن سجل المخاطر أيضاً فرصة: وفورات محتملة في جدول الكميات بعد إعادة حصر الكميات.

ملاحظات على البيانات

- لم يُرفع لهذا المشروع سوى تقرير أسبوعي واحد (مجلد W04)، لذا لا يمكن بعد حساب الأرقام الأسبوعية مثل الكميات المنفذة هذا الأسبوع.
- تذكر ورقة المعالم أن الأسبوع التعاقدي هو 42 من 60، واعتُمد رقماً لأسبوع التقرير. أما عدد الأسابيع الكاملة من تسليم الموقع حتى تاريخ البيانات فهو 41.
- التقدم المخطط حتى تاريخه 36.4% في ملخص التقدم، لكنه 34.3% لشهر أكتوبر في بيانات المنحنى الشهرية.

- يتوقع التقرير الأسبوعي الانتهاء في 05-مارس-2027 دون انحراف، بينما ينتهي كل من تحديث P6 وملخص هيكل تجزئة العمل (PDF) بتاريخ 26-أكتوبر-2026 في 15-يوليو-2027. أما ملخص خطة الاستعادة في بيانات المنحنى فينتهي في 06-مارس-2027.
- في جدول نظرة عامة على التقدم بلوحة المعلومات، اسما صفّي الطرق وكاميرات المراقبة متبادلان؛ لذا استُخدمت ورقة التقدم بدلاً منه.
- تصف ورقة الخلاصة ولوحة المعلومات التقدم المبني على التكلفة بأنه التقدم "الفعلي"؛ ولم يُستخدم في هذا التقرير.
- عنوان ورقة الخلاصة يذكر "الدمام"، وتذكر 260,000 م³ من الأعمال الترابية مقابل 428,344 م³ في ورقة الكميات الرئيسية، وتعطي أطوالاً للشبكات تختلف عن ورقة التوريدات (مثلاً مواسير السيول 4,838 م مقابل 4,672 م).
- يذكر ملخص المستخلصات تقديم 3 مستخلصات، بينما يسرد سجل المستخلصات 4 بإجمالي 10,524,342 ريال. ويُظهر السجل أيضاً قيمة عقد معدلة 21,100,000 وتكلفة متوقعة عند الإنجاز 20,900,000، ولا تتطابقان مع هذا العقد.
- تحمل عدة أوراق أرقام مشاريع أخرى أو تواريخ قديمة: قائمة تدقيق الجودة وملخص طلبات الفحص تستخدمان المشروع DHRT-02-001، وسجل المخاطر يستخدم DAMT-01-002 (الدمام)، وتفتيش السلامة يغطي الفترة من 27-يناير إلى 03-فبراير-2026.
- يغلق سجل المشكلات مشكلة الدفعة المقدمة، بينما يُظهرها كل من تحديث P6 وسجل المخاطر كمفتوحة.
- تعرض لوحة الموارد في لوحة المعلومات أعداد يناير (9.9 مخطط، 12 فعلي) بدلاً من أكتوبر.
- تذكر ورقة البرنامج الزمني 1,271 نشاطاً، بينما يحتوي ملف P6 المرفوع على 1,065.
- ينتهي منحنى التوقع للتقدم الفعلي عند 100.4% في فبراير 2027.
- تسجل ورقة التوريدات انتهاء توريد مواسير مياه الشرب في 09-يناير-2027 كتاريخ فعلي، رغم أنه تاريخ مستقبلي.
- ملف العرض المرفوع هو دليل تقرير مدن مع لقطة بيانات أقدم (الأسبوع التعاقدي 35 من 60، و95,730 ساعة عمل)؛ ولم تُستخدم أرقامه.
