# تقدم سير مشروع تطوير شبكات البنية التحتية في مدينة سدير للصناعة والأعمال – المرحلة الثانية – الجزء الثاني

## معلومات المشروع (Project information)

| | | | |
|---|---|---|---|
| المقاول(Contactor) | شركة تطوير التقنية للمقاولات | الاستشاري(Consultant) | شركة ايجيس السعودية للاستشارات |
| تاريخ استلام الموقع | 06-01-2026 م | مدة التنفيذ | 18 شهرًا ميلاديًا |
| بداية العقد | من تاريخ استلام الموقع | قيمة العقد (شامل ضريبة القيمة المضافة) | 193,923,948.00 ريال |
| نسبة الإنجاز المخطط له (Plan) | 37.90% | نسبة الإنجاز الفعلي (Actual) | 46.30% |

168,629,520

## ملخص جدول الكميات (Summary of Bill of Quantities)

| مكونات المشروع | التكلفة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) | النسبة الاجمالية |
|---|---|---|
| أعمال الطرق (Road) | 88,002,863.20 | 52.19% |
| شبكة تصريف مياه الأمطار (Storm) | 25,405,197.84 | 15.07% |
| شبكة الصرف الصحي (Sewer) | 7,071,026.55 | 4.19% |
| شبكة المياه المعالجة (TSE) | 4,147,557.33 | 2.46% |
| شبكة مياه الشرب (Potable) | 7,779,404.90 | 4.61% |
| الأعمال الكهربائية (Electrical) | 20,082,301.65 | 11.91% |
| أعمال تنسيق الموقع والري (Landscape & Irrigation) | 6,835,460.61 | 4.05% |
| أعمال كاميرات المراقبة (CCTV) | 9,305,707.92 | 5.52% |

## معالم البرنامج الزمني (Project Milestone)

| البند | التاريخ حسب الجدول الزمني | ملاحظة |
|---|---|---|
| Mobilization Finish Milestone | 5-Feb-26 | Finish |
| Baseline Submission Finish Milestone | 6-Apr-26 | Finish |
| Technical Submittals Finish Milestone | 16-Aug-26 | UP |
| Quality Lap Finish Milestone | 5-Feb-26 | Finish |
| RBF Finish Milestone | 5-Feb-26 | Finish |
| All Works Finish Milestone | 5-Jul-27 | UP |
| | | |
| | | |
| | | |

## نطاق المشروع(Project Scope)

| البند | الكمية الكلية | الكمية المنفذة | الكمية المتبقية | نسبة المنفذ |
|---|---|---|---|---|
| أعمال الطرق والرصف (ROD) | 15234 m | - | - | - |
| أعمال شبكة مياة الشرب (WAT) | 18,000 m | - | - | - |
| أعمال شبكة المياه المعالجة (TSE) | 16,000 m | - | - | - |
| أعمال شبكة الصرف الصحي (SEW) | 13,000 m | - | - | - |
| أعمال شبكة صرف مياه الأمطار (STR) | 14000 m | - | - | - |
| أعمال شبكة الري والمناظر الطبيعية (IRR&LANDSCAPE) | 29,000 m&12000 m2 | - | - | - |
| أعمال الشبكة الكهربائية (ELE) | 51,500 m | - | - | - |
| أعمال المراقبة بالكاميرات (CCTV) | 125 Nos | - | - | - |


## ملخص التوريدات (Supply Summary)

| البند | الكمية الكلية | الكمية الموردة | الكمية المتبقية | نسبة التوريد |
|---|---|---|---|---|
| GRP Pipes | 18337 | 17437 | 900 | 95.09% |
| UPVC Pipes | 4716 | 4716 | 0 | 100.00% |
| HDPE Pipes | 28557 | 28557 | 0 | 100.00% |
| Medium Voltage Cables | 51500 | 0 | 51500 | 0.00% |
| Low Voltage Cables | 68400 | 68400 | 0 | 100.00% |
| Manholes | 251 | 221 | 30 | 88.05% |
| Street Lighting Panels | 52 | 0 | 52 | 0.00% |

## التحديات والعوائق (Challenges and Obstacles)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

## موقع المشروع

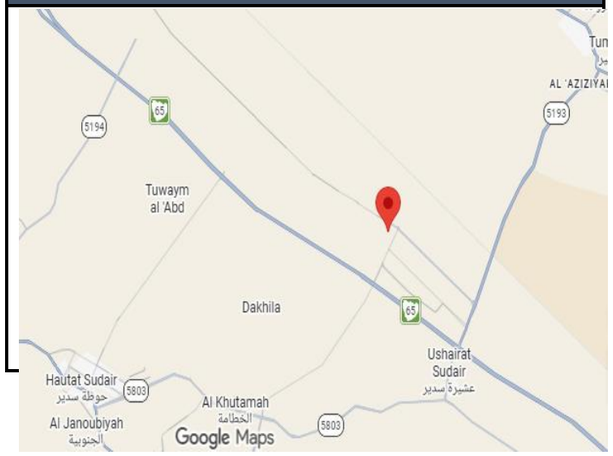


## تقدم أعمال layout

