مشروع تطوير شبكات البنية التحتية بالرياض الرابعة

Developing Infrastructure Networks in Riyadh's Fourth Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الرواف للمقاولات	شركة إيجيس للاستشارات الهندسية (EGIS)	شعيب الشعيبي	30-Nov-2025	30-May-2028

النطاق: بنية تحتية على مساحة نحو 6.5 كم² في المدينة الصناعية الرابعة بالرياض: الطرق والأنفاق، وشبكات الكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات والحماية، ومياه الشرب ومكافحة الحريق، والري، والصرف الصحي، وتصريف السيول، ومحطات رفع الصرف الصحي والسيول.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بنسبة إنجاز 23.6% مقابل 29.4% مخطط، المشروع متأخر بنسبة 5.8% (مؤشر الأداء الزمني 0.80). تقدم المشروع بنسبة 3.1% هذا الأسبوع. الأعمال الترابية متقدمة كثيراً على الخطة، بينما التوريدات وأعمال الشبكات في المناطق والأنفاق متأخرة.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
23.6% / 29.4% مخطط	**+3.1%** / −1.5% مخطط	**35.4%** · اليوم 323 من 912	**16.0%** · 71.0 مليون ريال
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.80 · −5.8%	؟ قيمة المخطط الأسبوعي سالبة	▼ الانتهاء المتوقع 06-فبراير-2029	8 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

التقرير الأسبوعي يتوقع انتهاء المشروع متأخراً نحو ثمانية أشهر.

يتوقع التقرير الأسبوعي الانتهاء في 06-فبراير-2029، أي بعد 252 يوماً من تاريخ انتهاء العقد في 30-مايو-2028. ويعطي مستخرج P6 في الملف نفسه تاريخ 13-فبراير-2029 بفائض زمني إجمالي −259 يوماً. وقد مرّ موعد معلم "اكتمال أعمال الجهد المتوسط والطرق" (30-سبتمبر-2026) ونسبة الأسفلت المنفذة 8.0% وشبكة الجهد المتوسط 0.3%.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من رفع 19-أكتوبر-2026 الأسبوعي، جميعها بختم GPS بتاريخ 13-أكتوبر-2026. طبقة الأساس والأسفلت والطبقة التأسيسية على الطريق RD-A-1 في المنطقتين 04 و05، وتحسين التربة والردم في البلوك BL-23. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال الأسفلت، RD-A-1، المنطقة 05

فرّادة تفرش طبقة الأساس الإسفلتية. ختم GPS بتاريخ 13-أكتوبر-2026، 07:24.



الطبقة التأسيسية (MC1)، RD-A-1، المنطقة 05

شاحنة رش تنفذ الطبقة التأسيسية MC1. ختم GPS بتاريخ 13-أكتوبر-2026، 16:09.



طبقة الأساس الحصوية، RD-A-1، المنطقة 05

فرّادات وقلابات تفرش طبقة الأساس. ختم GPS بتاريخ 13-أكتوبر-2026، 08:25.



طبقة الأساس الحصوية، RD-A-1، المنطقة 04

دحّال يدمك خلف الفرّادة. ختم GPS بتاريخ 13-أكتوبر-2026، 08:04.



الدمك بالصدم السريع، BL-23، المنطقة 07

معدة الدمك بالصدم (RIC) تدمك منسوب البلوك. ختم GPS بتاريخ 13-أكتوبر-2026، 08:59.



أعمال الردم، BL-23، المنطقة 09

بلدوزر يفرد الردم أثناء تفريغ قلاب. ختم GPS بتاريخ 13-أكتوبر-2026، 08:59.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة التقرير الأسبوعي، 19-أكتوبر-2026.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التصميم الهندسي	2.0%	100.0%	80.9%	−19.1%	0.81	▼ متأخر
التوريدات	8.2%	100.0%	5.1%	−94.9%	0.05	▼ متأخر
التنفيذ	78.7%	24.5%	27.5%	+3.0%	1.12	▲ متقدم
↳ الأعمال الترابية	21.9%	23.7%	71.6%	+47.9%	3.02	▲ متقدم
↳ أعمال المناطق (Z1–Z9)	50.7%	22.2%	8.0%	−14.3%	0.36	▼ متأخر
↳ الأنفاق	3.0%	93.8%	62.3%	−31.5%	0.66	▼ متأخر
↳ المحطات والقنوات المفتوحة والإزالة	3.1%	0.0%	0.1%	+0.1%	–	● لم يحن موعدها
الاختبار والتشغيل	11.2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعدها
الإجمالي	100%	**29.4%**	**23.6%**	**−5.8%**	**0.80**	▼ متأخر

في أعمال المناطق يتراوح مؤشر الأداء الزمني بين 0.01 (المنطقة 2) و0.52 (المنطقة 6)، ولم تبدأ المنطقة 1. وزن الأعمال التمهيدية والتصاريح أقل من 0.01%. وفق القيمة المكتسبة المالية يبلغ الإنجاز 21.0% مقابل 22.2% مخطط (مؤشر الأداء 0.95)؛ ويعتمد هذا التقرير الإنجاز الفعلي.

نطاق العمل: الكميات

إجمالي النطاق والكمية المنفذة والمتبقية لكل بند، من شريحة تفصيل جدول الكميات في عرض التقدم بتاريخ 19-أكتوبر-2026 (وهي نفس أرقام ورقة الكميات الرئيسية في الملف). الكميات للمشروع كاملاً وليست حسب المنطقة. لا يذكر التقرير الأخير كميات الأسبوع الماضي، لذا عمود "المنفذ هذا الأسبوع" فارغ.

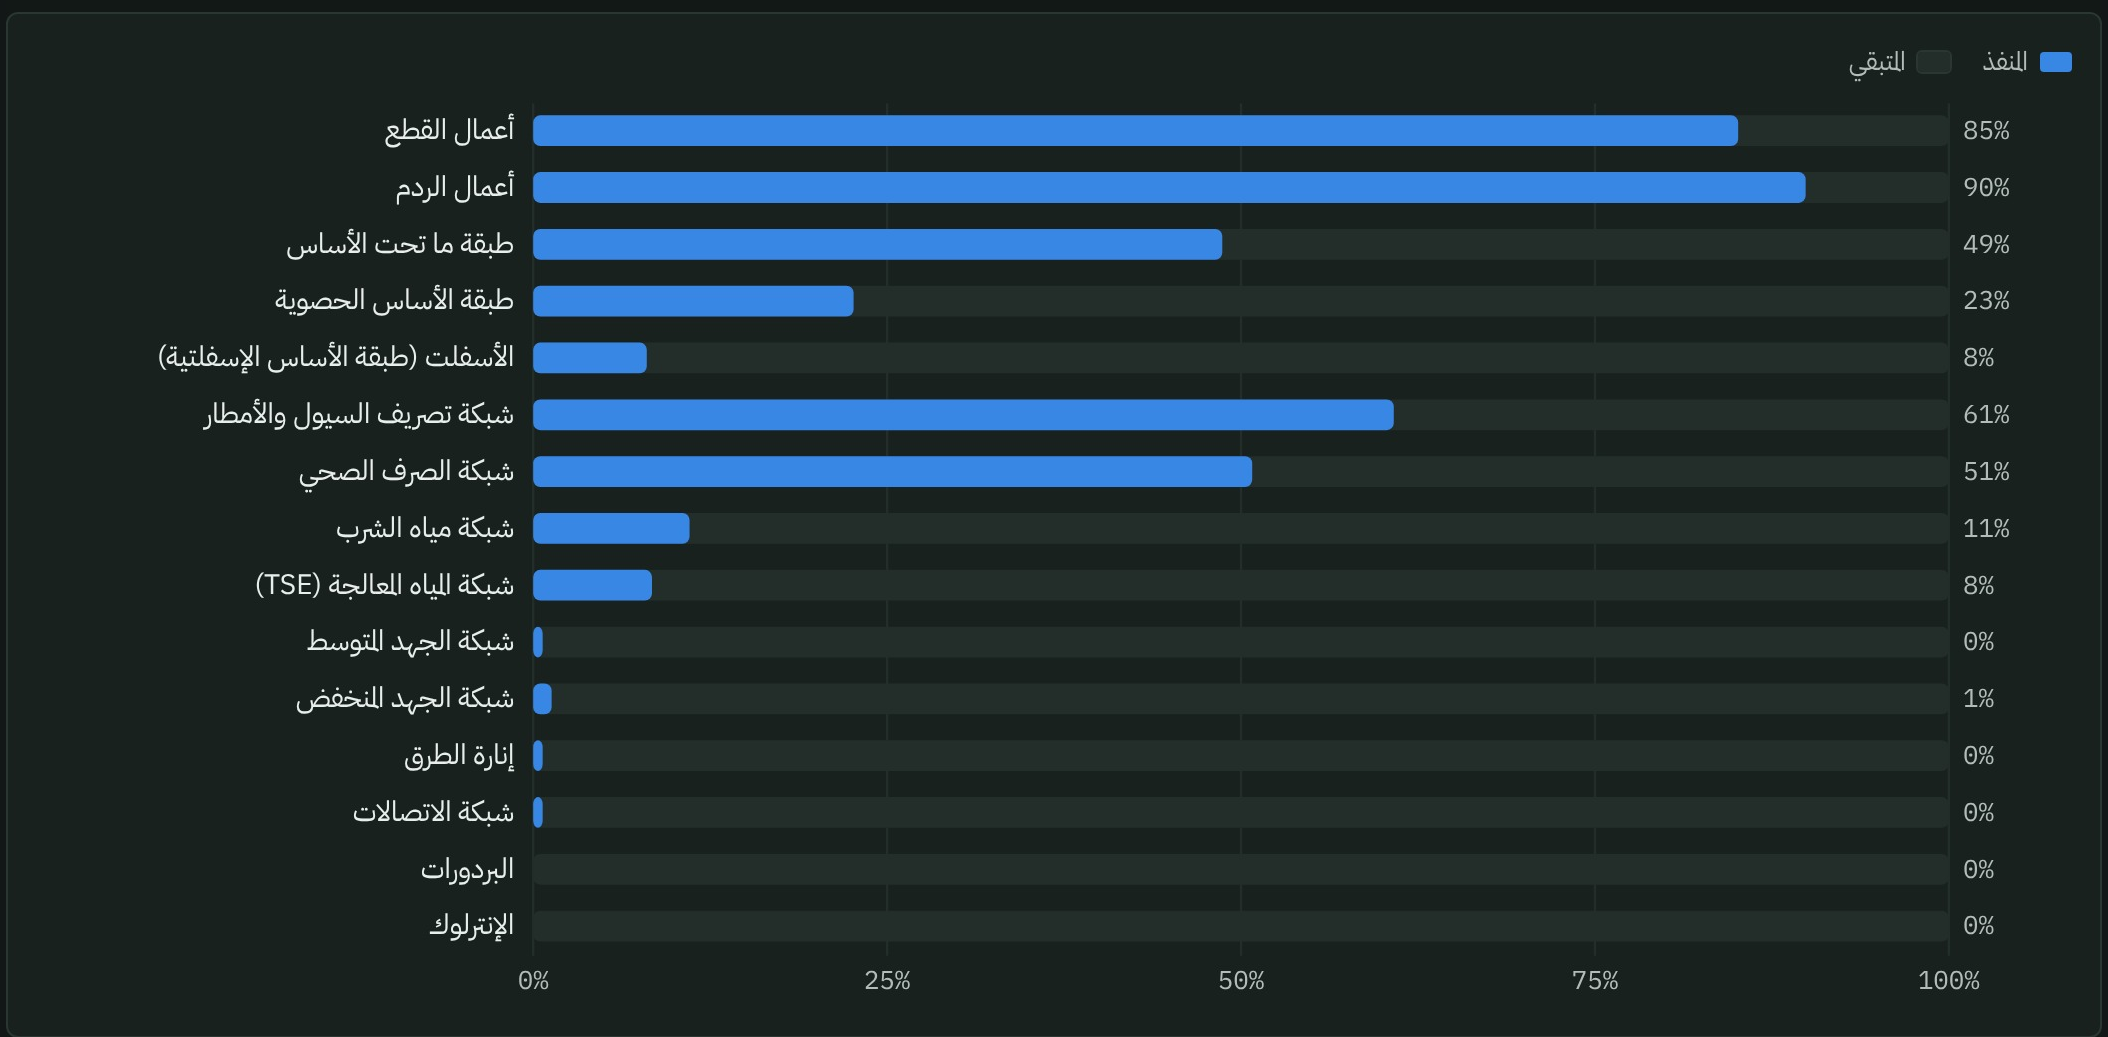

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
أعمال القطع	الكل	م³	4,319,104	3,676,360	–	642,744	85.1%	–
أعمال الردم	الكل	م³	3,811,986	3,426,403	–	385,583	89.9%	–
طبقة ما تحت الأساس	الكل	م³	232,143	113,000	–	119,143	48.7%	–
طبقة الأساس الحصوية	الكل	م³	145,809	33,000	–	112,809	22.6%	–
الأسفلت (طبقة الأساس الإسفلتية)	الكل	م³	86,559	6,946	–	79,613	8.0%	–
شبكة تصريف السيول والأمطار	الكل	م.ط	50,642	30,786	–	19,856	60.8%	–
شبكة الصرف الصحي	الكل	م.ط	22,579	11,468	–	11,111	50.8%	–
شبكة مياه الشرب	الكل	م.ط	31,687	3,500	–	28,187	11.0%	–
شبكة المياه المعالجة (TSE)	الكل	م.ط	35,746	3,000	–	32,746	8.4%	–
شبكة الجهد المتوسط	الكل	م.ط	131,104	350	–	130,754	0.3%	–
شبكة الجهد المنخفض	الكل	م.ط	24,579	320	–	24,259	1.3%	–
إنارة الطرق	الكل	م.ط	67,945	180	–	67,765	0.3%	–
شبكة الاتصالات	الكل	م.ط	53,637	201	–	53,436	0.4%	–
البردورات	الكل	م.ط	130,589	0	–	130,589	0.0%	–
الإنترلوك	الكل	م²	42,347	0	–	42,347	0.0%	–

الأعمال الترابية متقدمة

أُنجز 85.1% من القطع و89.9% من الردم. طبقة القاعدة عند 48.7%، وطبقة الأساس الحصوية 22.6%، والأسفلت 8.0%. ومن الشبكات الرطبة، نُفّذ 60.8% من شبكة السيول و50.8% من الصرف الصحي.

الشبكات بالكاد بدأت

شبكة الجهد المتوسط عند 0.3% (350 من 131,104 م)، وإنارة الطرق 0.3%، والاتصالات 0.4%، والجهد المنخفض 1.3%. مياه الشرب عند 11.1% والمياه المعالجة 8.4%. ولم تبدأ البردورات والإنترلوك.

المعالم الرئيسية

معالم العقد من ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي، مع الحالة الواردة في عرض التقدم. لم تُقدَّم تواريخ معالم P6 بصيغة مقروءة.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	التغير (أيام)	العرض	الحالة
ترسية العقد	09-Nov-2025	09-Nov-2025	0	–	✓ منجز
توقيع العقد	22-Nov-2025	22-Nov-2025	0	–	✓ منجز
تسليم الموقع	30-Nov-2025	30-Nov-2025	0	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	29-Dec-2025	30-Mar-2026	−91	المنفذ	✓ منجز متأخراً
تقديم واعتماد المخططات والمواد	28-Jan-2026	30-Apr-2026	−92	جارٍ، الانتهاء 30-يونيو-2026	▼ متأخر
توريد جميع المواد للموقع	28-Feb-2026	–	–	جارٍ	▼ متأخر
اكتمال أعمال الجهد المتوسط والطرق	30-Sep-2026	30-Sep-2026	0	جارٍ	▼ متأخر
اكتمال الشبكات العميقة	30-May-2027	30-May-2027	0	لم يبدأ	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع الشبكات	30-Nov-2027	30-Nov-2027	0	لم يبدأ	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للاستلام الابتدائي	30-May-2028	30-May-2028	0	لم يبدأ	؟ يتعارض مع التوقع 06-فبراير-2029
إخلاء الموقع وشهادة الاستلام الابتدائي	30-May-2028	30-May-2028	0	لم يبدأ	▼ معرّض للتأخير

يذكر التقرير الأسبوعي ثلاثة تواريخ مختلفة للانتهاء.

تُبقي ورقة المعالم تاريخ 30-مايو-2028 دون تغيير، وتتوقع ورقة المعلومات العامة 06-فبراير-2029 (−252 يوماً)، وينهي مستخرج P6 في ورقة التقدم المشروع في 13-فبراير-2029 بفائض زمني إجمالي −259 يوماً. ولا يزال معلم "اكتمال أعمال الجهد المتوسط والطرق" يظهر 30-سبتمبر-2026 دون تأخير، رغم مرور الموعد وأن العرض يذكره جارياً.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المورّدة للموقع من الكمية الكلية. المصدر: شريحة حالة التوريدات، عرض التقدم 19-أكتوبر-2026.



الكهرباء والاتصالات والبردورات والإنترلوك: لم يورّد شيء


الجهد المتوسط (131,104 م.ط) وإنارة الطرق (67,945 م.ط) والاتصالات (53,637 م.ط) والبردورات مسبقة الصب (130,589 م.ط) والإنترلوك (42,347 م²) كلها بنسبة توريد 0%. ولا يظهر في العرض اعتماد لمواد موردي الجهد المتوسط وأعمدة الإنارة.

مواسير الشبكات الرطبة في الموقع غالباً

ورّد 99% من أطوال مواسير الصرف الصحي و98% لمياه الشرب و98% للري. وشبكة السيول عند 85% (43,030 من 50,642 م.ط). ويستمر توريد حلقات وأغطية المناهل ومواسير GRP وUPVC.

القوى العاملة

عدد العمالة اليدوية الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة، التقرير الأسبوعي 19-أكتوبر-2026.

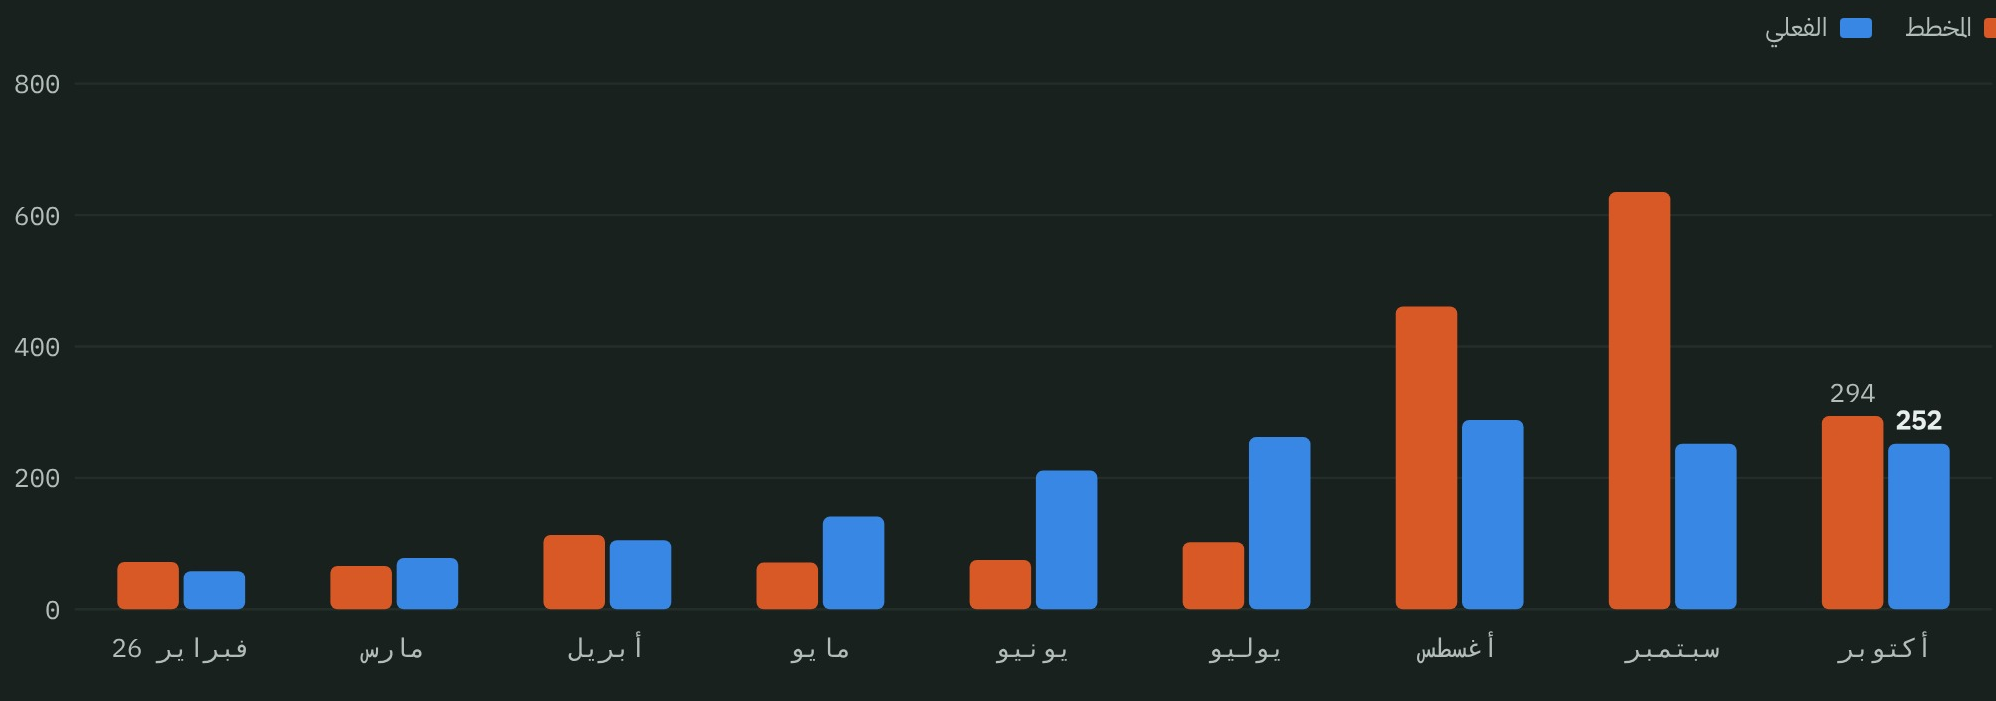

بلغت العمالة اليدوية في أكتوبر 252 مقابل 294 مخطط (−14%)، إضافة إلى 47 من الموظفين غير اليدويين، بإجمالي 299. رقم أكتوبر يكرر رقم سبتمبر (252). وترتفع الخطة إلى 1,033 في مارس 2027. في الموقع 208 من المعدات الرئيسية، منها 56 حفارة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الجدول 1: أعمال الطرق والموقع	214,146,361
الجدول 2: الأعمال الكهربائية	56,351,312
الجداول 2.1–2.3: الاتصالات وتقنية المعلومات والحماية	26,333,019
الجداول 3–6: المياه والري والصرف الصحي والسيول	98,702,595
الجدول 7: المباني والخدمات والأنفاق	49,466,713
قيمة العقد	**445,000,000**
جدول الكميات المعدل (بدون الضريبة)	374,123,662
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. مجموع الجداول يساوي قيمة العقد 445,000,000. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	8
القيمة الإجمالية	71,001,361
الخصومات والغرامات	380,000
الصافي شاملاً الضريبة	81,271,566
معتمدة من الاستشاري	8
معتمدة من مدير المشروع - مدن / مدفوعة	0 / 0

المستخلصات تمثل 16.0% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 23.6%. ويذكر العرض أرقاماً مختلفة: 54,980,525 مستخلصات و41,804,647 مصروفة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.55

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	458,560
ساعات العمل هذا الأسبوع	18,000
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	1
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	348 / 409

تقييم السلامة من تفتيش مدن للصحة والسلامة بتاريخ 09-يوليو-2026.

الجودة التقييم 0.81

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	720 / 700
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	101 / 100
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	34 / 33
تعليمات الموقع	0
المخططات التنفيذية المقدمة (رمز A / B)	1,453 (7 / 1,446)
تقديمات اعتماد المواد	111

أعداد تراكمية من ورقة إحصاءات الجودة.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
التعارض مع كابلات الجهد العالي لشركة الكهرباء	المقاول / شركة الكهرباء	تتعارض كابلات الجهد العالي التابعة لشركة نقل الكهرباء مع الطريق C2. قُدّم مقترح فني للحل وبانتظار رد شركة الكهرباء. التصنيف: حرج؛ الموعد المستهدف 30-أكتوبر-2026.
التعارض مع كابلات الجهد المتوسط لشركة الكهرباء	المقاول / شركة الكهرباء	تتعارض كابلات الجهد المتوسط مع الطريق C8. زار مقاول شركة الكهرباء (Pillar) الموقع ووُقّع محضر بدء الأعمال. التصنيف: حرج.
التعارض مع خدمات الرياض الخضراء	المقاول / الرياض الخضراء	يتعارض صمام هواء وحماية كاثودية على الطريق C8 مع الأعمال. ويجري التنسيق مع مقاول الرياض الخضراء للحصول على المخططات وتسعير التعديل. التصنيف: حرج.
التعارض مع خطوط غاز أرامكو	المقاول / أرامكو	تتعارض الشبكات الرطبة والجافة على الطريقين C8 وRD-L10 مع خطي غاز تابعين لأرامكو. وافقت أرامكو على الحلول الفنية لشبكات الاتصالات والصرف الصحي والجهد المتوسط وتقنية المعلومات والجهد المنخفض، ويستمر التنسيق لبقية الشبكات. التصنيف: مرتفع.
تأخر التوريدات	المقاول	تطلبت تعديلات التصميم مراجعة أوامر الشراء، كما ارتفعت أسعار المواد. صدرت أوامر الشراء ويجري التوريد. التصنيف: مرتفع.
تأخر الإنجاز عن الخطة	المقاول	الإنجاز متأخر عن الجدول الزمني بسبب تعديل المخطط العام (وادي السلي) ونقص المعدات في بداية المشروع. اكتملت معظم المخططات التنفيذية وزيد عدد المعدات وفرق الشبكات. التصنيف: حرج.

أسباب التأخير الواردة في التقرير: تعديل المخطط العام بعد إعادة تصميم وادي السلي مما غيّر تصميم جميع الشبكات، ونقص المعدات في بداية المشروع.

ملاحظات على البيانات

يعتمد هذا التقرير فقط على الملفات المرفوعة بتاريخ 19-أكتوبر-2026. لم تُستخدم الأسابيع السابقة، ولذلك لا يوجد قسم منحنى التقدم: ورقتا بيانات المنحنى الفعلي والقيمة المكتسبة في الملف فارغتان.

- التقدم المخطط الأسبوعي سالب (−3,650 ساعة عمل، −1.55%)، مما يشير إلى تغيّر الخطة هذا الأسبوع. كما انخفض المكتسب في التوريدات بمقدار 2,055 ساعة عمل.
- تظهر ثلاثة تواريخ انتهاء في الملف: 30-مايو-2028 (ورقة المعالم)، و06-فبراير-2029 (المعلومات العامة)، و13-فبراير-2029 (مستخرج P6، فائض −259 يوماً). ومستخرج P6 المعنون "الأسبوع الماضي" يعطي 17-ديسمبر-2029.
- التوريدات: يُظهر العرض توريد 85–99% من المواسير، بينما تُظهر ورقة الكميات الرئيسية توريد 576 م للسيول (1.1%) و720 م للصرف الصحي (3.2%) وصفر لمياه الشرب. وإنجاز التوريدات بساعات العمل 5.1% فقط.
- المستخلصات: يذكر الملف 8 مستخلصات بقيمة إجمالية 71,001,361 ريال ولم يُصرف أي منها؛ بينما يذكر العرض 54,980,525 ريال مستخلصات و41,804,647 ريال مصروفة.
- قيمة العقد 445,000,000 ريال موصوفة بأنها "شاملة ضريبة القيمة المضافة" في ورقة الخلاصة، بينما يعطي تفصيل الجداول نفس الإجمالي "غير شامل الضريبة".
- تختلف إجماليات النطاق بين الأوراق: الجهد المتوسط 131,104 م (العرض) مقابل 171,170 م (ورقة Major)؛ والإنترلوك 42,347 م² مقابل 46,105 م². كما تذكر ورقة الخلاصة سطراً ثانياً للردم (3,947,936 م³، 2.9%) يبدو خطأً.
- عدة لوحات ملخص تُظهر أخطاء #REF! أو #DIV/0! (أهم المشكلات، وتقييمات السلامة والجودة في ورقة Codes، وبيانات المنحنيات). وتُظهر طلبات الفحص 720 صادرة و700 مغلقة وطلباً واحداً فقط معلقاً.
- عدد العمالة اليدوية في أكتوبر (252) يكرر رقم سبتمبر.
- الصور مختومة بتاريخ 13-أكتوبر-2026، بينما تغطي أبرز أعمال العرض الفترة 6–12 أكتوبر. ويظهر البلوك BL-23 تحت المنطقة 07 في اسم ملف وتحت المنطقة 09 في آخر. صورة سابعة (داخل النفق، 20-أكتوبر-2026) بلا ختم ولم تُستخدم.
- لم يُحوَّل تحديث P6 (أرشيف XER) إلى نص مقروء، لذا لا تظهر أعداد أنشطة P6 ولا الفائض الزمني للمعالم.

أُعدّ في 28-أكتوبر-2026 من التقرير الأسبوعي وعرض التقدم المرفوعين بتاريخ 19-أكتوبر-2026.
