مبادرة الملاعب بالمنطقة الوسطى (حائل, واحة القصيم, تبوك)

Playgrounds Initiative: Qassim Oasis, Hail and Tabuk Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	تاريخ البدء	انتهاء العقد	الانتهاء المتوقع في P6
مدن	ADV	إيجيس (Egis)	17-Feb-2026	16-Dec-2026	10-Feb-2027

النطاق: ملاعب كرة قدم وكرة سلة وبادل، وقباب هوائية (القصيم وتبوك)، ودورات مياه، وتنسيق مواقع، وخزانات وخدمات موقع في ثلاثة مواقع: واحة القصيم وحائل والمدينة الصناعية بتبوك.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز في تحديث P6 المحمّل بالتكاليف (نسبة إنجاز الأداء، موزونة بالتكلفة المخططة)، إذ لا تتضمن ملفات هذا الأسبوع تقدماً يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في 11-أكتوبر-2026 بلغ الإنجاز 65.36% مقابل 76.88% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 11.52% (مؤشر الأداء الزمني 0.85). تبوك هي الأكثر تأخراً عند 55.38% مقابل 70.53%، وبشكل رئيسي في إنشاء القبة الهوائية والتوريدات.

نسبة الإنجاز الفعلي
65.36% / 76.88%
مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.85 متأخر بنسبة 11.52%

التقدم هذا الأسبوع
— غير مذكور
لا تتضمن ملفات هذا الأسبوع التقدم المحقق خلال الأسبوع.

المدة المنقضية من العقد
78.1% · اليوم 236 من 302
▼ انتهاء P6: 10-فبراير-2027

التأخير المتوقع في الإنجاز
56 يوماً
العقد 16-ديسمبر-2026، توقع P6 10-فبراير-2027، الفائض −47.4 يوماً

يتوقع تحديث P6 الانتهاء في 10-فبراير-2027، أي بعد تاريخ العقد بـ56 يوماً.

ينتقل الإنجاز الجوهري لجميع الأعمال من 16-ديسمبر-2026 إلى 10-فبراير-2027 بفائض زمني كلي −47.4 يوماً. لدى 205 من أصل 338 نشاطاً مفتوحاً فائض سالب، وتضم قائمة الأنشطة المتعثرة في البدء بتاريخ 11-أكتوبر-2026 عدد 77 نشاطاً لم تبدأ في موعدها (القصيم 28، حائل 31، تبوك 18). وتمثل القباب الهوائية الفجوة الأكبر: القصيم عند 34.97% مقابل 73.61% مخطط، وتبوك عند 28.98% مقابل 61.6%.

التقدم حسب المرحلة

المخطط (نسبة الإنجاز المجدولة) والفعلي (نسبة إنجاز الأداء) حسب الموقع والمرحلة، من ملخص هيكل تجزئة العمل في تحديث P6 بتاريخ 11-أكتوبر-2026. الوزن هو حصة التكلفة المخططة.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
واحة القصيم	**49.1%**	**79.15%**	**67.2%**	**−11.95%**	**0.85**	▼ متأخر
التصميم الهندسي	1.5%	100%	100%	0.00%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	13.3%	100%	82.29%	−17.71%	0.82	▼ متأخر
التنفيذ	29.5%	81.46%	66.88%	−14.58%	0.82	▼ متأخر
إغلاق المشروع	4.9%	3%	18.5%	+15.50%	6.17	▲ متقدم
حائل	**19.1%**	**81.68%**	**77.3%**	**−4.38%**	**0.95**	▼ متأخر
التصميم الهندسي	0.6%	100%	100%	0.00%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	5.2%	100%	97.17%	−2.83%	0.97	▼ متأخر
التنفيذ	11.4%	85.63%	78.26%	−7.37%	0.91	▼ متأخر
إغلاق المشروع	1.9%	3%	11.1%	+8.10%	3.70	▲ متقدم
تبوك	**31.8%**	**70.53%**	**55.38%**	**−15.15%**	**0.79**	▼ متأخر
التصميم الهندسي	1.0%	100%	100%	0.00%	1.00	✓ مكتمل

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التوريدات	8.6%	100%	74.52%	-25.48%	0.75	▼ متأخر
التنفيذ	19.1%	67.06%	50.68%	-16.38%	0.76	▼ متأخر
إغلاق المشروع	3.2%	3%	18.5%	+15.50%	6.17	▲ متقدم
الإجمالي	100%	**76.88%**	**65.36%**	**-11.52%**	**0.85**	▼ متأخر

يضم تحديث P6 (المشروع PG-Reco-4، تاريخ البيانات 09-أكتوبر-2026) عدد 1,929 نشاطاً: 1,591 مكتملاً و205 قيد التنفيذ و133 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 10-فبراير-2027 مقابل تاريخ الانتهاء الملزم 16-ديسمبر-2026. ويتقدم إغلاق المشروع على الخطة لأن المخططات حسب التنفيذ بدأت مبكراً.

نطاق العمل: المواقع وحزم الأعمال

لا يتضمن الجدول الزمني كميات، لذا يُعرض النطاق كحزم أعمال التنفيذ في كل موقع: التكلفة المخططة والقيمة المكتسبة حتى تاريخه والقيمة المخططة حتى تاريخه بالريال، من ملخص هيكل تجزئة العمل بتاريخ 11-أكتوبر-2026. لا تتضمن ملفات هذا الأسبوع أرقام الأسبوع السابق، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز –.

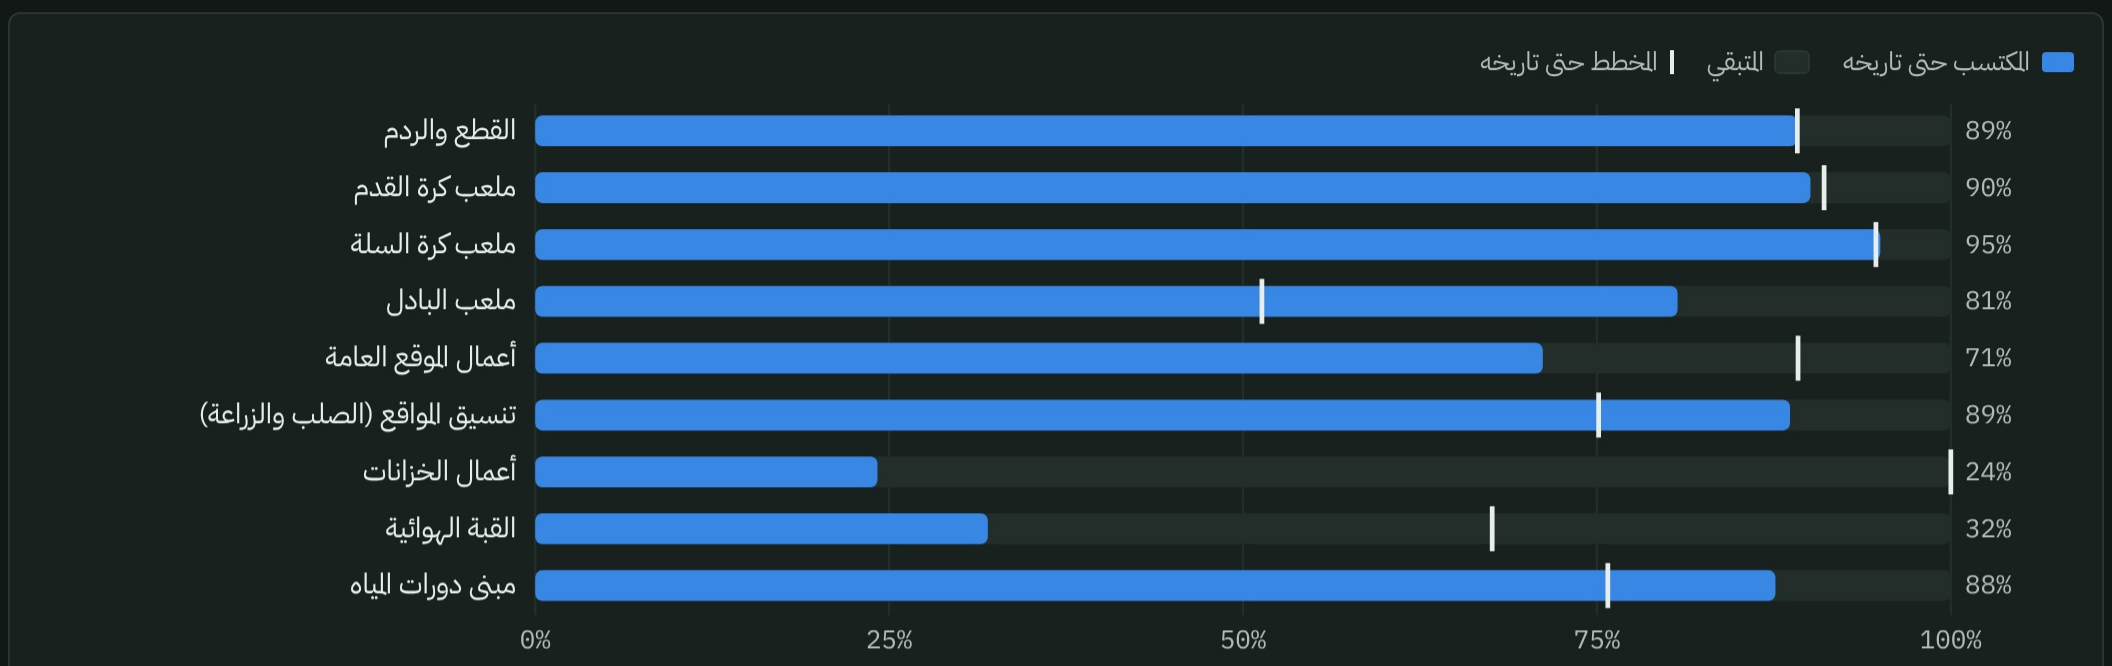

حزمة الأعمال	الموقع	الوحدة	الميزانية	المكتسب	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% الإنجاز	المخطط %
القطع والردم	القصيم	ريال	900,600	729,000	–	171,600	80.9%	80.9%
	حائل	ريال	453,900	453,900	–	0	100.0%	100.0%
	تبوك	ريال	228,240	228,240	–	0	100.0%	100.0%
	الإجمالي	ريال	**1,582,740**	**1,411,140**	–	**171,600**	**89.2%**	89.2%
ملعب كرة القدم	القصيم	ريال	611,282	571,304	–	39,979	93.5%	92.3%
	حائل	ريال	781,940	687,924	–	94,016	88.0%	93.2%
	تبوك	ريال	333,290	296,090	–	37,200	88.8%	83.8%
	الإجمالي	ريال	**1,726,513**	**1,555,318**	–	**171,195**	**90.1%**	91.0%
ملعب كرة السلة	القصيم	ريال	381,705	372,447	–	9,258	97.6%	96.4%
	تبوك	ريال	173,211	154,829	–	18,382	89.4%	91.1%
	الإجمالي	ريال	**554,916**	**527,276**	–	**27,640**	**95.0%**	94.7%
ملعب البادل	القصيم	ريال	325,484	276,386	–	49,098	84.9%	51.0%
	تبوك	ريال	116,990	80,691	–	36,299	69.0%	52.3%
	الإجمالي	ريال	**442,474**	**357,077**	–	**85,397**	**80.7%**	51.3%
أعمال الموقع العامة	القصيم	ريال	1,617,942	1,303,725	–	314,217	80.6%	92.4%
	حائل	ريال	1,224,114	716,076	–	508,038	58.5%	86.7%

حزمة الأعمال	الموقع	الوحدة	الميزانية	المكتسب	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% الإنجاز	المخطط %
	تبوك	ريال	656,604	470,510	–	186,094	71.7%	86.1%
	الإجمالي	ريال	**3,498,661**	**2,490,311**	**–**	**1,008,350**	**71.2%**	89.2%
تنسيق المواقع (الصلب والزراعة)	القصيم	ريال	2,134,335	1,896,826	–	237,509	88.9%	81.5%
	حائل	ريال	1,252,052	1,069,354	–	182,699	85.4%	71.1%
	تبوك	ريال	755,169	704,954	–	50,215	93.4%	63.9%
	الإجمالي	ريال	**4,141,556**	**3,671,133**	**–**	**470,423**	**88.6%**	75.1%
أعمال الخزانات	القصيم	ريال	48,290	13,577	–	34,713	28.1%	100.0%
	حائل	ريال	48,290	11,826	–	36,465	24.5%	100.0%
	تبوك	ريال	48,290	9,623	–	38,668	19.9%	100.0%
	الإجمالي	ريال	**144,871**	**35,026**	**–**	**109,845**	**24.2%**	100.0%
القبة الهوائية	القصيم	ريال	4,178,041	1,461,182	–	2,716,860	35.0%	73.6%
	تبوك	ريال	4,178,041	1,210,693	–	2,967,348	29.0%	61.6%
	الإجمالي	ريال	**8,356,082**	**2,671,875**	**–**	**5,684,207**	**32.0%**	67.6%
مبنى دورات المياه	القصيم	ريال	324,844	297,907	–	26,938	91.7%	76.4%
	حائل	ريال	328,494	260,954	–	67,539	79.4%	97.0%
	تبوك	ريال	324,844	298,150	–	26,694	91.8%	53.7%
	الإجمالي	ريال	**978,182**	**857,011**	**–**	**121,171**	**87.6%**	75.8%

المنجز المُبلغ عنه هذا الأسبوع

الخرسانة المطبوعة، والبردورات، وتركيب القوائم الحديدية للسياج، وردم شبكة الري، والأسفلت، وعزل اللبشة لواجهة الزجاج ومنطقة دورات المياه، والدمك والتسوية (الملخص التنفيذي الأسبوعي). الأسبوع القادم: الدمك والتسوية، والأسفلت، والبردورات، وتركيب السياج، والخرسانة المطبوعة.

القباب الهوائية والخزانات الأكثر تأخراً

القبة الهوائية: القصيم 34.97% مقابل 73.61% مخطط، وتبوك 28.98% مقابل 61.6%. الأعمال الميكانيكية للقبة عند 0% في الموقعين رغم أن المخطط 100% (القصيم) و84.38% (تبوك). خزانات المياه عند 14.95% في كل موقع مقابل 100% مخطط. ملاعب البادل والزراعة والمواقف متقدمة على الخطة.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية من جدول خط الأساس التعافي (Recovery Schedule.01). التوقعات من جدول المستوى 5 (PDF بتاريخ 11-أكتوبر-2026) ومن تحديث P6 (XER، تاريخ البيانات 09-أكتوبر-2026)، وهما متطابقان في جميع المعالم. الفائض هو الفائض الكلي في P6.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع جدول المستوى 5	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	17-Feb-2026	17-Feb-2026	17-Feb-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال الأعمال الترابية (القطع والردم)	05-May-2026	05-May-2026	05-May-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تجهيز الموقع وخطط العمل والجدول الزمني وتقديم المخططات	04-Aug-2026	16-Sep-2026 (+43 يوماً)	16-Sep-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
اكتمال مبنى دورات المياه	28-Oct-2026	28-Nov-2026 (+31 يوماً)	28-Nov-2026	-5.5	▼ متأخر
اكتمال أعمال الملاعب	07-Dec-2026	14-Dec-2026 (+7 أيام)	14-Dec-2026	+2.6	▼ معرّض للتأخير
اكتمال أعمال تنسيق المواقع	16-Dec-2026	25-Jan-2027 (+40 يوماً)	25-Jan-2027	-33.0	▼ متأخر
الإنجاز الجوهري: جميع الأعمال	16-Dec-2026	10-Feb-2027 (+56 يوماً)	10-Feb-2027	-47.4	▼ متأخر
تاريخ انتهاء المشروع	16-Dec-2026	10-Feb-2027 (+56 يوماً)	10-Feb-2027	-47.4	▼ متأخر

جميع المعالم التعاقدية المفتوحة متوقعة الآن بعد تواريخها في الخطة الأساسية.

يتأخر اكتمال مبنى دورات المياه 31 يوماً، وأعمال تنسيق المواقع 40 يوماً، والإنجاز الجوهري 56 يوماً. تحتفظ أعمال الملاعب بفائض +2.6 يوم لكنها متوقعة بعد خطتها الأساسية بـ7 أيام. وتحقق معلم تجهيز الموقع وتقديم المخططات في 16-سبتمبر-2026 متأخراً 43 يوماً.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الإنجاز في P6 لأنشطة "التوريد إلى الموقع" المفتوحة للمواد الرئيسية (تحديث P6، تاريخ البيانات 09-أكتوبر-2026). بلغت التوريدات إجمالاً 82.29% في القصيم و97.17% في حائل و74.52% في تبوك، مقابل 100% مخطط.



مواد القبة الهوائية: 60% مورّدة

في كل من القصيم وتبوك، بفائض −38.8 و−47.4 يوماً. وتحمل مواد القبة الهوائية في تبوك نفس الفائض السالب لإنجاز المشروع (−47.4 يوماً).

الحائط الستائري (المتبقي)

لم يبدأ التوريد في القصيم: كان التصنيع مقرراً أن يبدأ في 25-يونيو-2026 ومن المتوقع الآن أن يبدأ في 10-أكتوبر-2026، والتوريد من 08-نوفمبر-2026 إلى 24-نوفمبر-2026. حائل عند 80% وتبوك عند 60%. طفايات الحريق في حائل عند 20%.

الصحة والسلامة والجودة

لا تتضمن ملفات هذا الأسبوع إحصاءات السلامة أو سجلات الفحص في الموقع (MIR وIR وNCR). سجل التقديمات الفنية هو سجل الجودة الوحيد المتوفر. المصدر: سجل تقديم المستندات الفنية، ورقة Summary %.

التقديمات الفنية

المقدمة حتى تاريخه	819
المعتمدة (الرمزان A وB)	677 (82.7%)
تعديل وإعادة تقديم (الرمز C)	50
قيد المراجعة	57
مراجعة متأخرة (5 أيام أو أكثر)	35

المعتمد / المقدم حسب النوع

المخططات التنفيذية	309 / 375
تقديمات المستندات (فنية وعامة)	148 / 183
تقديمات المواد	120 / 137
التأهيل المسبق	47 / 55
طلبات الاستيضاح	30 / 34
بيانات طريقة العمل	22 / 22
اعتماد مصادر المواد	1 / 13

9 من أصل 13 طلب اعتماد مصدر مواد في مراجعة متأخرة.

المشكلات والمخاطر القائمة

من قائمة الأنشطة المتعثرة في البدء (11-أكتوبر-2026) وتحديث P6 وسجل التقديمات. لا تحدد الملفات المسؤول عن كل بند.

المشكلة	الموقع	التفاصيل
أعمال القبة الهوائية	القصيم، تبوك	عند 34.97% (القصيم) و28.98% (تبوك) مقابل 73.61% و61.6% مخطط. تركيب الهيكل الكابلي الفولاذي والغشاء ووحدات الهواء والتكييف والإنارة ضمن قائمة الأنشطة المتعثرة في البدء (15 نشاطاً).
الأعمال الكهربائية والتيار الخفيف وإنذار الحريق في الموقع	جميع المواقع	29 من أصل 77 نشاطاً متعثراً: لوحات التوزيع الرئيسية ولوحات القوى، والتمديدات، ووحدات الإنارة، والألياف البصرية، والاتصالات، والمراقبة بالكاميرات، وإنذار الحريق.
أعمال تصريف السيول والمرافق	جميع المواقع	لم تبدأ أعمال التغليف الخرساني والردم والدمك وإعادة الأسطح في موعدها (14 نشاطاً ميكانيكياً متعثراً، منها طفايات الحريق ورشاشات الري).
خزانات المياه	جميع المواقع	تركيب خزانات المياه من GRP ضمن قائمة الأنشطة المتعثرة في المواقع الثلاثة. أعمال الخزانات عند 28.12% (القصيم) و24.49% (حائل) و19.93% (تبوك) مقابل 100% مخطط.
الحائط الستائري	القصيم، حائل	تصنيع الجزء المتبقي من الحائط الستائري ضمن قائمة الأنشطة المتعثرة في القصيم وحائل (البدء في الخطة الأساسية 25-يونيو-2026، والآن 10-أكتوبر-2026).
تأخر مراجعة التقديمات	جميع المواقع	35 تقديماً في مراجعة متأخرة، منها 12 مخططاً تنفيذياً و12 تقديم مستندات.

ملاحظات على البيانات

- يعتمد هذا التقرير على ملفات W2 فقط (تاريخ البيانات 11-أكتوبر-2026). لا تتضمن ورقة تقدم فعلي، ولا أوزان ساعات عمل، ولا بيانات منحنى التقدم، ولا صور موقع، ولا قوى عاملة، ولا بيانات تكلفة أو مستخلصات، ولا إحصاءات سلامة، لذا حُذفت هذه الأقسام. التقدم المعروض هو نسبة الإنجاز الموزونة بالتكلفة من تحديث P6.
- لا تذكر هذه الملفات أرقام الأسبوع السابق أو "هذا الأسبوع"، لذا يظهر التقدم خلال الأسبوع وعمود المنفذ هذا الأسبوع بالرمز –.
- تاريخ بيانات ملف P6 (XER) هو 09-أكتوبر-2026، بينما الجداول بصيغة PDF وقائمة الأنشطة المتعثرة مؤرخة 11-أكتوبر-2026.
- ثلاثة ملفات PDF (جدول المستوى 5، والنظرة المستقبلية لثلاثة أسابيع، والأعمال المتبقية) مسماة MLTX-05-047 رغم أنها تخص هذا المشروع (MLTX-02-003).
- على مستوى المشروع، يذكر P6 أن المخطط 76.88% والفعلي 65.36%، لكن قسمة القيمة المخططة على الميزانية تعطي 76.51% وقسمة القيمة المكتسبة على الميزانية تعطي 65.04%. يستخدم التقرير نسب P6.
- تظهر أعمال القطع والردم في القصيم مكتملة 100%، لكن قيمتها المكتسبة 729,000 من ميزانية 900,600 ريال (80.9%).
- لدى 108 أنشطة قيد التنفيذ في تحديث P6 تاريخ انتهاء يسبق تاريخ البيانات (مثل مواد القبة الهوائية في القصيم: 60%، الانتهاء 06-أكتوبر-2026). يجب تحديث المدد المتبقية لها.
- تصنيع الحائط الستائري في حائل ضمن قائمة الأنشطة المتعثرة (لم يبدأ)، بينما يُظهر تحديث P6 توريد الحائط الستائري في حائل بنسبة 80%.
- لا يتضمن سجل التقديمات تقديمات مخططة أو مواعيد نهائية (N/A)، وتُظهر صفوف مخططات التصميم الخطأ #DIV/0!.
