مبادرة الملاعب بالمنطقة الغربية (عسير, جازان, واحة جدة)

Playground Initiative for Western Region (Asir, Jazan, Jeddah)

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة بروفاست المحدودة	إيجيس (EGIS)	م. يزيد آل رقبة	26-Mar-2026	25-Jan-2027

النطاق: ملاعب رياضية (بادل وكرة سلة وكرة قدم)، ومبنى خدمات ودورات مياه، وأعمال تنسيق المواقع، ومسارات للدراجات والمشي، ومواقف سيارات في ثلاثة مواقع في عسير وجازان وجدة.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. بلغ المشروع 42.4% مقابل 51.0% مخططاً، أي متأخر بنسبة 8.6% (مؤشر الأداء الزمني 0.83). أنجز 3.4% هذا الأسبوع مقابل 4.1% مخططاً، فاتسعت الفجوة من 8.0% في الأسبوع الماضي. موقع جازان هو الأكثر تأخراً عند 24.3% مقابل 44.5% مخططاً، بينما موقع جدة متقدم على خطته.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
42.4% / 51.0% مخطط	+3.4% / +4.1% مخطط	67.9% · اليوم 207 من 305	14.6% · 4.94 مليون ريال
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.83	▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.6%	▼ الانتهاء المتوقع 09-مايو-2027	5 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 08-أكتوبر-2026
−8.6%			

يُتوقع انتهاء المشروع متأخراً 104 أيام.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (تاريخ البيانات 19-أكتوبر-2026) انتهاء المشروع في 09-مايو-2027، مقابل تاريخ انتهاء العقد 25-يناير-2027. ويُظهر P6 فائضاً زمنياً −85 يوماً على انتهاء المشروع و330 نشاطاً مفتوحاً بفائض سالب. ويمر المسار الأكثر حرجاً عبر كابلات الشد الفولاذية واعتماد غشاء PVC (−85 يوماً)، وتوريد القبة الهوائية هو التحدي المذكور في الملخص الأسبوعي. وكانت الخطة الأساسية الأصلية تستهدف 75.1% بمنتصف أكتوبر.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي بتاريخ 19-أكتوبر-2026، صورتان من كل موقع، وجميعها مختومة بتاريخ 18-أكتوبر-2026. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




عزل السطح، جازان

عزل مائي لسطح مبنى الخدمات. مختومة 18-أكتوبر-2026، 11:28، أبو عريش.



أعمال الأبواب، جازان

تركيب باب معدني في مبنى الخدمات. مختومة 18-أكتوبر-2026، 11:01، أبو عريش.

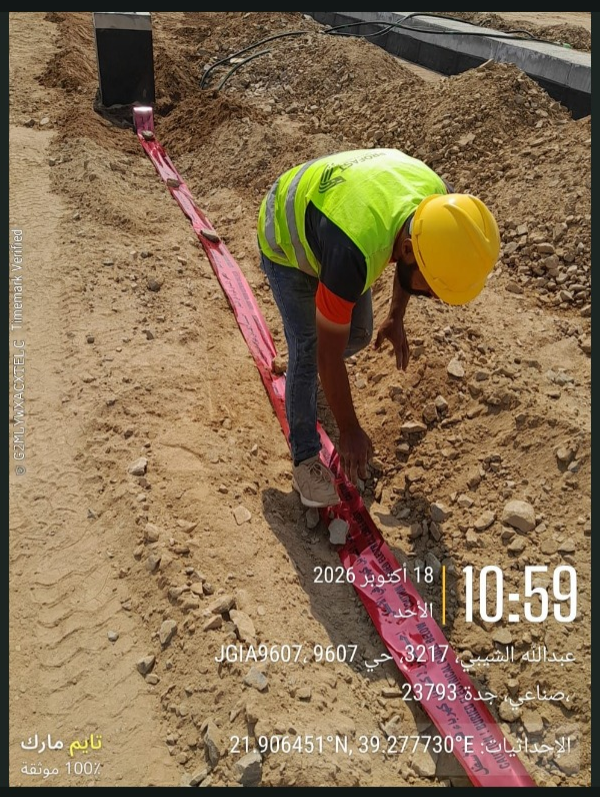

شريط تحذير التمديدات، جدة

مد الشريط التحذيري فوق خندق التمديدات. مختومة 18-أكتوبر-2026، 10:59، إحداثيات GPS 21.906451°N, 39.277730°E.



تمديدات وقواعد أعمدة الإنارة، جدة

الردم على امتداد قواعد الأعمدة. مختومة 18-أكتوبر-2026، 11:39، إحداثيات GPS 21.906437°N, 39.277696°E.



عزل المناطق الرطبة، عسير

طبقة بيتومينية حول جلب المواسير. مختومة 18-أكتوبر-2026، 10:15، إحداثيات GPS 18.3361059°N, 42.6567205°E.




لبشة مدخل القبة الهوائية، عسير

تركيب حديد تسليح اللبشة. مختومة 18-أكتوبر-2026، 08:24، خميس مشيط.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً، في منتصف كل شهر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، التقرير الأسبوعي 19-أكتوبر-2026.

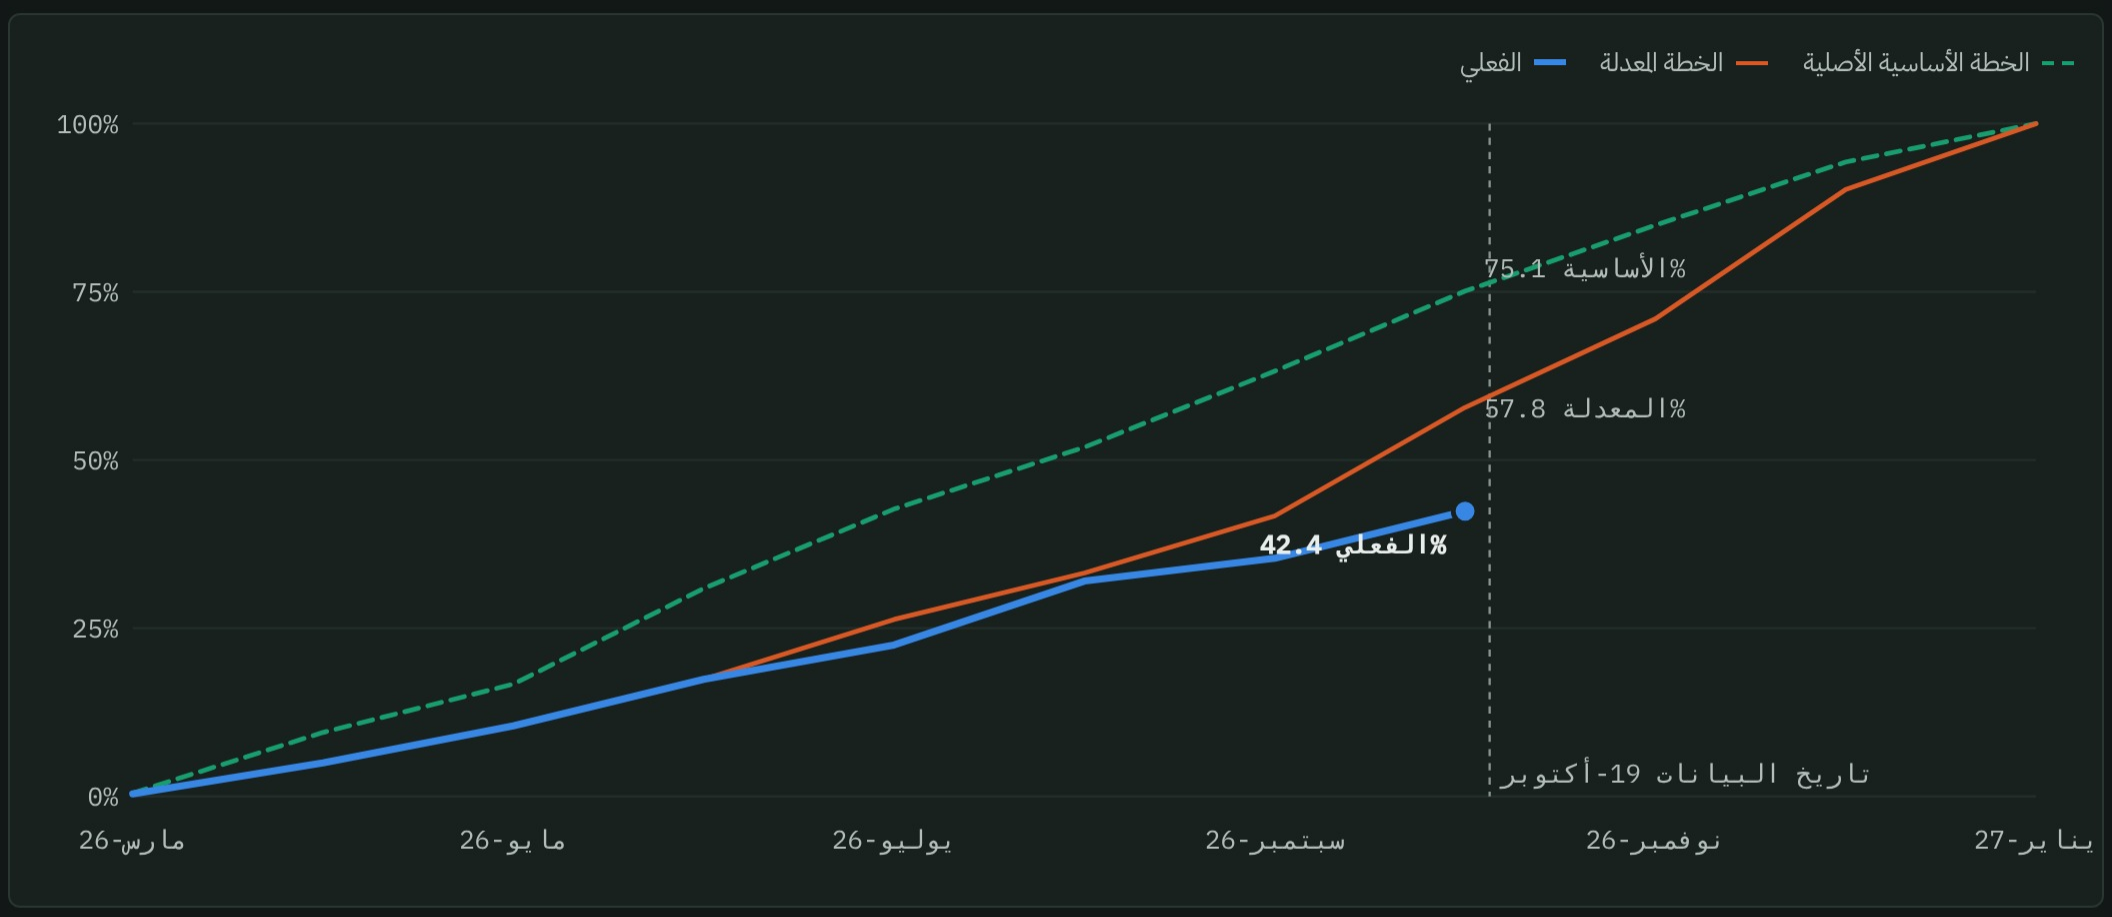

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
12-Oct-2026	47.0	39.0	-8.0	—	0.83
19-Oct-2026	**51.0**	**42.4**	**-8.6**	**+3.4**	**0.83**

استُخدم أحدث تقرير أسبوعي فقط. وهو يعطي القيم التراكمية لهذا الأسبوع والأسبوع الماضي (ورقة Progress)، لذا يضم الجدول صفين ولا يتوفر المنجز خلال الأسبوع الماضي. وكان المنجز المخطط هذا الأسبوع +4.1%.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. وقُسّم التنفيذ على المواقع الثلاثة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3.1%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5.2%	100.0%	98.6%	-1.4	0.99	▼ متأخر قليلاً
التوريدات	12.6%	98.9%	62.2%	-36.8	0.63	▼ متأخر
التنفيذ	73.8%	40.9%	35.6%	-5.3	0.87	▼ متأخر
التنفيذ: جازان	25.2%	44.5%	24.3%	-20.2	0.55	▼ متأخر
التنفيذ: عسير	23.8%	41.8%	40.9%	-0.9	0.98	● في المسار
التنفيذ: جدة	24.8%	36.4%	42.1%	+5.7	1.16	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	3.2%	0.0%	0.0%	0.0	–	○ لم يحن موعده
الإقفال	2.1%	0.0%	0.0%	0.0	–	○ لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**51.0%**	**42.4%**	**-8.6**	**0.83**	▼ متأخر

أوزان المواقع حصص من المشروع كاملاً. يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 19-أكتوبر-2026) عدد 2,134 نشاطاً: 1,728 مكتملاً و21 قيد التنفيذ و385 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 09-مايو-2027، مقابل تاريخ الانتهاء الملزم 25-يناير-2027.

نطاق العمل: الكميات

الكميات الرئيسية للمواقع الثلاثة مجتمعة، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 19-أكتوبر-2026. لا تتضمن الورقة قيم الأسبوع السابق، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز "–". والردم لا ينطبق على هذه البنود.

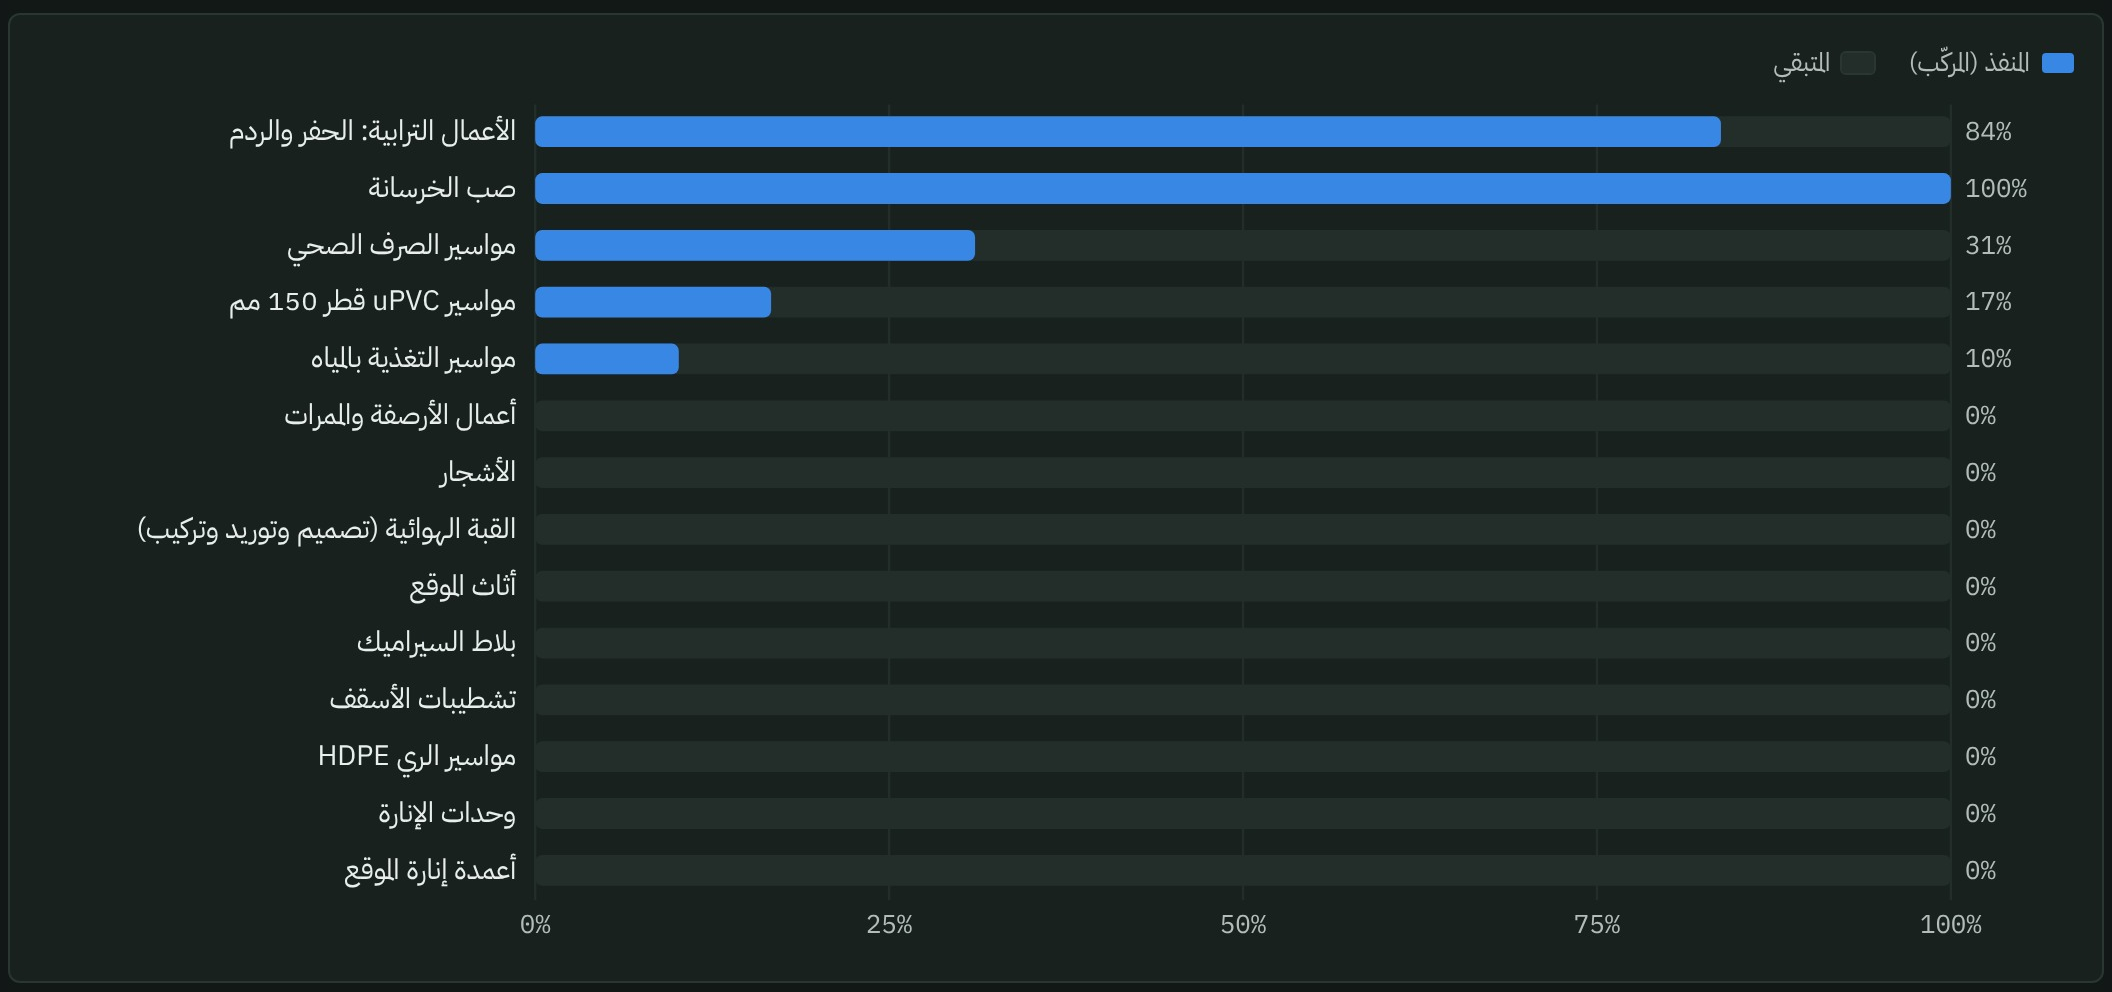

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الأعمال الترابية: الحفر والردم	جميع المواقع	م³	68,052	57,000	–	11,052	83.8%	–
صب الخرسانة	جميع المواقع	م³	145	145	–	0	100.0%	–
مواسير الصرف الصحي	جميع المواقع	م.ط	177	55	–	122	31.1%	–
مواسير uPVC قطر 150 مم	جميع المواقع	م.ط	300	50	–	250	16.7%	–
مواسير التغذية بالمياه	جميع المواقع	م.ط	138	14	–	124	10.1%	–
أعمال الأرصفة والممرات	جميع المواقع	م²	30,380	0	–	30,380	0.0%	–
الأشجار	جميع المواقع	عدد	895	0	–	895	0.0%	–
القبة الهوائية (تصميم وتوريد وتركيب)	جميع المواقع	بند	3	0	–	3	0.0%	–
أثاث الموقع	جميع المواقع	عدد	248	0	–	248	0.0%	–
بلاط السيراميك	جميع المواقع	م²	219	0	–	219	0.0%	–
تشطيبات الأسقف	جميع المواقع	م²	207	0	–	207	0.0%	–
مواسير الري HDPE	جميع المواقع	م.ط	7,150	0	–	7,150	0.0%	–
وحدات الإنارة	جميع المواقع	عدد	129	0	–	129	0.0%	–
أعمدة إنارة الموقع	جميع المواقع	عدد	322	0	–	322	0.0%	–

الأعمال المنفذة هذا الأسبوع

صب البلاطة الأرضية لمعبي كرة القدم والسلة في عسير. صب قواعد القبة الهوائية وجاري أعمال حدادة الواجهة الزجاجية في جميع المواقع. الانتهاء من تمديد مواسير الري في عسير وجدة، ومن تركيب البردورات حول الملاعب في جدة. الانتهاء من حجر الواجهة لدورات المياه في عسير. صب ميدة خزان المياه في جازان. وتستمر أعمال السيراميك في دورات المياه وعزل الأسطح وتمديدات وقواعد أعمدة الإنارة وردم المشى.

التقدم حسب حزمة العمل

تُظهر ورقة Conclusion الأعمال الترابية وأعمال الخرسانة والبلوك عند 90%، ومواسير الصرف الصحي والتغذية عند 50%، وأعمال الملاعب عند 30%، ووحدات الإنارة عند 20%، والقبة الهوائية عند 12%، وشبكة الري عند 10%. ولم تبدأ أعمال المناظر الطبيعية وتوريد الأشجار. ومقارنة بالمخطط حتى تاريخه، بلغت مواسير الصرف الصحي 55 من 177 م.ط، ومواسير uPVC قطر 150 مم 50 من 150 م.ط.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث P6 التواريخ المتوقعة نفسها لجميع المعالم، والتأخير مقارنة بالخطة الأساسية. والأيام بين القوسين هي الفرق عن الخطة الأساسية كما ورد في التقرير الأسبوعي.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	26-Mar-2026	26-Mar-2026	26-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد البرنامج الزمني الأساسي	29-Apr-2026	29-Apr-2026	29-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	02-Jun-2026	02-Jun-2026	02-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
أعمال التسوية	22-Jul-2026	20-Oct-2026 (+90 يوماً)	20-Oct-2026	-13	▼ متأخر
التصميم الهندسي	19-Jan-2027	05-Nov-2026 (−75 يوماً)	05-Nov-2026	69	● متقدم على الخطة الأساسية
مبنى دورات المياه	09-Aug-2026	04-Jan-2027 (+148 يوماً)	04-Jan-2027	18	▼ متأخر
منطقة الملاعب	30-Nov-2026	29-Apr-2027 (+150 يوماً)	29-Apr-2027	-77	▼ متأخر
أعمال موقع عسير	13-Dec-2026	29-Mar-2027 (+106 أيام)	29-Mar-2027	-50	▼ متأخر
أعمال المناظر الطبيعية	16-Jan-2027	08-Mar-2027 (+51 يوماً)	08-Mar-2027	-53	▼ متأخر
أعمال موقع جازان	19-Jan-2027	09-May-2027 (+110 أيام)	09-May-2027	-85	▼ متأخر
أعمال موقع جدة	25-Jan-2027	25-Mar-2027 (+59 يوماً)	25-Mar-2027	-47	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	29-Apr-2026 *	11-Apr-2027 (+347 يوماً)	11-Apr-2027	-61	▼ متأخر
انتهاء المشروع	25-Jan-2027	09-May-2027 (+104 أيام)	09-May-2027	-85	▼ متأخر

موقع جازان يحدد تاريخ الانتهاء.

تشترك أعمال موقع جازان وانتهاء المشروع في أبعد تاريخ متوقع، 09-مايو-2027، بفائض −85 يوماً. وتتصدر الأنشطة المفتوحة ذات الفائض السالب: الأثاث (19) والأعمال الكهربائية (15) والتجهيزات (14) والأبواب العازلة للهواء (12) وكابلات الشد الفولاذية (11) وأبواب الطوارئ (11) وملعبا البادل وكرة السلة (10 لكل منهما). * تاريخ الخطة الأساسية للاختبار والتشغيل 29-أبريل-2026 كما ورد في ورقة Milestones ويبدو خاطئاً.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ملف متابعة التوريدات بتاريخ 19-أكتوبر-2026.



اثنا عشر بنداً من Global Sport Gate: لم يورَّد شيء


الغشاء (18,019 م²) و1,521 مثبّتاً و1,488 م.ط من مقاطع L و162 وحدة إنارة و24 باباً والمولدات ووحدات التحويل الآلي ATS واللوحات الكهربائية والتهوية والعزل جميعها قيد التصنيع، والتوريد مجدول بين 01-نوفمبر و25-ديسمبر-2026. وتوريد القبة الهوائية هو التحدي المذكور في الملخص الأسبوعي، ويصنّف سجل المخاطر تأخر توريد القبة الهوائية بدرجة عالية.

الرصف والتشجير والتجهيزات الكهربائية

البردورات (8,868 م.ط) والإنترلوك (8,173 م²) جاري توريدها ولم يصل منها شيء إلى الموقع بعد. والأشجار والنجيل وأثاث الموقع وأعمدة الإنارة والإنارة الداخلية وإنذار الحريق وكاميرات المراقبة ولوحات الجهد المنخفض عند 0 أيضاً. وتمديدات الجهد المنخفض عند 4,500 من 7,700 م.ط. وإجمالاً لم يورَّد شيء من 37 بنداً متابَعاً. ويذكر التقرير الأسبوعي 117 مادة مخططة و35 أمر شراء صادراً و22 مادة في الموقع.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمال والموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

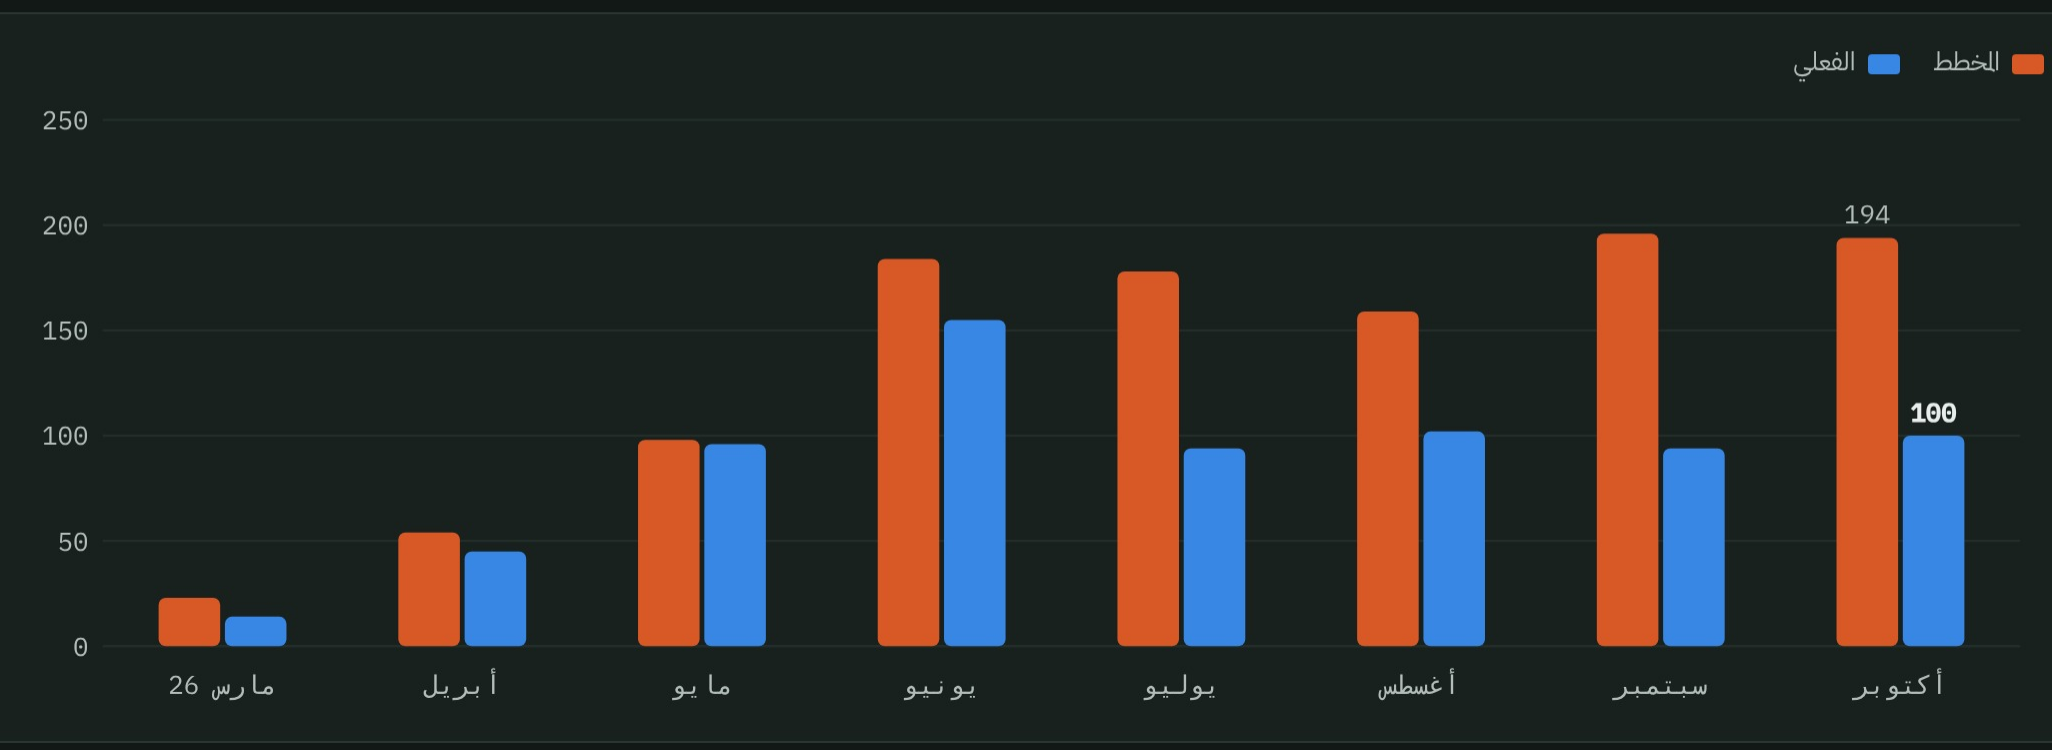

عدد العمالة في أكتوبر 100 مقابل 194 مخططاً (−48%): 70 عاملاً مقابل 175 مخططاً، و30 موظفاً مقابل 19.
والمعدات في الموقع 21 مقابل 27 مخططاً.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	33,997,787
التغييرات المحتملة	−204,183
قيمة العقد المعدلة	33,793,604
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	33,997,787
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. تذكر ورقة Conclusion أن 33,997,787 شاملة ضريبة القيمة المضافة. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	5
القيمة الإجمالية	4,943,711
الخصومات والغرامات	11,000
الصافي شاملاً الضريبة	5,674,267
المعتمد من مدير المشروع - مدن / المدفوع	0 / 0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	6,416,144

المفوتر 14.6% من قيمة العقد المعدلة مقابل إنجاز فعلي 42.4%. المستخلصات الخمسة معتمدة من الاستشاري، لكن لم يُسجَّل اعتماد أي منها من مدير المشروع في مدن ولا دفعه. وقيمة طلبات الفحص حتى تاريخه 18.9% من قيمة العقد.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.84

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	132,050
ساعات العمل هذا الأسبوع	6,480
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	156 / 160

تفتيش مدن للصحة والسلامة في الموقع 13-أكتوبر-2026 (التقرير رقم 13).

الجودة التقييم 0.86

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	657 / 634
طلبات الفحص المعلقة	22
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	102 / 99
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	20 / 20
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	25 / 25
تقديمات المخططات التنفيذية المنجزة	137 من 141
تقديمات اعتماد المواد المنجزة	130 من 147

قائمة ملاحظات مراقبة الجودة رقم 25، يوم التفتيش 19-أكتوبر-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
تمديدات الجهد المتوسط في مسار الحفر	المسؤول	أُثيرت في 10-أكتوبر-2026 (جازان، وفق سجل المخاطر والمشكلات). تتعارض تمديدات الجهد المتوسط مع مسار الحفر، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المعالجة مستمر، والمقاول بانتظار إذن المالك.
توريد القبة الهوائية	المقاول	مذكور بوصفه تحدي المشروع في الملخص الأسبوعي. ويصنّف سجل المخاطر تأخر توريد مواد القبة الهوائية بدرجة عالية (20)، والمعالجة متابعة مستمرة مع مدن لتسريع اعتماد تصميم القبة الهوائية، والموعد المستهدف 15-نوفمبر-2026.

يضم سجل المخاطر 9 مخاطر قائمة. ستة منها عالية: تأخر توريد القبة الهوائية، وجودة الهواء في الأماكن المغلقة، وصيانة المعدات وشهاداتها، والحماية من السقوط، والإجهاد الحراري، وفصل الحركة المرورية العامة. واثنان متوسطان (الدخول غير المصرح به إلى الموقع، والتخزين غير الآمن للمواد) وواحد منخفض (الأدوات المعيبة). والمشكلات السبع السابقة في سجل المشكلات مغلقة.

ملاحظات على البيانات

- استُخدم أحدث رفع أسبوعي فقط (W3، تاريخ البيانات 19-أكتوبر-2026). وقيم "هذا الأسبوع" مأخوذة من أعمدة الأسبوع الماضي في التقرير نفسه، ولا يتضمن جدول الكميات مثلها، لذا عمود هذا الأسبوع فيه فارغ.
- أسبوع التقرير هو أسبوع المشروع محسوباً من تسليم الموقع (من 26-مارس-2026 إلى 19-أكتوبر-2026 تساوي 207 أيام، أي الأسبوع 29). تحمل الملفات الرقم التسلسلي WPR-25 ولا تذكر رقم الأسبوع.
- تعطي أوراق الملخص الأسبوعي (الملفان 15 و16) وورقة Conclusion نسبة فعلية 35.39% مقابل 39.13% مخططة. وهذه أرقام مبنية على التكلفة (القيمة المكتسبة)، بينما يستخدم هذا التقرير التقدم الفعلي 42.41% مقابل 51.03%.
- يذكر الملف 16 مقاولاً مختلفاً (شركة الانجاز للتجارة والمقاولات) ومدير مشروع (عبد الله الشنيفي) وقطاعاً (القطاع الأوسط) وتاريخ بدء 24-نوفمبر-2025 ونهاية عقد 23-مايو-2026. بينما يذكر الملف 15 والتقرير الأسبوعي شركة بروفاست وم. يزيد آل رقبة و26-مارس-2026 و25-يناير-2027.
- تضع ورقة Physical-Chart Data الخطة المعدلة عند 57.8% لمنتصف أكتوبر، أعلى من 51.0% المخططة حتى 19 أكتوبر في ورقة Progress. ومجموع منحنى الخطة الأساسية 427,120 ساعة عمل مقابل 406,255 في الخطة المعدلة وورقة Progress.
- "الخطة الأصلية" للقيمة المكتسبة حتى تاريخه 10.5% في ورقة Progress، بينما تبلغ الخطة الأساسية في مخطط القيمة المكتسبة 78.6% بمنتصف أكتوبر.
- تبدو تواريخ الخطة الأساسية في ورقة Milestones لاعتماد البرنامج (02-يونيو-2026) والتجهيز (25-يناير-2027) والاختبار والتشغيل (29-أبريل-2026) مُزاحة، إذ يعطي ملخص الورقة الأولى في التقرير 29 أبريل و2 يونيو للأولين. وتؤرخ ورقة Conclusion نهاية المشروع بـ 25-يناير-2026 واكتمال الملاعب بـ 16-يناير-2026.
- أعمدة جدول الكميات الرئيسية في الورقة الأولى من التقرير مُزاحة (مثلاً الأشجار: الإجمالي 895 والمتبقي 30,380)، لذا أُخذت الكميات من ورقة Major Quantities.
- يحسب سجل المستخلصات 47 مستخلصاً معتمداً من الاستشاري رغم تقديم 5 فقط.
- تغطي ورقة إحصاءات السلامة الفترة 06–13 أكتوبر 2026 وتعطي 137,270 ساعة عمل تراكمية و159 اجتماع توعية، بينما يعطي ملخص التقرير 132,050 و156.
- يُظهر سجل التوريدات أعمدة الإنارة على أنها مورّدة إلى الموقع، بينما يُظهر ملف التوريدات 0 من 322. وفي ملف التوريدات تبدو أعمدة الملاحظات والوحدات مُزاحة في عدة صفوف.
- تُظهر عدة خلايا في الورقة الأولى من التقرير أخطاء #REF! (التكلفة المتوقعة عند الإنجاز وجدول المعالم).

أُعدّ في 28-أكتوبر-2026 من التقرير الأسبوعي المرفوع للأسبوع المنتهي في 19-أكتوبر-2026.
