مشروع تطوير شبكات البنية التحتية بالرياض الرابعة

Developing Infrastructure Networks in Riyadh's Fourth Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الرواف للمقاولات	شركة إيجيس للاستشارات الهندسية (EGIS)	شعيب الشعيبي	30-Nov-2025	30-May-2028

النطاق: بنية تحتية على مساحة نحو 6.5 كم² في المدينة الصناعية الرابعة بالرياض: الطرق والأنفاق، وشبكات الكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات والحماية، ومياه الشرب ومكافحة الحريق، والري، والصرف الصحي، وتصريف السيول، ومحطات رفع الصرف الصحي والسيول.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بنسبة إنجاز 25.2% مقابل 30.1% مخطط، المشروع متأخر بنسبة 4.9% (مؤشر الأداء الزمني 0.84). تقدم المشروع بنسبة 1.6% هذا الأسبوع مقابل 0.8% مخطط، فتقلصت الفجوة من 5.8% في الأسبوع الماضي. لا تزال الأعمال الترابية متقدمة كثيراً على الخطة، بينما التوريدات وأعمال الشبكات في المناطق والأنفاق متأخرة.

نسبة الإنجاز الفعلي
25.2% / 30.1% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.84 −4.9%

التقدم هذا الأسبوع
+1.6% / 0.8% مخطط
▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.9%

المدة المنقضية من العقد
36.2% · اليوم 330 من 912
▼ انتهاء P6: 01-فبراير-2029

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
16.0% · 71.0 مليون ريال
8 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

لا يزال البرنامج الزمني ينهي المشروع متأخراً نحو ثمانية أشهر.

ينهي مستخرج P6 في تقرير هذا الأسبوع المشروع في 01-فبراير-2029، أي بعد 247 يوماً من تاريخ انتهاء العقد في 30-مايو-2028 (الأسبوع الماضي: 13-فبراير-2029، −259 يوماً). ولا تزال ورقة المعلومات العامة في التقرير تذكر 06-فبراير-2029. وقد مرّ موعد معلم "اكتمال أعمال الجهد المتوسط والطرق" (30-سبتمبر-2026) ونسبة الأسفلت المنفذة 11.0% وشبكة الجهد المتوسط 0.3%.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من رفع 26-أكتوبر-2026 الأسبوعي. خمس منها بختم GPS بتاريخ 24-أكتوبر-2026: الأسفلت وطبقة الأساس على الطريقين RD-A-1 وRD-L-7، والحفر وتحسين التربة في البلوكين BL-31 وBL-33. والسادسة لتركيب مواسير السيول. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال الأسفلت، RD-A-1، المنطقة 04

فرّادة تفرش طبقة الأساس الإسفلتية. ختم GPS بتاريخ 24-أكتوبر-2026، 07:43.




طبقة الأساس الحصوية، RD-A-1، المنطقة 08

فرّادة تفرش طبقة الأساس من قلاب. ختم GPS بتاريخ 24-أكتوبر-2026، 07:54.




طبقة الأساس الحصوية، RD-L-7، المنطقة 05

فرّادة وقلاب على قاع الطريق. ختم GPS بتاريخ 24-أكتوبر-2026، 08:53.

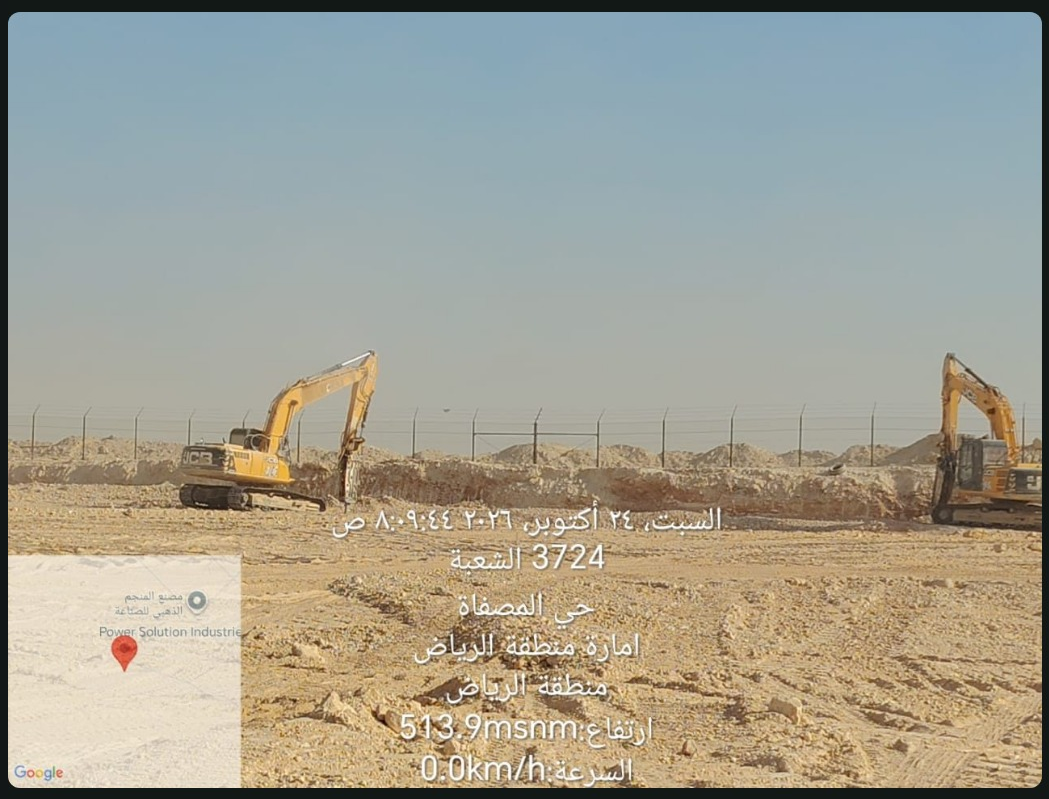

أعمال القطع، BL-31، المنطقة 09

حفارات تنفذ القطع في منسوب البلوك. ختم GPS بتاريخ 24-أكتوبر-2026، 08:09.

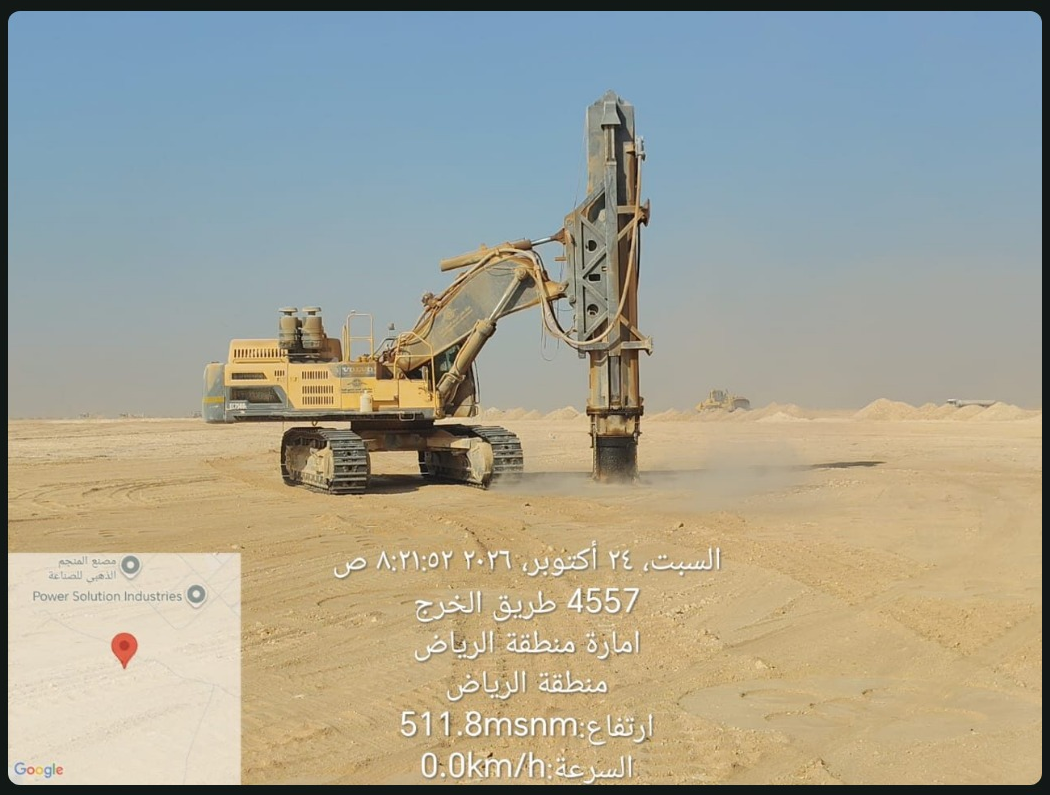

الدمك بالصدم السريع، BL-33، المنطقة 09

معدة الدمك بالصدم (RIC) تدمك منسوب البلوك. ختم GPS بتاريخ 24-أكتوبر-2026، 08:21.



تركيب مواسير السيول

ماسورة مركّبة في خندق مفتوح. بلا ختم؛ الملف بتاريخ 24-أكتوبر-2026.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة التقرير الأسبوعي، 26-أكتوبر-2026.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التصميم الهندسي	2.0%	100.0%	82.3%	−17.7%	0.82	▼ متأخر
التوريدات	8.2%	100.0%	6.6%	−93.4%	0.07	▼ متأخر
التنفيذ	78.7%	25.4%	29.3%	+3.9%	1.15	▲ متقدم
↳ الأعمال الترابية	21.9%	23.7%	74.0%	+50.3%	3.13	▲ متقدم
↳ أعمال المناطق (Z1–Z9)	50.7%	23.5%	9.2%	−14.3%	0.39	▼ متأخر
↳ الأنفاق	3.0%	97.5%	72.1%	−25.4%	0.74	▼ متأخر
↳ المحطات والقنوات المفتوحة والإزالة	3.1%	0.0%	1.4%	+1.4%	–	● لم يحن موعدها
الاختبار والتشغيل	11.2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعدها
الإجمالي	100%	**30.1%**	**25.2%**	**−4.9%**	**0.84**	▼ متأخر

في أعمال المناطق يتراوح مؤشر الأداء الزمني بين 0.02 (المنطقتان 1 و2) و0.54 (المنطقة 6)، وبدأت المنطقة 1 هذا الأسبوع. وسجلت المحطات أول تقدم لها هذا الأسبوع. وزن الأعمال التمهيدية والتصاريح أقل من 0.01%.

نطاق العمل: الكميات

إجمالي النطاق والكمية المنفذة والمتبقية لكل بند، من جدول النطاق في ورقة الخلاصة بالتقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026 (وهي نفس أرقام ورقة الكميات الرئيسية). الكميات للمشروع كاملاً وليست حسب المنطقة. "المنفذ هذا الأسبوع" هو كمية هذا التقرير مطروحاً منها كمية تقرير 19-أكتوبر-2026.

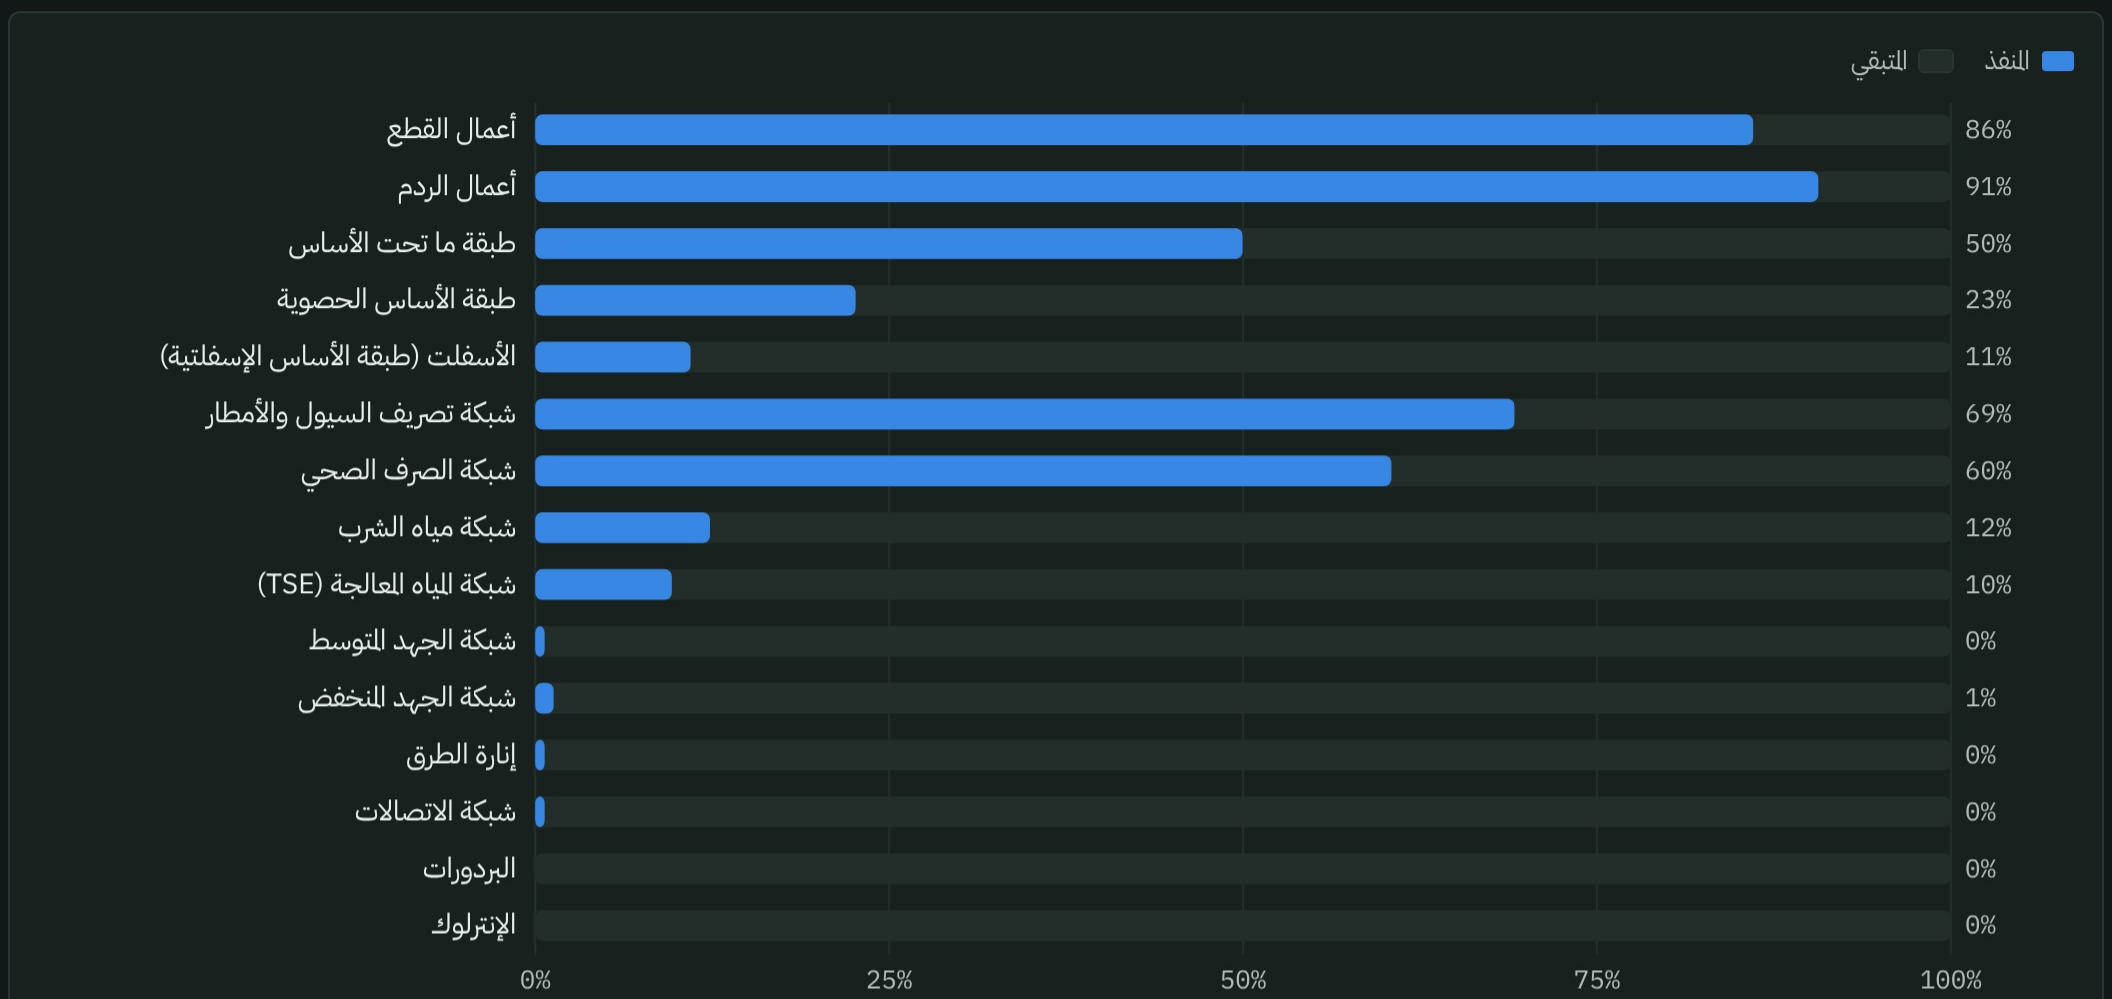

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
أعمال القطع	الكل	م³	4,319,104	3,716,000	39,640+	603,104	86.0%	–
أعمال الردم	الكل	م³	3,811,986	3,455,205	28,802+	356,781	90.6%	–
طبقة ما تحت الأساس	الكل	م³	232,143	116,000	3,000+	116,143	50.0%	–
طبقة الأساس الحصوية	الكل	م³	145,809	33,000	0	112,809	22.6%	–
الأسفلت (طبقة الأساس الإسفلتية)	الكل	م³	86,559	9,501	2,555+	77,058	11.0%	–
شبكة تصريف السيول والأمطار	الكل	م.ط	50,642	35,030	4,244+	15,612	69.2%	–
شبكة الصرف الصحي	الكل	م.ط	22,579	13,656	2,188+	8,923	60.5%	–
شبكة مياه الشرب	الكل	م.ط	31,687	3,912	412+	27,775	12.3%	–
شبكة المياه المعالجة (TSE)	الكل	م.ط	35,746	3,450	450+	32,296	9.7%	–
شبكة الجهد المتوسط	الكل	م.ط	131,104	350	0	130,754	0.3%	–
شبكة الجهد المنخفض	الكل	م.ط	24,579	320	0	24,259	1.3%	–
إنارة الطرق	الكل	م.ط	67,945	180	0	67,765	0.3%	–
شبكة الاتصالات	الكل	م.ط	53,637	201	0	53,436	0.4%	–
البردورات	الكل	م.ط	130,589	0	0	130,589	0.0%	–
الإنترلوك	الكل	م²	42,347	0	0	42,347	0.0%	–

تقدم الأعمال الترابية والشبكات الرطبة

أُنجز 86.0% من القطع و90.6% من الردم. وبلغت طبقة القاعدة 50.0% والأسفلت 11.0% (+2,555 م³ هذا الأسبوع)، وبقيت طبقة الأساس الحصوية عند 22.6%. وارتفعت شبكة السيول إلى 69.2% (+4,244 م) والصرف الصحي إلى 60.5% (+2,188 م).

شبكات الكهرباء والاتصالات متوقفة

لا تزال شبكة الجهد المتوسط عند 0.3% (350 من 131,104 م)، وإنارة الطرق 0.3%، والاتصالات 0.4%، والجهد المنخفض 1.3%، دون تغيير هذا الأسبوع. مياه الشرب عند 12.3% والمياه المعالجة 9.7%. ولم تبدأ البردورات والإنترلوك.

المعالم الرئيسية

معالم العقد من ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي. لم تُقدَّم تواريخ معالم P6 بصيغة مقروءة.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	التغير (أيام)	الحالة
ترسية العقد	09-Nov-2025	09-Nov-2025	0	✓ منجز
توقيع العقد	22-Nov-2025	22-Nov-2025	0	✓ منجز
تسليم الموقع	30-Nov-2025	30-Nov-2025	0	✓ منجز
اكتمال التجهيز	29-Dec-2025	30-Mar-2026	−91	✓ منجز متأخراً
تقديم واعتماد المخططات والمواد	28-Jan-2026	30-Apr-2026	−92	▼ متأخر
توريد جميع المواد للموقع	28-Feb-2026	–	–	▼ متأخر
اكتمال أعمال الجهد المتوسط والطرق	30-Sep-2026	30-Sep-2026	0	▼ متأخر
اكتمال الشبكات العميقة	30-May-2027	30-May-2027	0	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع الشبكات	30-Nov-2027	30-Nov-2027	0	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للاستلام الابتدائي	30-May-2028	30-May-2028	0	؟ يتعارض مع انتهاء P6 في 01-فبراير-2029
إخلاء الموقع وشهادة الاستلام الابتدائي	30-May-2028	30-May-2028	0	▼ معرّض للتأخير

لا يزال التقرير الأسبوعي يذكر ثلاثة تواريخ مختلفة للانتهاء.

تُبقي ورقة المعالم تاريخ 30-مايو-2028 دون تغيير، وتتوقع ورقة المعلومات العامة 06-فبراير-2029 (−252 يوماً، دون تغيير عن الأسبوع الماضي)، وينهي مستخرج P6 في ورقة التقدم المشروع في 01-فبراير-2029 بفائض زمني إجمالي −247 يوماً. ولا يزال معلم "اكتمال أعمال الجهد المتوسط والطرق" يظهر 30-سبتمبر-2026 دون تأخير، رغم مرور الموعد وعدم اكتمال الأعمال.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة للموقع من الكمية الكلية. المصدر: جدول توريد المواد في ورقة الخلاصة وورقة الكميات الرئيسية، التقرير الأسبوعي 26-أكتوبر-2026.



الكهرباء والاتصالات والبردورات والإنترلوك: لم يورّد شيء


لا تزال تمديدات الجهد المتوسط (131,104 م.ط) وإنارة الطرق (67,945 م.ط) والاتصالات (53,637 م.ط) والبردورات مسبقة الصب (130,589 م.ط) والإنترلوك (42,347 م²) كلها بنسبة توريد 0%.

مواد الشبكات الرطبة في الموقع غالباً

ورّد 99% من أطوال مواسير الصرف الصحي و98% لمياه الشرب و98% للري. وشبكة السيول عند 87% (44,030 من 50,642 م.ط)، بزيادة 1,000 م.ط عن الأسبوع الماضي. ومناهل المداخل عند 96% (480 من 501) وغرف التجميع عند 91% (906 من 998).

القوى العاملة

عدد العمالة اليدوية الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة، التقرير الأسبوعي 26-أكتوبر-2026.

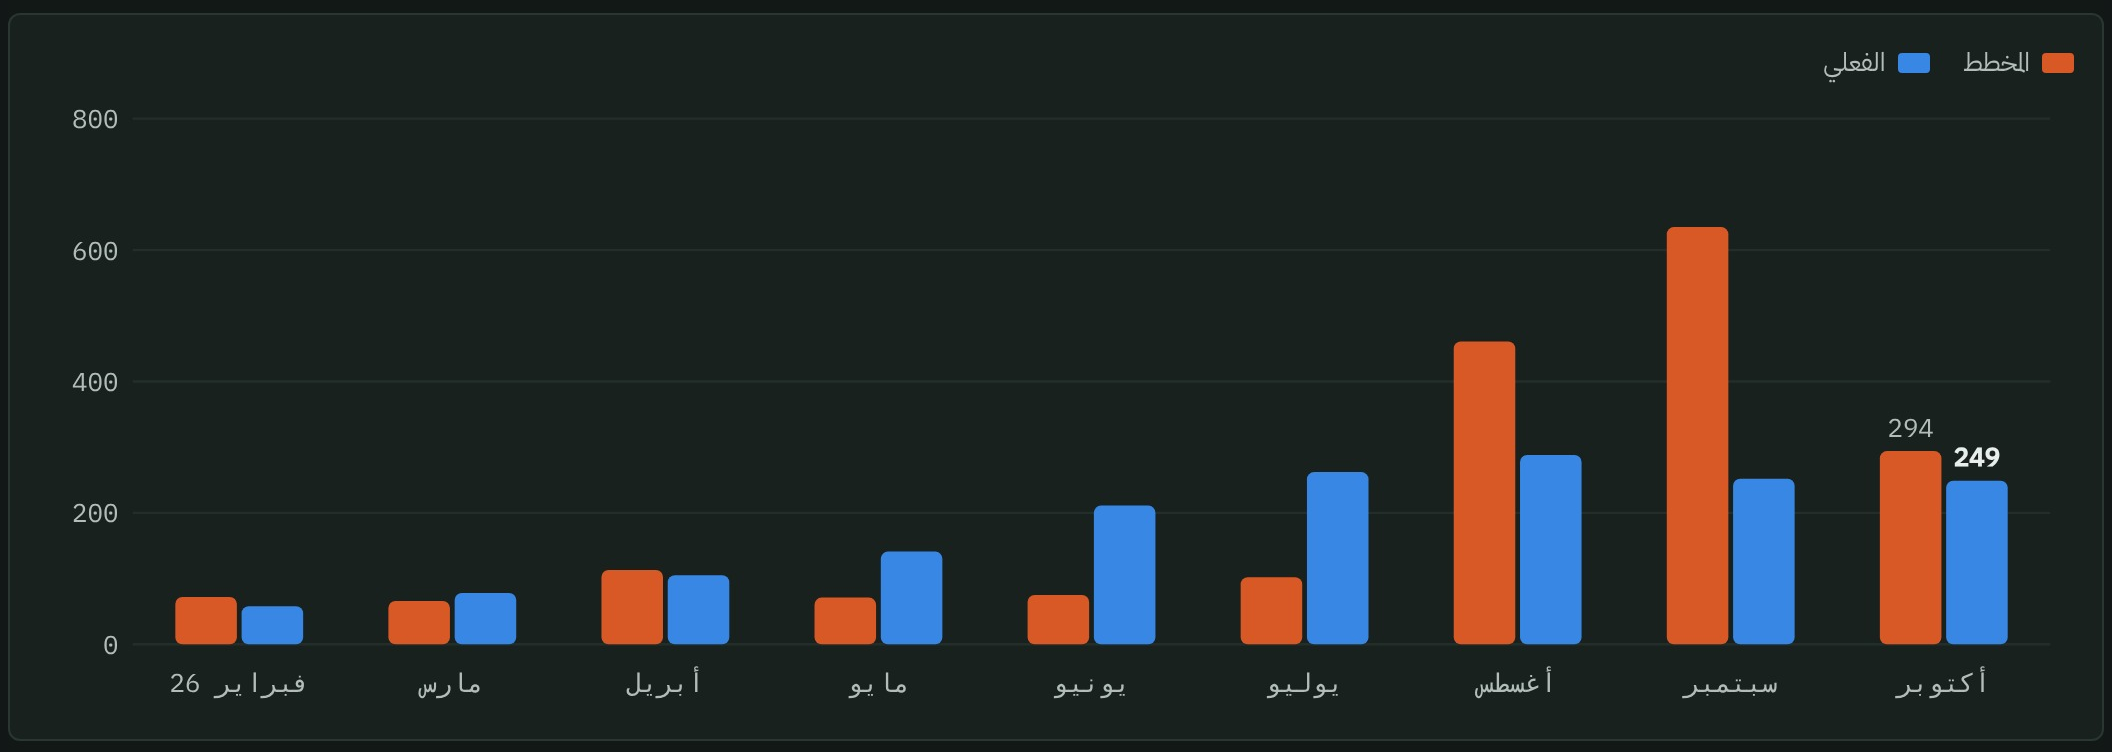

بلغت العمالة اليدوية في أكتوبر 249 مقابل 294 مخطط (−15%)، إضافة إلى 47 من الموظفين غير اليدويين، بإجمالي 296. وكان تقرير الأسبوع الماضي يذكر 252 لشهر أكتوبر. وترتفع الخطة إلى 1,033 في مارس 2027. في الموقع 208 من المعدات الرئيسية، منها 56 حفارة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الجدول 1: أعمال الطرق والموقع	214,146,361
الجدول 2: الأعمال الكهربائية	56,351,312
الجداول 2.1–2.3: الاتصالات وتقنية المعلومات والحماية	26,333,019
الجداول 3–6: المياه والري والصرف الصحي والسيول	98,702,595
الجدول 7: المباني والخدمات والأنفاق	49,466,713
قيمة العقد	**445,000,000**
جدول الكميات المعدل (بدون الضريبة)	352,632,896
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. مجموع الجداول يساوي قيمة العقد 445,000,000. وانخفض إجمالي جدول الكميات المعدل من 374,123,662 في الأسبوع الماضي. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	8
القيمة الإجمالية	71,001,361
الخصومات والغرامات	380,000
الصافي شاملاً الضريبة	81,271,566
معتمدة من الاستشاري	8
معتمدة من مدير المشروع - مدن / مدفوعة	0 / 0

المستخلصات تمثل 16.0% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 25.2%. لم يُقدَّم مستخلص جديد هذا الأسبوع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.55

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	458,560
ساعات العمل هذا الأسبوع	18,000
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	1
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	348 / 409

جميع أرقام السلامة مطابقة لتقرير الأسبوع الماضي. وتقييم السلامة من تفتيش مدن للصحة والسلامة بتاريخ 09-يوليو-2026.

الجودة التقييم 0.81

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	720 / 700
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	101 / 100
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	34 / 33
تعليمات الموقع	0
المخططات التنفيذية المقدمة (رمز A / B)	1,453 (7 / 1,446)
تقديمات اعتماد المواد	111

أعداد تراكمية من ورقة إحصاءات الجودة، دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
التعارض مع كابلات الجهد العالي لشركة الكهرباء	المقاول / شركة الكهرباء	تتعارض كابلات الجهد العالي التابعة لشركة نقل الكهرباء مع الطريق C2. قُدّم مقترح فني للحل وبانتظار رد شركة الكهرباء. التصنيف: حرج؛ الموعد المستهدف 30-أكتوبر-2026.
التعارض مع كابلات الجهد المتوسط لشركة الكهرباء	المقاول / شركة الكهرباء	تتعارض كابلات الجهد المتوسط مع الطريق C8. زار مقاول شركة الكهرباء (Pillar) الموقع ووُقّع محضر بدء الأعمال. التصنيف: حرج.
التعارض مع خدمات الرياض الخضراء	المقاول / الرياض الخضراء	يتعارض صمام هواء وحماية كاثودية على الطريق C8 مع الأعمال. ويجري التنسيق مع مقاول الرياض الخضراء للحصول على المخططات وتسعير التعديل. التصنيف: حرج.
التعارض مع خطوط غاز أرامكو	المقاول / أرامكو	تتعارض الشبكات الرطبة والجافة على الطريقين C8 وRD-L10 مع خطي غاز تابعين لأرامكو. قُدّمت الحلول الفنية وبانتظار رد أرامكو، وقد اعتُمدت سابقاً حلول شبكات الاتصالات والصرف الصحي والجهد المتوسط وتقنية المعلومات والجهد المنخفض. التصنيف: مرتفع.
تأخر التوريدات	المقاول	تطلبت تعديلات التصميم مراجعة أوامر الشراء، كما ارتفعت أسعار المواد. صدرت أوامر الشراء ويجري التوريد. التصنيف: مرتفع.
تأخر الإنجاز عن الخطة	المقاول	الإنجاز متأخر عن الجدول الزمني بسبب تعديل المخطط العام (وادي السلي) ونقص المعدات في بداية المشروع. اكتملت معظم المخططات التنفيذية وزيد عدد المعدات وفرق الشبكات. التصنيف: حرج.

أسباب التأخير الواردة في التقرير: تعديل المخطط العام بعد إعادة تصميم وادي السلي مما غيّر تصميم جميع الشبكات، ونقص المعدات في بداية المشروع.

ملاحظات على البيانات

يعتمد هذا التقرير على التقرير الأسبوعي المرفوع بتاريخ 26-أكتوبر-2026، وعلى تقرير 19-أكتوبر-2026 لقيم هذا الأسبوع. جميع نسب التقدم هي نسب الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. لا يوجد قسم منحنى التقدم لأن ورقة بيانات المنحنى الفعلي في الملف فارغة.

- رقم الأسبوع 47 هو أسبوع العقد المذكور في ورقة المعالم ("Current Contract Weeks: 47 of 130").
- يذكر الملف أيضاً نسبة تقدم مبنية على التكلفة، موصوفة في بعض المواضع بأنها الإنجاز الفعلي. لا يستخدمها هذا التقرير.
- تظهر ثلاثة تواريخ انتهاء في الملف: 30-مايو-2028 (ورقة المعالم)، و06-فبراير-2029 (المعلومات العامة، دون تحديث منذ الأسبوع الماضي)، و01-فبراير-2029 (مستخرج P6، فائض −247 يوماً؛ الأسبوع الماضي 13-فبراير-2029).
- إنجاز التوريدات بساعات العمل 6.6% فقط، رغم توريد 87–99% من مواسير الشبكات الرطبة. وقد حُدّثت ورقة الكميات الرئيسية هذا الأسبوع لتُظهر التوريدات، بعد أن كانت تُظهر 1–3% في الأسبوع الماضي.
- إحصاءات السلامة (18,000 ساعة عمل هذا الأسبوع، و458,560 تراكمياً) وأعداد الجودة مطابقة لتقرير الأسبوع الماضي، ويبدو أنها لم تُحدَّث.
- عُدّل عدد العمالة اليدوية لشهر أكتوبر من 252 (تقرير الأسبوع الماضي) إلى 249.
- تغيّر إجمالي جدول الكميات المعدل من 374,123,662 إلى 352,632,896 ريال دون توضيح.
- المستخلصات: يذكر الملف 8 مستخلصات بقيمة إجمالية 71,001,361 ريال ولم يُصرف أي منها؛ بينما ذكر عرض الأسبوع الماضي 54,980,525 ريال مستخلصات و41,804,647 ريال مصروفة. وقيمة العقد 445,000,000 ريال موصوفة بأنها "شاملة الضريبة" في ورقة الخلاصة و"غير شاملة الضريبة" في تفصيل الجداول.

- تختلف إجماليات النطاق بين الأوراق: الجهد المتوسط 131,104 م مقابل 171,170 م (ورقة Major)؛ والإنترلوك 42,347 م² مقابل 46,105 م². ولا تزال عدة لوحات ملخص تُظهر أخطاء #REF! أو #DIV/0! .
- لم يُرفع عرض التقدم ولا تحديث P6 (XER) هذا الأسبوع، لذا تعتمد حالة المعالم على الملف فقط، ولا يظهر الفائض الزمني لمعالم P6.
- الصور: خمس منها مختومة بتاريخ 24-أكتوبر-2026، وصورة مواسير السيول بلا ختم. ولم تُستخدم صورة الجدران الجانبية للنفق بتاريخ 28-أكتوبر-2026 (بعد تاريخ البيانات) ولا صورة ثانية لردم BL-31.

أُعدّ في 01-نوفمبر-2026 من التقرير الأسبوعي المرفوع بتاريخ 26-أكتوبر-2026، مع قيم هذا الأسبوع من تقرير 19-أكتوبر-2026.
