تقرير التقدم الأسبوعي · الأسبوع 46 تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026 رقم المشروع 3121 · KHJ1-02-007

تطوير شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية بالخرج

Development of Infrastructure Networks, Al-Kharj Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	مجموعة مفرح (MMAH)	إيجيس (EGIS)	راكان العتيبي	03-Dec-2025	02-Dec-2027

النطاق: شبكات البنية التحتية على مساحة 3.5 كم² تقريباً في المنطقتين A وB ومنطقة السكن العمالي.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. صدرت هذا الأسبوع خطة معدلة جديدة أصبح فيها التقدم المخطط حتى تاريخه 48.4% بعد أن كان 52.5% في الخطة السابقة. ووفقها المشروع متقدم بنسبة 0.9% بعد إنجاز 2.2% خلال الأسبوع.

نسبة الإنجاز الفعلي
49.3% / 48.4% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.02 +0.9%

التقدم هذا الأسبوع
%2.2 / %1.0 مخطط
▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة %1.2

المدة المنقضية من العقد
44.8% · اليوم 327 من 730
▼ انتهاء P6: 27-أبريل-2028

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
16.1% · 49.7 مليون ريال
5 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

الجدول الزمني يُنهي المشروع الآن متأخراً نحو خمسة أشهر.
يُحدد تحديث P6 المرفوع مع تقرير هذا الأسبوع انتهاء المشروع في 27-أبريل-2028، أي بعد تاريخ انتهاء العقد (02-ديسمبر-2027) بـ147 يوماً، وبفائض زمني −126 يوماً. ولا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع 02-ديسمبر-2027. وارتفع عدد الأنشطة المفتوحة ذات الفائض السالب من 701 إلى 1,243. ومقارنة بالخطة الأساسية الأصلية التي كانت تستهدف 83.0% بنهاية أكتوبر، يبقى المشروع متأخراً كثيراً عند 49.3%.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026، وتحمل ختم GPS بتاريخ 27-أكتوبر-2026 حيث يظهر الختم. تستمر أعمال الأسفلت والبردورات والإنارة، ويتقدم العمل في كرفان مكتب الموقع وهيكل مبنى خرساني. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.

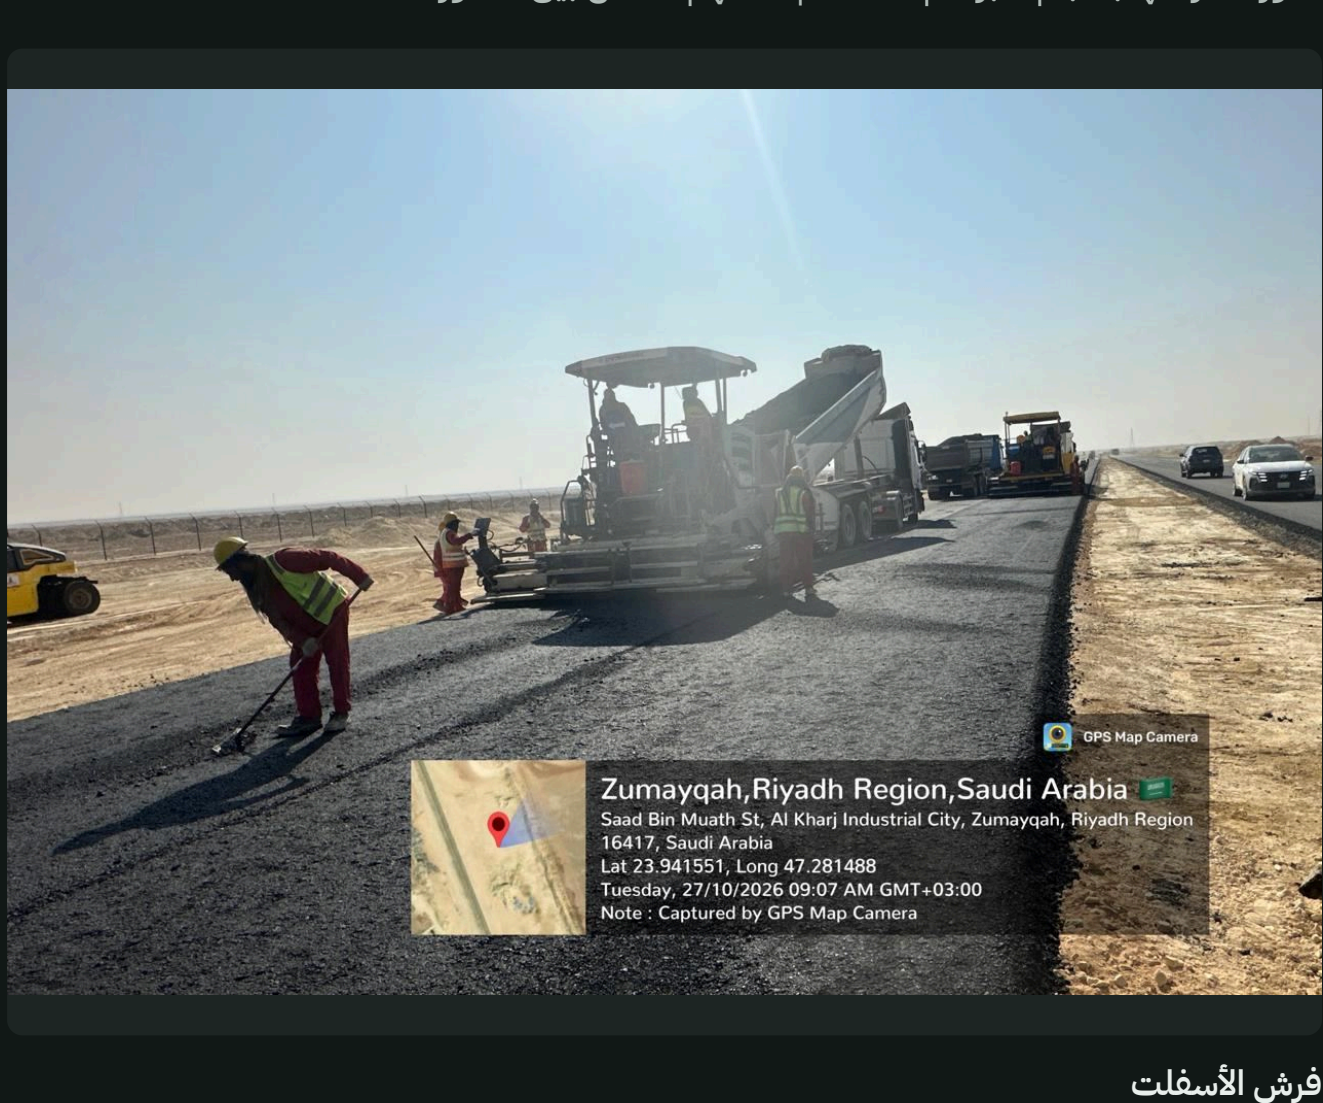
GPS Map Camera
Zumayqah,Riyadh Region,Saudi Arabia
Saad Bin Muath St, Al Kharj Industrial City, Zumayqah, Riyadh Region 16417, Saudi Arabia
Lat 23.941551, Long 47.281488
Tuesday, 27/10/2026 09:07 AM GMT+03:00
Note : Captured by GPS Map Camera

فرش الأسفلت
الفرّادة والطاقم على الطبقة الرابطة. ختم GPS بتاريخ 27-أكتوبر-2026، 09:07.

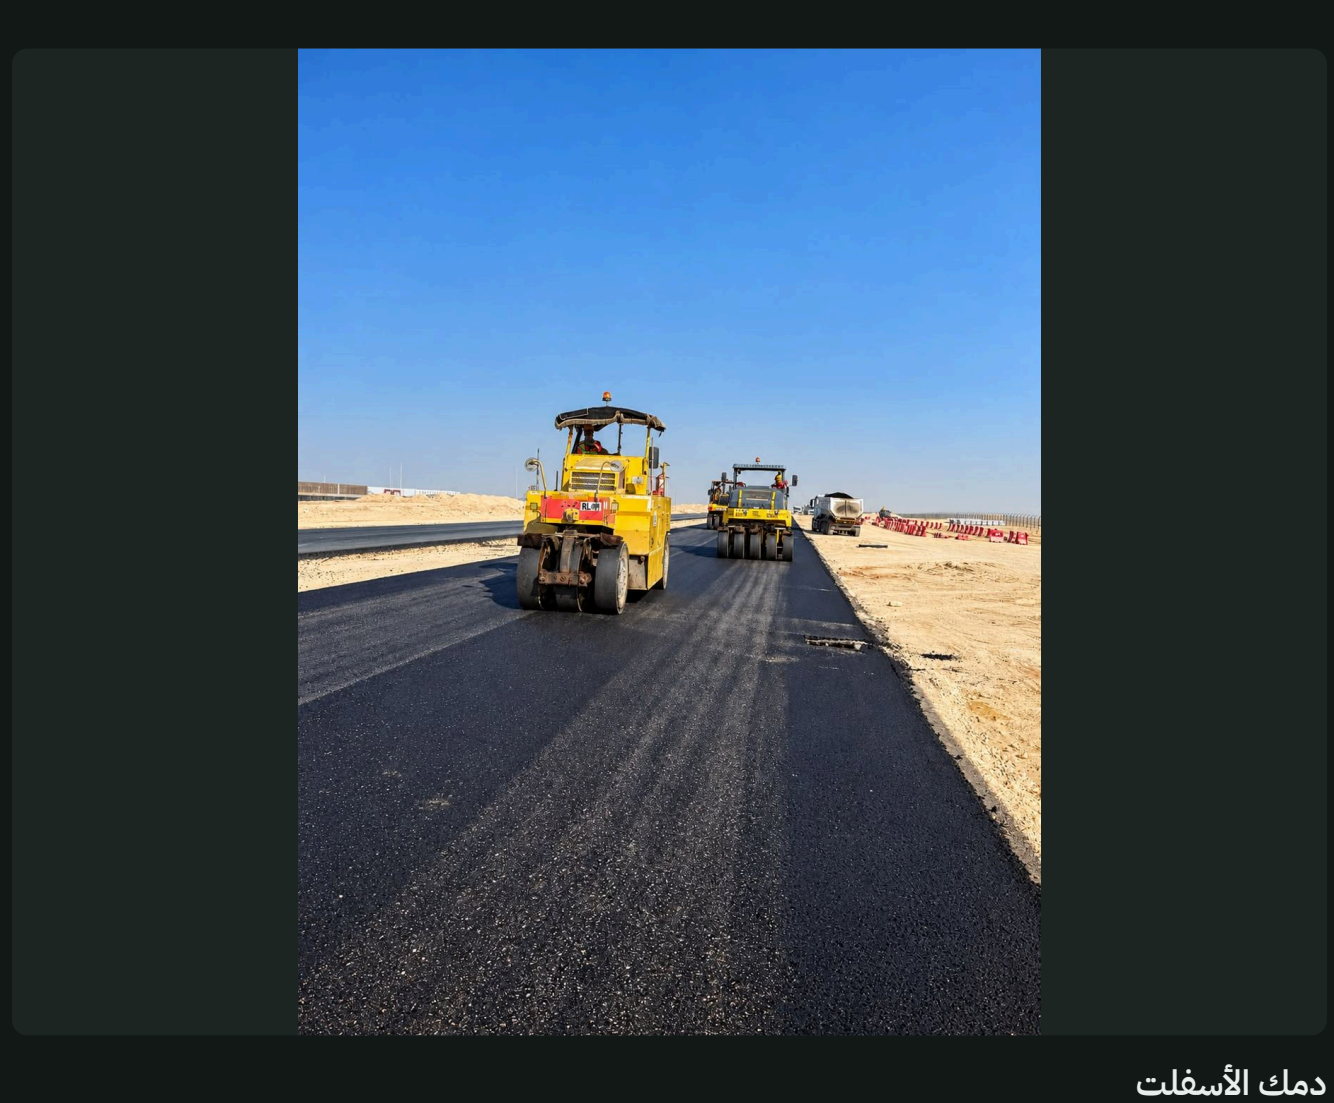

دمك الأسفلت
دحّالات مطاطية ومزدوجة على الطبقة الجديدة.

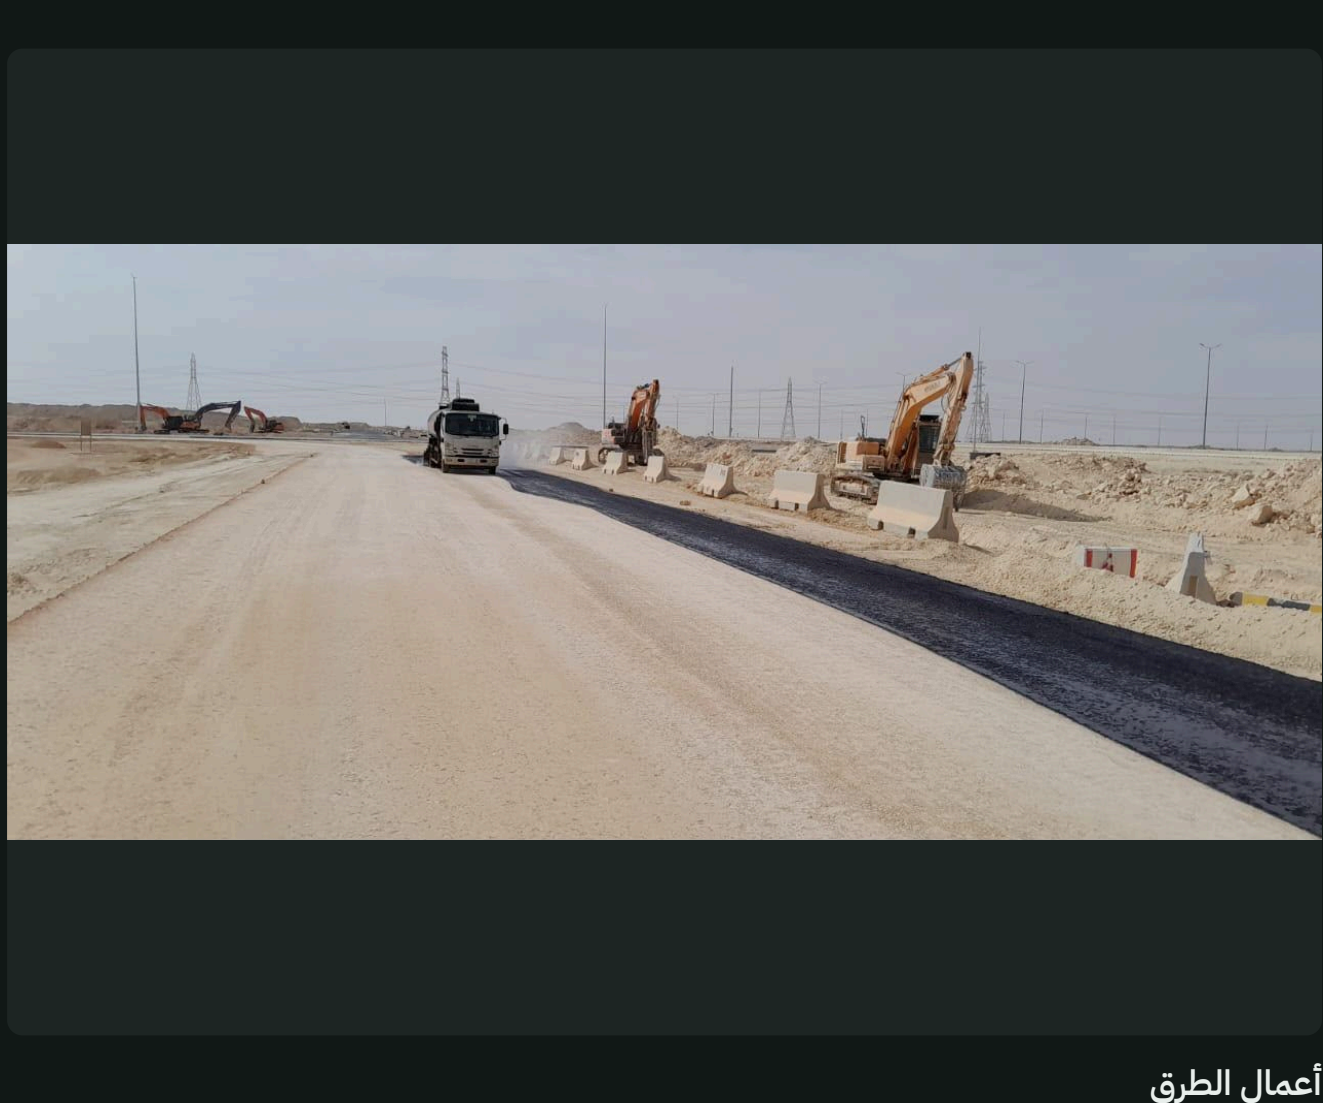

أعمال الطرق
مسار أسفلت منتهٍ بجانب طبقة الأساس، والحفّارات تعمل في الأمام.

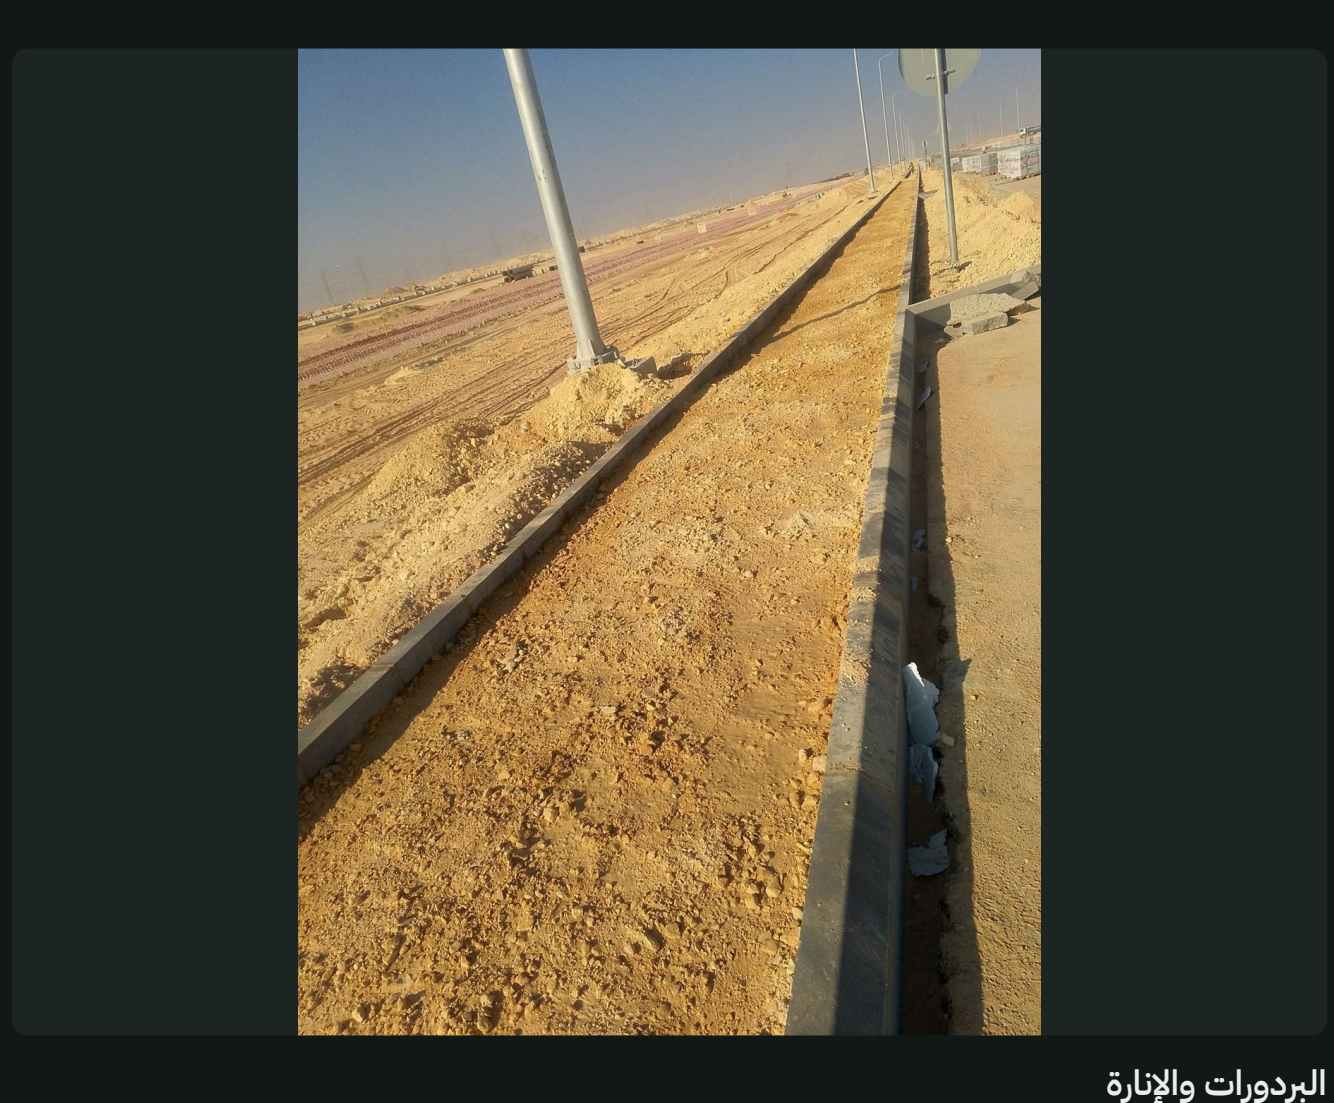

البردورات والإنارة
بردورات مركّبة على حافة الطريق، وأعمدة الإنارة مركّبة.

كرفان مكتب الموقع
كرفان مسبق الصنع مع تركيب الكسوة.

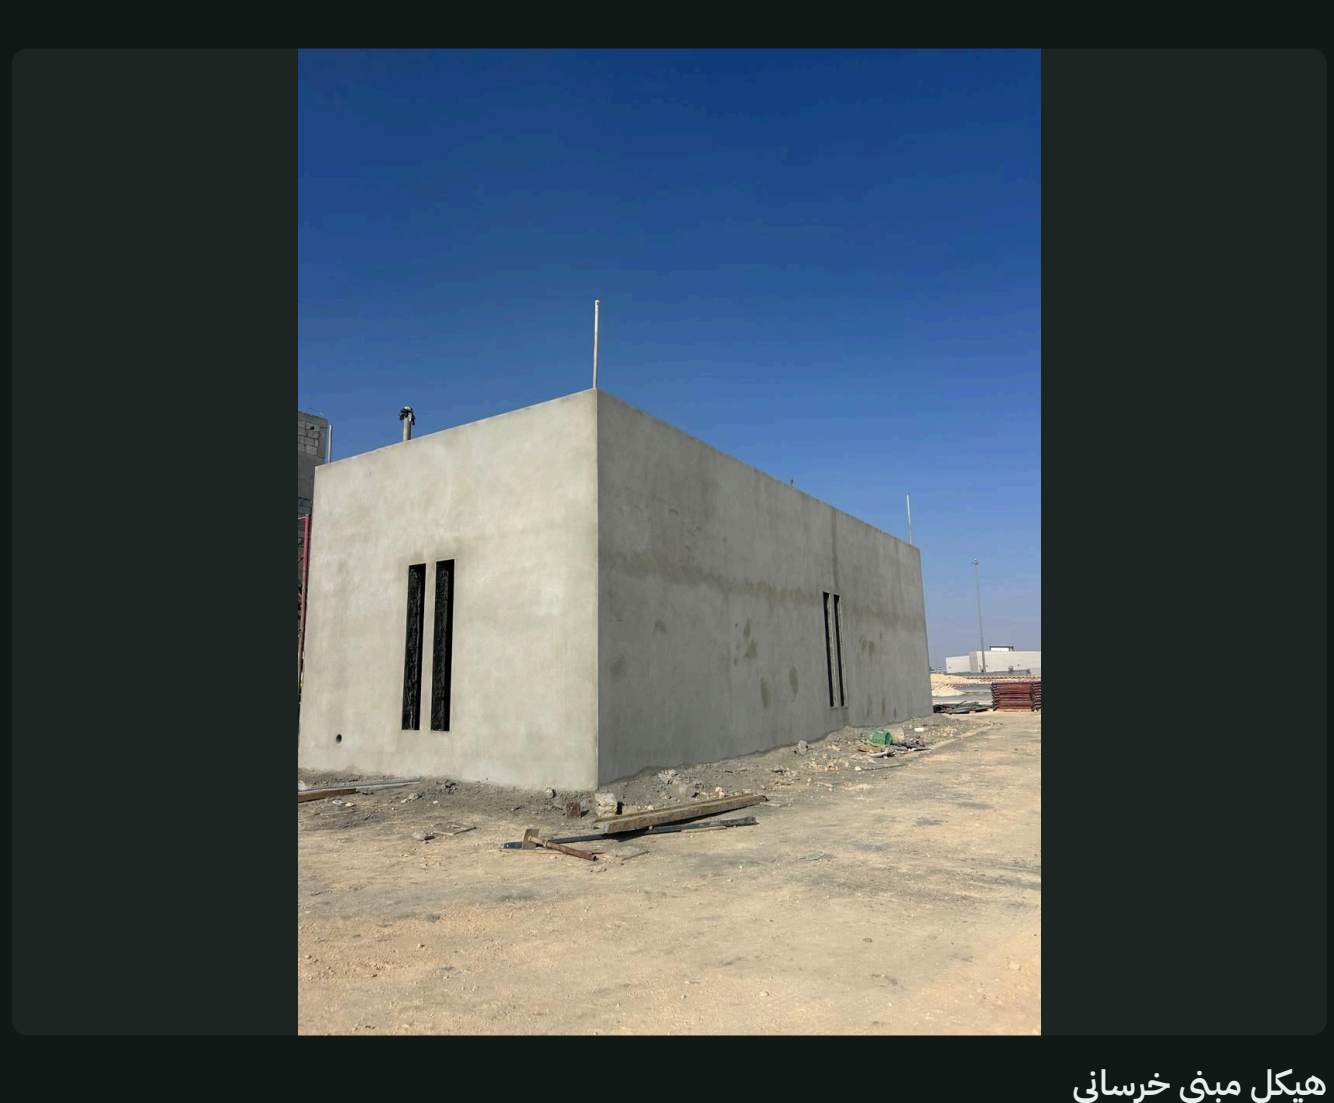

هيكل مبنى خرساني
اكتمل الهيكل الخرساني.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

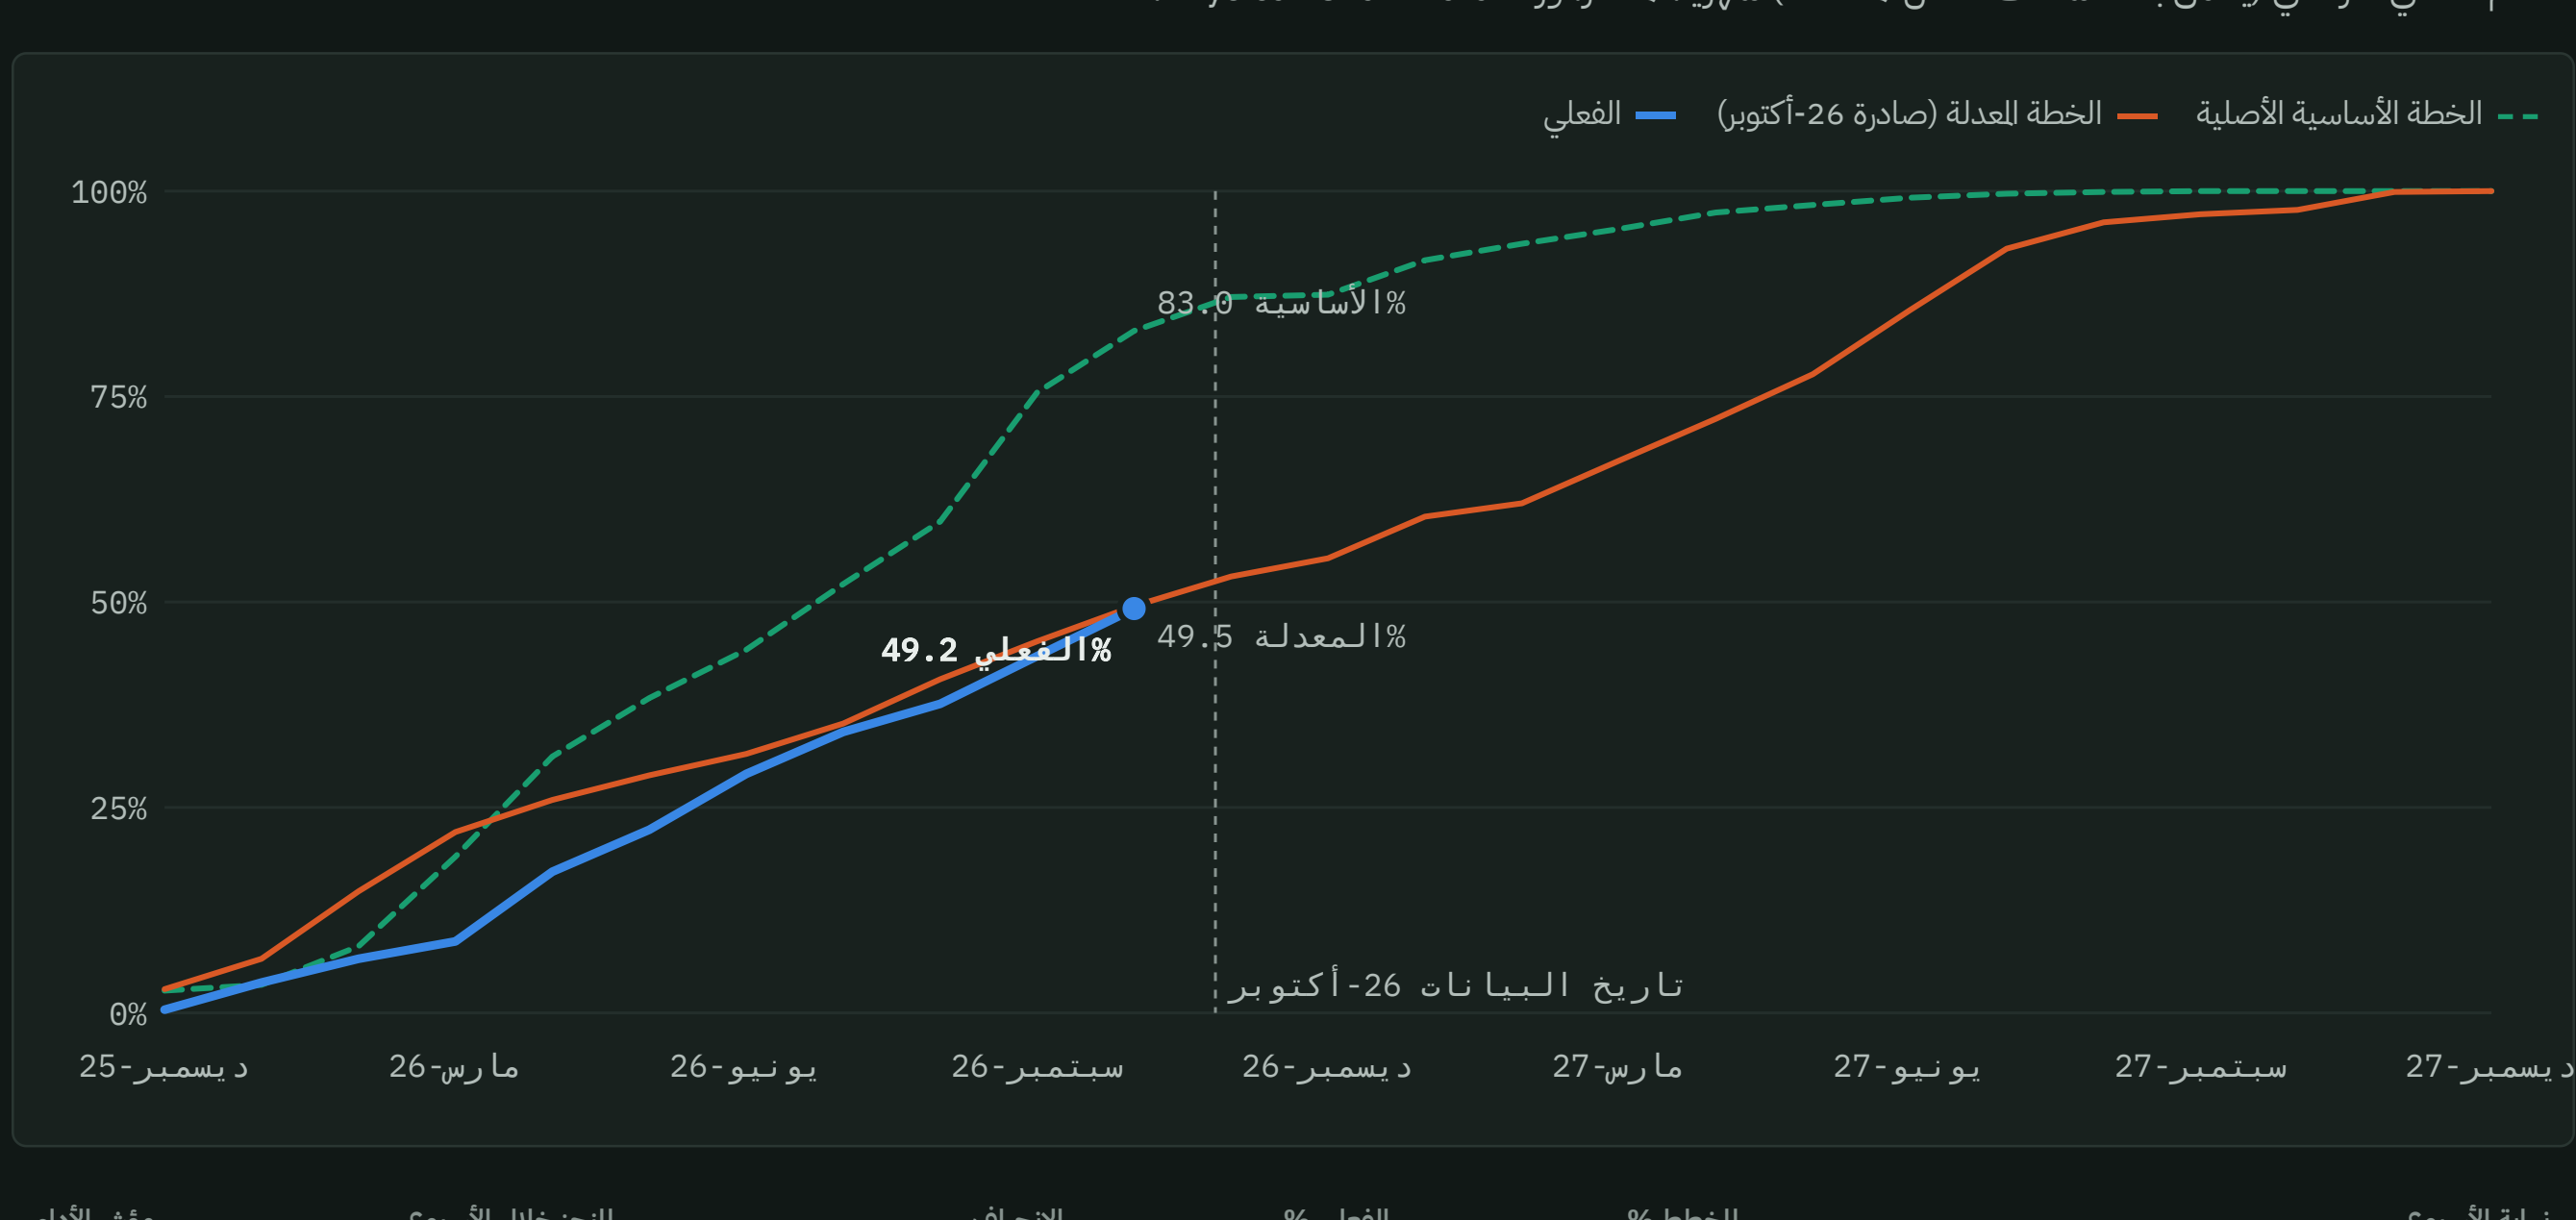

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
28-Sep-2026	47.2	42.5	-4.7	+0.8	0.90
05-Oct-2026	50.1	43.4	-6.7	+0.9	0.87
12-Oct-2026	51.4	45.7	-5.7	+2.3	0.89
19-Oct-2026	52.5	47.0	-5.5	+1.3	0.89
26-Oct-2026	**48.4***	**49.3**	**+0.9**	**%2.2**	**1.02**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقارير الأسبوعية من 28 سبتمبر إلى 26 أكتوبر. * اعتباراً من 26 أكتوبر تأتي القيمة المخططة من الخطة المعدلة الجديدة، لذا فإن الانتقال من −5.5% إلى +0.9% يعكس الخطة الجديدة إلى جانب تقدم هذا الأسبوع.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التصميم الهندسي	3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	20%	68.6%	76.5%	+7.9	1.12	▲ متقدم
التنفيذ	67%	44.8%	46.2%	+1.4	1.03	▲ في المسار
الاختبار والتشغيل	10%	16.0%	0.0%	-16.0	0.00	▼ لم يبدأ
الإجمالي	100%	**48.4%**	**49.3%**	**+0.9**	**1.02**	▲ في المسار

يضم تحديث P6 (نسخة الجدول ICKM01-22.Oct.2026، تاريخ البيانات 17-أكتوبر-2026) عدد 5,877 نشاطاً: 3,671 مكتملاً و254 قيد التنفيذ و1,952 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 27-أبريل-2028، أي بعد تاريخ العقد بـ147 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية لكل شبكة، من جداول الكميات في صفحات المخططات بعرض التقدم بتاريخ 26-أكتوبر-2026. بالنسبة للمواسير والتمديدات والمناهل، "المنفذ" يعني المركّب، ويُظهر العمود الأخير نسبة ما تم ردمه أيضاً. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" الكمية المنفذة منذ عرض 19-أكتوبر-2026.

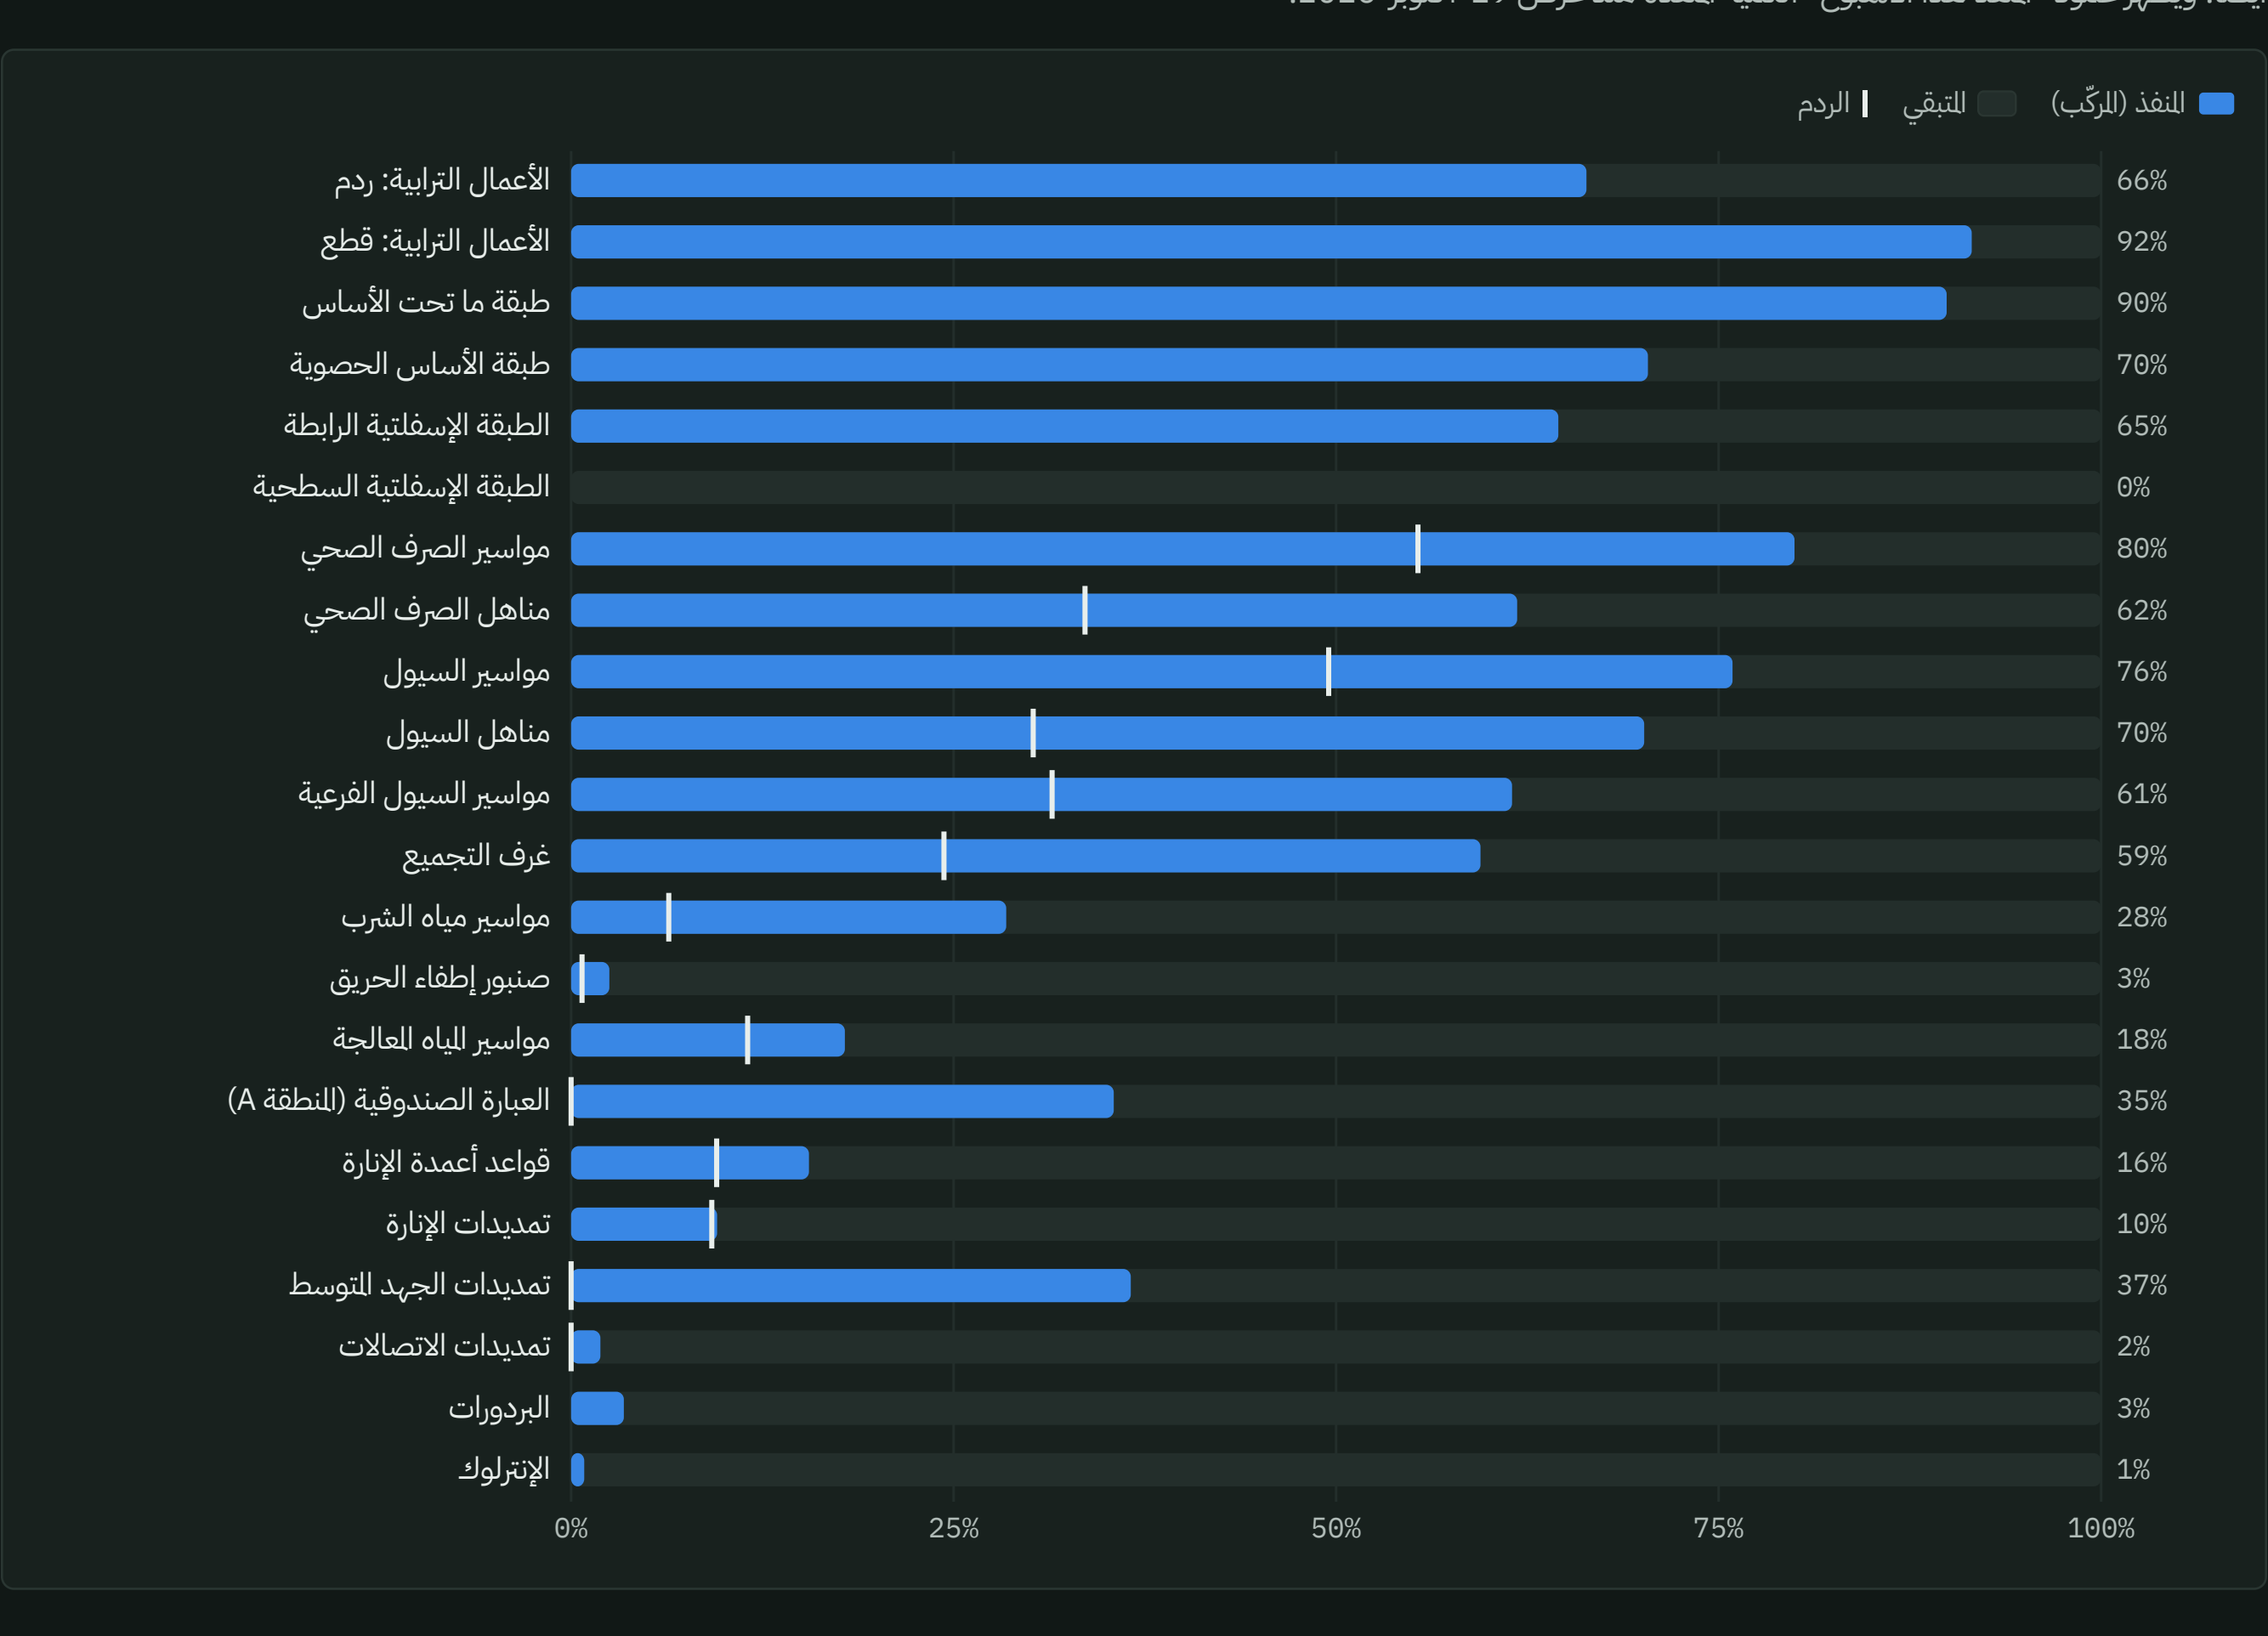

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الأعمال الترابية: ردم	A	م³	357,335	268,632	0	88,703	75.2%	–
	B	م³	499,555	300,000	18,324+	199,555	60.1%	–
	الإجمالي	م³	**856,890**	**568,632**	**18,324+**	**288,258**	**66.4%**	–
الأعمال الترابية: قطع	A	م³	97,475	89,831	0	7,644	92.2%	–
	B	م³	40,190	36,189	0	4,001	90.0%	–
	الإجمالي	م³	**137,665**	**126,020**	**0**	**11,645**	**91.5%**	–
طبقة ما تحت الأساس	A	م³	82,330	73,996	16,762+	8,334	89.9%	–
	B	م³	78,595	70,682	1,223+	7,913	89.9%	–
	الإجمالي	م³	**160,926**	**144,678**	**17,985+**	**16,248**	**89.9%**	–
طبقة الأساس الحصوية	A	م³	52,379	35,604	4,336+	16,775	68.0%	–
	B	م³	47,537	34,715	3,444+	12,822	73.0%	–
	الإجمالي	م³	**99,916**	**70,319**	**7,780+**	**29,597**	**70.4%**	–
الطبقة الإسفلتية الرابطة	A	م³	19,245	12,211	1,955+	7,034	63.5%	–
	B	م³	24,948	16,303	1,614+	8,645	65.3%	–
	الإجمالي	م³	**44,192**	**28,514**	**3,569+**	**15,678**	**64.5%**	–
الطبقة الإسفلتية السطحية	A	م³	12,400	0	0	12,400	0.0%	–
	B	م³	11,205	0	0	11,205	0.0%	–
	الإجمالي	م³	**23,605**	**0**	**0**	**23,605**	**0.0%**	–
مواسير الصرف الصحي	A	م.ط	14,308	11,541	1,011+	2,767	80.7%	50.7%
	B	م.ط	7,539	5,928	0	1,611	78.6%	64.1%
	الإجمالي	م.ط	**21,847**	**17,468**	**1,011+**	**4,378**	**80.0%**	55.3%
مناهل الصرف الصحي	A	عدد	286	160	25+	126	55.9%	39.5%
	B	عدد	107	83	0	24	77.6%	17.8%
	الإجمالي	عدد	**393**	**243**	**25+**	**150**	**61.8%**	33.6%
مواسير السيول	A	م.ط	14,482	10,911	331.4+	3,571	75.3%	52.4%
	B	م.ط	8,544	6,568	264+	1,977	76.9%	44.6%
	الإجمالي	م.ط	**23,026**	**17,479**	**595.4+**	**5,547**	**75.9%**	49.5%
مناهل السيول	A + السكن العمالي	عدد	194	124	13+	70	63.9%	33.5%
	B	عدد	104	85	0	19	81.7%	24.0%
	الإجمالي	عدد	**298**	**209**	**13+**	**89**	**70.1%**	30.2%
مواسير السيول الفرعية	A	م.ط	7,207	4,544	217.6+	2,663	63.0%	44.4%
	B	م.ط	5,323	3,162	91.5+	2,161	59.4%	13.9%
	الإجمالي	م.ط	**12,529**	**7,705**	**309.1+**	**4,824**	**61.5%**	31.4%
غرف التجميع	A	عدد	416	221	18+	195	53.1%	25.5%
	B	عدد	257	179	0	78	69.6%	22.6%
	الإجمالي	عدد	**673**	**400**	**18+**	**273**	**59.4%**	24.4%
مواسير مياه الشرب	A + السكن العمالي	م.ط	20,475	2,445	–	18,030	11.9%	1.4%
	B	م.ط	10,308	6,310	125.3+	3,998	61.2%	16.2%
	الإجمالي	م.ط	**30,783**	**8,754**	**–**	**22,029**	**28.4%**	6.4%
صنبور إطفاء الحريق	A	عدد	170	3	0	167	1.8%	1.2%
	B	عدد	110	4	0	106	3.6%	0.0%
	الإجمالي	عدد	**280**	**7**	**0**	**273**	**2.5%**	0.7%
مواسير المياه المعالجة	A	م.ط	13,023	130	0	12,893	1.0%	0.0%
	B	م.ط	10,991	4,167	220+	6,824	37.9%	25.2%
	الإجمالي	م.ط	**24,014**	**4,297**	**220+**	**19,717**	**17.9%**	11.5%
العبارة الصندوقية (المنطقة A)	A	م.ط	1,500	532	0	968	35.5%	0.0%
قواعد أعمدة الإنارة	A	عدد	509	68	0	441	13.4%	0.0%
	B	عدد	353	66	0	287	18.7%	23.2%
	الإجمالي	عدد	**862**	**134**	**0**	**728**	**15.5%**	9.5%
تمديدات الإنارة	A	م.ط	26,093	1,831	0	24,262	7.0%	7.0%
	B	م.ط	18,277	2,403	0	15,873	13.1%	12.3%
	الإجمالي	م.ط	**44,370**	**4,234**	**0**	**40,136**	**9.5%**	9.2%
تمديدات الجهد المتوسط	A	م.ط	27,225	5,313	0	21,912	19.5%	0.0%
	B	م.ط	44,775	21,024	0	23,751	47.0%	0.0%
	الإجمالي	م.ط	**72,000**	**26,337**	**0**	**45,663**	**36.6%**	0.0%
تمديدات الاتصالات	A	م.ط	34,149	0	0	34,149	0.0%	0.0%
	B	م.ط	20,299	1,042	0	19,257	5.1%	0.0%
	الإجمالي	م.ط	**54,448**	**1,042**	**0**	**53,406**	**1.9%**	0.0%
البردورات	A	م.ط	81,768	1,041	0	80,727	1.3%	–
	B	م.ط	74,109	4,333	0	69,776	5.8%	–
	الإجمالي	م.ط	**155,877**	**5,374**	**0**	**150,503**	**3.4%**	–
الإنترلوك	A	م²	71,538	0	0	71,538	0.0%	–
	B	م²	68,822	1,206	1,206+	67,616	1.8%	–
	الإجمالي	م²	**140,359**	**1,206**	**1,206+**	**139,154**	**0.9%**	–

العبّارات
العبّارتان 01 (الطريق المحلي 19) و02 (الطريق المحلي 20) مكتملتان. العبّارة 05 (الطريق المحلي 23) رُكّبت جميع وحداتها مسبقة الصب وعددها 35. العبّارة 06 (الطريق المحلي 24) رُكّبت 37 وحدة والحفر ما زال جارياً. العبارة الصندوقية في المنطقة A مركّبة بنسبة 35% ولم تُردم بعد.

لم تبدأ أو بالكاد بدأت
طبقة الأسفلت السطحية واتصالات المنطقة A عند 0%. الإنترلوك عند 0.9% (المنطقة B فقط)، والبردورات نحو 3%، وصنبور إطفاء الحريق 2–4%، والمياه المعالجة في المنطقة A 1%، ومياه الشرب في المنطقة A 12%. وتظهر شبكة السيول في منطقة المصانع لأول مرة في عرض هذا الأسبوع ولم يبدأ العمل فيها بعد.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث جدول P6 توقعات مختلفة للمعالم المرحلية. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	03-Dec-2025	03-Dec-2025	03-Dec-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	02-Jan-2026	02-Jan-2026	–	–	✓ منجز
أعمال الطرق	02-Oct-2026	07-Nov-2026 (+36 يوماً)	20-Dec-2026	-68	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	02-Oct-2026	31-Oct-2026 (+29 يوماً)	28-Jan-2027	-102	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	–	–	03-Mar-2027	-24	▼ معرّض للتأخير
شبكة الصرف الصحي	–	–	14-Mar-2027	-33	▼ معرّض للتأخير
شبكة الاتصالات	–	–	25-May-2027	-94	▼ متأخر
شبكة الري	–	–	18-Jul-2027	-141	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	–	–	30-Oct-2027	-230	▼ متأخر
جميع الشبكات	02-Feb-2027	02-Feb-2027	–	–	? يتعارض مع P6
تنسيق المواقع	–	–	19-Apr-2028	-118	▼ متأخر
تسليم المشروع	02-Dec-2027	02-Dec-2027	27-Apr-2028	-126	▼ متأخر

تواريخ P6 تتعارض مع معلم "جميع الشبكات" بتاريخ 02-فبراير-2027 ومع تاريخ انتهاء العقد.
يُنهي تحديث P6 لهذا الأسبوع الشبكات بين ديسمبر 2026 وأكتوبر 2027، والمشروع في 27-أبريل-2028. أضعف نقطة هي شبكة مياه الشرب بفائض −230 يوماً بسبب المحابس. ويشمل الفائض السالب الآن 1,243 نشاطاً مفتوحاً، في مقدمتها اللوحات المرورية (74) والغطاء النباتي والشجيرات (64) والأشجار والنخيل (61) وبنود التشجير (60) والبردورات مسبقة الصب (47).

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموردة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 26-أكتوبر-2026.

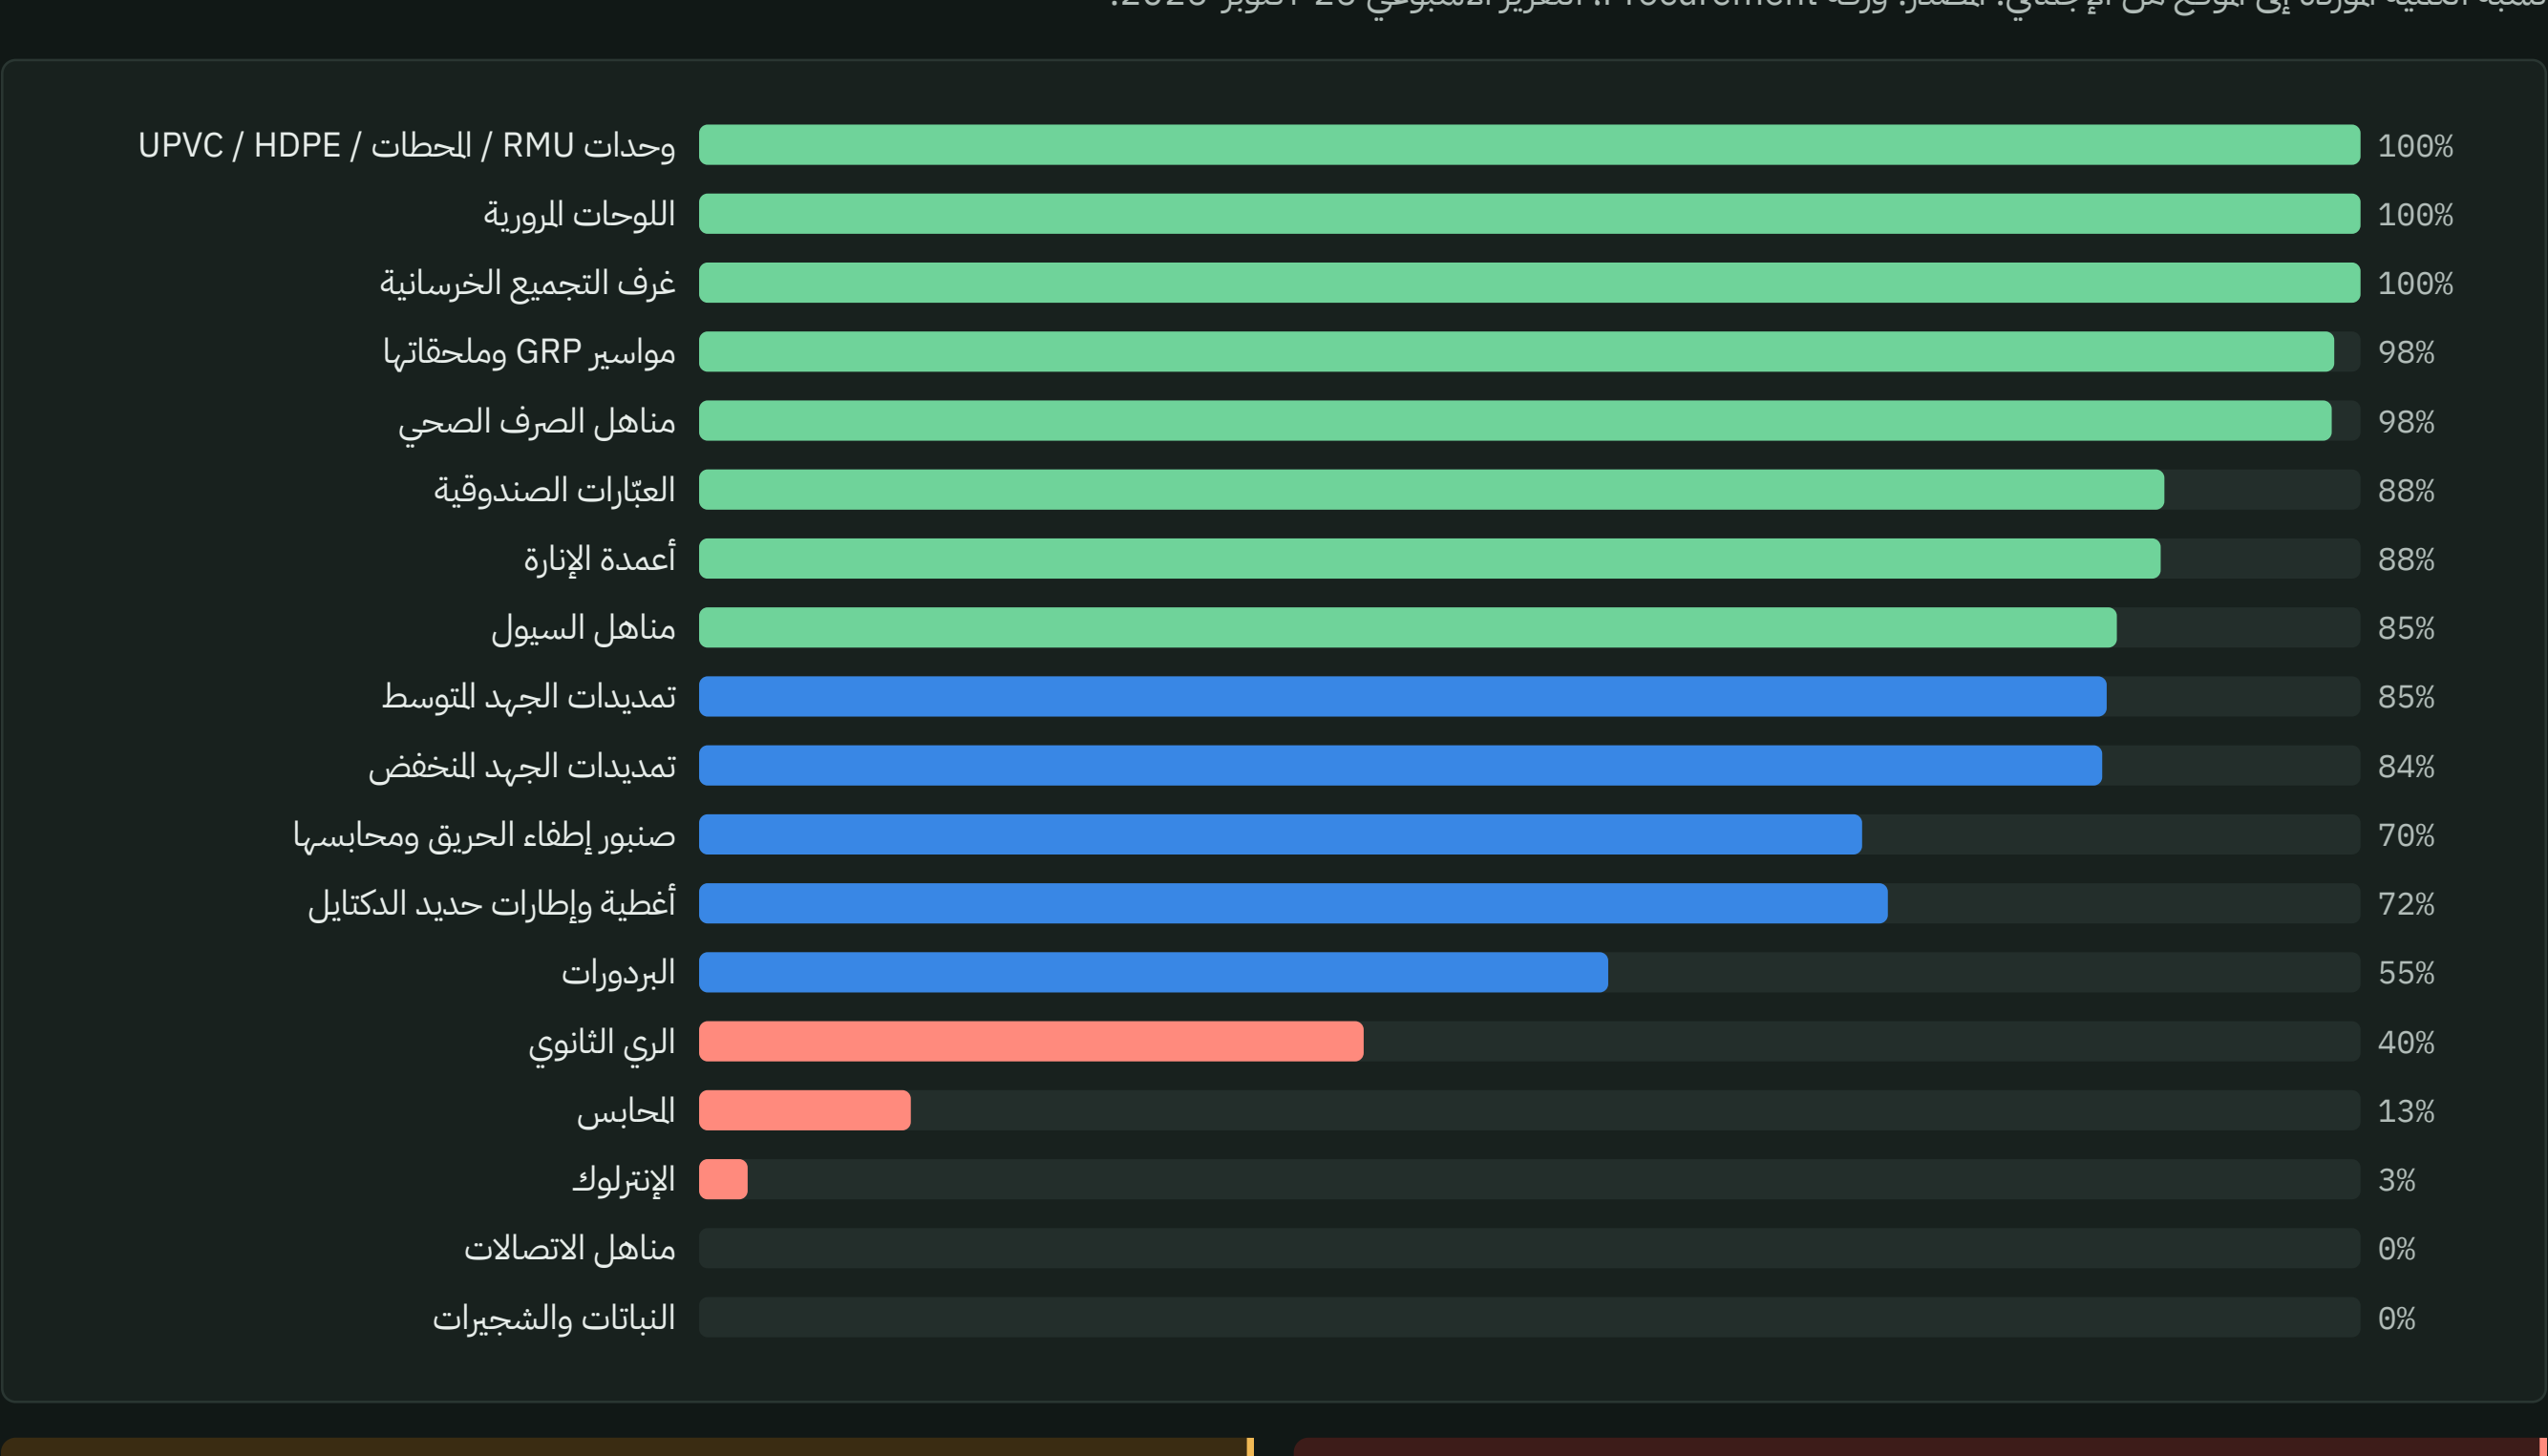

الإنترلوك: 3% مورّد
3,780 من 129,381 م.ط. العيّنة لم تُعتمد بعد والتوريدات ما زالت متوقفة، ومع ذلك يُذكر الآن تركيب 1,206 م² في المنطقة B.

المحابس ومناهل الاتصالات والتشجير
المحابس الموردة 347 من 2,723 (13%). مناهل الاتصالات 0 من 214، والموعد بحلول 20-نوفمبر. التشجير (30,556 م²) بانتظار الاتفاق على الكمية النهائية. تمديدات الجهد المتوسط 61 من 72 كم، بانتظار إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من اختبار القبول في المصنع.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

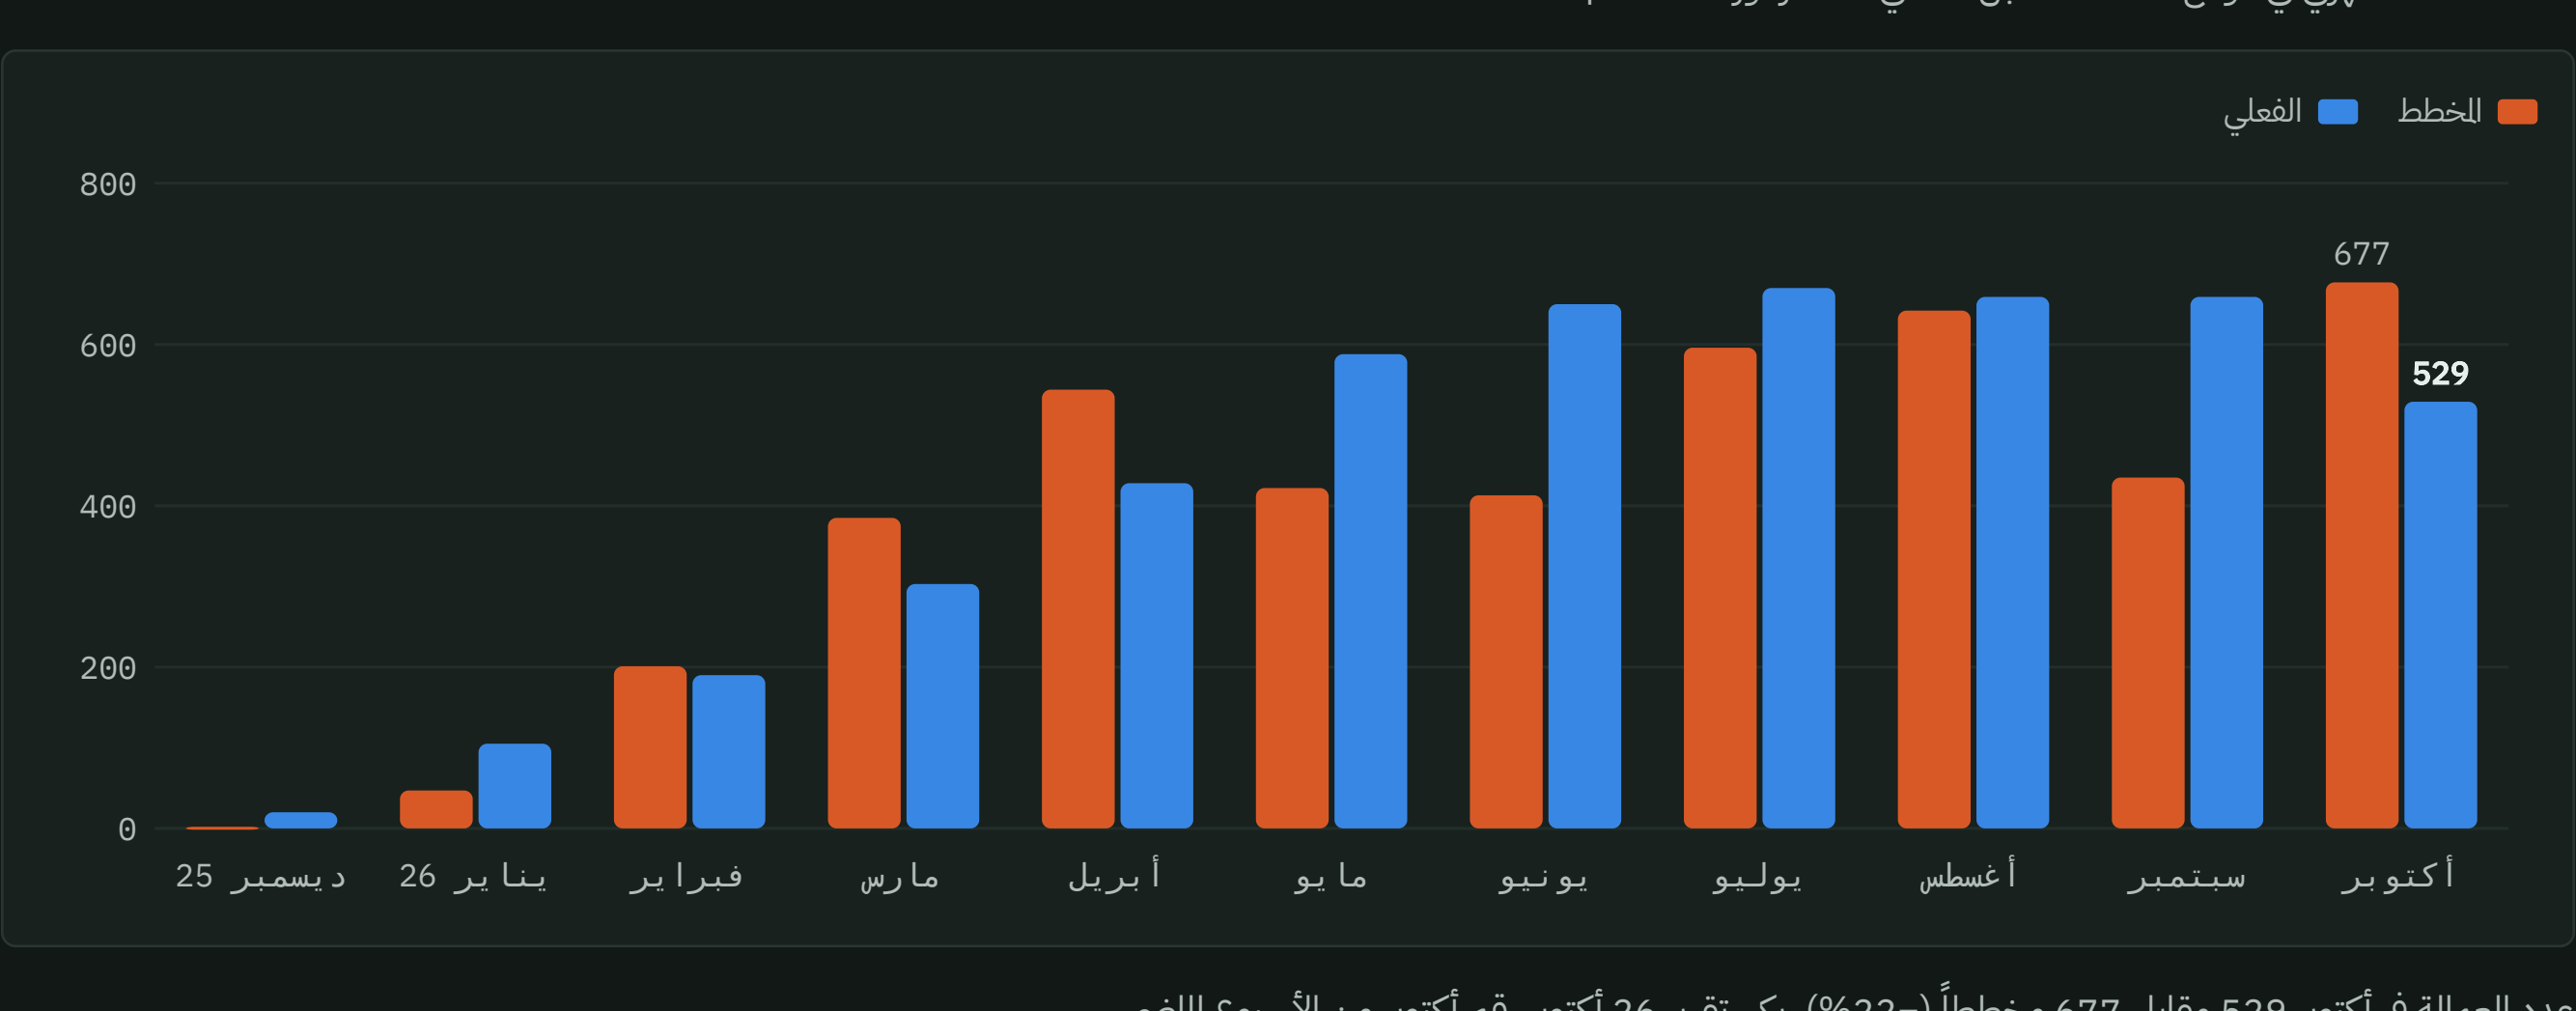

عدد العمالة في أكتوبر 529 مقابل 677 مخططاً (−22%). يكرر تقرير 26 أكتوبر رقم أكتوبر من الأسبوع الماضي. وتبلغ الخطة ذروتها عند 841 في نوفمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الحزمة 01: البنية التحتية، 3.5 كم²	226,527,683
الحزمة 02: منطقة السكن العمالي	18,085,168
الحزمة 03: مسجد ومهبط مروحيات وسيول وتأهيل طرق	23,118,731
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**267,731,582**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	307,891,320
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	5
القيمة الإجمالية	49,710,656
المحتجزات (10%)	4,971,066
الخصومات والغرامات	111,000
الصافي شاملاً الضريبة	51,339,529
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	61,710,656

المفوتر 16.1% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 49.3%. يسجل سجل المستخلصات تواريخ اعتماد للمستخلصات الخمسة، لكن ملخصه يُظهر 0 معتمداً من مدير المشروع و0 مدفوعاً. يجب تأكيد حالة الدفع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.90

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	1,135,445
ساعات العمل هذا الأسبوع	30,630
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	6
حوادث وشيكة	2
أضرار الممتلكات	3
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	1,944 / 217

الجودة التقييم 0.93

طلبات الفحص هذا الأسبوع: معتمدة	294
طلبات الفحص هذا الأسبوع: مرفوضة	9
طلبات الفحص قيد المراجعة	49
الاختبارات المنفذة (تراكمي)	2,450
تقارير عدم المطابقة (تراكمي)	37
طلبات الاستيضاح مفتوحة / مغلقة	1 / 122
طلبات فحص المواد المعتمدة	49
المخططات التنفيذية المعتمدة	2,087

أسبوع الجودة: 18–24 أكتوبر 2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
عوائق الموقع	المالك	عوائق بين حدود المصنع والطريقين المحليين 19–20. غرف قديمة ومستودع مسوّر ولوحات على الطريق المحلي 18. خزان ديزل لم تُحدَّد الجهة المسؤولة عن إزالته. منطقة الكسارة لم تُسلَّم رسمياً بعد.
تعارضات شبكة الجهد المتوسط	المقاول	مسار الجهد المتوسط قريب جداً من شبكتي المياه والري، مما يمنع بدء أعمال الجهد المتوسط الداخلية.
العبّارة الصندوقية، المنطقة A	المقاول	يتعارض حفر العبّارة الصندوقية لتصريف السيول مع تمديدات الجهد المنخفض والمتوسط القائمة ومواسير المياه والري.
استمرارية الأسفلت	المقاول	يجب استمرار أعمال الأسفلت دون انقطاع لاستعادة معلم الطرق.
استعادة المعالم	المقاول	أُغلق التعافي في التصميم والتوريد، والتعافي في التنفيذ مستمر.
وفورات التكلفة	المقاول	تحديد الوفورات المالية والفنية الممكنة.

المخاطر القائمة في السجل: الطقس (أمطار ورياح وغبار)، وتوريد مواد الردم والمناهل والمواسير، وسلامة الحفر العميق، والخدمات والطرق القائمة، وتأخر المواد الرئيسية.

ملاحظات على البيانات

- تُظهر عدة جداول ملخصة في ملف التقرير الأسبوعي (التقديمات، التوريد، العمالة حسب المهنة، أهم المشكلات) أخطاء ‎#REF!‎، لذا أُخذت الأرقام من الأوراق التفصيلية.
- توقعات المعالم في التقرير الأسبوعي لا تطابق تحديث P6، ويختلفان الآن أيضاً على تاريخ الانتهاء، انظر قسم المعالم الرئيسية.
- صدرت خطة معدلة جديدة مع تقرير 26 أكتوبر. انخفض التقدم المخطط حتى تاريخه من 52.5% إلى 48.4%، لذا فإن معظم التغير من −5.5% إلى +0.9% يعود إلى الخطة الجديدة وليس إلى أعمال هذا الأسبوع.
- تحديث P6 المرفوع في 26 أكتوبر تاريخ بياناته 17-أكتوبر-2026، وهو نفس تاريخ ملف الأسبوع السابق، لذا لا يشمل أعمال الأسبوع الأخير.
- ورقة القوى العاملة تكرر رقم أكتوبر من الأسبوع الماضي (529).
- طلبات فحص المواد المعتمدة تُظهر 49 تراكمياً هذا الأسبوع مقابل 213 الأسبوع الماضي، ويبدو أن العداد أُعيد ضبطه.
- تُظهر ورقة الجودة 53,207 طلب فحص معتمداً للأسبوع السابق، ويبدو ذلك خطأً في الإدخال.
- التقارير الأسبوعية موجودة في W1–W5 (من 28 سبتمبر إلى 26 أكتوبر). كما رُفعت نسخ من ملفات Excel وPDF الأصلية داخل مجلد MD Files في W1، ومكانها مجلد All Files.
- كميات النطاق: يضيف عرض هذا الأسبوع جدول مياه الشرب للمنطقة A الذي كان ناقصاً، ويصحح إجمالي اتصالات المنطقة A من 155,000 م.ط إلى 34,149 م.ط. ولا تزال أعمدة الإنارة موسومة بالمتر الطولي في المصدر رغم أنها معدودة بالوحدة.

أُعدّ في 28-أكتوبر-2026 من التقارير الأسبوعية المرفوعة للأسابيع المنتهية من 28 سبتمبر إلى 26 أكتوبر 2026.
