شبكات البنية التحتية للمنطقة اللوجستية لمساحة 1 كم مربع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

Infrastructure Networks for the 1 km² Logistics Zone, 2nd Industrial City, Dammam

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة شبه الجزيرة للمقاولات	إيجيس (Egis)	محمد العيسى	30-Jul-2025	29-Jan-2027

النطاق: المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية. الشبكات الرطبة (الصرف الصحي، وتصريف السيول، ومياه الشرب، ومكافحة الحريق، والمياه المعالجة، بما فيها خط الضخ الرئيسي)، والشبكات الجافة (الجهد المتوسط، والجهد المنخفض، والإنارة، والاتصالات)، ومحطة ضخ مياه الشرب، ومحطة رفع الصرف الصحي، وغرف الحراسة، وجميع طبقات الطرق حتى الطبقة الإسفلتية السطحية، وتنسيق المواقع.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026 بلغ الإنجاز 57.9% مقابل 71.1% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 13.2% عن الخطة (مؤشر الأداء الزمني 0.81). وأنجز هذا الأسبوع مقابل 5.5% مخططاً، فاتسعت الفجوة من 9.7% إلى 13.2%. 2.1%

نسبة الإنجاز الفعلي
57.9% / 71.1% مخطط
مؤشر الأداء الزمني 0.81 ▼
−13.2%

التقدم هذا الأسبوع
2.1% / 5.5% مخطط
أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 3.5% ▼

المدة المنقضية من العقد
81.6% · اليوم 447 من 548
التسليم المتوقع 01-مارس-2027 ▼

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
31.6% · 62.9 مليون ريال
7 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 15-سبتمبر-2026

مع انقضاء 81.6% من مدة العقد، يتبقى 42.1% من الأعمال.

يتطلب الإنهاء بحلول تاريخ انتهاء العقد 29-يناير-2027 نحو 2.9% أسبوعياً، مقابل 2.1% تحققت هذا الأسبوع. وتبلغ الخطة المعدلة 92.9% بنهاية نوفمبر و100% في ديسمبر 2026. وتتوقع ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي وتحديث P6 تسليم المشروع في 01-مارس-2027، أي بتأخير 31 يوماً، بينما تذكر ورقة المعلومات العامة 14-فبراير-2027. والتنفيذ هو المرحلة الأضعف: 45.1% منجز مقابل 70.9% مخطط.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من الموقع رُفعت مع التقرير الأسبوعي بتاريخ 20-أكتوبر-2026، وتحمل ختم الكاميرا من 15 إلى 18 أكتوبر 2026 حيث يظهر الختم. تُظهر الصور أعمال الأسفلت واختبار طبقات الطريق وأعمال التمديدات وأعمال المباني. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




فرش الأسفلت

فرّادة ودحّال مزدوج على مسار أسفلت جديد. لا يوجد ختم تاريخ.



اختبار الكثافة الحقلية

اختبار طبقة طريق مدموكة. ختم الكاميرا 17-أكتوبر-2026، 15:39، الدمام.

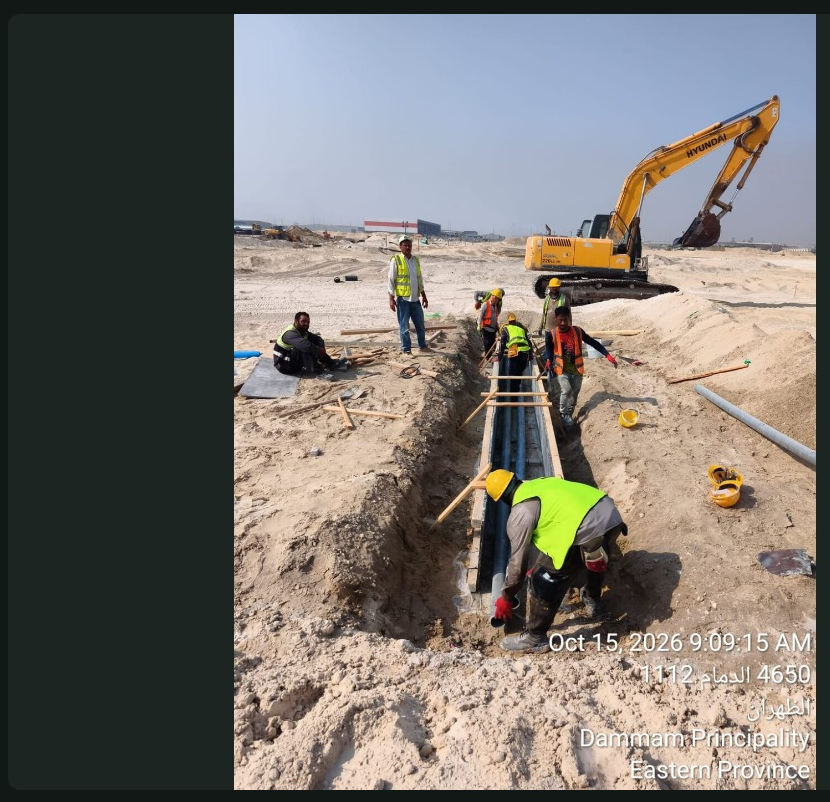

تمديد المواسير في الخندق

مواسير تمديدات مثبتة على فواصل خشبية. ختم الكاميرا 15-أكتوبر-2026، 09:09، الدمام.



خرسانة في الخندق

شريط خرساني مصبوب على طول الخندق. ختم الكاميرا 17-أكتوبر-2026، 08:01، الدمام.



أعمال البلوك للمباني

جدران بلوك ترتفع بين أشاير الأعمدة. لا يوجد ختم تاريخ.




أعمال القواعد

صب الخرسانة بين أقفاص حديد الأعمدة. ختم الكاميرا 18-أكتوبر-2026، 06:49.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) بقيم نهاية كل شهر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data. قيمة أكتوبر الفعلية هي قيمة 20 أكتوبر.

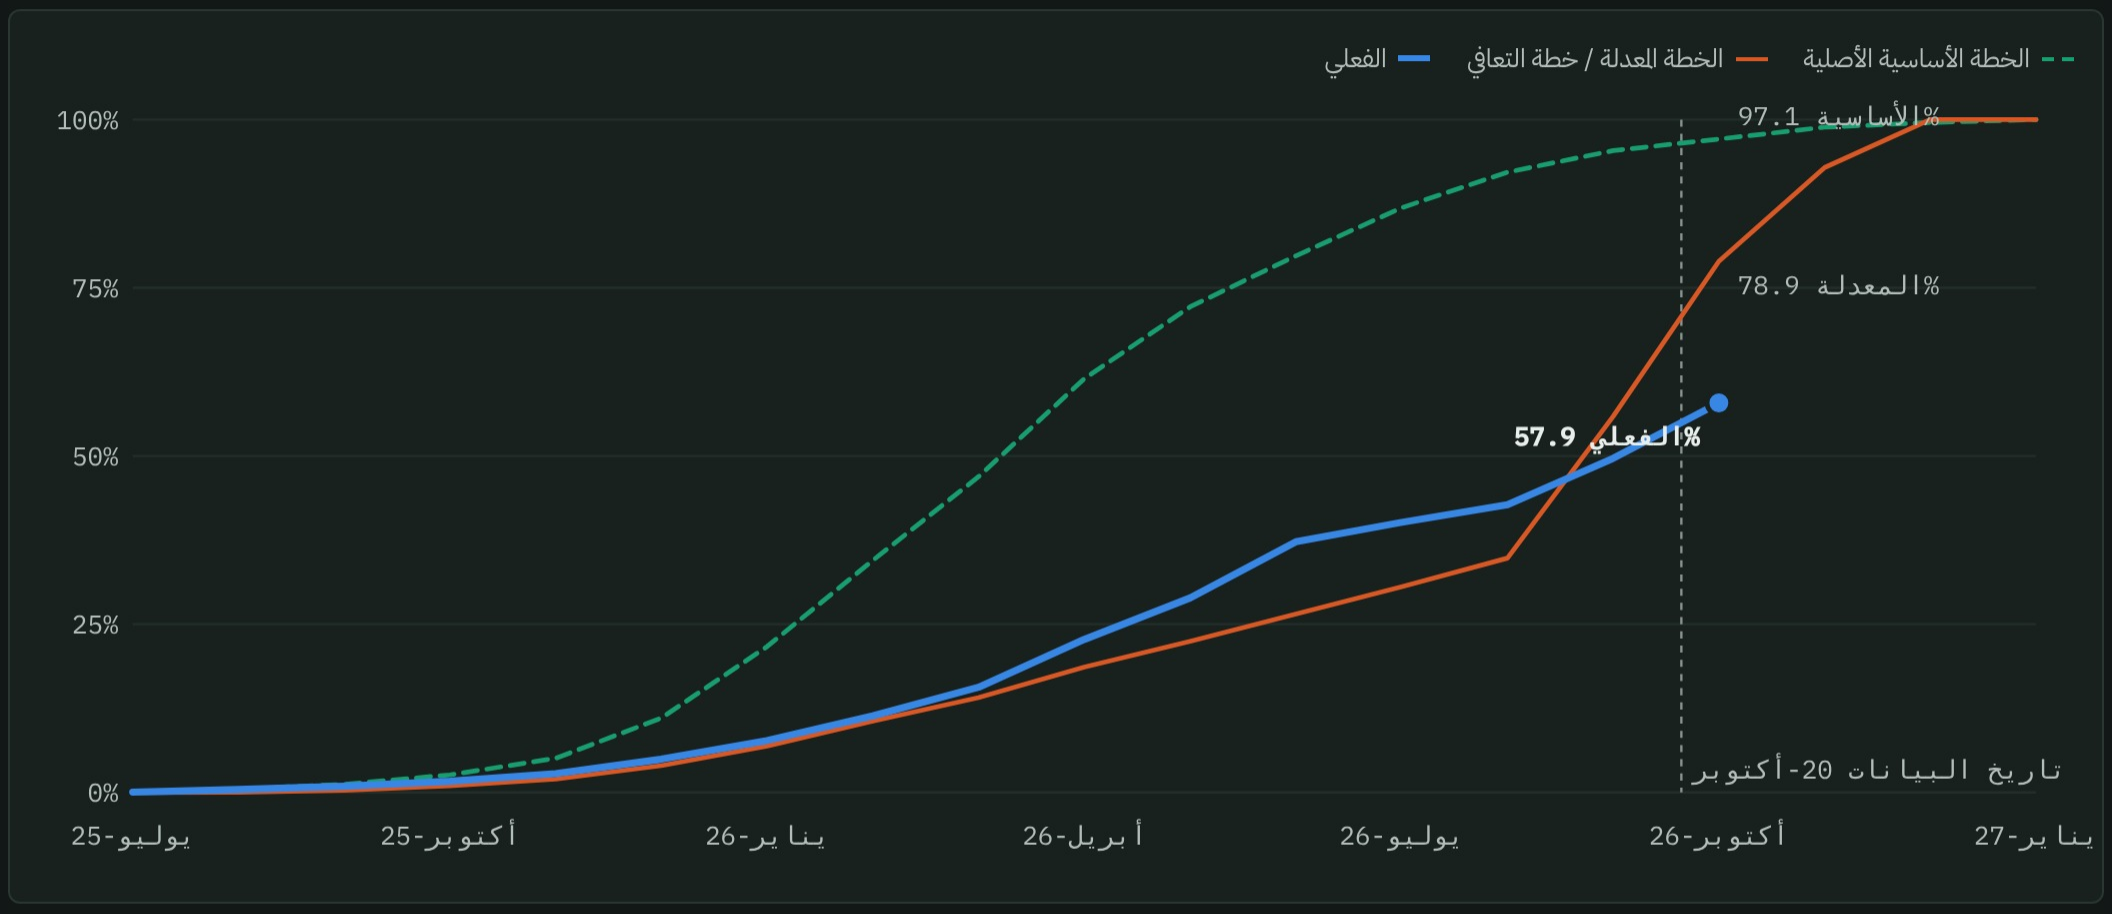

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026*	65.6	55.8	-9.7	—	0.85
20-Oct-2026	**71.1**	**57.9**	**-13.2**	**+2.1**	**0.81**

* استُخدم أحدث تقرير أسبوعي فقط. صف 13 أكتوبر مشتق منه: القيم حتى تاريخه مطروحاً منها قيم هذا الأسبوع (المخطط 5.53%، الفعلي 2.07%). لا تُعرض الأسابيع السابقة. ويبلغ توقع المقاول في الورقة نفسها 79.4% بنهاية نوفمبر و100% في يناير 2027.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب المرحلة، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة، مجموعاً لكل الشبكات من ورقة Progress.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الإزالة والأعمال الترابية	2.9%	100.0%	96.7%	−3.3	0.97	▼ متأخر قليلاً
التصميم الهندسي	3.0%	100.0%	97.3%	−2.7	0.97	▼ متأخر قليلاً
التوريدات	27.0%	91.5%	92.7%	+1.2	1.01	▲ في المسار
التنفيذ	57.1%	70.9%	45.1%	−25.8	0.64	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	10.0%	0.0%	14.1%	+14.1	–	▲ بدأ مبكراً
الإجمالي	100%	**71.1%**	**57.9%**	**−13.2**	**0.81**	▼ متأخر

الشبكة / حزمة العمل	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الإزالة وتنظيف الموقع	0.4%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
الأعمال الترابية وتسوية الموقع	2.5%	100.0%	96.2%	−3.8	0.96	▼ متأخر قليلاً
شبكة الصرف الصحي	8.1%	86.0%	82.9%	−3.1	0.96	▼ متأخر قليلاً
شبكة تصريف السيول	15.6%	87.9%	82.5%	−5.5	0.94	▼ متأخر قليلاً
شبكة مياه الشرب	6.3%	78.2%	59.7%	−18.5	0.76	▼ متأخر
شبكة مكافحة الحريق	6.9%	74.1%	55.8%	−18.3	0.75	▼ متأخر
شبكة المياه المعالجة	5.2%	63.2%	45.2%	−17.9	0.72	▼ متأخر
محطة ضخ مياه الشرب	7.8%	76.9%	68.0%	−8.9	0.88	▼ متأخر
محطة رفع الصرف الصحي	7.7%	84.0%	70.0%	−14.1	0.83	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	3.7%	68.7%	46.9%	−21.8	0.68	▼ متأخر
شبكة الجهد المنخفض	3.4%	57.3%	35.5%	−21.9	0.62	▼ متأخر
شبكة الإنارة	8.3%	48.3%	33.5%	−14.8	0.69	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	6.8%	59.2%	27.1%	−32.1	0.46	▼ متأخر
أعمال الطرق	8.7%	58.1%	34.4%	−23.7	0.59	▼ متأخر
تنسيق المواقع	4.9%	19.7%	31.6%	+11.8	1.60	▲ متقدم
غرف الحراسة	3.7%	85.9%	75.5%	−10.4	0.88	▼ متأخر
الإجمالي	100%	**71.1%**	**57.9%**	**−13.2**	**0.81**	▼ متأخر

الأوزان هي ساعات العمل المخططة. وبحسب قيمة العقد، تمثل أعمال الطرق 39.8% من العقد وحققت 52.7% من قيمتها مقابل 65.8% مخططاً. ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026) عدد 4,851 نشاطاً: 2,482 مكتملاً و431 قيد التنفيذ و1,938 لم يبدأ. وارتفعت الأنشطة المتأخرة عن موعد بدئها من 993 إلى 1,047 هذا الأسبوع.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 20-أكتوبر-2026. تعطي الورقة إجماليات الموقع كاملاً فقط، دون مناطق ودون أرقام الردم. ويظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز "—" لأن أحدث تقرير لا يتضمن كميات الأسبوع السابق.

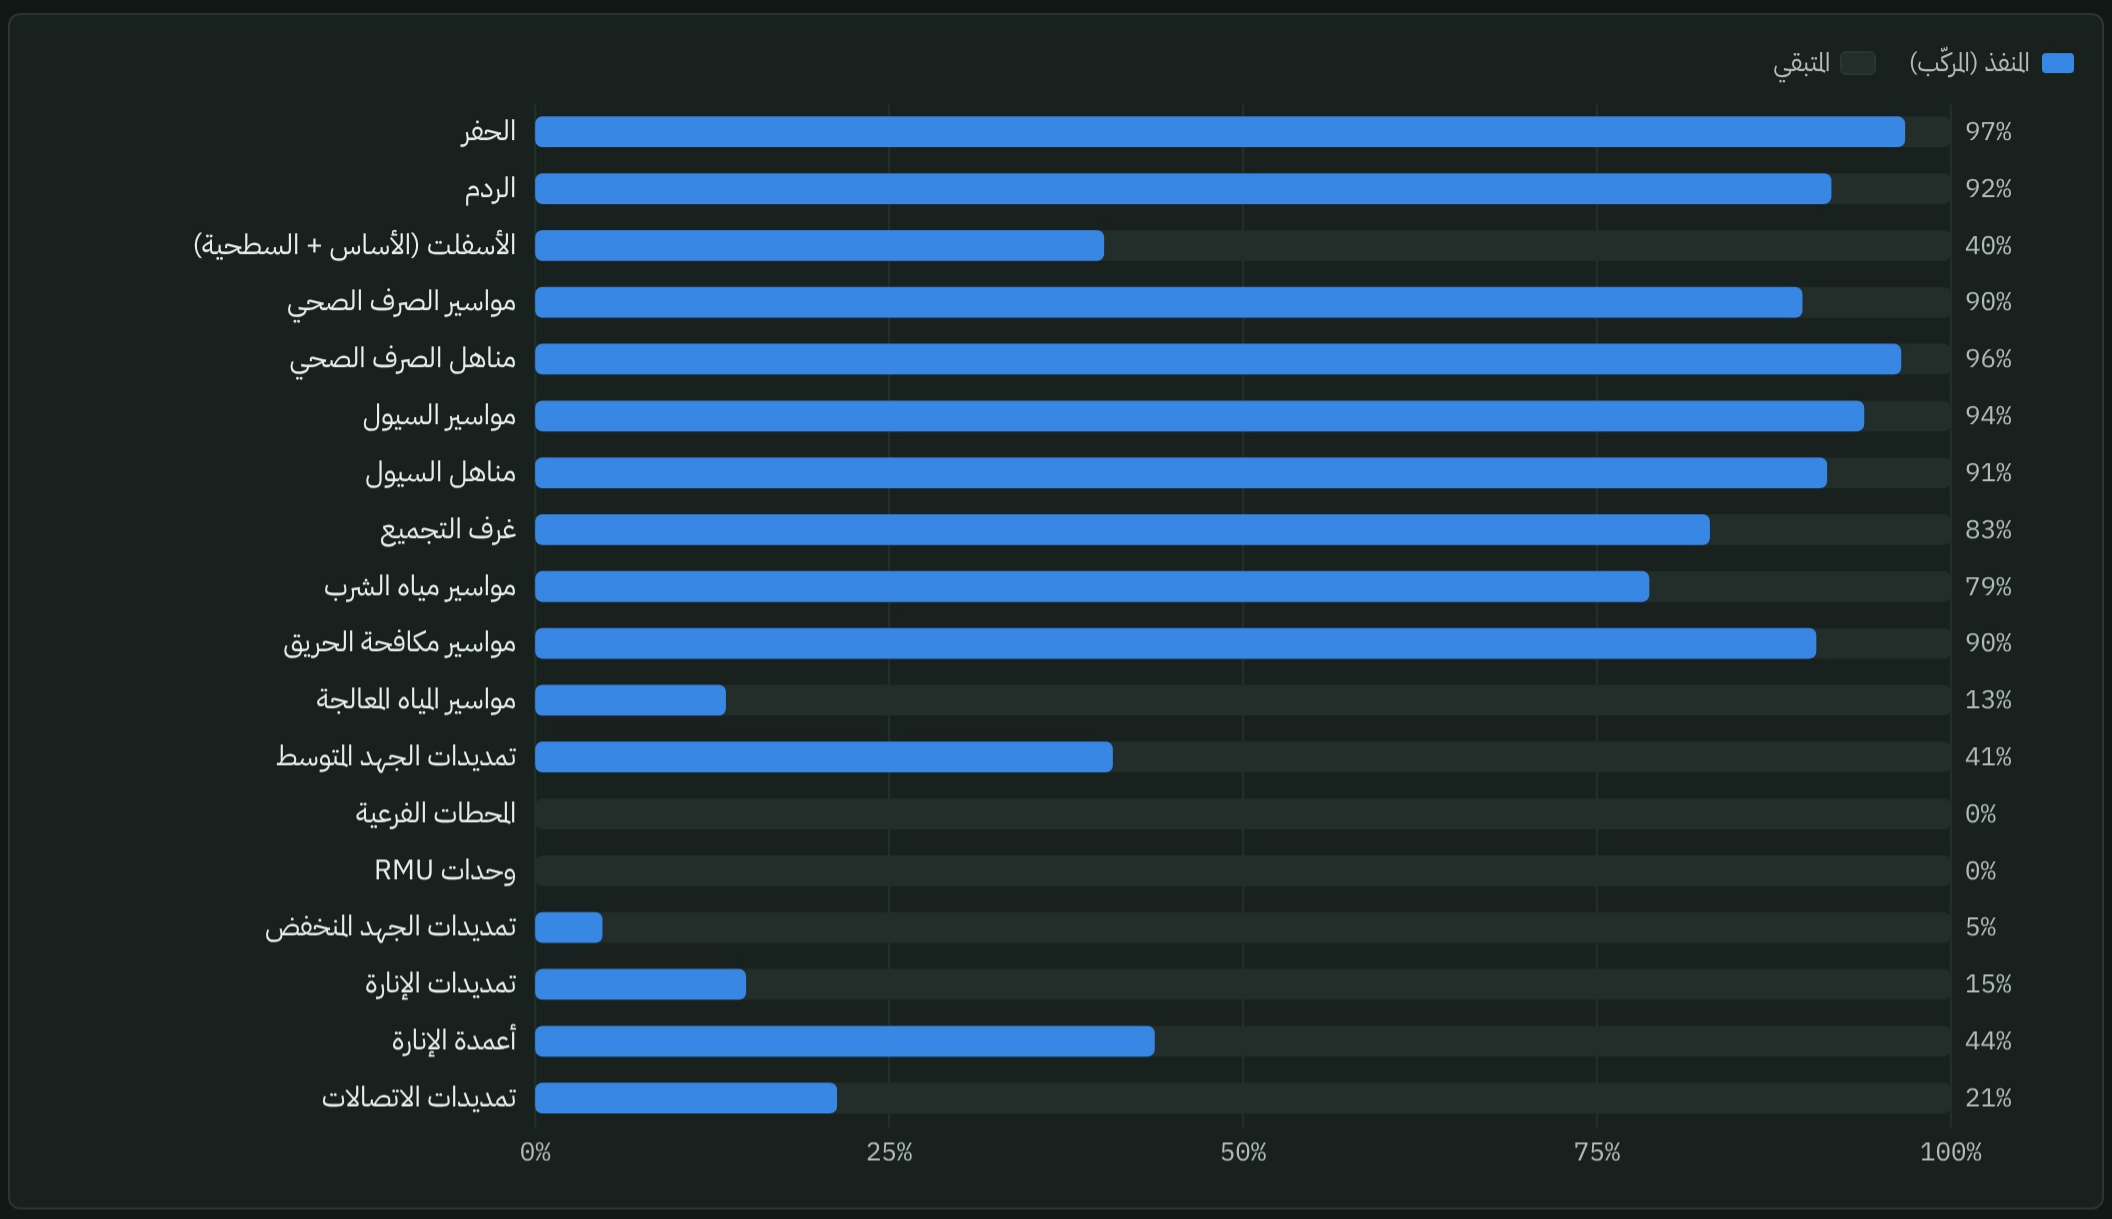

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر	الكل	م³	853,395	825,821	—	27,574	96.8%	—
الردم	الكل	م³	1,481,028	1,356,040	—	124,988	91.6%	—
الأسفلت (الأساس + السطحية)	الكل	م³	64,334	25,856	—	38,478	40.2%	—
مواسير الصرف الصحي	الكل	م.ط	7,567	6,774	—	793.3	89.5%	—
مناهل الصرف الصحي	الكل	عدد	136	131.2	—	4.8	96.5%	—
مواسير السيول	الكل	م.ط	14,821	13,914	—	907.2	93.9%	—
مناهل السيول	الكل	عدد	160	146	—	14	91.3%	—
غرف التجميع	الكل	عدد	338	280.5	—	57.5	83.0%	—
مواسير مياه الشرب	الكل	م.ط	7,214	5,677	—	1,537	78.7%	—
مواسير مكافحة الحريق	الكل	م.ط	6,355	5,751	—	604	90.5%	—
مواسير المياه المعالجة	الكل	م.ط	57,419	7,737	—	49,682	13.5%	—
تمديدات الجهد المتوسط	الكل	م.ط	12,559	5,125	—	7,434	40.8%	—
المحطات الفرعية	الكل	عدد	3	0	—	3	0.0%	—
وحدات RMU	الكل	عدد	3	0	—	3	0.0%	—
تمديدات الجهد المنخفض	الكل	م.ط	14,370	683.4	—	13,687	4.8%	—
تمديدات الإنارة	الكل	م.ط	21,525	3,207	—	18,318	14.9%	—
أعمدة الإنارة	الكل	عدد	565	247.3	—	317.7	43.8%	—
تمديدات الاتصالات	الكل	م.ط	11,057	2,358	—	8,699	21.3%	—

الشبكات الرطبة مركّبة في معظمها

مواسير السيول مركّبة بنسبة 93.9%، ومواسير الصرف الصحي 89.5%، ومواسير مكافحة الحريق 90.5%، ومواسير مياه الشرب 78.7%. ونُفذ الحفر بنسبة 96.8% والردم بنسبة 91.6%.

الشبكات الجافة والمياه المعالجة والأسفلت متأخرة كثيراً

الأسفلت المنفذ 25,856 م³ مقابل 55,841 م³ مخططاً حتى تاريخه (40.2% من الإجمالي). مواسير المياه المعالجة عند 13.5%، وتمديدات الجهد المنخفض 4.8%، وتمديدات الإنارة 14.9%، وتمديدات الاتصالات 21.3%، وتمديدات الجهد المتوسط 40.8%. ولم تُركّب أي من المحطات الفرعية الثلاث أو وحدات RMU الثلاث.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية والتوقع من ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي، وتواريخ P6 والفائض الكلي من تحديث P6 بتاريخ بيانات 20-أكتوبر-2026.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	30-Jul-2025	30-Jul-2025	30-Jul-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	30-Aug-2025	30-Aug-2025	25-Nov-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال الأعمال الترابية	15-Sep-2026	25-Aug-2026 (−21 يوماً)	–	–	؟ تاريخ التوقع انقضى
اكتمال التقديمات وطلبات المواد طويلة الأجل	24-Sep-2026	24-Oct-2026 (+30 يوماً)	–	–	▼ متأخر
توريد جميع المعدات والمواد	03-Dec-2026	24-Oct-2026 (−40 يوماً)	–	–	؟ يتعارض مع التوريدات
جميع الشبكات الرطبة	22-Nov-2026	17-Dec-2026 (+25 يوماً)	17-Dec-2026	63	▼ متأخر
الأعمال الكهربائية	24-Nov-2026	21-Dec-2026 (+27 يوماً)	30-Dec-2026	53	▼ متأخر
محطة ضخ مياه الشرب	–	–	02-Dec-2026	26	● مجدول
محطة رفع الصرف الصحي	–	–	15-Dec-2026	40	● مجدول
أعمال الطرق والطبقة الإسفلتية السطحية	–	–	22-Dec-2026	5	▼ معرّض للتأخير
انتهاء التنفيذ	–	–	07-Jan-2027	12	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	14-Jan-2027	14-Feb-2027 (+31 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال إخلاء الموقع	25-Jan-2027	24-Feb-2027 (+30 يوماً)	–	–	▼ متأخر
تسليم المشروع	29-Jan-2027	01-Mar-2027 (+31 يوماً)	01-Mar-2027	0	▼ متأخر

يُنهي تحديث P6 المشروع في 01-مارس-2027، أي بعد تاريخ انتهاء العقد بـ31 يوماً.

لا يتضمن الجدول قيداً للانتهاء عند تاريخ العقد، لذا يُقاس الفائض مقابل تاريخ انتهائه المتأخر ولا يظهر أي نشاط بفائض سالب. وللطبقة الإسفلتية السطحية فائض 5 أيام فقط، ولانتهاء التنفيذ 12 يوماً. وتتوقع ورقة المعلومات العامة الانتهاء في 14-فبراير-2027 وورقة الأعمال القادمة في 30-نوفمبر-2026، فالتوقعات الثلاثة في التقرير غير متطابقة.

توريد المواد الرئيسية

أوامر الشراء الصادرة والمواد الموجودة في الموقع حسب التخصص. المصدر: ملخص التوريدات في ورقة Quality-Stat، التقرير الأسبوعي 20-أكتوبر-2026.



توريدات الكهرباء والميكانيكا تجاوزت مواعيدها


كان الموعد المخطط لاكتمال التوريد 27-سبتمبر-2026 لمواد الكهرباء و28-سبتمبر-2026 لمواد الميكانيكا، ومع ذلك لا يوجد في الموقع سوى 17 من 30 مادة كهربائية و25 من 48 مادة ميكانيكية. ومواد المدني والطرق مستحقة بحلول 09-نوفمبر-2026، ولا تزال 22 من 77 مادة لم تصل.

مواد محطة الضخ ومحطة الرفع وتنسيق المواقع

صدرت أوامر الشراء والتصنيع جارٍ، وسيبدأ التوريد قريباً (ورقة الأعمال القادمة). اعتماد المواد: 139 من 155 معتمدة، و7 تقديمات قيد المراجعة لدى الاستشاري.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (الموظفون والعمالة)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

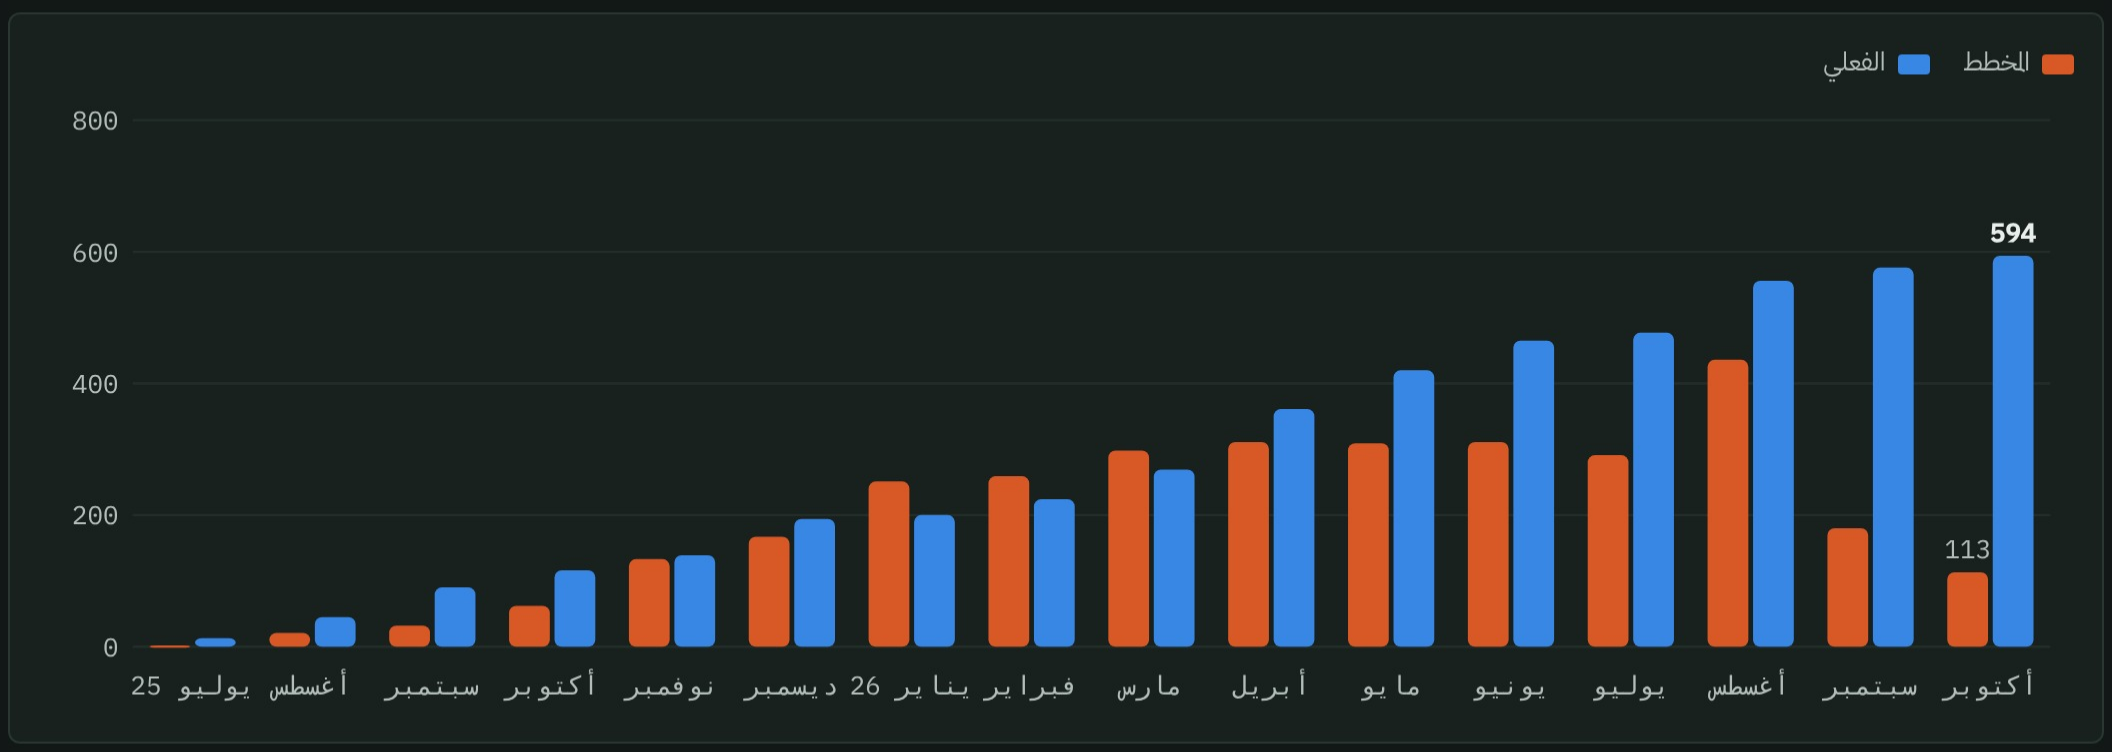

عدد العاملين في أكتوبر 594 (57 موظفاً و537 عاملاً) مقابل 113 مخططاً. بلغت خطة القوى العاملة ذروتها عند 436 في أغسطس 2026 وهي تنخفض رغم تأخر الأعمال، فلم تعد تعكس الأعمال المتبقية. ويتوقع المقاول 677 في نوفمبر. والمعدات في الموقع 326 مقابل 166 مخططاً.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	198,906,162.61
قيمة العقد المعدلة	198,906,162.61
أوامر التغيير	0
القيمة المخططة حتى تاريخه (70.7%)	140,538,384.61
القيمة المكتسبة حتى تاريخه (54.5%)	108,337,412.25
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه (42.4%)	84,260,706.89

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ والتغييرات المحتملة 0.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	7
القيمة الإجمالية	62,889,673.53
الخصومات والغرامات	-104,500
الصافي شاملاً الضريبة	72,218,624.56
معتمدة من الاستشاري	7
معتمدة من مدير المشروع - مدن / مدفوعة	0 / 0

المفوتر 31.6% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 57.9%. المستخلصات السبعة جميعها معتمدة من الاستشاري، لكن لم يُسجَّل أي منها معتمداً من مدير المشروع في مدن أو مدفوعاً. يجب تأكيد حالة الدفع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.93

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	874,722
ساعات العمل هذا الأسبوع	34,740
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة (تراكمي)	148 (895)
اجتماعات التوعية (تراكمي)	56 (8,671)

تفتيش الاستشاري للسلامة بتاريخ 20-أكتوبر-2026. الأرقام بين الأقواس كما وردت في التقرير.

الجودة التقييم 0.93

طلبات الفحص: صادرة / مغلقة / معلقة	4,699 / 4,481 / 218
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	116 / 113 / 3
تعليمات الموقع: صادرة / مغلقة	52 / 42
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة	51 / 49
المخططات التنفيذية المعتمدة	1,774 من 1,774
المواد المعتمدة	139 من 155

تفتيش الاستشاري للجودة بتاريخ 20-أكتوبر-2026. تُظهر الصفحة الأولى من التقرير 4 تقارير عدم مطابقة صادرة و3 مغلقة، انظر ملاحظات على البيانات.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
قلة عدد العمالة والمعدات وتوقف مقاول الباطن	المقاول	جارٍ إسناد جزء من المشروع لمقاول آخر، وتوفير عمالة من الشركة لاستكمال الأعمال المتبقية، ويجب استمرار زيادة العمالة والمعدات لتحقيق مستهدفات مدن. مفتوحة منذ 01-أبريل-2026 (202 يوماً).
تأخر أعمال العبّارة بالطريق الشرياني	المقاول	جارٍ الانتهاء من الحدادة لـ16 فاصلاً وصب القاعدة لـ3 فواصل، وتم حفر 14 والعمل جارٍ في 3 فواصل أخرى. مفتوحة منذ 01-يونيو-2026 (141 يوماً).
ضرورة الانتهاء من الشبكات قبل أعمال الطرق	أخرى	تم استبعاد مقاول الباطن يوناسكو وسحب اعتماده لعدم وفائه بمستهدفات مدن، وعلى المقاول العمل مباشرة على الشبكات أو تقديم مقاول باطن للاعتماد. مفتوحة منذ 01-يونيو-2026 (141 يوماً).

يتضمن سجل المخاطر البنود الثلاثة نفسها، وجميعها مفتوحة ومصنفة عالية الاحتمال وعالية الأثر بعد المعالجة.

ملاحظات على البيانات

- أسبوع التقرير: يذكر التقرير الأسبوعي "Current Contract Weeks: 64 of 78" (ورقة Milestones). وتستخدم تفتيشات الاستشاري للسلامة والجودة ترقيماً خاصاً بها (التفتيش رقم 46، محسوباً من 25-نوفمبر-2025).
- يعتمد هذا التقرير على أحدث تقرير أسبوعي فقط (تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026). لا يتضمن كميات الأسبوع السابق، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" في جدول الكميات بالرمز "—"، وصف 13 أكتوبر في منحنى التقدم مشتق من أرقام هذا الأسبوع.
- ثلاثة توقعات مختلفة للانتهاء: 14-فبراير-2027 (ورقة المعلومات العامة، −16 يوماً)، و01-مارس-2027 (ورقة المعالم وتحديث P6، −31 يوماً)، و30-نوفمبر-2026 (ورقة الأعمال القادمة).
- لا يتضمن تحديث P6 قيداً للانتهاء، لذا لا يظهر أي نشاط بفائض سالب رغم أنه ينتهي بعد تاريخ العقد. و194 نشاطاً قيد التنفيذ لها تواريخ انتهاء قبل تاريخ البيانات.
- التجهيز: يذكر التقرير الأسبوعي 30-أغسطس-2025 تاريخاً فعلياً، بينما يذكر معلم "P6 Mobilization - Finish" تاريخ 25-نوفمبر-2025.
- انقضى تاريخ توقع "اكتمال الأعمال الترابية" 25-أغسطس-2026 ولا يزال مسجلاً كتوقع، والأعمال الترابية عند 96.2%. ويتعارض توقع "توريد جميع المواد" في 24-أكتوبر-2026 مع عدم وصول 58 من 155 مادة إلى الموقع.
- لا يمكن استخدام سجل التوريدات: الكميات الموّردة تتجاوز الكميات المطلوبة (مثل 12,600 موّردة من 2 قاطع MCCB، و1,325,000 من 12 ماسورة حديد دكتايل)، وتظهر في خلايا كثيرة أخطاء #DIV/0! و#VALUE!، وتحمل الصفوف رقم المشروع DAM2-01-029. ويكرر إجمالي التوريدات في الصفحة الأولى صف الميكانيكا (48 / 48 / 42) بدلاً من 155 / 155 / 140، ويُظهر أمر شراء واحداً متبقياً مقابل 15 ضمنياً.
- تقارير عدم المطابقة: تُظهر الصفحة الأولى 4 صادرة و3 مغلقة، بينما تُظهر ورقة Quality-Stat عدد 51 صادرة و49 مغلقة.
- العمالة: تُظهر الصفحة الأولى 360 مخططاً و483 فعلياً، بينما تُظهر ورقة Manpower عدد 78 مخططاً و537 فعلياً لشهر أكتوبر، ويخطط جدول المهن فيها لـ391.
- تختلف كميات النطاق في ورقة Conclusion عن ورقة Major Quantities (إجمالي الصرف الصحي 6,146 مقابل 7,567 م.ط، وإجمالي المياه المعالجة 17,678 مقابل 57,419 م.ط، والمنفذ من الاتصالات 1,000 مقابل 2,358 م.ط). وتُظهر مواسير الصرف الصحي 2.01 م.ط مخططاً حتى تاريخه، وللمناهل وغرف التجميع إجماليات كسرية (مثل 135.99).

- قيمة العقد 198,906,162.61 في الصفحة الأولى و198,906,162.312 "شاملة الضريبة" في ورقة Conclusion. ويتضمن سجل المستخلصات قيماً شاردة (21,100,000 و20,900,000 و200,000) بجانب قيم العقد، وتُظهر خلية التكلفة المتوقعة عند الإنجاز #REF!.
- تواريخ التقديمات الرئيسية (خطط الجودة والسلامة والخطة الأساسية) في فبراير–مارس 2024، أي قبل ترسية العقد في 30-يونيو-2025. وتتضمن ورقة الأعمال القادمة بيانات P6 من مشروع المدينة الصناعية بحائل - المرحلة الثانية، ويستخدم سجل المخاطر رقم المشروع DAM2-01-029 ويذكر المدينتين الصناعيتين الثالثة والسادسة.
- لا يزال نص الإجراء في المشكلة 1 يذكر 304 عمال و184 معدة، مقابل 594 و326 في الموقع حالياً.
- يُظهر تنسيق المواقع إنجازاً فعلياً 31.6%، معظمه من التوريدات، مقابل 0.7% فقط من قيمته مكتسبة.

أُعدّ في 28-أكتوبر-2026 من التقرير الأسبوعي بتاريخ بيانات 20-أكتوبر-2026 وتحديث P6 المرفق به.
