برنامج المصانع الجاهزة و المنتجات الجديدة الحزمة الثالثة (المحفظة الاستثمارية) - حائل 20 مصنع 900 متر

Ready-Built Factories Program, Package 3: 20 Factories of 900 m² in Hail

المالك	التقرير الأسبوعي	بدء المشروع	انتهاء العقد	الانتهاء المتوقع في P6	أنشطة الجدول الزمني
مدن	رقم 41	04-Dec-2025	03-Dec-2026	02-Nov-2026	1,827

النطاق: 20 مصنعاً جاهزاً مساحة كل منها 900 م² في خمس مجموعات (A إلى E)، مع أعمال الموقع والشبكات والأعمال الخارجية والطرق وتنسيق المواقع.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 19-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 97.2% مقابل 96.5% مخطط، أي متقدم بنسبة 0.7%. اكتمل التصميم الهندسي والتوريدات والتجهيز، والتنفيذ وفق الخطة عند 96.4%، والاختبار والتشغيل متقدم على الخطة.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	أنشطة الجدول المكتملة
97.2% / 96.5% مخطط	—	87.6% · اليوم 319 من 364	93.1% · 1,701 من 1,827
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.01 +0.7%	غير مذكور في ملفات هذا الرفع.	▲ انتهاء P6: 02-نوفمبر-2026	60 قيد التنفيذ، 66 لم تبدأ

الانتهاء المتوقع مبكر بـ 31 يوماً، لكن دون أي فائض زمني.

يُنهي تحديث P6 المشروع في 02-نوفمبر-2026، قبل تاريخ انتهاء العقد 03-ديسمبر-2026 بـ 31 يوماً. الفائض الزمني صفر لكل من انتهاء المشروع وانتهاء التنفيذ والأعمال الخارجية. أعمال الطرق منجزة بنسبة 68.8% والبردورات والإنترلوك واللوحات المرورية ما زالت عند 0%، والأسوار والبوابات عند 67.1% مقابل 90.0% مخطط.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ملف التقرير الأسبوعي رقم 41، بختم الكاميرا 18-أكتوبر-2026. يجري فرش الأسفلت على الطرق الداخلية بجانب مباني المصانع المكتملة. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



واجهة مبنى المصنع

الكسوة والباب اللفاف وواجهة المكتب الزجاجية مركّبة. الختم 18-أكتوبر-2026، 07:04.



أسفلت الطرق الداخلية

طبقة أسفلت جديدة ودحّال يعمل في الأمام. الختم 18-أكتوبر-2026، 08:05.



فرش الأسفلت

الفرّادة والطاقم على الطريق بجانب صف المصانع. الختم 18-أكتوبر-2026، 08:39.



أعمال الطرق

مسار مسفلت، والثاني ما زال على طبقة الأساس. الختم 18-أكتوبر-2026، 08:41.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يقاس بعدد ساعات العمل المخططة (وحدات العمالة في P6).
المصدر: تقرير تحديث P6 رقم 41، تاريخ البيانات 19-أكتوبر-2026.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	0.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	12.6%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	23.5%	100.1%	100.1%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التنفيذ	59.1%	96.4%	96.4%	0.0	1.00	▲ في المسار
الاختبار والتشغيل	3.4%	74.0%	92.9%	+18.9	1.26	▲ متقدم
إغلاق المشروع وتسريح الموقع	0.5%	0.0%	0.0%	0.0	–	● يبدأ 19-أكتوبر-2026
الإجمالي	100%	**96.5%**	**97.2%**	**+0.7**	**1.01**	▲ في المسار

الأوزان هي حصة كل مرحلة من 116,740 ساعة عمل مخططة. تسميات هيكل تجزئة العمل في الجدول تذكر أوزاناً مختلفة (التصميم 3%، التوريدات 27%، التنفيذ 60%، الاختبار والتشغيل 10%). يضم تحديث P6 عدد 1,827 نشاطاً: 1,701 مكتمل و60 قيد التنفيذ و66 لم تبدأ.

نطاق العمل: مجموعات المصانع

ساعات العمل المخططة والمكتسبة لكل مجموعة مصانع وللبنية التحتية للموقع حسب التخصص، من تقرير تحديث P6 رقم 41. لم تُرفع جداول كميات هذا الأسبوع، ولا تتضمن الملفات أرقام الأسبوع السابق، لذا يظهر عمود "هذا الأسبوع" بالرمز "–".

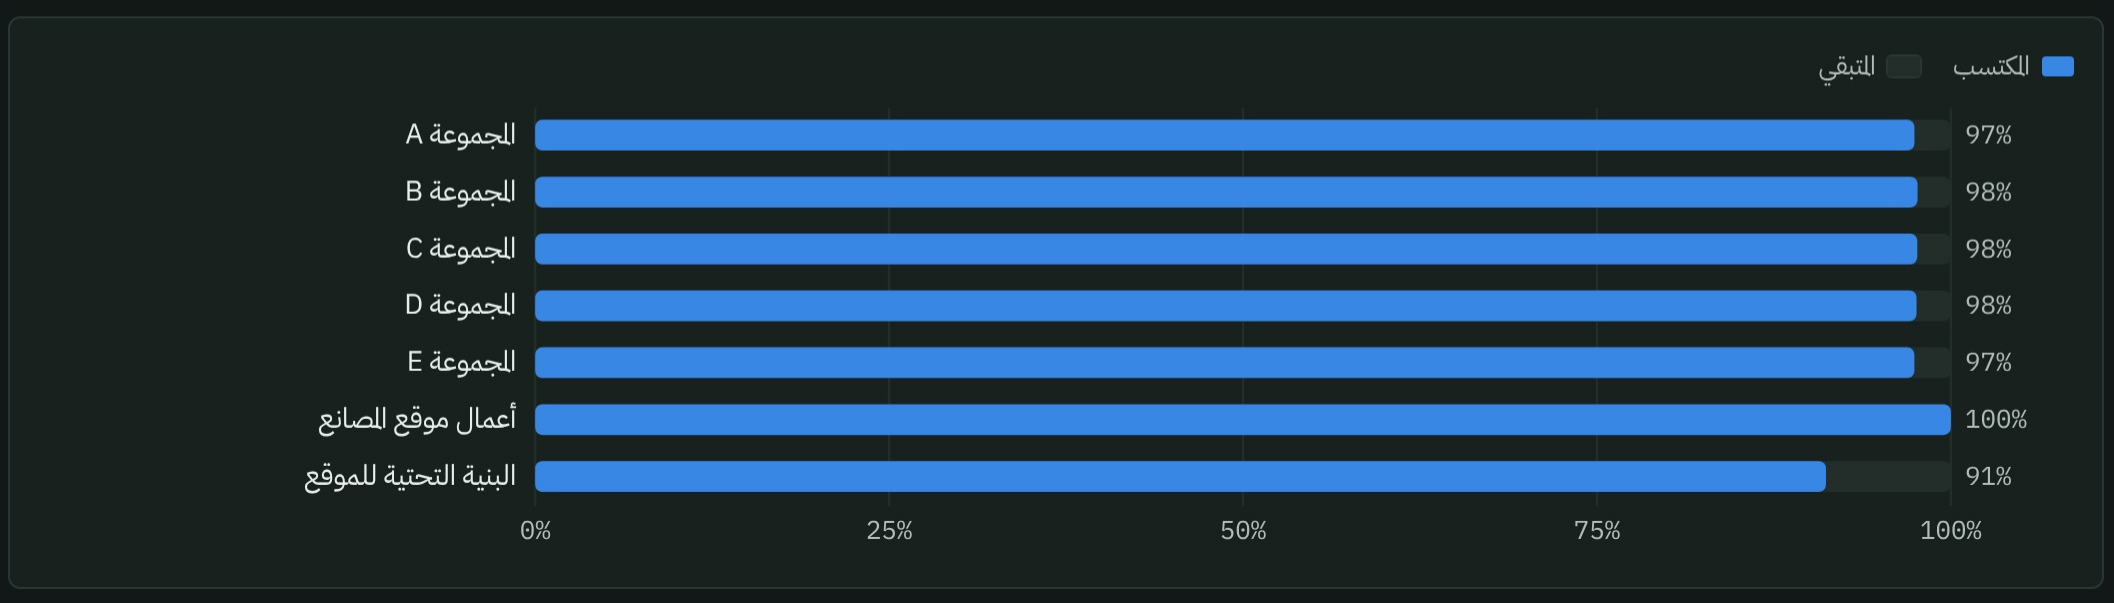

بند النطاق	التخصص	الوحدة	المخطط	المكتسب	هذا الأسبوع	المتبقي	% الإنجاز
المجموعة A	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	3,008	3,008	–	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	–	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,928	2,709	–	219	92.5%
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	–	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,264	1,205	–	59	95.3%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,800**	**10,522**	**–**	**278**	**97.4%**
المجموعة B	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	3,072	3,072	–	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	–	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,992	2,773	–	219	92.7%
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	–	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,248	1,210	–	38	97.0%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,912**	**10,655**	**–**	**257**	**97.6%**
المجموعة C	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	2,960	2,960	–	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	–	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,896	2,677	–	219	92.4%
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	–	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,248	1,213	–	35	97.2%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,704**	**10,450**	**–**	**254**	**97.6%**
المجموعة D	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	3,008	3,008	–	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	–	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,928	2,709	–	219	92.5%
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	–	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,264	1,221	–	43	96.6%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,800**	**10,538**	**–**	**262**	**97.6%**
المجموعة E	الأعمال الإنشائية	ساعة عمل	3,040	3,040	–	0	100.0%
	الهيكل الحديدي	ساعة عمل	2,512	2,512	–	0	100.0%
	الأعمال المعمارية	ساعة عمل	2,896	2,677	–	219	92.4%
	الأعمال الميكانيكية	ساعة عمل	1,088	1,088	–	0	100.0%
	الأعمال الكهربائية	ساعة عمل	1,280	1,220	–	60	95.3%
	الإجمالي	ساعة عمل	**10,816**	**10,537**	**–**	**279**	**97.4%**
أعمال موقع المصانع	الكل	ساعة عمل	1,808	1,808	–	0	100.0%
البنية التحتية للموقع	أعمال الموقع	ساعة عمل	1,376	1,376	–	0	100.0%
	الشبكات	ساعة عمل	4,960	4,960	–	0	100.0%
	الأعمال الخارجية: ميكانيكية	ساعة عمل	2,384	2,384	–	0	100.0%
	الأعمال الخارجية: كهربائية	ساعة عمل	624	584	–	40	93.6%
	الأعمال الكهربائية الخارجية	ساعة عمل	1,136	1,008	–	128	88.7%
	الأسوار والبوابات	ساعة عمل	1,360	912	–	448	67.1%
	أعمال الطرق	ساعة عمل	1,136	782	–	354	68.8%

بند النطاق	التخصص	الوحدة	المخطط	المكتسب	هذا الأسبوع	المتبقي	% الإنجاز
	تنسيق المواقع	ساعة عمل	192	0	–	192	0.0%
	الإجمالي	ساعة عمل	**13,168**	**12,006**	**–**	**1,162**	**91.2%**

التشطيبات المعمارية في كل المجموعات

اكتملت الأعمال الإنشائية والهيكل الحديدي والأعمال الميكانيكية في المجموعات الخمس. الأعمال المعمارية عند 92.4–92.7% مقابل 100% مخطط: الأعمال المعدنية (الدرابزين الحديدي) عند 69.2% في كل مجموعة، والأعمال الخاصة (الأثاث ولوحات التعريف) عند 50.0–58.3%. الأعمال الكهربائية عند 95.3–97.2%.

البنية التحتية للموقع: 91.2%

اكتملت أعمال الموقع وجميع الشبكات. الأسوار والبوابات عند 67.1% مقابل 90.0% مخطط، والأعمال الكهربائية الخارجية عند 88.7% مقابل 100%. أعمال الطرق عند 68.8% وفق الخطة، ومن المقرر أن يبدأ تنسيق المواقع (الأشجار والشجيرات) في 21-أكتوبر-2026.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية وتوقعات P6 من تقرير تحديث P6 رقم 41، والفائض الكلي من ملف تحديث P6 (XER).
لا تتوفر نسخة نصية من ملف التقرير الأسبوعي، لذا لم يمكن مقارنة توقعاته.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع تحديث P6	التغير (أيام)	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	04-Dec-2025	04-Dec-2025 (فعلي)	0	–	منجز
بدء التنفيذ	24-Dec-2025	28-Dec-2025 (فعلي)	+4	–	منجز
اكتمال التجهيز	04-Jan-2026	05-Jan-2026 (فعلي)	+1	–	منجز
تسوية الموقع والطرق المحلية والمواقف	07-Jan-2026	05-Jan-2026 (فعلي)	−2	–	منجز
بدء الشبكات	03-Jun-2026	05-May-2026 (فعلي)	−29	–	منجز
اكتمال التصميم الهندسي والمواد	09-Apr-2026	19-Oct-2026	+193	2.8	متأخر
اكتمال الأعمال المدنية	14-Jul-2026	19-Oct-2026	+97	5.8	متأخر
اكتمال الأعمال البيئية	11-Oct-2026	19-Oct-2026	+8	10.8	متأخر
اكتمال الاختبار والتشغيل	25-Oct-2026	21-Oct-2026	−4	10.1	في الموعد
اكتمال الأعمال الميكانيكية	01-Oct-2026	24-Oct-2026	+23	6.5	متأخر
اكتمال الأعمال المعمارية	04-Oct-2026	27-Oct-2026	+23	2.8	متأخر
اكتمال الأعمال الكهربائية	26-Nov-2026	27-Oct-2026	−30	2.8	في الموعد
اكتمال التنفيذ	09-Nov-2026	31-Oct-2026	−9	2.0	في الموعد
اكتمال الأعمال الخارجية	09-Nov-2026	31-Oct-2026	−9	0	فائض صفري
انتهاء المشروع	03-Dec-2026	02-Nov-2026	−31	0	فائض صفري

المعالم المرحلية متأخرة عن الخطة الأساسية، لكن الانتهاء متوقع مبكراً.

اكتمال الأعمال المدنية والميكانيكية والمعمارية متأخر من 23 إلى 97 يوماً عن تواريخ الخطة الأساسية، بينما يُتوقع اكتمال التنفيذ وانتهاء المشروع مبكراً بـ 9 و31 يوماً. لم يتبقَّ فائض زمني لانتهاء المشروع وانتهاء التنفيذ والأعمال الخارجية، لذا فإن أي تأخير في أعمال الطرق أو الأسوار والبوابات أو أنشطة التسليم يؤخر تاريخ الانتهاء.

توريد المواد الرئيسية

نسبة ساعات عمل التوريدات المكتسبة إلى المخططة لكل حزمة مواد. المصدر: تقرير تحديث P6 رقم 41.



تم توريد جميع حزم المواد.

لكل حزم المواد طويلة وقصيرة المهلة تاريخ انتهاء فعلي للتوريد إلى الموقع. آخر الحزم، مواد الأعمال الخارجية، انتهت في 15-أكتوبر-2026. تُظهر المواد الميكانيكية قصيرة المهلة 8,272 ساعة عمل مكتسبة مقابل 8,236 مخططة.

المشكلات والمخاطر القائمة

مستخلصة من الأنشطة المفتوحة في تحديث P6. سجل المشكلات الخاص بالتقرير الأسبوعي موجود في ملف لا تتوفر له نسخة نصية.

المشكلة	المجال	التفاصيل
أعمال الطرق على المسار الحرج	البنية التحتية للموقع	782 من 1,136 ساعة عمل مكتسبة (68.8%). البردورات والإنترلوك واللوحات المرورية قيد التنفيذ عند 0%. لم تبدأ أعمال الجيوتكستايل وفرشة الحصى والخطوط المرورية ومصدات العجلات. الفائض الزمني لجميعها صفر.
الأسوار والبوابات متأخرة عن الخطة	البنية التحتية للموقع	912 من 1,360 ساعة عمل مكتسبة (67.1%) مقابل 90.0% مخطط. لم يبدأ تركيب ألواح القاعدة والعناصر الحديدية والسور الحديدي والبوابات، مع فائض من 0.8 إلى 1.8 يوم.
الأعمال الكهربائية الخارجية	البنية التحتية للموقع	88.7% مقابل 100% مخطط. التأريض (20%) ولوحات تغذية الإنارة وعدادات الكهرباء (0%) قيد التنفيذ، مع فائض 2.8 يوم.
التشطيبات المعمارية	المجموعات A إلى E	يتبقى الدرابزين الحديدي والأثاث ولوحات التعريف في كل مجموعة، مع فائض من 2.8 إلى 9.8 يوم.
الإغلاق والتسليم	إغلاق المشروع	المخططات كما نُفذت والضمانات والتدريب والأدلة مستحقة بين 19 و27 أكتوبر مع فائض 3.8 يوم. معالجة الملاحظات والتسليم الابتدائي وخطاب التسليم (31-أكتوبر-2026 إلى 02-نوفمبر-2026) فائضها صفر.

ملاحظات على البيانات

- ملف التقرير الأسبوعي (رقم 41، بتاريخ 19-أكتوبر-2026) ليس له نسخة نصية في MD Files. لم يمكن استخدام أرقامه لمنحنى التقدم والقوى العاملة والتكلفة والمستخلصات والصحة والسلامة والجودة، لذا حُذفت هذه الأقسام. لا يذكر أي ملف نصي اسم المقاول أو الاستشاري أو مدير المشروع. استُخدمت صوره فقط.
- يعتمد هذا التقرير على آخر رفع فقط (W4)، لذا لا تتوفر أرقام الأسبوع السابق: التقدم هذا الأسبوع وعمود هذا الأسبوع يظهران "–".
- التقدم الفعلي مأخوذ من وحدات العمالة في تقرير تحديث P6: 116,740 ساعة عمل مخططة للمشروع، و112,642 مخططة حتى تاريخه، و113,420 مكتسبة.
- أسماء الملفات تستخدم رمز المشروع HAL1-05-009، بينما رمز ملف تحديث P6 هو HAL1-05-10.
- يذكر ملف تحديث P6 بداية مخططة في 14-مارس-2023، بينما بدأ المشروع في 04-ديسمبر-2025. وتواريخ البدء والانتهاء للأنشطة المكتملة فيه لاحقة لتواريخها الفعلية (مثلاً بدء المشروع 29-ديسمبر-2025 مقابل 04-ديسمبر-2025 فعلياً).
- ساعات العمل المكتسبة والمخططة للتوريدات (27,496) تتجاوز الميزانية (27,460)، لأن أوامر شراء المواد الميكانيكية قصيرة المهلة تُظهر 2,480 مكتسبة مقابل 2,444 مخططة.
- معلم "اكتمال التصميم الهندسي والمواد" ما زال مفتوحاً في P6 بتاريخ متوقع 19-أكتوبر-2026، رغم أن جميع أنشطة التصميم والتوريدات لها تواريخ انتهاء فعلية.

- الطبقة الإسفلتية السطحية وطبقة اللصق تظهران مكتملتين 100% لكنهما ما زالتا قيد التنفيذ دون تاريخ انتهاء فعلي.
- مجموع التخصصات في المجموعة B يبلغ 10,655 ساعة عمل مكتسبة مقابل 10,654 في سطر المجموعة (فرق تقريب).
- أسبوع التقرير: لا تذكر الملفات أسبوع العقد، لذا فالأسبوع 45 هو عدد الأسابيع الكاملة من بدء المشروع (04-ديسمبر-2025) إلى تاريخ البيانات (319 يوماً). "رقم 41" هو الرقم التسلسلي للتقرير الأسبوعي وليس رقم الأسبوع.
- تحمل الصور ختم تاريخ الكاميرا 18-أكتوبر-2026 دون ختم GPS.

أُعدّ في 28-أكتوبر-2026 من آخر رفع أسبوعي (W4): تحديث P6 وتقارير P6 للتقرير الأسبوعي رقم 41، تاريخ البيانات 19-أكتوبر-2026.
