تسوير المنطقة المطورة بوعد الشمال

Improvement of Waad Al Shamal Industrial City Fence & Gates

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	Hamza Mohammad Alderi Construction Co.	Consolidated Consultants Group	محمد ح. العيسى	06-May-2026	05-Oct-2026

النطاق: 35,400 م من السور الشبكي المجلفن مع البوابات والحواجز الكهربائية، ونظام كشف التسلل على تمديدات الألياف البصرية، وثلاث غرف حراسة، والأعمال الخارجية.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. كان مخططاً إنجاز جميع الأعمال بحلول تاريخ انتهاء العقد 05-أكتوبر-2026، لذا فإن نسبة الإنجاز المخططة 100%. بلغت نسبة الإنجاز 77.1%، أي أن المشروع متأخر بنسبة 22.9%، بعد تقدم مُبلَّغ عنه بنسبة 20.2% هذا الأسبوع.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
77.1% / 100% مخطط	**+20.2%** / +0.0%	**113.8%** · اليوم 173 من 152	**55.3%** · 8.80 مليون ريال
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.77 · −22.9%	مخطط · ● المخطط بلغ 100% مسبقاً	▼ انتهاء P6: 26-نوفمبر-2026	4 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 05-أكتوبر-2026

انقضى تاريخ انتهاء العقد ولا يزال 22.9% من الأعمال غير منجز.

كان موعد انتهاء العقد 05-أكتوبر-2026، أي قبل تاريخ البيانات بثلاثة أسابيع. يحدد تحديث P6 المرفوع مع تقرير هذا الأسبوع انتهاء المشروع في 26-نوفمبر-2026، أي بعد التاريخ التعاقدي بـ 52 يوماً، بفائض زمني −44.5 يوماً. ولا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع الانتهاء في 05-أكتوبر-2026 دون أي انحراف. ولم تبدأ أعمال الاختبار والتشغيل، التي تمثل 4% من ساعات العمل.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ورقة "Weekly Photos" في التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026. لا تحمل الصور ختم تاريخ أو GPS. وتُظهر أعمال الردم والعزل المائي في غرف الحراسة وأعمال التشطيب النهائي للأعمال الكهروميكانيكية داخل الغرف. اضغط على صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال الردم

ردم بجوار جدار غرفة الحراسة.



أعمال العزل المائي

تركيب غشاء بيتوميني حول ماسورة وصندوق.



التشطيب النهائي للأعمال الكهروميكانيكية في الغرف

أعمال التشطيب النهائي جارية داخل غرفة الحراسة.



التشطيب النهائي للأعمال الكهروميكانيكية في الغرف

تركيب وحدات الإنارة السقفية ووحدة تكييف منفصلة.



التشطيب النهائي للأعمال الكهروميكانيكية في الغرف

وحدات الإنارة مركّبة؛ ووحدة التكييف لا تزال مغلّفة.




التشطيب النهائي للأعمال الكهروميكانيكية في الغرف

مروحة شفط مثبتة على الجدار وقيد التوصيل.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

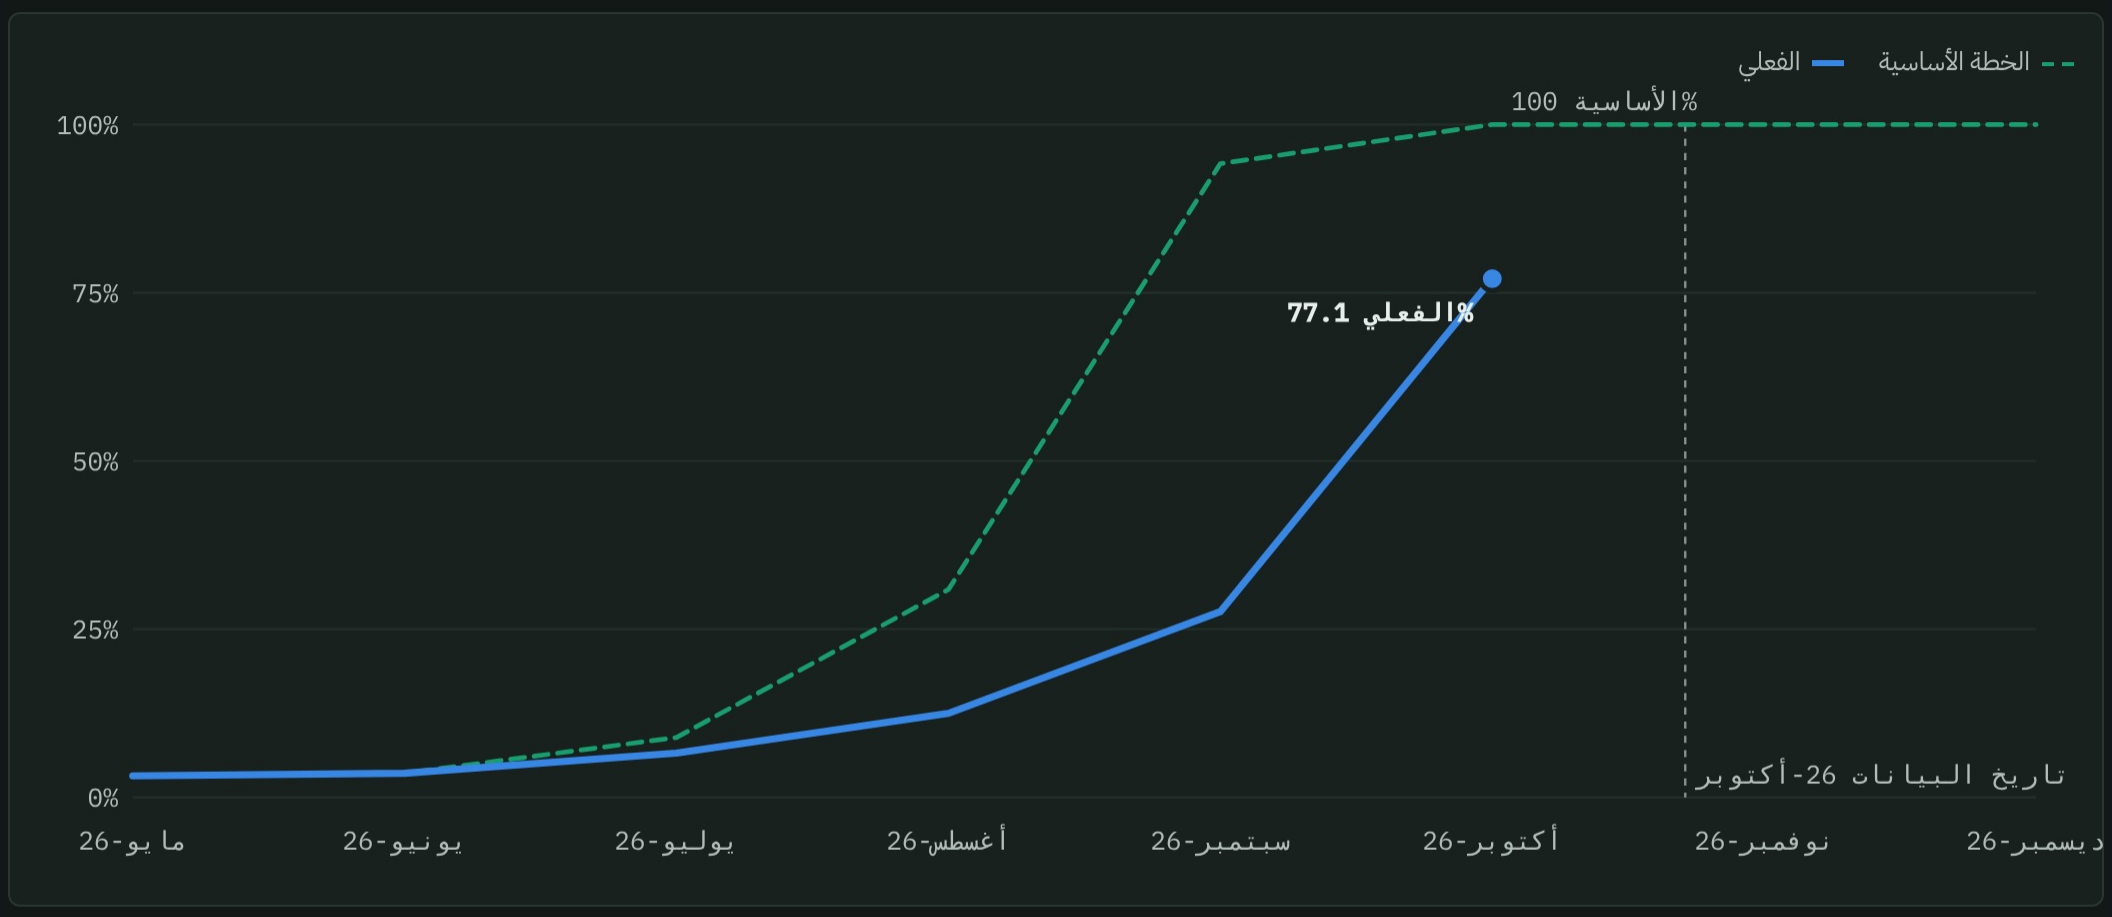

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
التقرير السابق	100.0	56.9	-43.1%	—	0.57
26-Oct-2026	**100.0**	**77.1**	**-22.9%**	**+20.2%**	**0.77**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقرير الأسبوعي بتاريخ 26-أكتوبر-2026. الرقم السابق مأخوذ من عمود "Previous week Effort" في التقرير نفسه. لم يُرفع أي تقرير أسبوعي سابق، لذا لا تظهر الأسابيع السابقة.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5%	100.0%	74.8%	-25.2%	0.75	▼ متأخر
التوريدات	13%	100.0%	90.4%	-9.6%	0.90	▼ متأخر
التنفيذ	75%	100.0%	78.2%	-21.8%	0.78	▼ متأخر
· الأسوار	5.0%	100.0%	83.0%	-17.0%	0.83	▼ متأخر
· غرفة الحراسة 1	22.6%	100.0%	78.1%	-21.9%	0.78	▼ متأخر
· غرفة الحراسة 2	22.6%	100.0%	77.3%	-22.7%	0.77	▼ متأخر
· غرفة الحراسة 3	22.6%	100.0%	77.8%	-22.2%	0.78	▼ متأخر
· الأعمال الخارجية	2.2%	100.0%	80.0%	-20.0%	0.80	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	4%	100.0%	0.0%	-100.0%	0.00	▼ لم يبدأ
الإجمالي	100%	**100.0%**	**77.1%**	**-22.9%**	**0.77**	▼ متأخر

الأوزان حصص من 98,544 ساعة عمل مخططة؛ وبنود التنفيذ (·) جزء من التنفيذ. تقدم التنفيذ هذا الأسبوع بنسبة 22.3%، والتوريدات بنسبة 20.1%، والتصميم الهندسي بنسبة 16.8% من ساعات عمل كل منها. يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026) 554 نشاطاً: 309 مكتملة، و137 قيد التنفيذ، و108 لم تبدأ.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية من مطبوعة جدول P6، وتوقعات التقرير الأسبوعي من ورقة المعالم فيه، وتوقعات P6 والفائض الزمني من تحديث P6 (تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026).


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	06-May-2026	06-May-2026	07-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	31-May-2026	06-May-2026	09-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال الأسوار	26-Aug-2026	–	27-Oct-2026	−18.0	▼ متأخر
اكتمال غرفة الحراسة 1	26-Aug-2026	–	27-Oct-2026	−18.0	▼ متأخر
اكتمال التصميم الهندسي	22-Sep-2026	22-Sep-2026	28-Oct-2026	−19.5	▼ متأخر
اكتمال الأعمال الخارجية	27-Sep-2026	–	08-Nov-2026	−28.9	▼ متأخر
اكتمال التوريدات	28-Sep-2026	28-Sep-2026	07-Nov-2026	−27.3	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	05-Oct-2026	05-Oct-2026	11-Nov-2026	−31.6	▼ متأخر
انتهاء المشروع	05-Oct-2026	05-Oct-2026	26-Nov-2026	−44.5	▼ متأخر

توقعات التقرير الأسبوعي أصبحت في الماضي.

يتوقع التقرير الأسبوعي اكتمال التصميم الهندسي والتوريدات والمشروع في تواريخ الخطة الأساسية (22-سبتمبر و28-سبتمبر و05-أكتوبر-2026)، وجميعها قبل تاريخ البيانات 26-أكتوبر، ولم يُسجَّل أي منها منجزاً. أما تحديث P6 فينقل جميع المعالم المفتوحة إلى ما بين 27-أكتوبر و26-نوفمبر-2026، بفائض زمني من −18 إلى −44.5 يوماً، كما يسجل تسليم الموقع في 07-يوليو-2026 وليس 06-مايو-2026.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي (الموظفون والعمالة). المصدر: ورقة Manpower.

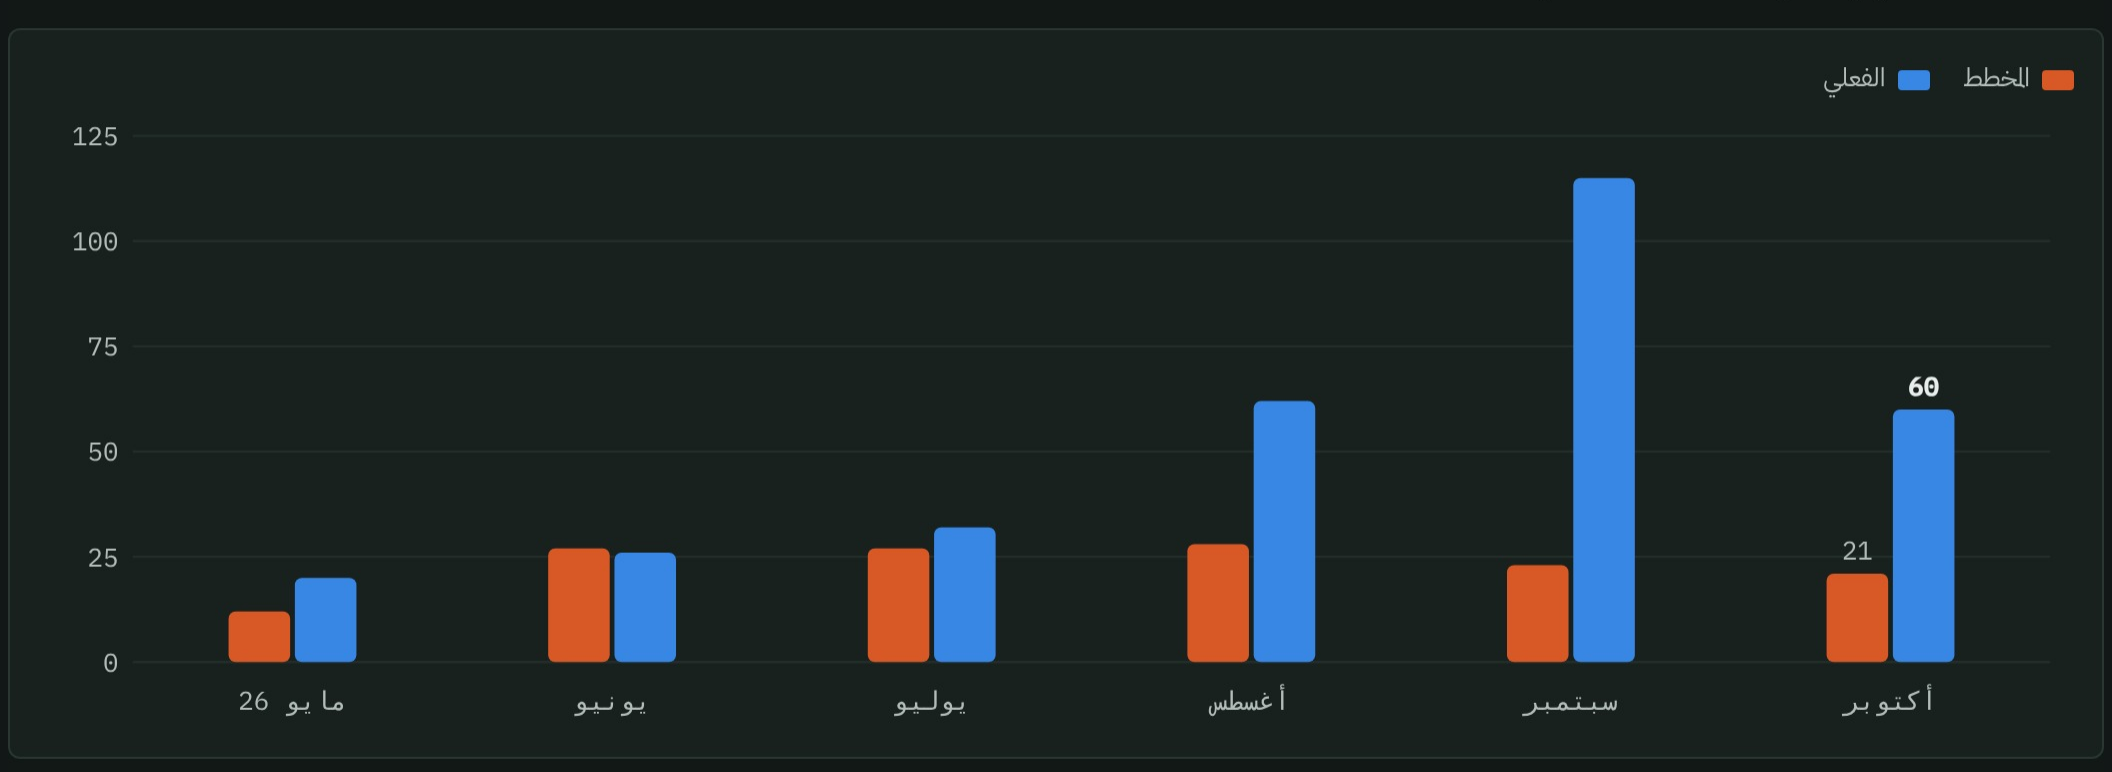

بلغ عدد العاملين في أكتوبر 60 (10 موظفين و50 عاملاً) مقابل 21 مخططاً. وظل العدد الفعلي أعلى من المخطط منذ يوليو، وبلغ ذروته 115 في سبتمبر. وعدد المعدات في الموقع 9 مقابل 4 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	15,898,659
قيمة العقد المعدلة	15,898,659
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ. ويُظهر رأس سجل المستخلصات قيماً مختلفة؛ انظر ملاحظات على البيانات.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	4
القيمة الإجمالية	8,797,318
معتمدة من إدارة الإنشاء / البرنامج	4
معتمدة من مدير المشروع - مدن	0
المدفوعة	0
الصافي شاملاً الضريبة	9,756,785

تبلغ المستخلصات 55.3% من قيمة العقد مقابل نسبة إنجاز فعلي 77.1%. يغطي آخر مستخلص الفترة من 25-سبتمبر إلى 05-أكتوبر-2026. ولا توجد محتجزات أو دفعة مقدمة أو خصومات مسجلة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.85

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	42,116
ساعات العمل هذا الأسبوع	6,138
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	24 / 23

الجلسات حتى تاريخه: حضر 137 شخصاً جلسات التعريف بالسلامة و360 اجتماعات التوعية.

الجودة التقييم 0.86

تقارير عدم المطابقة (تراكمي)	0
تعليمات الموقع	0
طلبات الفحص الميداني الصادرة / المغلقة	485 / 420
طلبات الفحص الميداني المعلقة	65
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	64 / 57
طلبات فحص المواد المعلقة	7
المخططات التنفيذية: الرمز A / B / D	11 / 26 / 1
اعتمادات المواد المقدمة	94

ملاحظات مراقبة الجودة من الاستشاري رقم 17، بتاريخ 24-أكتوبر-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
انقضاء التاريخ التعاقدي	المقاول	كان موعد انتهاء العقد 05-أكتوبر-2026. وفي 26-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 77.1%، ويحدد P6 الانتهاء في 26-نوفمبر-2026 بفائض زمني −44.5 يوماً.
اعتماد المواد وتوريدها	المقاول	خطر قائم في السجل منذ 06-يونيو-2026: تأخر اعتماد المواد وتوريدها قد يؤخر الانتهاء. كان موعد إجراء المعالجة (تسريع الاعتمادات والتوريدات) 23-أكتوبر-2026 ولا يزال مفتوحاً، وتقييمه مرتفع جداً.
مواد غرف الحراسة	المقاول	في P6 لا يزال 100 من أصل 147 نشاط توريد قيد التنفيذ، منها الأبواب والنوافذ ولوحات التوزيع وأنظمة UPS والمراقبة بالكاميرات والتحكم في الدخول، وجميعها بفائض زمني بين −18.8 و−44.5 يوماً.
الاختبار والتشغيل	المقاول	لم يبدأ. كان مخططاً من 26-سبتمبر إلى 05-أكتوبر-2026، ويتوقع P6 الآن هذا المعلم في 11-نوفمبر-2026.
اعتماد المستخلصات	مدن	أربعة مستخلصات (8.80 مليون ريال إجمالي) معتمدة من إدارة الإنشاء / البرنامج، ولم يُسجَّل أي منها معتمداً من مدير المشروع في مدن أو مدفوعاً.

سجل المشكلات وأهم 5 مشكلات في التقرير الأسبوعي فارغان. ويضم سجل المخاطر خطراً واحداً قائماً.

ملاحظات على البيانات

- لم يُرفع أي تقرير أسبوعي سابق لهذا المشروع. رقم الأسبوع السابق (56.9%) وتقدم هذا الأسبوع (20.2%) مأخوذان من عمود "Previous week Effort" في تقرير 26-أكتوبر نفسه. تقدم بنسبة 20.2% في أسبوع واحد كبير على نحو غير معتاد: بيانات المنحنى الشهرية تُظهر 27.6% في سبتمبر و77.1% في أكتوبر. يرجى التأكيد.
- يذكر التقرير الأسبوعي 05-أكتوبر-2026 تاريخاً متوقعاً للانتهاء بانحراف 0 يوم، رغم أن تاريخ البيانات 26-أكتوبر-2026. ويحدد تحديث P6 تاريخ 26-نوفمبر-2026.

- تاريخ تسليم الموقع 06-مايو-2026 في التقرير الأسبوعي و07-يوليو-2026 في تحديث P6. ويُحسب رقم الأسبوع (24) من 06-مايو-2026.
- يسجل تحديث P6 تواريخ بدء أو انتهاء فعلية بعد تاريخ بياناته 26-أكتوبر-2026 لعدد 107 أنشطة (حتى 24-نوفمبر-2026)، لذا فإن حالة التقدم فيه غير موثوقة.
- أعداد الأنشطة مختلفة: يُظهر التقرير الأسبوعي 195 مكتملة و123 قيد التنفيذ و236 لم تبدأ، بينما يُظهر تحديث P6 309 و137 و108.
- تصف مطبوعة P6 نسبة تقدم مبنية على التكلفة بأنها "Actual %". يعتمد هذا التقرير على نسبة الإنجاز الفعلي (ساعات العمل) فقط.
- مطبوعة "Two Week Look Ahead" تغطي الفترة من 28-سبتمبر إلى 05-أكتوبر-2026، أي قبل تاريخ البيانات.
- تحتوي عدة أوراق على بيانات مشروع آخر: Major Quantities (بنود صرف صحي وسيول ومياه مؤرخة 2024)، والجدول السفلي في ورقة Milestones (SUD1-05-015)، و(KUMT-05-001) Sheet1. كما يُظهر عمود نشاط P6 في ورقة Procurement الرمز KHJ1-05010. لذلك حُذف قسم كميات نطاق العمل.
- تُظهر ورقة Procurement أن 156 من أصل 166 بنداً مورّدة دون ذكر الكميات المورّدة، بينما يُظهر P6 أن معظم أنشطة التوريد لا تزال قيد التنفيذ. لذلك حُذف قسم التوريدات حتى يتطابق المصدران.
- يُظهر رأس سجل المستخلصات قيمة عقد معدلة 21,100,000 ريال، وتكلفة متوقعة عند الإنجاز 20,900,000 ريال، وتغييرات محتملة 200,000 ريال، بينما تُظهر بقية الأوراق 15,898,659.13 ريال و0. كما أن صافي المستخلص 4 شاملاً الضريبة يكرر صافي المستخلص 3 (2,864,258.52 ريال).
- مجموع العمالة حسب المهنة 50 في ورقة Weekly Progress Report و109 في ورقة Manpower.
- تُظهر ورقة Weekly Progress Report أرقام طلبات فحص المواد والفحص الميداني مُزاحة بعمود واحد (57 / 7 و420 / 65)، بينما تذكر ورقة Quality-Stat 64 صادرة و57 مغلقة و7 معلقة، و485 و420 و65.
- ساعات العمل التراكمية 42,166 بينما ساعات العمل الآمنة 42,116، رغم عدم تسجيل أي حادث. وتقييم السلامة 0.85 في الملخص و0.88 في تفتيش الاستشاري بتاريخ 24-أكتوبر.
- تُظهر ورقة DB القيمة !#REF لنطاق المشروع ولعدة تواريخ رئيسية.
