تقدم سير مشروع تطوير شبكات البنية التحتية في مدينة سدير للصناعة والأعمال – المرحلة الثانية – الجزء الثاني

معلومات المشروع (Project information)

المقاول(Contactor)	شركة تطوير التقنية للمقاولات	الاستشاري(Consultant)	شركة ايجيس السعودية للاستشارات
تاريخ استلام الموقع	06-01-2026 م	مدة التنفيذ	18 شهرًا ميلاديًا
بداية العقد	من تاريخ استلام الموقع	قيمة العقد (شامل ضريبة القيمة المضافة)	193,923,948.00 ريال
نسبة الإنجاز المخطط له (Plan)	41.45%	نسبة الإنجاز الفعلي (Actual)	50.28%

168,629,520

ملخص جدول الكميات (Summary of Bill of Quantities)

مكونات المشروع	التكلفة (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)	النسبة الاجمالية
أعمال الطرق (Road)	88,002,863.20	52.19%
شبكة تصريف مياه الأمطار (Storm)	25,405,197.84	15.07%
شبكة الصرف الصحي (Sewer)	7,071,026.55	4.19%
شبكة المياه المعالجة (TSE)	4,147,557.33	2.46%
شبكة مياه الشرب (Potable)	7,779,404.90	4.61%
الأعمال الكهربائية (Electrical)	20,082,301.65	11.91%
أعمال تنسيق الموقع والري (Landscape & Irrigation)	6,835,460.61	4.05%
أعمال كاميرات المراقبة (CCTV)	9,305,707.92	5.52%

معالم البرنامج الزمني (Project Milestone)

البند	التاريخ حسب الجدول الزمني	ملاحظة
Mobilization Finish Milestone	5-Feb-26	Finish
Baseline Submission Finish Milestone	6-Apr-26	Finish
Technical Submittals Finish Milestone	16-Aug-26	UP
Quality Lap Finish Milestone	5-Feb-26	Finish
RBF Finish Milestone	5-Feb-26	Finish
All Works Finish Milestone	5-Jul-27	UP

نطاق المشروع(Project Scope)

البند	الكمية الكلية	الكمية المنفذة	الكمية المتبقية	نسبة المنفذ
أعمال الطرق والرصف (ROD)	15234 m	-	-	-
أعمال شبكة مياة الشرب (WAT)	18,000 m	-	-	-
أعمال شبكة المياه المعالجة (TSE)	16,000 m	-	-	-
أعمال شبكة الصرف الصحي (SEW)	13,000 m	-	-	-
أعمال شبكة صرف مياه الأمطار (STR)	14000 m	-	-	-
أعمال شبكة الري والمناظر الطبيعية (IRR&LANDSCAPE)	29,000 m&12000 m2	-	-	-
أعمال الشبكة الكهربائية (ELE)	51,500 m	-	-	-
أعمال المراقبة بالكاميرات (CCTV)	125 Nos	-	-	-


ملخص التوريدات (Supply Summary)

البند	الكمية الكلية	الكمية المورده	الكمية المتبقية	نسبة التوريد
GRP Pipes	18337	17437	900	95.09%
UPVC Pipes	4716	4716	0	100.00%
HDPE Pipes	28557	28557	0	100.00%
Medium Voltage Cables	51500	0	51500	0.00%
Low Voltage Cables	68400	68400	0	100.00%
Manholes	251	228	23	90.84%
Street Lighting Panels	52	0	52	0.00%

التحديات والعوائق (Challenges and Obstacles)

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

موقع المشروع

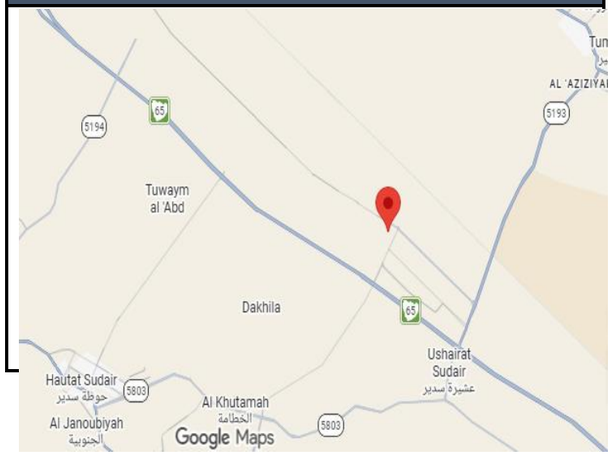

تقدم أعمال layout

