تطوير شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية بالخرج

Development of Infrastructure Networks, Al-Kharj Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	مجموعة مفرح (MMAH)	إيجيس (EGIS)	راكان العتيبي	03-Dec-2025	02-Dec-2027

النطاق: شبكات البنية التحتية على مساحة 3.5 كم² تقريباً في المنطقتين A وB ومنطقة السكن العمالي.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. ووفق الخطة المعدلة الصادرة في 26 أكتوبر، المشروع متقدم بنسبة 0.6%: إنجاز 50.4% مقابل 49.8% مخطط، بعد إنجاز 1.2% هذا الأسبوع مقابل 0.75% مخطط.

نسبة الإنجاز الفعلي
50.4% / 49.8% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.01 +0.6%

التقدم هذا الأسبوع
1.2% / 0.75% مخطط
▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.4%

المدة المنقضية من العقد
45.8% · اليوم 334 من 730
● انتهاء P6: 02-ديسمبر-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
18.6% · 49.7 مليون ريال
5 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

عاد تاريخ الانتهاء إلى الموعد التعاقدي، لكن معلمَي الطرق والجهد المتوسط متأخران من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

يُنهي تحديث P6 المرفوع هذا الأسبوع (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) المشروع في 02-ديسمبر-2027 بفائض صفري، مقابل 27-أبريل-2028 في ملف الأسبوع الماضي. ويُتوقع إنجاز أعمال الطرق في 02-يناير-2027 وشبكة الجهد المتوسط في 08-فبراير-2027، أي بعد 92 و129 يوماً من تاريخيهما في الخطة الأساسية، كما تواجه أعمال الأسفلت توقفاً بسبب قيود توريد البيتومين. ومقارنة بالخطة الأساسية الأصلية التي كانت تستهدف 83.0% بنهاية أكتوبر، لا يزال المشروع متأخراً كثيراً عند 50.4%.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ملف التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026، إحداها تحمل ختم GPS بتاريخ 31-أكتوبر-2026. يستمر رصف الأسفلت، ويجري تركيب البردورات وكشافات الإنارة، وتتقدم أعمال البلوك. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



فريق رصف الأسفلت

فرادة وفريق يرصفون الأسفلت. ختم GPS بتاريخ 31-أكتوبر-2026، الساعة 07:14.



فرش الأسفلت

فرادتان ترصفان طبقة أسفلت جديدة.




توريد الأسفلت ودمكه

شاحنة تورّد الأسفلت وهراس يعمل أمامها.




تركيب البردورات

بردورات مركّبة على جزيرة وسطية، مع دمك ما بين البردورات.

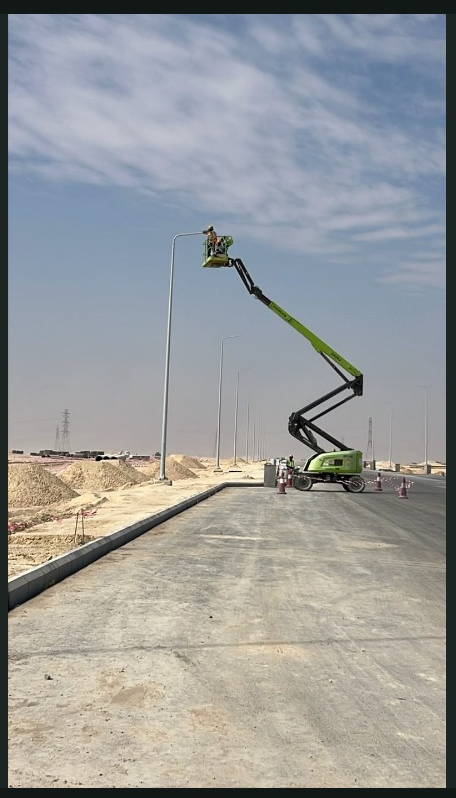

كشافات الإنارة

رافعة سلة تركّب كشافاً على عمود إنارة.

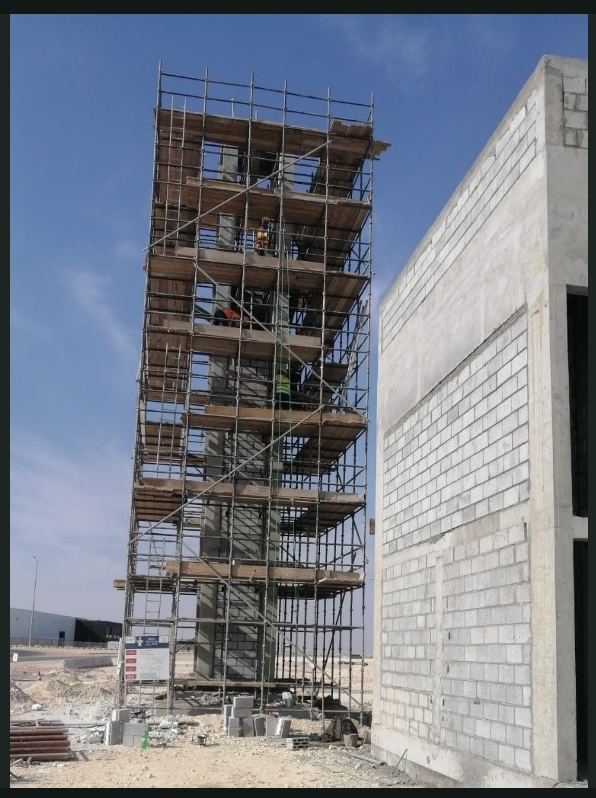


أعمال البلوك

برج خرساني بسقالات بجوار جدار من البلوك.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

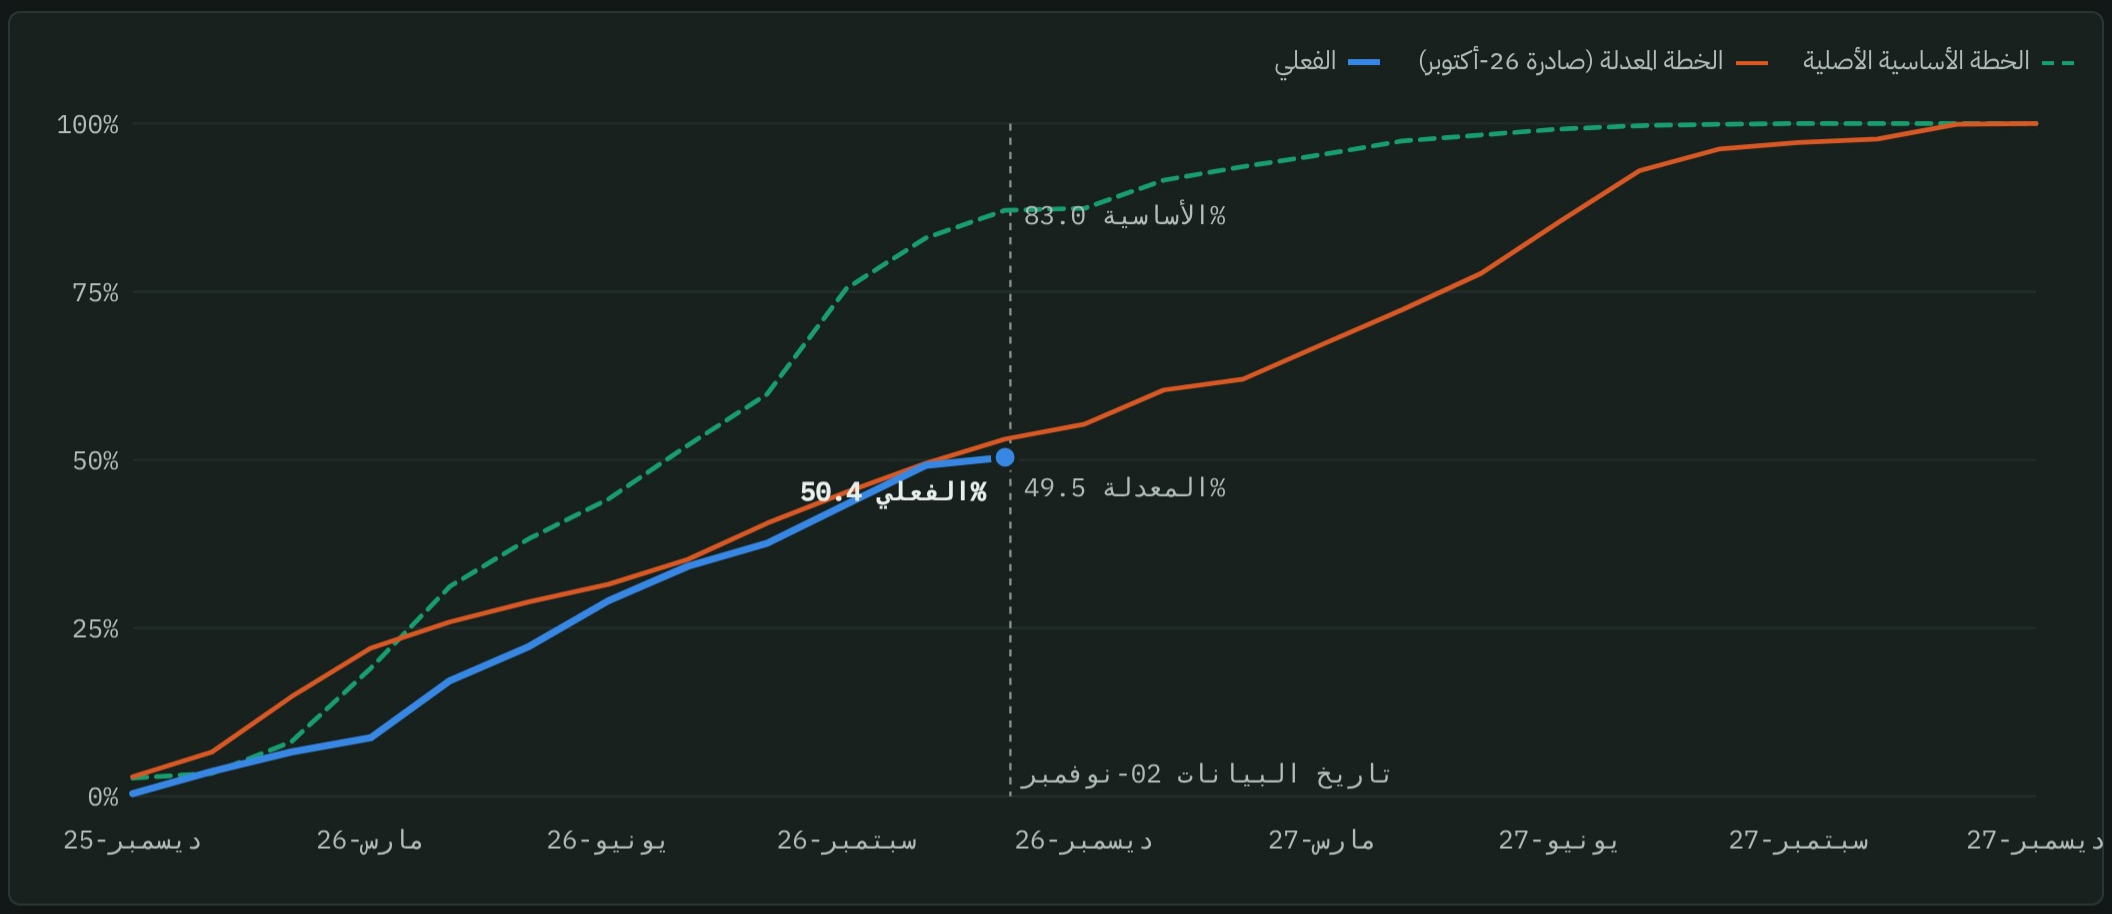

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
28-Sep-2026	47.2	42.5	−4.7	+0.8	0.90
05-Oct-2026	50.1	43.4	−6.7	+0.9	0.87
12-Oct-2026	51.4	45.7	−5.7	+2.3	0.89
19-Oct-2026	52.5	47.0	−5.5	+1.3	0.89
26-Oct-2026	48.4*	49.3	+0.9	+2.2	1.02
02-Nov-2026	**49.8**	**50.4**	**+0.6**	**%1.2**	**1.01**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقارير الأسبوعية من 28 سبتمبر إلى 02 نوفمبر. * اعتباراً من 26 أكتوبر تؤخذ القيمة المخططة من الخطة المعدلة الصادرة في ذلك الأسبوع. وارتفع المخطط التراكمي هذا الأسبوع بنسبة 1.4%، بينما يذكر جدول الجهد أن التقدم المخطط لهذا الأسبوع 0.75%.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التصميم الهندسي	3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	20%	69.0%	77.7%	+8.7	1.13	▲ متقدم
التنفيذ	67%	46.9%	47.6%	+0.7	1.01	▲ في المسار
الاختبار والتشغيل	10%	16.0%	0.0%	−16.0	0.00	▼ لم يبدأ
الإجمالي	100%	**49.8%**	**50.4%**	**+0.6**	**1.01**	▲ في المسار

يضم تحديث P6 (البرنامج ICKM01-22.Oct.2026-1، تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) 5,877 نشاطاً: 3,718 منجزاً و258 جارياً و1,901 لم يبدأ. وتاريخ الانتهاء المجدول 02-ديسمبر-2027، وهو تاريخ العقد.

نطاق العمل: الكميات

لم يُرفع عرض التقدم هذا الأسبوع، لذا لا تتوفر جداول الكميات لكل شبكة. يعرض هذا القسم متتبع الكميات الرئيسية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026 (المنطقتان A وB معاً). و«هذا الأسبوع» هو التغير منذ عرض 26-أكتوبر-2026 الذي يستخدم الإجماليات نفسها؛ أما الأسفلت فيُتابَع بالطن فلا تتوفر له مقارنة.

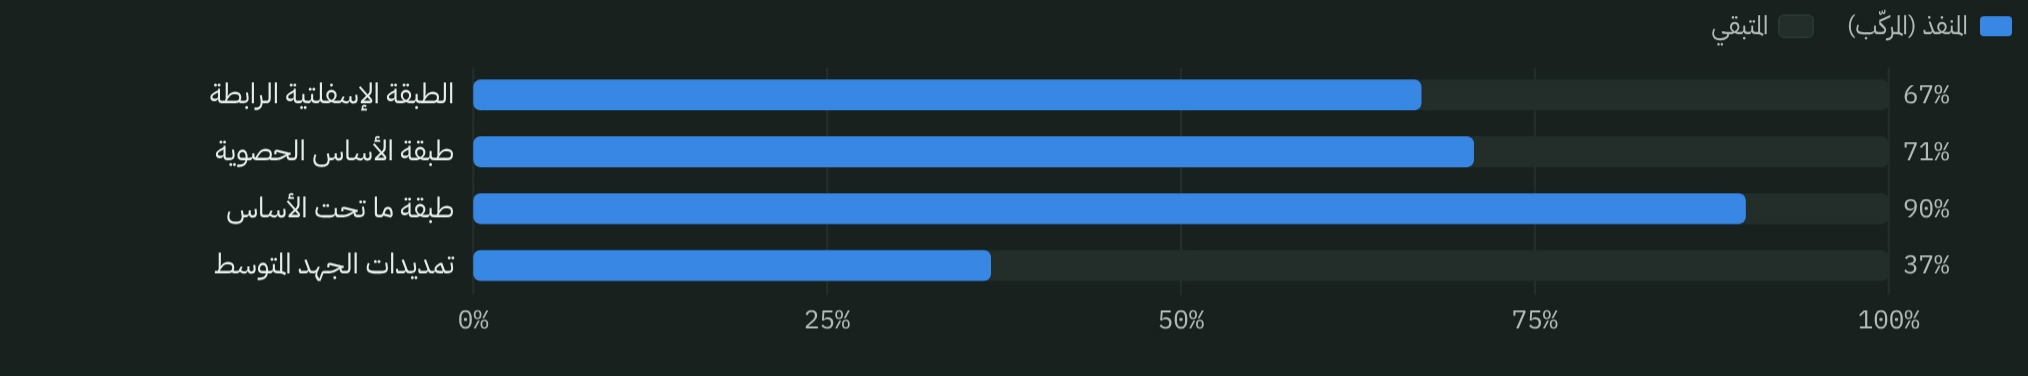

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الطبقة الإسفلتية الرابطة	A + B	طن	110,480	74,008	–	36,472	67.0%	–
طبقة الأساس الحصوية	A + B	م³	99,916	70,640	321+	29,276	70.7%	–
طبقة ما تحت الأساس	A + B	م³	160,925	144,678	0	16,247	89.9%	–
تمديدات الجهد المتوسط	A + B	م.ط	72,000	26,337	0	45,663	36.6%	–

كان يُفترض إنجاز البنود الأربعة المتابَعة بالكامل حتى الآن

المخطط حتى تاريخه في المتتبع يساوي الكمية الكاملة لكل بند. ولا يزال متبقياً: 36,472 طناً من الطبقة الإسفلتية الرابطة، و29,276 م³ من طبقة الأساس الحصوية، و16,247 م³ من طبقة ما تحت الأساس، و45,663 م.ط من تمديدات الجهد المتوسط.

لا تغيير في طبقة ما تحت الأساس والجهد المتوسط

تطابق طبقة ما تحت الأساس (144,678 م³) وتمديدات الجهد المتوسط (26,337 م.ط) عرضَ 26-أكتوبر تماماً، فإما أنه لم تُسجَّل أعمال هذا الأسبوع أو أن المتتبع لم يُحدَّث. وزادت طبقة الأساس الحصوية 321 م³.

المعالم الرئيسية

يتفق التقرير الأسبوعي وتحديث P6 الآن على التواريخ المتوقعة لأعمال الطرق وشبكة الجهد المتوسط. أما المعالم المرحلية الأخرى فمصدرها P6 فقط.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	03-Dec-2025	03-Dec-2025	03-Dec-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	02-Jan-2026	02-Jan-2026	–	–	✓ منجز
أعمال الطرق	02-Oct-2026	02-Jan-2027 (+92 d)	02-Jan-2027	−79	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	02-Oct-2026	08-Feb-2027 (+129 d)	08-Feb-2027	−110	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	–	–	28-Feb-2027	−22	▼ معرّض للتأخير
شبكة تصريف السيول	–	–	16-Mar-2027	−35	▼ معرّض للتأخير
شبكة الري	–	–	27-Mar-2027	−44	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	–	–	29-Mar-2027	−46	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	–	–	26-May-2027	−95	▼ متأخر
جميع الشبكات	02-Feb-2027	29-Mar-2027 (+55 d)	–	–	▼ متأخر
تنسيق المواقع	–	–	04-Oct-2027	+51	● في المسار
تسليم المشروع	02-Dec-2027	02-Dec-2027	02-Dec-2027	0	● دون فائض زمني

يتعارض تاريخ الاتصالات في P6 مع توقع التقرير الأسبوعي لمعلم «جميع الشبكات» في 29-مارس-2027.

يُنهي P6 شبكة الاتصالات في 26-مايو-2027 بفائض زمني −95 يوماً. وانخفض عدد الأنشطة المفتوحة ذات الفائض السالب من 1,243 إلى 574، أكثرها في الأعمال الإسفلتية (20) وطبقة الأساس الحصوية (19) والأعمال الترابية (17). وأسوأ فائض (−110 أيام) على أعمال الجهد المتوسط وسلسلة الطبقة الإسفلتية الرابطة وطبقة الأساس. وكان ملف الأسبوع الماضي يُنهي المشروع في 27-أبريل-2028؛ وعلى المقاول توضيح تغييرات العلاقات والمدد وراء استرداد 147 يوماً.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموَرَّدة إلى الموقع من إجمالي الكمية. المصدر: ورقة التوريدات، التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026.



الإنترلوك: 3% مورّد


4,280 من 129,381 م.ط، بزيادة 500 هذا الأسبوع، رغم أن الجدول لا يزال يذكر أن العينة غير معتمدة وأن التوريد متوقف.

المحابس ومناهل الاتصالات والتشجير

المحابس المنزلقة: وُرِّد 347 من 2,723 (13%). غرف الاتصالات: 0 من 214، والمطلوب توريدها بحلول 20-نوفمبر. التشجير (30,556 م²) بانتظار الاتفاق على الكمية النهائية. وتمديدات الجهد المتوسط لا تزال عند 61 من 72 كم بانتظار إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من اختبار القبول في المصنع. وتقدم هذا الأسبوع توريد البردورات (+2,200 م.ط) والأغطية الحديدية (+200) والعبارات الصندوقية (+50 م.ط).

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

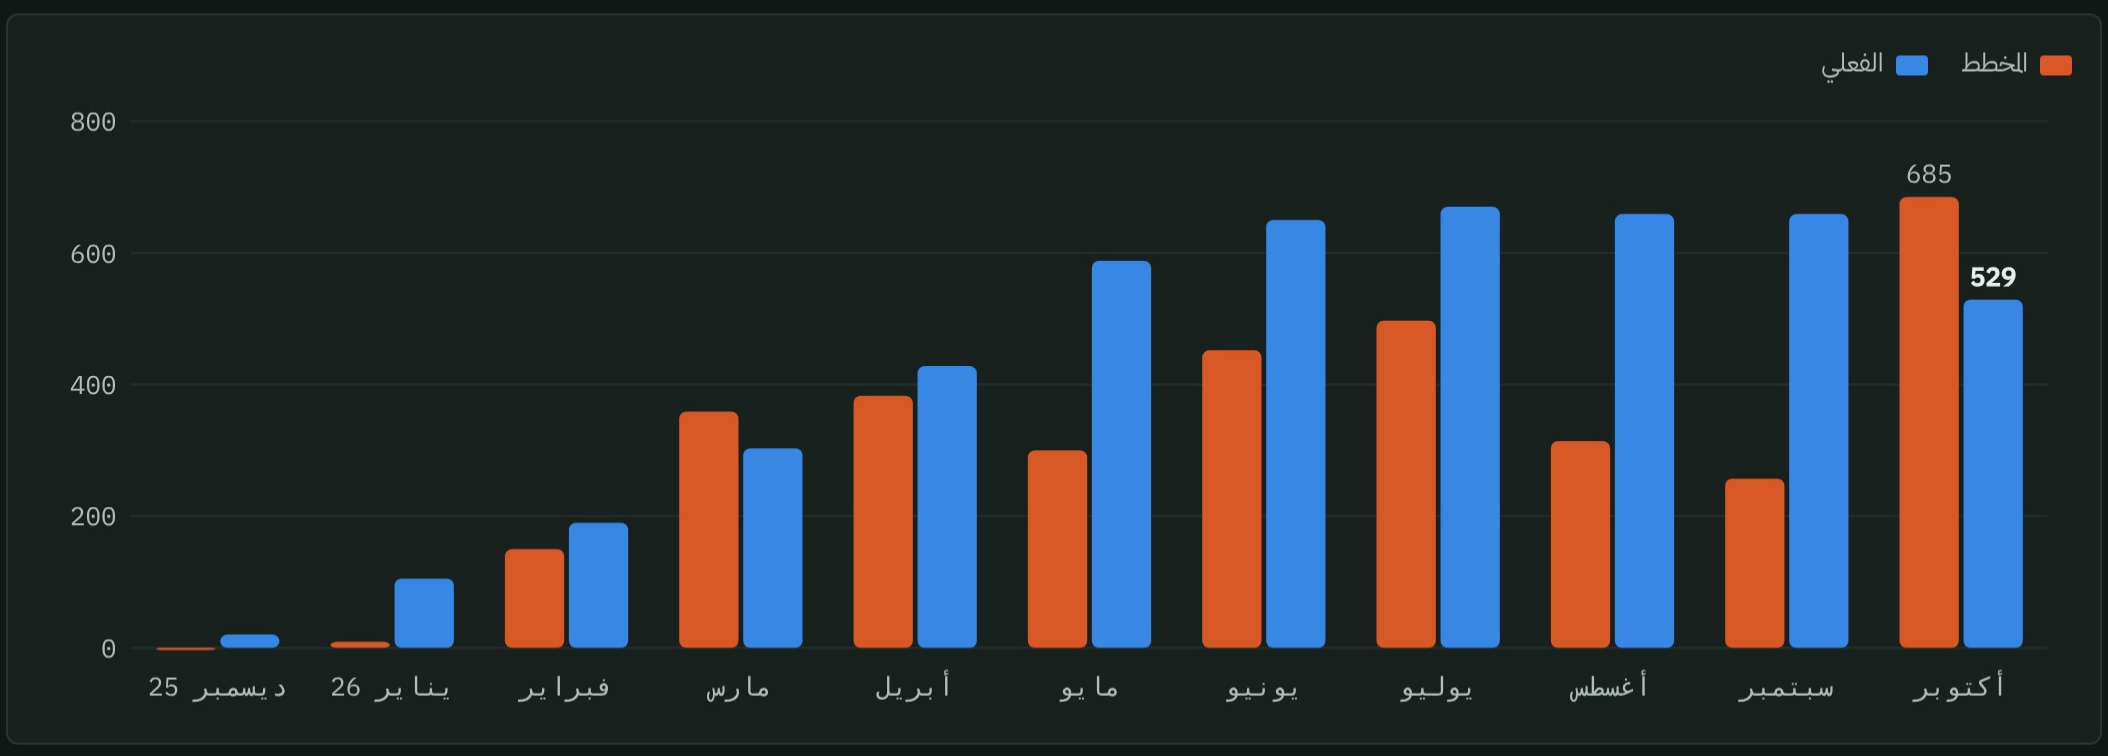

بلغ عدد العمالة في أكتوبر 529 مقابل 685 مخططاً (−23%). ويكرر تقرير 02-نوفمبر رقم أكتوبر مرة أخرى دون عدد لشهر نوفمبر. واستُبدلت العمالة المخططة هذا الأسبوع: ارتفع مخطط أكتوبر من 677 إلى 685 وانخفضت ذروة نوفمبر من 841 إلى 721.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الحزمة 01: البنية التحتية، 3.5 كم²	226,527,683
الحزمة 02: منطقة السكن العمالي	18,085,168
الحزمة 03: مسجد ومهبط مروحيات وسيول وتأهيل طرق	23,118,731
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**267,731,582**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	307,891,320
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	5
القيمة الإجمالية	49,710,656
المحتجزات (10%)	4,971,066
الخصومات والغرامات	111,000
الصافي شاملاً الضريبة	51,339,529
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	67,676,799

بلغت المستخلصات 18.6% من قيمة جدول الكميات دون ضريبة القيمة المضافة (16.1% من قيمة العقد شاملة الضريبة) مقابل نسبة إنجاز فعلي 50.4%. وارتفعت قيمة طلبات الفحص الميداني بمقدار 5,966,143 هذا الأسبوع. ولا يزال ملخص المستخلصات يُظهر صفراً للمقدَّمة والمعتمدة والمدفوعة، لذا يلزم تأكيد حالة الصرف.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.90

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	1,172,525
ساعات العمل هذا الأسبوع	37,080
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	6
حوادث وشيكة	2
أضرار الممتلكات	3
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	218 / 1,959

الجودة التقييم 0.93

طلبات الفحص هذا الأسبوع: معتمدة	327
طلبات الفحص هذا الأسبوع: مرفوضة	7
طلبات الفحص قيد المراجعة	49
الاختبارات المنفذة (تراكمي)	2,544
تقارير عدم المطابقة (تراكمي)	42
طلبات الاستيضاح مفتوحة / مغلقة	4 / 124
طلبات فحص المواد المعتمدة هذا الأسبوع	5
المخططات التنفيذية المعتمدة	2,087

أسبوع الجودة: 24–31 أكتوبر 2026. سُجلت هذا الأسبوع خمسة تقارير عدم مطابقة و20 مخططاً تنفيذياً مرفوضاً.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
توريد البيتومين	المقاول	تواجه أعمال الأسفلت توقفاً بسبب قيود توريد البيتومين؛ إذ أفاد المقاول بأن أرامكو أغلقت مصفاتَي رأس تنورة والرياض.
القناة الصندوقية والخدمات القائمة	المالك / الاستشاري	حفريات القناة الصندوقية مقيّدة لأن الخدمات القائمة تحت الأرض غير موضحة بشكل كافٍ في مخططات التنفيذ الفعلي (As-built)، ويلزم توفير معلومات مؤكدة عنها.
العبّارة الصندوقية، المنطقة A	المقاول	يتعارض حفر العبّارة الصندوقية لتصريف السيول مع تمديدات الجهد المنخفض والمتوسط القائمة ومواسير المياه والري.
تعارضات شبكة الجهد المتوسط	المقاول	مسار الجهد المتوسط قريب جداً من شبكتي المياه والري، مما يمنع بدء أعمال الجهد المتوسط الداخلية.
وفورات التكلفة	المقاول	تحديد الوفورات المالية والفنية الممكنة والاستفادة منها.

يُظهر سجل المشكلات الآن عوائق الموقع واسترداد المعالم وتوفر المادة الخام لمواسير GRP على أنها مغلقة. المخاطر القائمة في السجل: الطقس (أمطار ورياح وغبار)، وتوريد مواد الردم والمناهل والمواسير، وسلامة الحفريات العميقة، والخدمات والطرق القائمة، وتأخر المواد الرئيسية.

ملاحظات على البيانات

- لم يُرفع عرض التقدم مع تقرير 02-نوفمبر، لذا لا تتوفر الكميات حسب الشبكة والمنطقة ولا الكميات المنفذة هذا الأسبوع. ويستخدم قسم النطاق متتبع الكميات ذي البنود الأربعة في التقرير الأسبوعي.
- انتقل تاريخ انتهاء P6 من 27-أبريل-2028 إلى 02-ديسمبر-2027 في تحديث واحد، والفائض الزمني لمياه الشرب من −230 إلى −46 يوماً، والأنشطة المفتوحة ذات الفائض السالب من 1,243 إلى 574. ولا تزال عدة أنشطة جارية للإنارة والبردورات تمتد إلى 09-أكتوبر-2028 بعد انتهاء المشروع، مما يشير إلى علاقات مفتوحة غير مكتملة.
- تعرض ورقة الملخص الرئيسية تواريخ المعالم المتوقعة مساويةً لتواريخ الخطة الأساسية، بينما يذكر عمود فرق الأيام فيها وورقة المعالم −92 و−129 و−55 يوماً. وتشير ورقة ملاحظات الاستشاري في مقدمة ملف PDF إلى الأمر نفسه.
- ارتفع المخطط التراكمي من 48.4% إلى 49.8% هذا الأسبوع، بينما يذكر جدول الجهد أن التقدم المخطط لهذا الأسبوع 0.75%.
- استُبدل مخطط العمالة (أكتوبر 677 ← 685، ونوفمبر 841 ← 721)، وتكرر رقم أكتوبر الفعلي 529 للتقرير الثالث دون عدد لشهر نوفمبر.
- يقيس التقرير الأسبوعي التكلفة الآن مقابل 267,731,582 ريالاً دون ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 307,891,320 ريالاً، فأصبحت نسبة الفوتر 18.6% بدلاً من 16.1%؛ بينما لا يزال سجل المستخلصات يستخدم القيمة القديمة. كما يُظهر بند «الغرامات والمحتجزات» في الملخص 111,000 فقط دون المحتجزات البالغة 4,971,066.
- الجودة: تُظهر طلبات فحص المواد المعتمدة 5 تراكمياً (49 الأسبوع الماضي)، أي أُعيد تصفير العداد مرة أخرى؛ ويظهر إجمالي المخططات التنفيذية 20,887 بدلاً من 2,087؛ وتقارير عدم المطابقة هذا الأسبوع 5 في ورقة Quality-Stat و4 في ورقة Weekly Quality. كما تعرض ورقة Quality-Stat تقدماً قائماً على التكلفة بوصفه «فعلياً»، ولم يُستخدم هنا.
- تكرر أعداد طلبات الفحص الميداني في لوحة الملخص (353 صادرة و294 مغلقة) أرقام الأسبوع الماضي؛ بينما تذكر ورقة Weekly Quality استلام 407 طلبات هذا الأسبوع.
- لا تزال ملاحظات التوريدات تذكر انتهاء توريد عدة بنود في 20 أكتوبر (مناهل السيول والعبارات الصندوقية والمحابس المنزلقة وتمديدات الجهد المتوسط) رغم عدم اكتمالها، كما زادت كميات الإنترلوك الموزَّدة رغم تسجيل التوريد على أنه متوقف.
- تسمّي ورقة SPI الأسبوع الجديد «Week 5 26.Oct.2026» مرة أخرى، ولا تزال ساعات العمل «لهذا الشهر» في ورقة السلامة (131,580) تشمل أكتوبر.
