تطوير شبكات البنية التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام المرحلة الثانية الجزء الثاني - المنطقة J

Development of Infrastructure Networks, 3rd Industrial City in Dammam, Phase 2 Part 2, Zone J

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة أنساب للمقاولات العامة	إيجيس (EGIS)	المهندس محمد العيسى	12-Jan-2025	11-Jan-2027

النطاق: الطرق التجميعية والمحلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والجهد المتوسط وإنارة الشوارع والاتصالات، ومحطة رفع للصرف الصحي وبحيرات لتصريف السيول في البلوك J. قيمة العقد 117.4 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 24 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بالجهد المخطط (أيام العمل، وهو الأساس نفسه في التقرير 94). في تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026 بلغ الإنجاز 78.7% مقابل 87.6% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 8.9% (مؤشر الأداء الزمني 0.90). ومنذ التقرير 94 أُنجز 0.24% مقابل 1.04% مخططاً، فاتسعت الفجوة مجدداً.

نسبة الإنجاز الفعلي
78.7% / 87.6% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.90 −8.9%

التقدم هذا الأسبوع
+0.24% / 1.04% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.8%

المدة المنقضية من العقد
90.5% · اليوم 660 من 729
▼ انتهاء P6 في 20-نوفمبر-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
43.1% · 50.6 مليون ريال
20 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

من المتوقع الآن أن ينتهي المشروع متأخراً ثمانية إلى عشرة أشهر.

يُنهي تحديث P6 بتاريخ 03-نوفمبر-2026 المشروع في 20-نوفمبر-2027، أي بعد تاريخ العقد (11-يناير-2027) بـ313 يوماً، بفائض −258 يوماً. ويتوقع التقرير الأسبوعي 29-سبتمبر-2027 (تأخير 261 يوماً)، وهو التاريخ الذي تُظهره أيضاً قائمة الأنشطة متعثرة البدء. وقد سُحب التوقع المعدل في التقرير 94 (18-يناير-2027). وبعد انقضاء 90.5% من مدة العقد، يتبقى 21.3% من الأعمال، وجميع معالم اكتمال الشبكات في P6 بفائض سالب بين 196 و258 يوماً.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور جديدة مرفوعة مع التقرير 95، تحمل ختم الكاميرا من 31-أكتوبر إلى 04-نوفمبر-2026، المدينة الصناعية الثالثة بالدمام. تُظهر الردم حول جدران محطة الرفع، وحفرة عميقة محاطة بحواجز، وقاع الطرق. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




الردم عند محطة الرفع

دحّال يدمك الردم بجوار الجدار المحمي. مختومة 31-أكتوبر-2026، 08:24.




حماية الحفر العميق

حواجز خرسانية ولوحة تحذير من الحفر العميق حول غرفة مفتوحة. مختومة 03-نوفمبر-2026، 11:24.

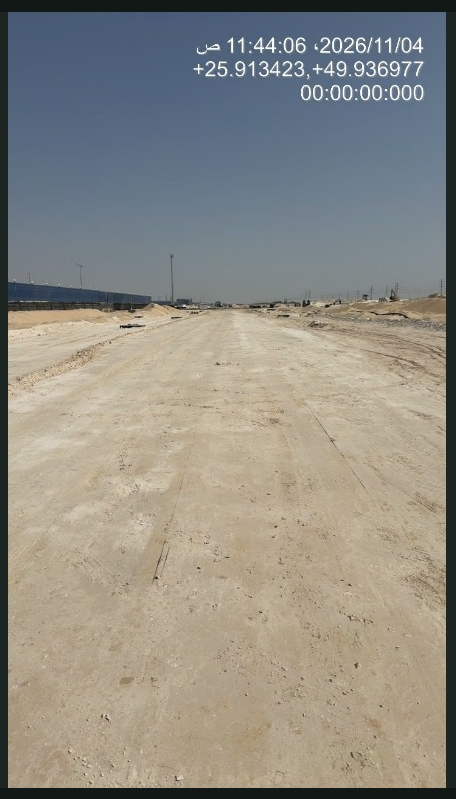

تجهيز قاع الطريق

قاع مسوّى على امتداد مسار الطريق. ختم GPS بتاريخ 04-نوفمبر-2026، 11:44.

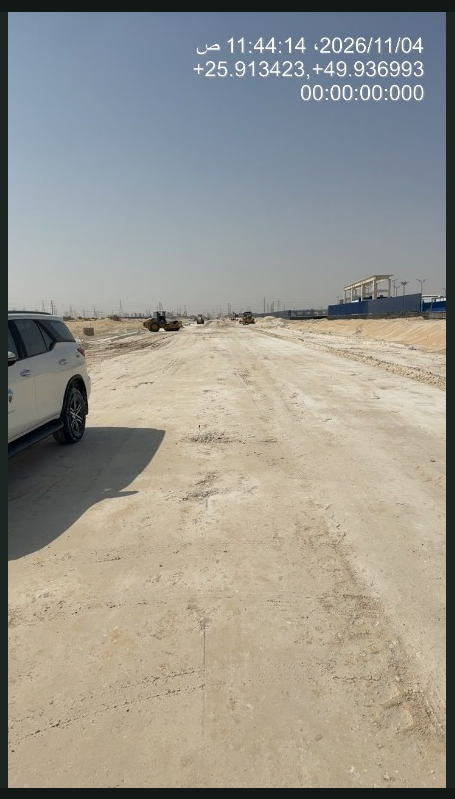


مسار الطريق

قاع جاهز للطبقة التالية والمعدات تعمل في الأمام. ختم GPS بتاريخ 04-نوفمبر-2026، 11:44.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بالجهد المخطط) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

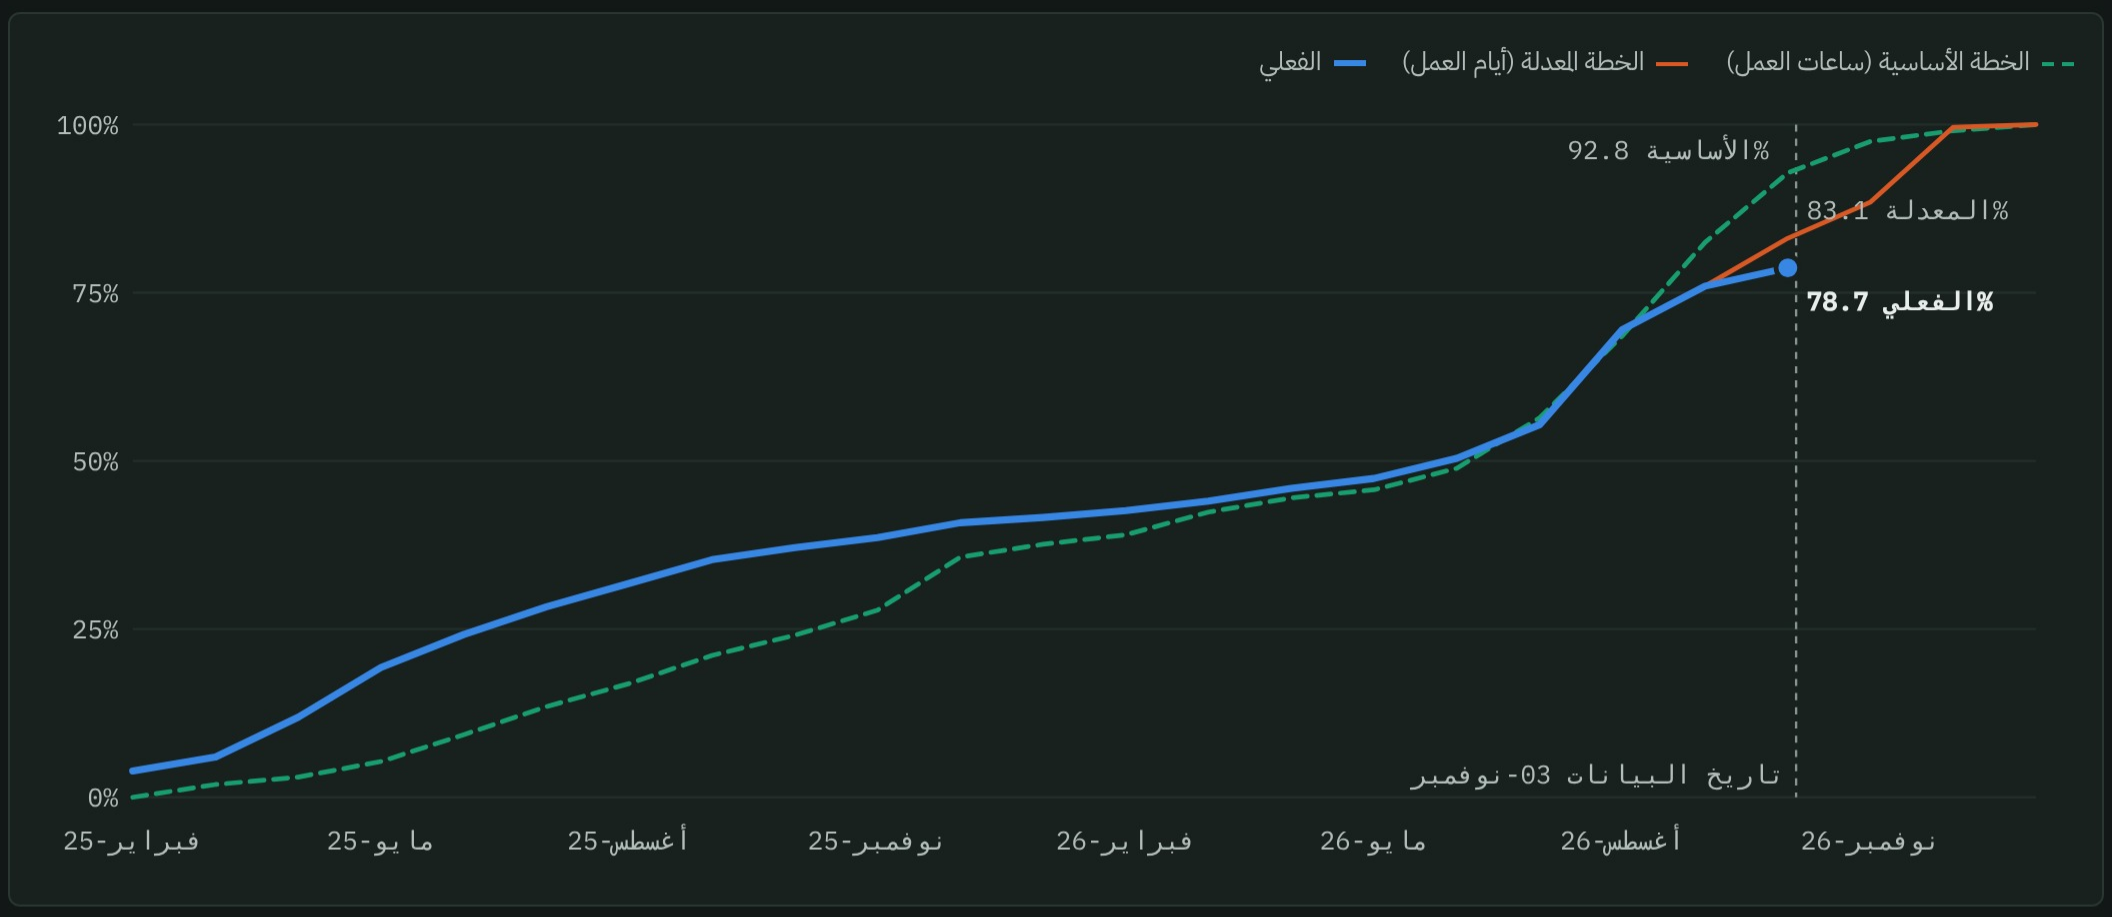

نهاية الفترة	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الفترة	مؤشر الأداء
يوليو-2026	55.4	55.4	0.0	+5.0	1.00
أغسطس-2026	69.5	69.5	0.0	+14.1	1.00
سبتمبر-2026	76.0	76.0	0.0	+6.5	1.00
27-Oct-2026	86.6*	78.5	-8.1	+2.5	0.91
03-Nov-2026	**87.6***	**78.7**	**-8.9**	**+0.2**	**0.90**

قيم نهاية الشهر مقابل الخطة المعدلة (أيام العمل) من ورقة Physical-Chart Data، ثم التقرير 94 (الأسبوع السابق، بالأساس نفسه) والتقرير 95. وحتى سبتمبر يساوي الفعلي في الورقة الخطة المعدلة تماماً، لذا يظهر مؤشر الأداء 1.00. * القيمة المخططة في تاريخ البيانات من ورقة Progress، بينما الخطة المعدلة لنهاية أكتوبر 83.1%، وهي أقل من كلتيهما. وكانت الخطة الأساسية الأصلية (ساعات العمل) تستهدف 92.8% بنهاية أكتوبر.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بالجهد المخطط (أيام العمل). المصدر: ورقة Progress.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التصميم الهندسي	3.0%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	20.0%	100.0%	95.4%	-4.6	0.95	▼ متأخر
شبكة الأعمال الترابية	6.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
شبكة الري	1.9%	100.0%	53.7%	-46.3	0.54	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	2.9%	99.7%	68.7%	-31.0	0.69	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	1.6%	100.0%	94.4%	-5.6	0.94	▼ متأخر
شبكة إنارة الشوارع	3.7%	100.0%	9.4%	-90.6	0.09	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	1.5%	100.0%	61.7%	-38.3	0.62	▼ متأخر
شبكة الطرق	23.1%	91.3%	64.8%	-26.5	0.71	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	12.7%	98.1%	87.4%	-10.7	0.89	▼ متأخر

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
شبكة تصريف السيول	12.8%	99.2%	84.1%	−15.1	0.85	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	10.0%	0.0%	72.4%	+72.4	–	؟ لا يوجد مخطط حتى تاريخه
الإجمالي	100%	**87.6%**	**78.7%**	**−8.9**	**0.90**	▼ متأخر

يُقاس الجهد بأيام العمل (65,420 إجمالاً) بالأساس نفسه في التقرير 94، لكن أُعيد توزيع أوزان البنود: حُذف التجهيز، وتغيرت الكميات المخططة للتصميم والتوريدات والشبكات والاختبار. ويذكر التقرير هذا الأسبوع 778 يوم عمل مكتسباً (منها 561 في الاختبار والتشغيل) مقابل 912 مخططاً، بينما لم يرتفع الإجمالي التراكمي المكتسب إلا بـ158، لأن التوريدات انخفضت من 12,670 إلى 12,485 والطرق من 10,205 إلى 9,798. يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) عدد 1,921 نشاطاً: 1,231 مكتملاً و63 قيد التنفيذ و627 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 20-نوفمبر-2027، أي بعد تاريخ العقد بـ313 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

الكميات الإجمالية والمنفذة والمتبقية لكل شبكة، من ملخص التنفيذ في ورقة ملخص سير الأعمال. غيّر التقرير 95 إجماليات السيول والصرف الصحي ومياه الشرب، وأصبح يقيس الطرق بالطن، وأضاف الاتصالات، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" فقط حيث لم يتغير الإجمالي منذ التقرير 94.

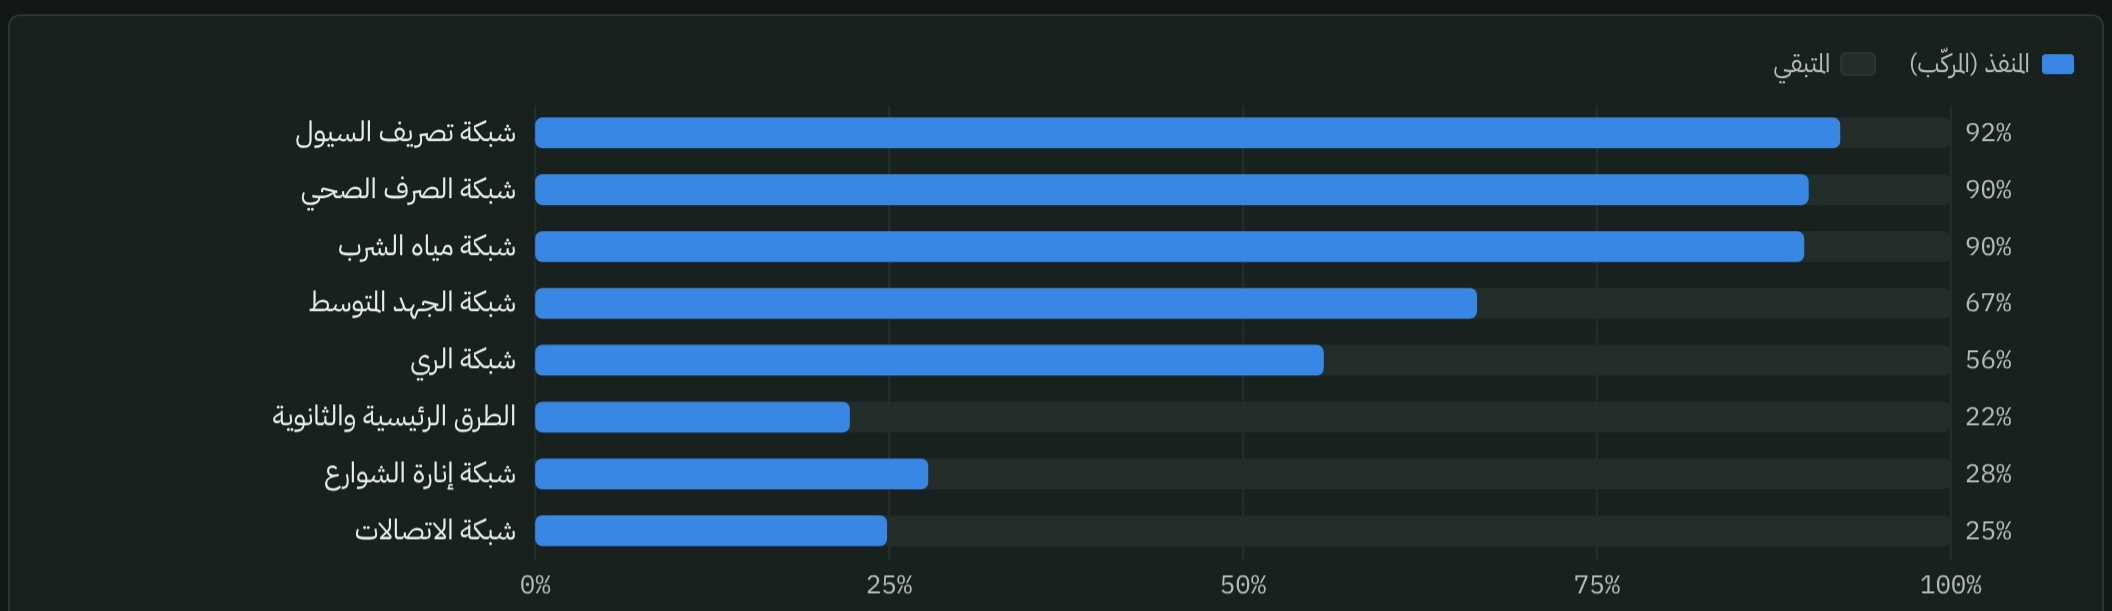

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
شبكة تصريف السيول	البلوك J	م.ط	24,720	22,788	–	1,932	92.2%	–
شبكة الصرف الصحي	البلوك J	م.ط	12,806	11,520	–	1,286	90.0%	–
شبكة مياه الشرب	البلوك J	م.ط	14,405	12,913	–	1,492	89.6%	–
شبكة الجهد المتوسط	البلوك J	م.ط	17,328	11,528	0	5,800	66.5%	–
شبكة الري	البلوك J	م.ط	14,494	8,074	0	6,420	55.7%	–
الطرق الرئيسية والثانوية	البلوك J	طن	55,631	12,365	–	43,266	22.2%	–
شبكة إنارة الشوارع	البلوك J	م.ط	12,786	3,550	0	9,236	27.8%	–
شبكة الاتصالات	البلوك J	م.ط	9,354	2,325	–	7,029	24.9%	–

الأعمال المنفذة هذا الأسبوع

الشبكة	النشاط	الوحدة	المنفذ هذا الأسبوع	المصدر
مياه الشرب	تمديد خط المياه قطر 200 مم	م.ط	100	ورقة أنشطة الأسبوع
الجهد المتوسط	تمديد كابلات الجهد المتوسط	م.ط	500	ورقة أنشطة الأسبوع
الطرق	الانتهاء من طبقة التحسين، طريق 10	م.ط	500	ورقة أنشطة الأسبوع
تصريف السيول	الانتهاء من المواسير الفرعية، طريق 23	م.ط	200	ورقة أنشطة الأسبوع
طريق 23	الانتهاء من مواسير HDPE قطر 315 مم	م.ط	300	ورقة أنشطة الأسبوع
تصريف السيول	تركيب المناهل ومصائد الأمطار	–	–	ورقة أنشطة الأسبوع

الشبكة	النشاط	الوحدة	المنفذ هذا الأسبوع	المصدر
محطة رفع الصرف الصحي	الردم حول الجدران	–	–	ورقة أنشطة الأسبوع

الكميات كما وردت في ورقة أنشطة الأسبوع بالتقرير. المخطط لاحقاً: استكمال خط المياه 630 مم وخط الري 500 مم وخط 800 مم، ونحو 1,000 م من كابلات الجهد المتوسط في الشارع 9، ومزيد من المناهل ومصائد الأمطار، وأسفلت الشارع 10 والطريق 14.

الأكثر تأخراً

نُفذ 27.8% من إنارة الشوارع (3,550 من 12,786 م.ط) و24.9% من الاتصالات (2,325 من 9,354 م.ط). والطرق عند 22.2% بالوزن (12,365 من 55,631 طناً)، ولا يزال الأسفلت مخططاً في الشارع 10 والطريق 14. ولا يزال الري عند 55.7%. ولم تبدأ أعمال الدهانات المرورية واللوحات وصنبور إطفاء الحريق (0 من 55).

قريبة من الاكتمال

وفق الإجماليات الجديدة نُفذ 92.2% من تصريف السيول و90.0% من الصرف الصحي و89.6% من مياه الشرب. وتُظهر ورقة Major Quantities الآن تمديد 8,136 من 8,218 م من مواسير المياه قطر 200 مم. واكتملت العبارة الصندوقية لتصريف السيول (2,051 م)، ويجري ردم جدران محطة الرفع.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتواريخ المتوقعة من جدول المعالم في التقرير الأسبوعي، مقابل تحديث P6 بتاريخ 03-نوفمبر-2026. الأيام بين القوسين هي التأخير عن الخطة الأساسية كما يذكره التقرير الأسبوعي.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	12-Jan-2025	12-Jan-2025	12-Jan-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	12-Mar-2025	12-Mar-2025	09-Mar-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد المخططات التنفيذية والمواد	10-Feb-2025	11-Feb-2025	24-May-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
شبكة الأعمال الترابية	24-May-2026	31-May-2025	–	–	✓ منجز
شبكة الاتصالات	28-Sep-2026	28-Mar-2027 (+181 يوماً)	05-Jun-2027	−227	▼ متأخر
شبكة الري	23-Aug-2026	04-May-2027 (+254 يوماً)	05-Aug-2027	−232	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	05-Oct-2026	24-Jul-2027 (+292 يوماً)	26-Sep-2027	−257	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	06-Oct-2026	31-May-2027 (+237 يوماً)	26-Aug-2027	−241	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	17-Oct-2026	10-Apr-2027 (+175 يوماً)	24-Jun-2027	−196	▼ متأخر
أعمال الطرق	21-Oct-2026	14-Sep-2027 (+328 يوماً)	25-Oct-2027	−258	▼ متأخر
شبكة إنارة الشوارع	20-Dec-2026	19-Jun-2027 (+181 يوماً)	11-Aug-2027	−248	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	–	–	15-Sep-2027	−232	▼ متأخر
بحيرات تصريف السيول	–	–	22-May-2027	−122	▼ متأخر
محطة رفع الصرف الصحي	–	–	12-Jun-2027	−140	▼ متأخر
الربط بالشبكات القائمة	–	–	25-Oct-2027	−245	▼ متأخر
انتهاء المشروع	11-Jan-2027	29-Sep-2027 (+261 يوماً)	20-Nov-2027	−258	▼ متأخر

يُنهي تحديث P6 الآن المشروع بعد التقرير الأسبوعي بنحو شهرين.

يتوقع التقرير الأسبوعي الانتهاء في 29-سبتمبر-2027، واكتمال الشبكات بين 28-مارس و14-سبتمبر-2027. أما تحديث P6 بتاريخ 03-نوفمبر-2026 فأبعد بـ41 إلى 93 يوماً لكل شبكة، وينتهي في 20-نوفمبر-2027، وتأخرت معالمه بين 42 و91 يوماً مقارنة بتحديث P6 بتاريخ 27-أكتوبر-2026. ولا تزال شهادة عدم الممانعة من المالك لشبكة الجهد المتوسط المعلم الرقابي الوحيد الذي لم يتحقق، ويجدولها P6 الآن في 27-يناير-2027 بفائض −257 يوماً.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الكمية المطلوبة. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 95. جميع المواد المدرجة معتمدة.

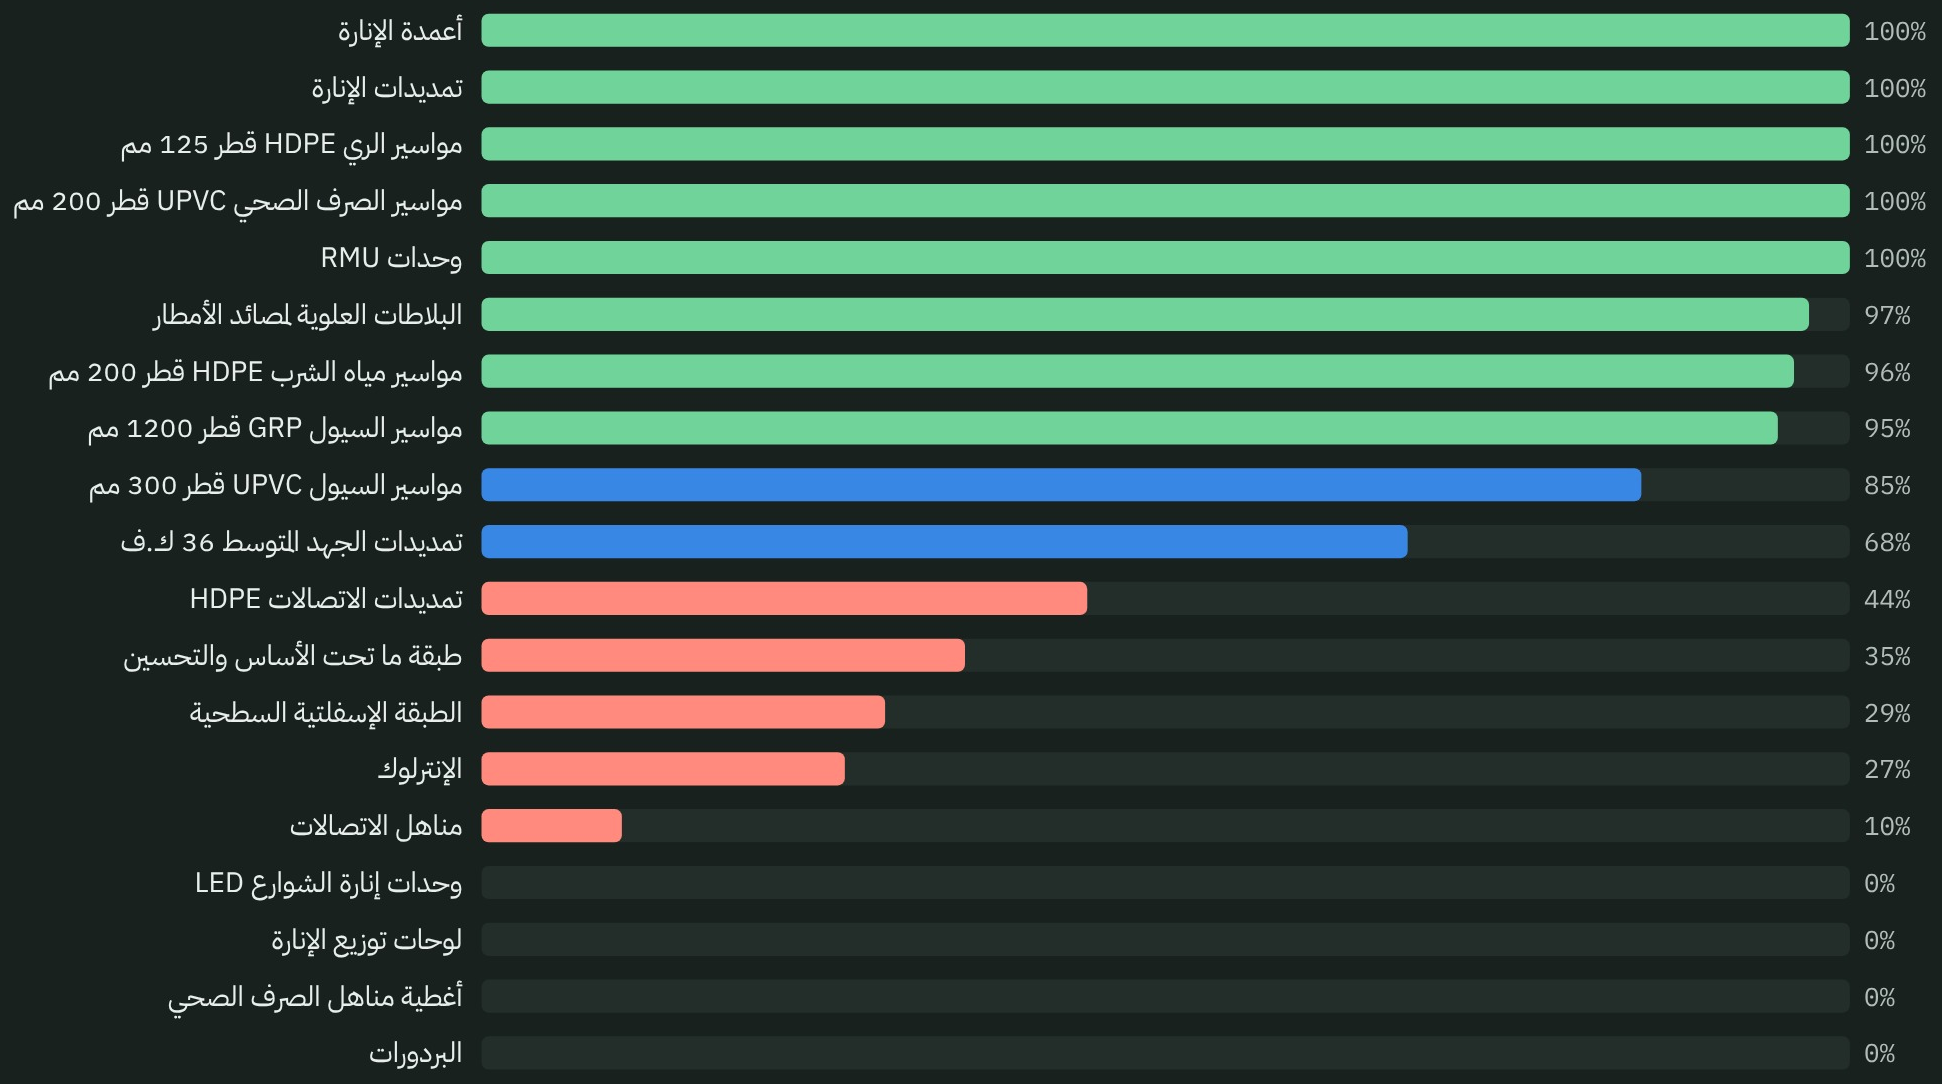

لم يُورّد شيء بعد لعدة بنود


وحدات إنارة الشوارع LED (0 من 363)، ولوحات توزيع الإنارة (0 من 6)، والبردورات (0 من 42,552 قطعة)، وأغطية مناهل الصرف الصحي (0 من 129). ومناهل الاتصالات عند 8 من 78، وتمديدات الاتصالات عند 44%. ويصنف سجل المخاطر تأخر المواد طويلة الأجل كخطر مرتفع.

ما وُرّد هذا الأسبوع

جميع وحدات RMU التسع (من 0)، وبقية مواسير الري قطر 125 مم (100% الآن بعد 22%)، ومواسير الصرف الصحي قطر 200 مم (100%)، والبلاطات العلوية لمصائد الأمطار (488 من 503 بعد 100)، وقواعد وحلقات مناهل السيول. ومواسير المياه قطر 200 مم عند 96%، ومواسير السيول UPVC قطر 300 مم عند 85%. ولا تزال مواد طبقات الطرق عند 17–35%.

القوى العاملة

عدد العمالة في الموقع هذا الشهر حسب المهنة، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower. لا يتضمن التقرير سجلاً شهرياً.

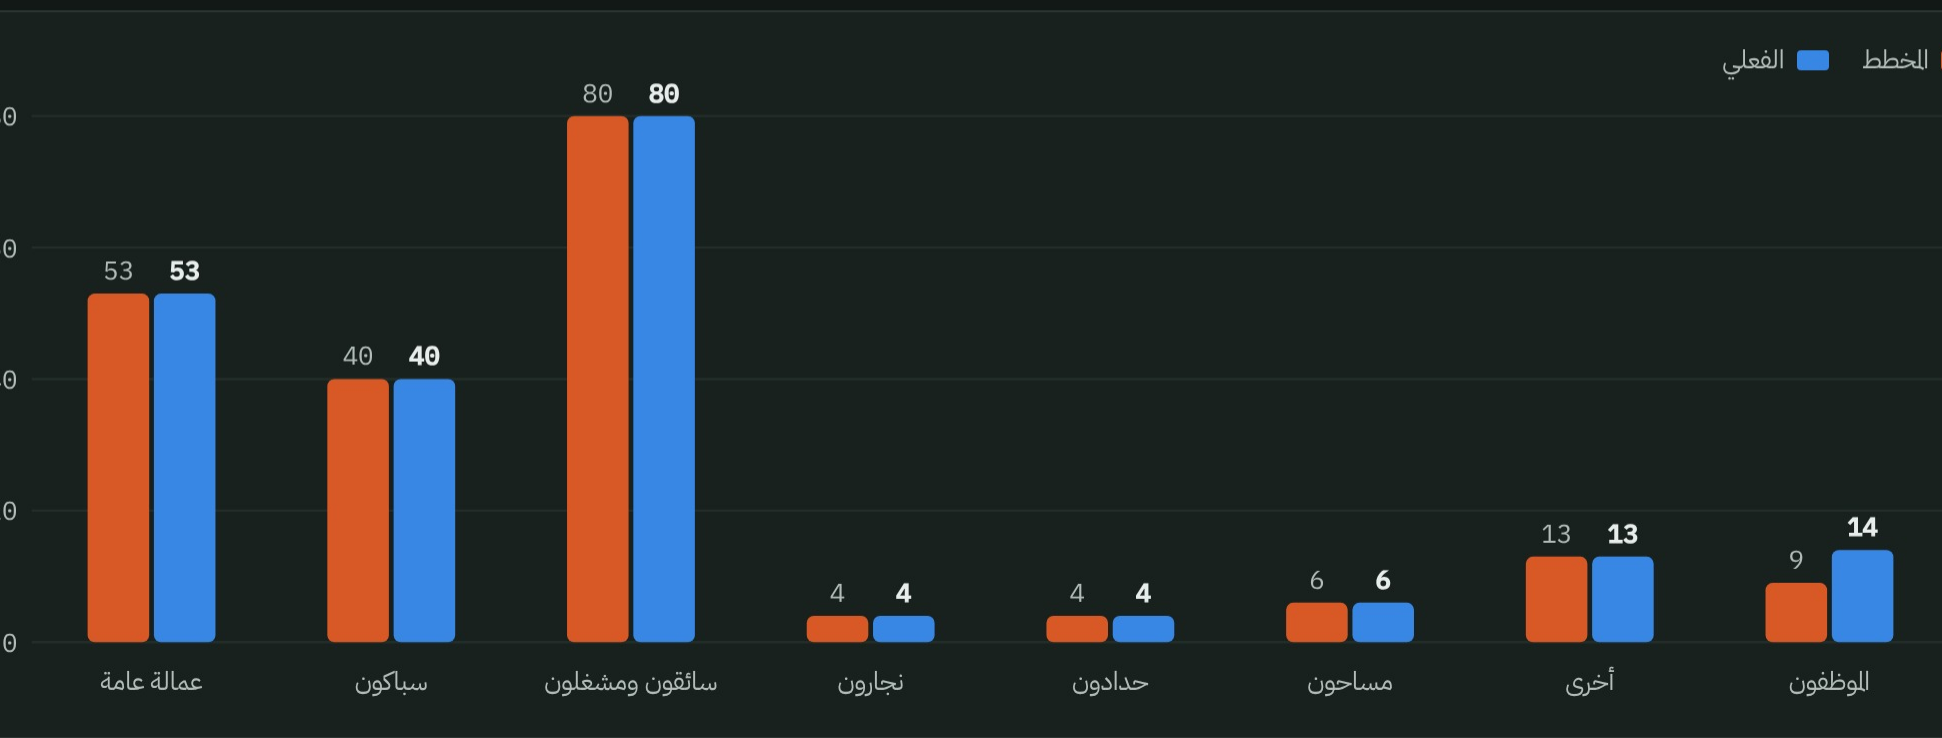

إجمالي العمالة 214 مقابل 209 مخططاً: 200 عامل مقابل 200، و14 موظفاً مقابل 9. وورقة القوى العاملة دون تغيير عن التقرير 94: الخطة لكل مهنة مساوية للفعلي (مثلاً 4 نجارين و4 حدادين و80 سائقاً ومشغلاً). والمعدات في الموقع 100 وحدة مقابل 78 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الطرق والرصف	31,308,119
تصريف مياه الأمطار	33,717,595
الصرف الصحي ومحطات الرفع	24,177,287
مياه الشرب	10,220,942
الري	6,738,491
إنارة الشوارع والاتصالات	6,440,353
الجهد المتوسط	4,788,987
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**117,391,774**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	135,000,540
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. سجل أوامر التغيير فارغ، ويذكر التقرير تغييراً محتملاً واحداً.

المستخلصات

الدفعة المقدمة (10%)	11,739,177
المستخلصات الجارية المقدمة	20
القيمة الإجمالية	50,649,221
استرداد الدفعة المقدمة	5,064,922
المحتجزات / الغرامات	0 / 0
المعتمد من مدير المشروع - مدن	50,649,221
المدفوع (19 مستخلصاً)	43,414,468

المفوتر 43.1% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 78.7%. لا يوجد مستخلص جديد هذا الأسبوع. والمستخلص 20 (من 01-سبتمبر إلى 30-سبتمبر-2026، بقيمة إجمالية 7,234,753 ريال) معتمد وبانتظار الدفع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.82

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	410,698
ساعات العمل هذا الأسبوع	12,000
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	5
حوادث وشيكة	1
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	106 / 323
تفتيش السلامة من الاستشاري، 27-أكتوبر-2026	0.84

أرقام تراكمية. هذا الأسبوع: 10 جلسات تعريف بالسلامة و3 اجتماعات توعية.

الجودة التقييم 0.90

طلبات الفحص الميداني الصادرة (تراكمي)	1,881
طلبات الفحص المغلقة	1,791
طلبات الفحص المعلقة (0–10 أيام)	90
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	21 / 21
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	13 / 12
طلبات فحص المواد الصادرة	0
المخططات التنفيذية المقدمة (جميعها بالرمز B)	23
اعتمادات المواد (A / B / C / D)	1 / 72 / 2 / 1

تُغلق تقارير عدم المطابقة خلال 7 أيام في المتوسط. ولا يزال 7 من طلبات اعتماد المواد بانتظار الاعتماد.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
التأخر في الجدول الزمني	المقاول	يتوقع P6 الانتهاء في 20-نوفمبر-2027 بتأخير 313 يوماً (التقرير الأسبوعي: 29-سبتمبر-2027، 261 يوماً). والتقدم الفعلي متأخر عن الخطة بنسبة 8.9%، ولم يُنجز سوى 0.24% هذا الأسبوع. ولا تزال إحصائيات الجدول في الملف (406 أنشطة متعثرة البدء و281 نشاطاً على المسار الحرج) تكرر قيم التقرير 92. ولا يوجد تسجيل لاعتماد جدول تعافٍ.
المواد طويلة الأجل	المقاول	الخطر 05، مرتفع وقائم: قد يؤدي تأخر توريد المواد طويلة الأجل إلى توقف العمل. المعالجة: متابعة الموردين والحصول على موافقة مدن على مصادر بديلة. الموعد المستهدف 20-نوفمبر-2026.
الربط بالشبكات القائمة	المقاول / مدن	الخطر 01، منخفض وقائم: قد لا تكون البنية التحتية القائمة جاهزة للربط، مما يؤخر التشغيل والتسليم. معلم الربط في P6 بتاريخ 25-أكتوبر-2027 بفائض −245 يوماً.
الاختبار والتشغيل	المقاول	كان مخططاً بدء الاختبارات في 12-أكتوبر-2026 (الاتصالات) و18-أكتوبر-2026 (الري) و26-أكتوبر-2026 (إنارة الشوارع والجهد المتوسط). لم يبدأ أي منها، وتمتد تواريخ البدء المتوقعة من 12-نوفمبر-2026 إلى 04-يناير-2027.
شهادة عدم الممانعة لشبكة الجهد المتوسط	المقاول	شهادة عدم الممانعة من المالك لشبكة الجهد المتوسط لم تصدر بعد (P6: 27-يناير-2027، بفائض −257 يوماً).

المغلق في السجلات: المياه الجوفية ونزحها (مرتفع)، وتأخر أو فشل الاختبارات، والمشكلتان المسجلتان (نقطة توصيل الري، وخط الضخ لمحطة الرفع). وسُجلت وفورات إعادة قياس جدول الكميات كفرصة متحققة.

ملاحظات على البيانات

أُعدّ من رفع W06 (التقرير 95)، واستُخدم مجلد الأسبوع السابق (التقرير 94، الملف المحدّث) لحساب تغيرات هذا الأسبوع.

- لم تُحدَّث حقول التاريخ في الملف: لا تزال أوراق الغلاف والمعلومات العامة والجدول الزمني تُظهر تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026 والتقرير 94 وأسبوع العقد 93. أما اسم الملف وتحديث P6 والخطة قصيرة المدى وقائمة الأنشطة متعثرة البدء فبتاريخ 03-نوفمبر-2026، لذا يعتمد هذا التقرير 03-نوفمبر-2026 والأسبوع 94 (660 يوماً من تسليم الموقع في 12-يناير-2025).
- أساس التقدم: يحتفظ التقرير 95 بأساس أيام العمل في التقرير 94 المحدّث (65,420 يوم عمل)، ويعتمد هذا التقرير الأساس نفسه. ولا تصح مقارنة الأرقام بالتقرير 92 (ساعات العمل).
- إجمالي التقدم الفعلي في الغلاف (89.99% مخطط و74.16% مكتسب، ومؤشر أداء 0.82) غير متسق: إجمالي الكمية المخططة فيه 96,167 يوم عمل مقابل 65,420 في ورقة Progress. يعتمد هذا التقرير ورقة Progress (87.64% مخطط و78.71% مكتسب)، وهي الأرقام التي تُظهرها ورقة الملخص العربية أيضاً.
- يذكر التقرير 778 يوم عمل مكتسباً هذا الأسبوع، لكن الإجمالي التراكمي المكتسب لم يرتفع إلا بـ158 (من 51,333 إلى 51,491): انخفضت التوريدات من 12,670 إلى 12,485، والطرق من 10,205 إلى 9,798، وحُذف التجهيز (188). ويكتسب الاختبار والتشغيل مجدداً 561 يوم عمل دون قيمة مخططة ودون بدء أي اختبار.
- ثلاثة تواريخ انتهاء متعارضة: يذكر التقرير الأسبوعي وقائمة الأنشطة متعثرة البدء 29-سبتمبر-2027، وملف P6 20-نوفمبر-2027، ومستخلص P6 في ورقة Progress يُظهر التسليم في 07-فبراير-2028. ولا يزال مستخلص الجدول في ورقة المعالم يعرض برنامج 18-يناير-2027 من التقرير 94 المحدّث.
- غيّرت ورقة الملخص العربية إجمالياتها: أصبحت الطرق بالطن (55,631 طناً)، وزادت إجماليات السيول والصرف الصحي ومياه الشرب (مثلاً السيول من 18,554 إلى 24,720 م.ط)، وأُضيفت الاتصالات. ولم تتغير ورقة Major Quantities إلا في مواسير المياه قطر 200 مم (من 5,579 إلى 8,136 م) وأعمدة الإنارة (من 126 إلى 169)، بينما تذكر ورقة الأنشطة 100 م فقط من خط المياه هذا الأسبوع.
- لا يزال التوقع الفعلي في بيانات المنحنى يصل إلى 100% في يناير 2027، مقابل انتهاء P6 في نوفمبر 2027. وفي بيانات المنحنى يساوي الجهد المكتسب حتى سبتمبر الخطة المعدلة شهراً بشهر.
- ورقتا القوى العاملة والمستخلصات دون تغيير عن التقرير 94 (الخطة لكل مهنة مساوية للفعلي؛ وتوقع الشهر القادم 1,148). وساعات العمل هذا الأسبوع 12,000 بينما يُظهر "هذا الشهر" 6,000، ولا تزال ورقة تفتيش الصحة والسلامة تغطي الفترة من 26-أغسطس إلى 01-سبتمبر-2026.
- لا يزال سجل التوريدات يتضمن كميات أعلى من المطلوبة (مواسير GRP للصرف الصحي 400 مم SN5000 بكمية 1,138 من 261 م، ومواسير المياه 160 مم 214 من 73 م، وبطانة GRP قطر 1,900 مم 43 من 32 م) وأخطاء في الوحدات ("m132" و"m133").
- رمز المشروع في ملف P6 أصبح MOD3-J-2769-BL01-R01-1 (وكان MOD3-J-1 الأسبوع الماضي). ولا تزال ورقة الملخص تذكر تاريخ استلام الموقع 12-فبراير-2025 (12-يناير-2025 في التقرير الأسبوعي).
- تُظهر عدة حقول في الغلاف الخطأ !REF# (التكلفة المتوقعة عند الإنجاز، وأهم المشكلات)، ولا يزال سجل المستخلصات يحتوي على القيم الشاذة 21,100,000 و20,900,000.
- الصور: رُفعت أربع صور جديدة، أما بقية الملفات في المجلد فتكرر صور الأسابيع السابقة ولم يُعَد استخدامها. وتحمل صورتان ختم 04-نوفمبر-2026، أي بعد تاريخ البيانات بيوم.
