إستكمال شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة

Completion of the Infrastructure Development of the First Phase, Third Industrial City, Jeddah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	تاريخ الانتهاء المعدل
مدن	شركة الرواف للمقاولات	إيجيس (Egis)	شعيب الشعيبي	29-Jul-2024	26-Sep-2026

النطاق: شبكات الصرف الصحي وتصريف السيول (مع البحيرات والقنوات المفتوحة) والري ومياه الشرب، وتمديدات جهد 13.8 ك.ف، وإنارة الطرق، وتمديدات الاتصالات، والطرق الداخلية والخارجية بالأسفلت والأرصفة.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في 01-نوفمبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 99.18% مقابل 99.93% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 0.75% (مؤشر الأداء الزمني 0.99). وأُنجز هذا الأسبوع 0.13% (63 من 48,045 ساعة عمل، في الطرق الرئيسية والمنطقة Z05) مقابل 0.09% في الأسبوع السابق. وقد انقضى تاريخ الانتهاء المعدل 26-سبتمبر-2026.

نسبة الإنجاز الفعلي
99.2% / 99.9% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.99 −0.75%

التقدم هذا الأسبوع
+0.13% / 0.00% مخطط
63 ساعة عمل مكتسبة (42 في الأسبوع الماضي)، ولا يتبقى في الخطة تقدم مخطط لهذا الأسبوع

المدة المنقضية من العقد
105% · اليوم 825 من 789
▼ انتهاء P6: 22-ديسمبر-2026


المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
84.1% · 268.8 مليون ريال
25 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 26-سبتمبر-2026

انقضى تاريخ الانتهاء المعدل، وتأخر التوقعان مجدداً: يُنهي P6 المشروع الآن متأخراً 87 يوماً.

مُدّد تاريخ انتهاء العقد شهرين إلى 26-سبتمبر-2026 (أمر التغيير 2، المعتمد في 29-يونيو-2026). ويتوقع التقرير الأسبوعي الآن الانتهاء في 30-نوفمبر-2026، أي بتأخير 65 يوماً (15-نوفمبر-2026 في الأسبوع الماضي). ويُنهي تحديث البرنامج الزمني P6 بتاريخ 01-نوفمبر-2026 المشروع في 22-ديسمبر-2026 بفائض زمني كلي −87 يوماً، أي بعد أسبوع من تاريخ 15-ديسمبر-2026 (−80 يوماً) في التحديث السابق. وفي P6 لا تزال شبكة السيول تنتهي منطقةً بعد أخرى بين 16 و24 نوفمبر 2026 (Z11 وZ04 وZ05 وZ08)، وتنتهي جميع الأعمال بما فيها الاختبار والتشغيل في 24-نوفمبر-2026، واعتماد جميع مخططات حسب التنفيذ في 08-نوفمبر-2026.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، ونقطة 01-نوفمبر-2026 من ورقة Progress.

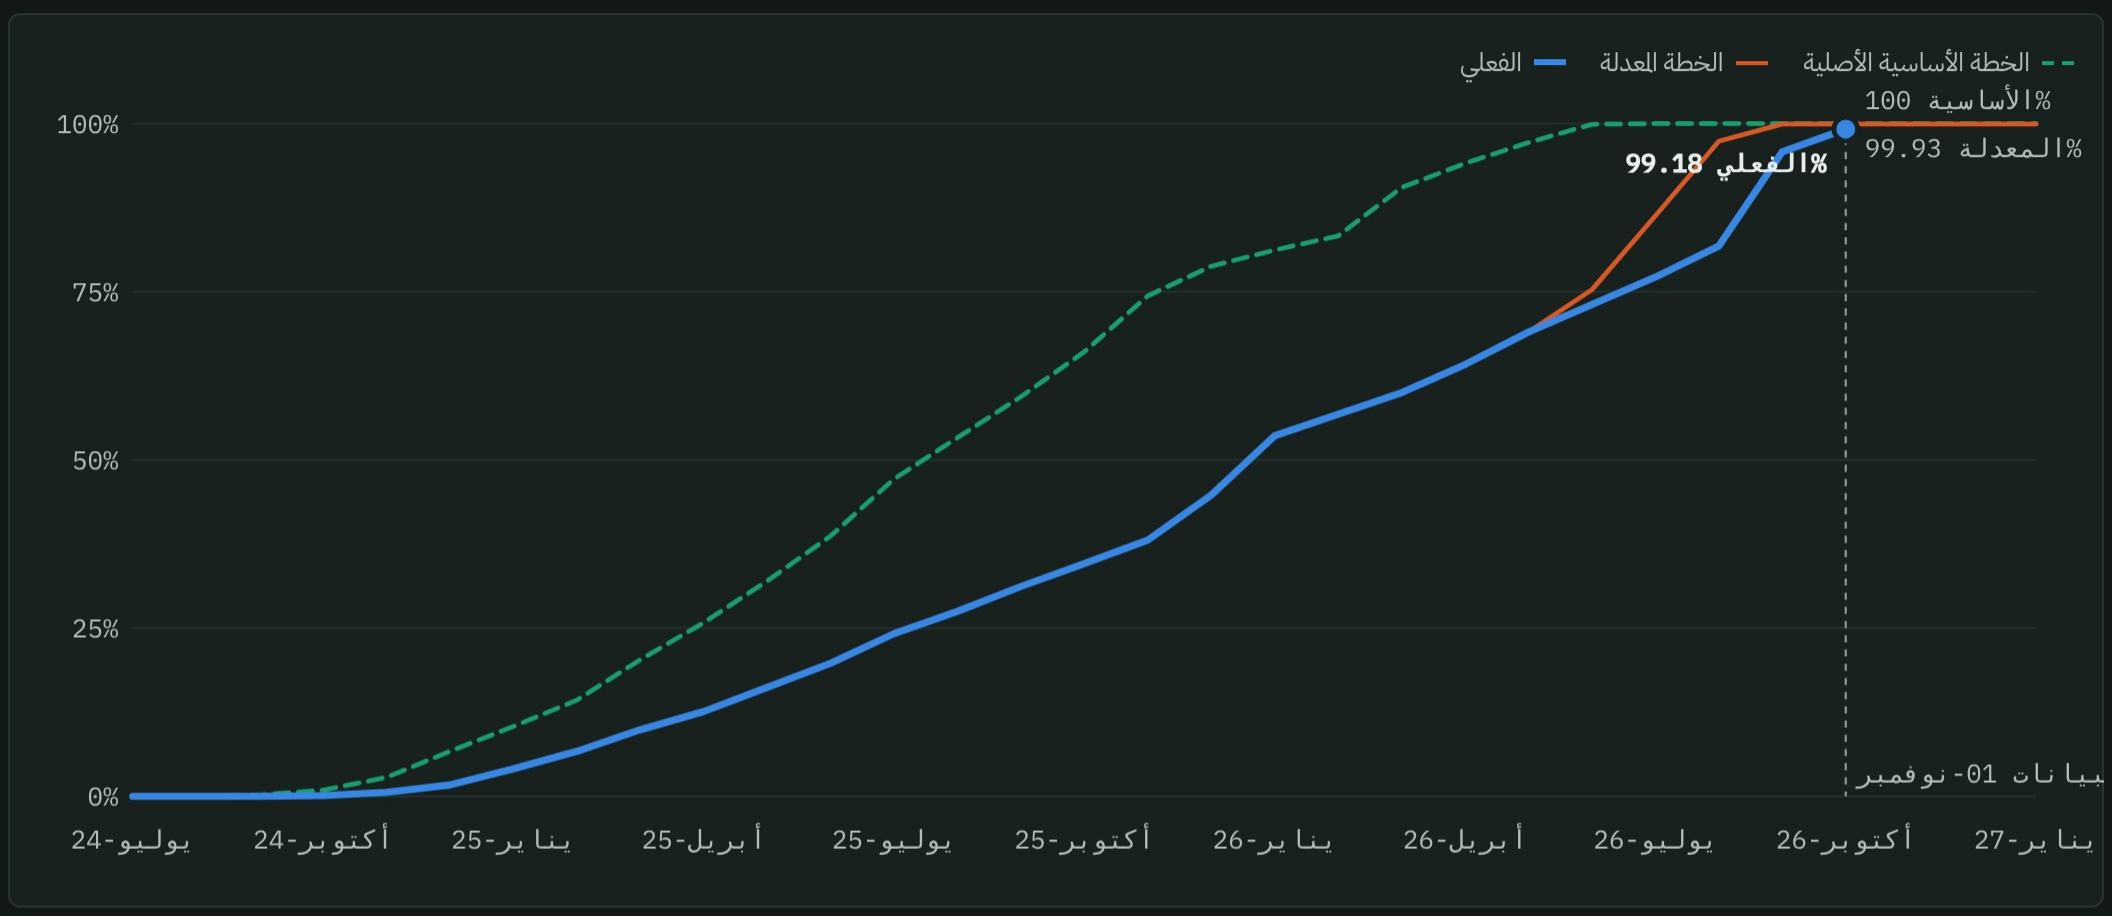

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
18-Oct-2026	99.93	98.96	−0.97	+0.05	0.99
25-Oct-2026	99.93	99.05	−0.88	+0.09	0.99
01-Nov-2026	**99.93**	**99.18**	**−0.75**	**+0.13**	**0.99**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقارير الأسبوعية بتاريخ 18 و25 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 (47,547 و47,589 و47,652 من 48,045 ساعة عمل مكتسبة). وصُحح هذا الأسبوع منحنى الفعلي في ورقة Physical-Chart Data: أصبح سبتمبر 95.8% بدلاً من 100%، وخُفّض يوليو وأغسطس كذلك. وتنتهي الخطة المعدلة عند 48,012 ساعة عمل (99.93%).

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب حزم أعمال التنفيذ، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (48,045 ساعة إجمالاً). لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات والإغلاق ساعات عمل، لذا لا توجد لها نسبة إنجاز فعلي.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
MR	36.5%	99.9%	99.8%	−0.1	1.00	▼ متأخر
البحيرات والقنوات العشبية	7.7%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z05	7.7%	100.0%	94.2%	−5.8	0.94	▼ متأخر
Z02-2	6.4%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z06	6.3%	100.0%	99.6%	−0.4	1.00	▼ متأخر
Z01	5.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z02-1	5.6%	99.4%	100.0%	+0.6	1.01	✓ مكتمل
Z07	5.6%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z07-1	4.3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z10	3.2%	100.0%	99.0%	−1.0	0.99	▼ متأخر
الأعمدة العالية (High Mast)	2.5%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z09	1.8%	99.8%	99.2%	−0.6	0.99	▼ متأخر

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
النطاق الجديد	1.3%	100.0%	96.4%	−3.6	0.96	▼ متأخر
Z13	1.1%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z02	1.0%	100.0%	96.7%	−3.3	0.97	▼ متأخر
Z03	0.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z08	0.7%	100.0%	87.3%	−12.7	0.87	▼ متأخر
Z04	0.7%	100.0%	92.0%	−8.0	0.92	▼ متأخر
Z11	0.7%	100.0%	99.7%	−0.3	1.00	▼ متأخر
ELDREES	0.3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
CCTV	0.0%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
الإجمالي	100%	**99.93%**	**99.18%**	**−0.75**	**0.99**	▼ متأخر

تحصي إحصاءات جدول P6 (تاريخ البيانات 01-نوفمبر-2026) عدد 9,236 نشاطاً: 9,036 مكتملاً و75 قيد التنفيذ و125 لم يبدأ، منها 50 نشاطاً متأخراً. ويُنهي تحديث P6 المشروع في 22-ديسمبر-2026 بفائض زمني كلي −87 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

كمية جدول الكميات المعدل والكمية المركّبة لكل شبكة، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 01-نوفمبر-2026. ويمثل عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير عن تقرير 25-أكتوبر-2026، ولم تتغير الورقة، لذا فهو 0 لجميع البنود. وجميع البنود المدرجة مُبلغ عنها بأنها مركّبة بنسبة 100%.

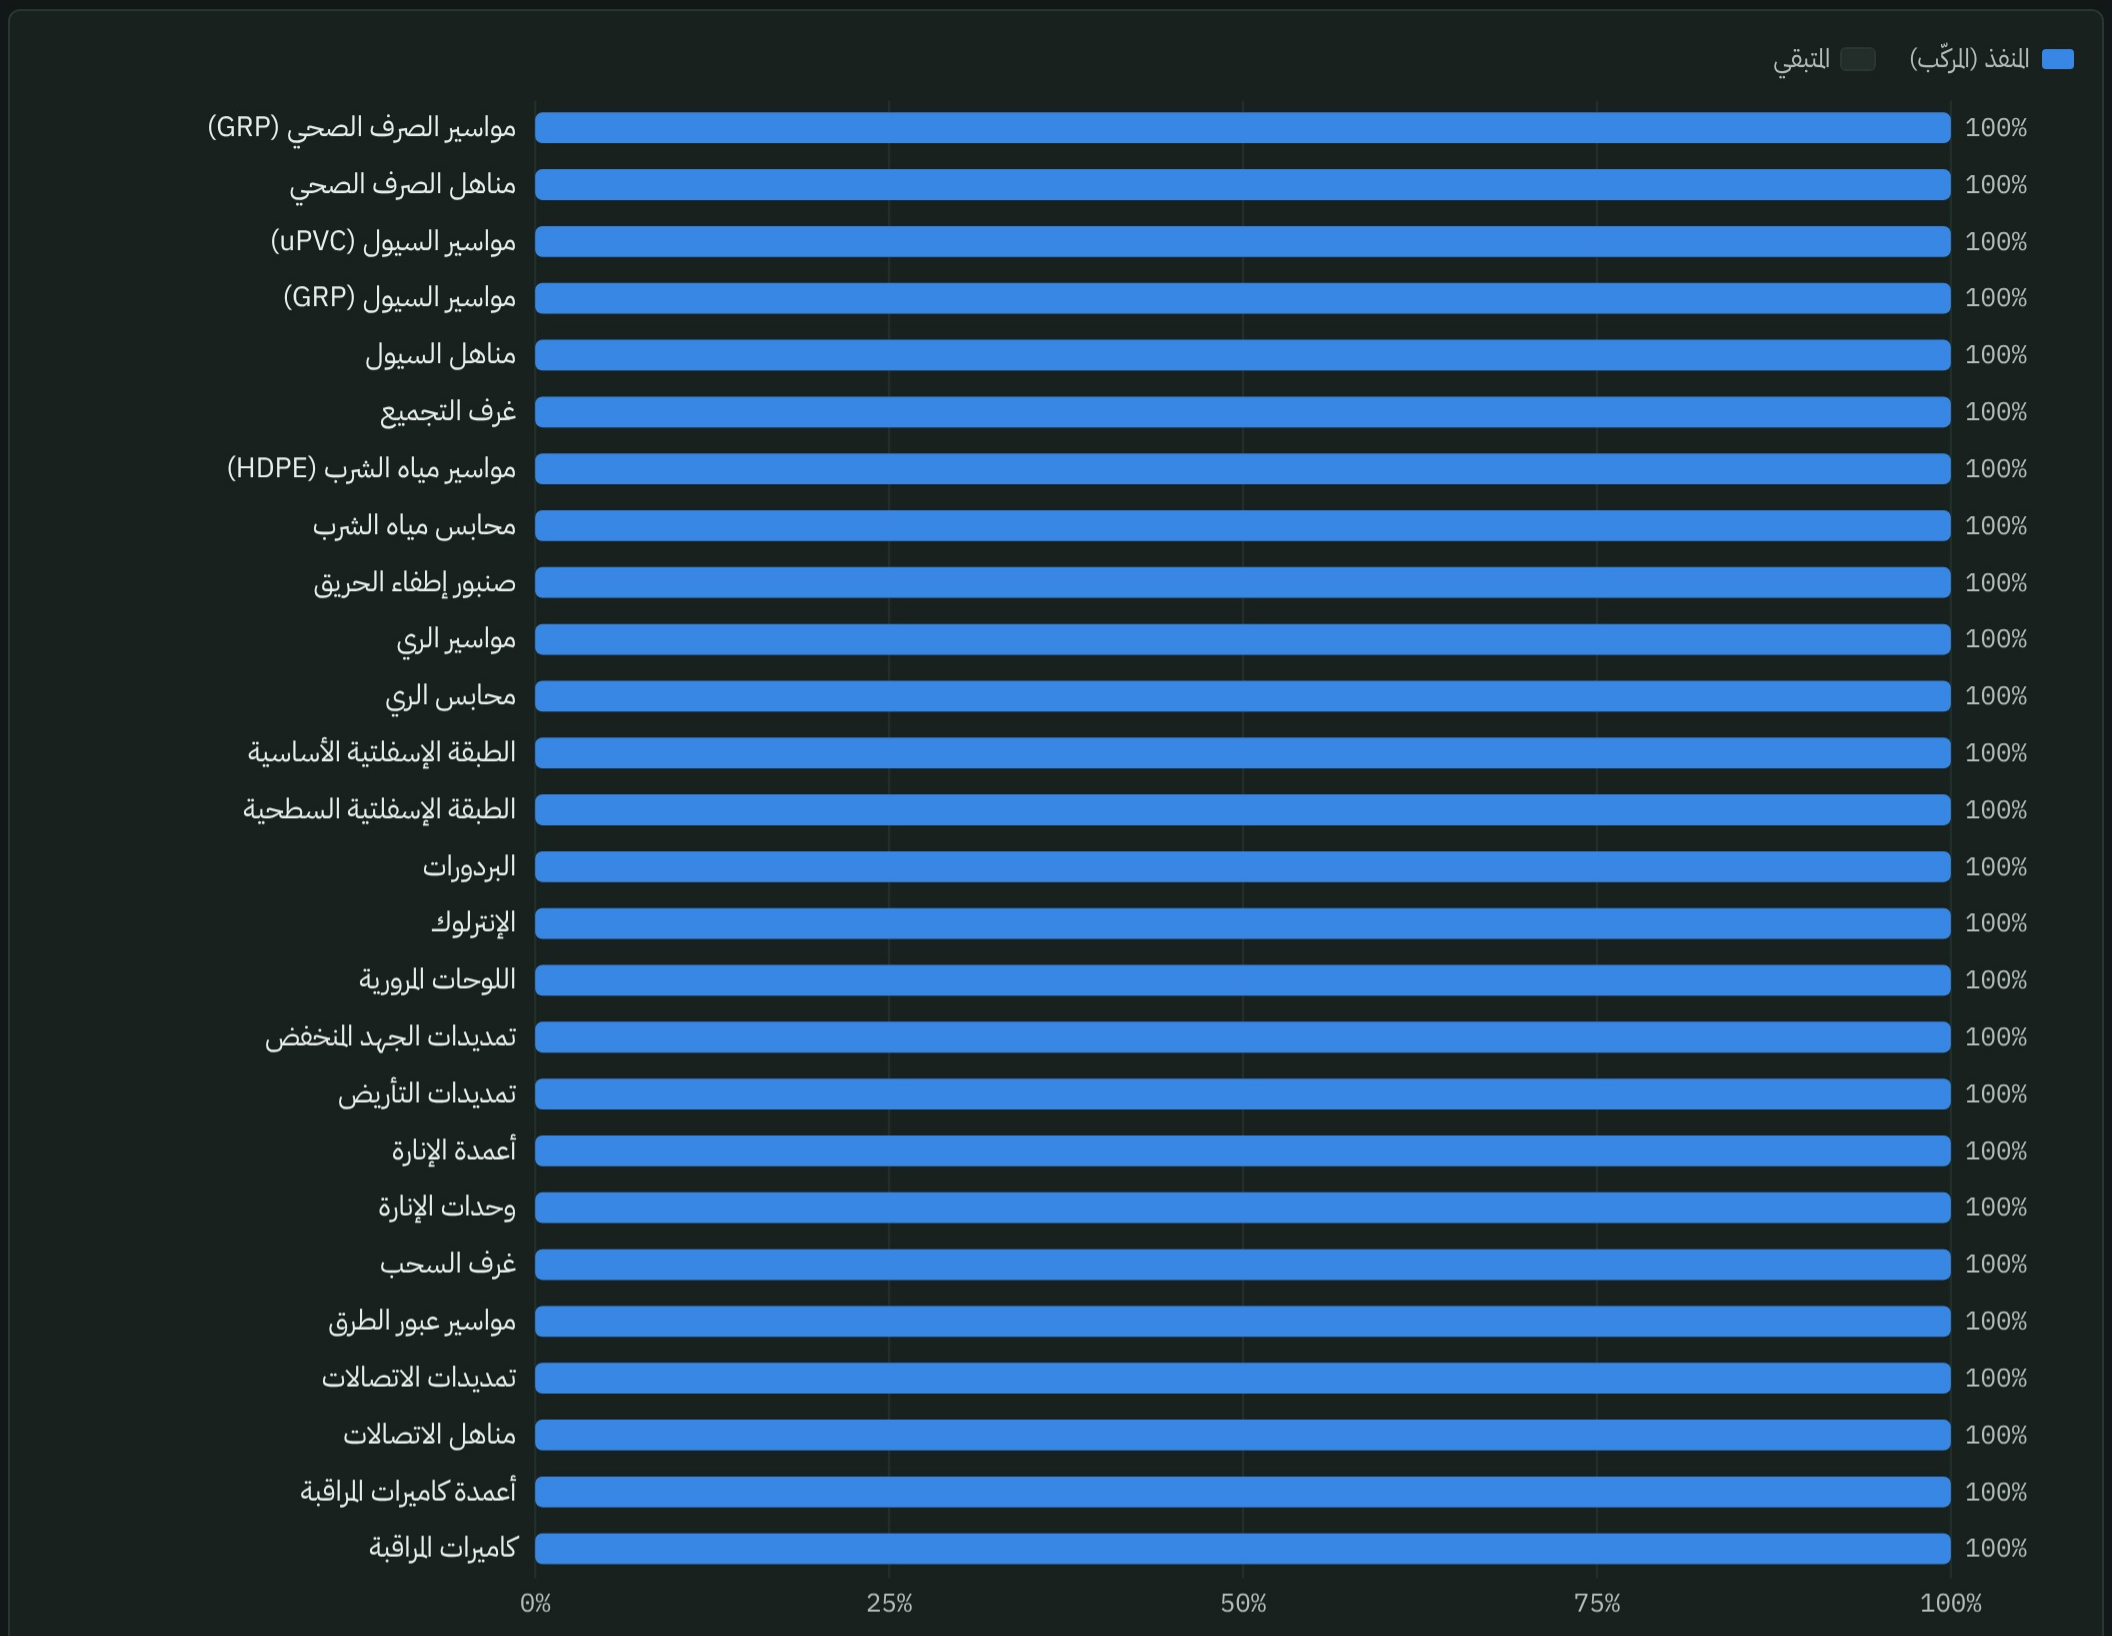

بند النطاق	المقاس / النوع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
مواسير الصرف الصحي (GRP)	DN 200	م.ط	21,379	21,379	0	0	100.0%	–
	DN 250	م.ط	4,579	4,579	0	0	100.0%	–
	DN 300	م.ط	204.6	204.6	0	0	100.0%	–
	DN 400	م.ط	531.9	531.9	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**26,695**	**26,695**	**0**	**0**	**100.0%**	–
مناهل الصرف الصحي	جميع المقاسات	عدد	355	355	0	0	100.0%	–
مواسير السيول (uPVC)	DN 300	م.ط	29,080	29,080	0	0	100.0%	–
مواسير السيول (GRP)	DN 400	م.ط	11,758	11,758	0	0	100.0%	–
	DN 500	م.ط	4,240	4,240	0	0	100.0%	–
	DN 600	م.ط	5,966	5,966	0	0	100.0%	–
	DN 700	م.ط	5,347	5,347	0	0	100.0%	–
	DN 800	م.ط	6,312	6,312	0	0	100.0%	–

بند النطاق	المقاس / النوع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
	DN 900	م.ط	7,736	7,736	0	0	100.0%	–
	DN 1000	م.ط	2,856	2,856	0	0	100.0%	–
	DN 1100	م.ط	1,771	1,771	0	0	100.0%	–
	DN 1200	م.ط	8,972	8,972	0	0	100.0%	–
	DN 1400	م.ط	425.4	425.4	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**55,383**	**55,383**	**0**	**0**	**100.0%**	–
مناهل السيول	DN 1200	عدد	203	203	0	0	100.0%	–
	DN 1500	عدد	418	418	0	0	100.0%	–
	DN 2000	عدد	219	219	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**840**	**840**	**0**	**0**	**100.0%**	–
غرف التجميع	مفردة	عدد	1,007	1,007	0	0	100.0%	–
	مزدوجة	عدد	761	761	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**1,768**	**1,768**	**0**	**0**	**100.0%**	–
مواسير مياه الشرب (HDPE)	DN 160	م.ط	8,045	8,045	0	0	100.0%	–
	DN 225	م.ط	2,000	2,000	0	0	100.0%	–
	DN 315	م.ط	215	215	0	0	100.0%	–
	DN 450	م.ط	1,890	1,890	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**12,150**	**12,150**	**0**	**0**	**100.0%**	–
محابس مياه الشرب	محابس بوابية	عدد	77	77	0	0	100.0%	–
	محابس فراشة	عدد	2	2	0	0	100.0%	–
	محابس غسيل	عدد	3	3	0	0	100.0%	–
	محابس هواء	عدد	1	1	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**83**	**83**	**0**	**0**	**100.0%**	–
صنبور إطفاء الحريق	ULFM 150	عدد	193	193	0	0	100.0%	–
مواسير الري	HDPE DN 125	م.ط	24,479	24,479	0	0	100.0%	–
	HDPE DN 250	م.ط	28,362	28,362	0	0	100.0%	–
	HDPE DN 315	م.ط	7,061	7,061	0	0	100.0%	–
	HDPE DN 450	م.ط	8,870	8,870	0	0	100.0%	–
	HDPE DN 630	م.ط	2,221	2,221	0	0	100.0%	–
	GRP DN 800	م.ط	1,340	1,340	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**72,333**	**72,333**	**0**	**0**	**100.0%**	–
محابس الري	محابس بوابية	عدد	455	455	0	0	100.0%	–
	محابس فراشة	عدد	61	61	0	0	100.0%	–
	محابس غسيل	عدد	29	29	0	0	100.0%	–
	محابس هواء	عدد	44	44	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**589**	**589**	**0**	**0**	**100.0%**	–
الطبقة الإسفلتية الأساسية	تدرج I	م³	1,735	1,735	0	0	100.0%	–
الطبقة الإسفلتية السطحية	تدرج I	م³	1,240	1,240	0	0	100.0%	–

بند النطاق	المقاس / النوع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
البردورات	نوع K1-D	م.ط	15,100	15,100	0	0	100.0%	–
	نوع L1	م.ط	1,972	1,972	0	0	100.0%	–
	منخفضة K2	م.ط	750	750	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**17,822**	**17,822**	**0**	**0**	**100.0%**	–
الإنترلوك	الكل	م²	1,576	1,576	0	0	100.0%	–
اللوحات المرورية	قائم مفرد	عدد	31	31	0	0	100.0%	–
	قائم مزدوج	عدد	4	4	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**35**	**35**	**0**	**0**	**100.0%**	–
تمديدات الجهد المنخفض	4C×6 mm²	م.ط	1,826	1,826	0	0	100.0%	–
	4C×10 mm²	م.ط	2,092	2,092	0	0	100.0%	–
	4C×16 mm²	م.ط	896	896	0	0	100.0%	–
	4C×25 mm²	م.ط	7,396	7,396	0	0	100.0%	–
	4C×35 mm²	م.ط	11,757	11,757	0	0	100.0%	–
	4C×50 mm²	م.ط	120	120	0	0	100.0%	–
	4C×150 mm²	م.ط	1,500	1,500	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**25,587**	**25,587**	**0**	**0**	**100.0%**	–
تمديدات التأريض	6 mm²	م.ط	4,208	4,208	0	0	100.0%	–
	16 mm²	م.ط	20,049	20,049	0	0	100.0%	–
	70 mm²	م.ط	2,700	2,700	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**26,957**	**26,957**	**0**	**0**	**100.0%**	–
أعمدة الإنارة	12 م، ذراعان	عدد	10	10	0	0	100.0%	–
	12 م، ذراع واحد	عدد	220	220	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**230**	**230**	**0**	**0**	**100.0%**	–
وحدات الإنارة	LED 150 W	عدد	240	240	0	0	100.0%	–
	LED 342 W	عدد	88	88	0	0	100.0%	–
	LED 208 W	عدد	102	102	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**430**	**430**	**0**	**0**	**100.0%**	–
غرف السحب	600×600	عدد	783	783	0	0	100.0%	–
	900×900	عدد	151	151	0	0	100.0%	–
	1800×900	عدد	18	18	0	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**952**	**952**	**0**	**0**	**100.0%**	–
مواسير عبور الطرق	UPVC 160 مم	م.ط	1,116	1,116	0	0	100.0%	–
تمديدات الاتصالات	6 مسارات، 50 مم	م.ط	8,100	8,100	0	0	100.0%	–
مناهل الاتصالات	نوع 1	عدد	90	90	0	0	100.0%	–
أعمدة كاميرات المراقبة	الكل	عدد	18	18	0	0	100.0%	–
كاميرات المراقبة	الكل	عدد	82	82	0	0	100.0%	–

الكميات المعدلة لأعمال الطرق أقل بكثير من جدول الكميات الأصلي

يجعل جدول الكميات المعدل، الذي لا يزال "قيد المراجعة"، كل إجمالي مساوياً للكمية المركّبة. وفي أعمال الطرق يمثل جزءاً صغيراً من جدول الكميات الأصلي: الطبقة الإسفلتية السطحية 1,240 من 63,689 م³، والبردورات مسبقة الصب K1-D بطول 15,100 من 187,209 م، والبردورات L1 بطول 1,972 من 123,805 م، والإنترلوك 1,576 من 59,537 م².

الورقة تتعارض مع قائمة الأنشطة المتبقية

لا يزال تحديث P6 بتاريخ 01-نوفمبر-2026 يُبقي شبكة السيول مفتوحة في المناطق Z04 وZ05 وZ08 وZ11 (تنتهي بين 16 و24 نوفمبر 2026)، وتنتهي الطرق الرئيسية والمنطقة Z02 في 5 و7 نوفمبر 2026. وأظهرت قائمة الأنشطة المتبقية في الأسبوع الماضي خطوط غرف تجميع من مواسير uPVC قطر 300 مم وGRP قطر 400 مم لم تُمدّ بعد في هذه المناطق. لذا فإن الكميات أعلاه تبالغ في تقدير ما تم تركيبه.

أعمال الجهد المتوسط عُدّلت إلى صفر

تمديدات جهد 13.8 ك.ف (30,720 م في جدول الكميات الأصلي) ووصلاتها ونهاياتها، ومجاري التمديدات بطول 950 م، ووحدات RMU للفتح العادي، والمحطات الفرعية الثلاث للإنارة ووحداتها، جميعها كميتها المعدلة 0، لذا لم تُدرج في الجدول.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتقرير الأسبوعي من ورقة Milestones، وتوقعات P6 والفائض الزمني الكلي من ملف تحديث البرنامج الزمني P6 (XER، تاريخ البيانات 01-نوفمبر-2026، يوم عمل من 10 ساعات). ويختلف المصدران، لذا يُعرض كلاهما.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	29-Jul-2024	29-Jul-2024 (فعلي)	29-Jul-2024 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	03-Sep-2024	26-Oct-2024 (فعلي)	11-Dec-2024 (فعلي)	–	✓ منجز
مسح الوضع القائم والتقارير النهائية	07-Sep-2025	23-Jul-2025 (فعلي)	01-Nov-2026	−31	؟ يتعارض مع P6
اكتمال الأعمال الميكانيكية	01-Oct-2025	27-Jun-2026	05-Nov-2026	−34	▼ متأخر
اكتمال تركيب الهياكل المعدنية	02-Jul-2026	25-Feb-2026	01-Nov-2026	−31	▼ متأخر
اكتمال الأعمال الترابية	07-Jul-2026	02-Jul-2026	01-Nov-2026	−31	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال المدنية	07-Jul-2026	02-Jul-2026	01-Nov-2026	−31	▼ متأخر
اكتمال إخلاء الموقع	23-Jul-2026	20-Jul-2026	01-Nov-2026	−31	▼ متأخر
إنهاء البردورات ورصف الطرق	28-Jun-2026	–	01-Nov-2026	−31	▼ متأخر
إنهاء شبكات المياه (الشرب والمعالجة)	12-Sep-2026	–	02-Nov-2026	−31	▼ متأخر
اعتماد جميع مخططات حسب التنفيذ	–	–	08-Nov-2026	−37	▼ متأخر
إنهاء شبكات الصرف الصحي والسيول والكهرباء	26-Sep-2026	–	24-Nov-2026	−51	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	28-Jul-2026	28-Jul-2026	24-Nov-2026	−51	▼ متأخر
التنفيذ (P6)	26-Sep-2026	–	24-Nov-2026	−59	▼ متأخر
الإغلاق (P6)	26-Sep-2026	–	22-Dec-2026	−75	▼ متأخر
انتهاء المشروع	26-Sep-2026 (الأصلي 28-يوليو-2026)	30-Nov-2026 (+65 يوماً)	22-Dec-2026	−87	▼ متأخر

يفصل بين توقعي الانتهاء 22 يوماً، وستة معالم متوقعة في تاريخ البيانات نفسه.

يتوقع التقرير الأسبوعي الانتهاء في 30-نوفمبر-2026، بينما ينتهي تحديث P6 في 22-ديسمبر-2026. وستة معالم، منها الأعمال الترابية والأعمال المدنية وإخلاء الموقع والبردورات، متوقعة في 01-نوفمبر-2026 وهو تاريخ البيانات: أي أنها لم تكتمل وتُرحَّل مع كل تحديث (كانت متوقعة في الأسبوع الماضي بين 25 و28 أكتوبر 2026). ولا تزال ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي تعطي تواريخ متوقعة بين فبراير ويوليو 2026.

توريد المواد الرئيسية

الكمية المورّدة مقابل كمية جدول الكميات المعدل. المصدر: ورقة Major Quantities، التقرير الأسبوعي 18- أكتوبر-2026.

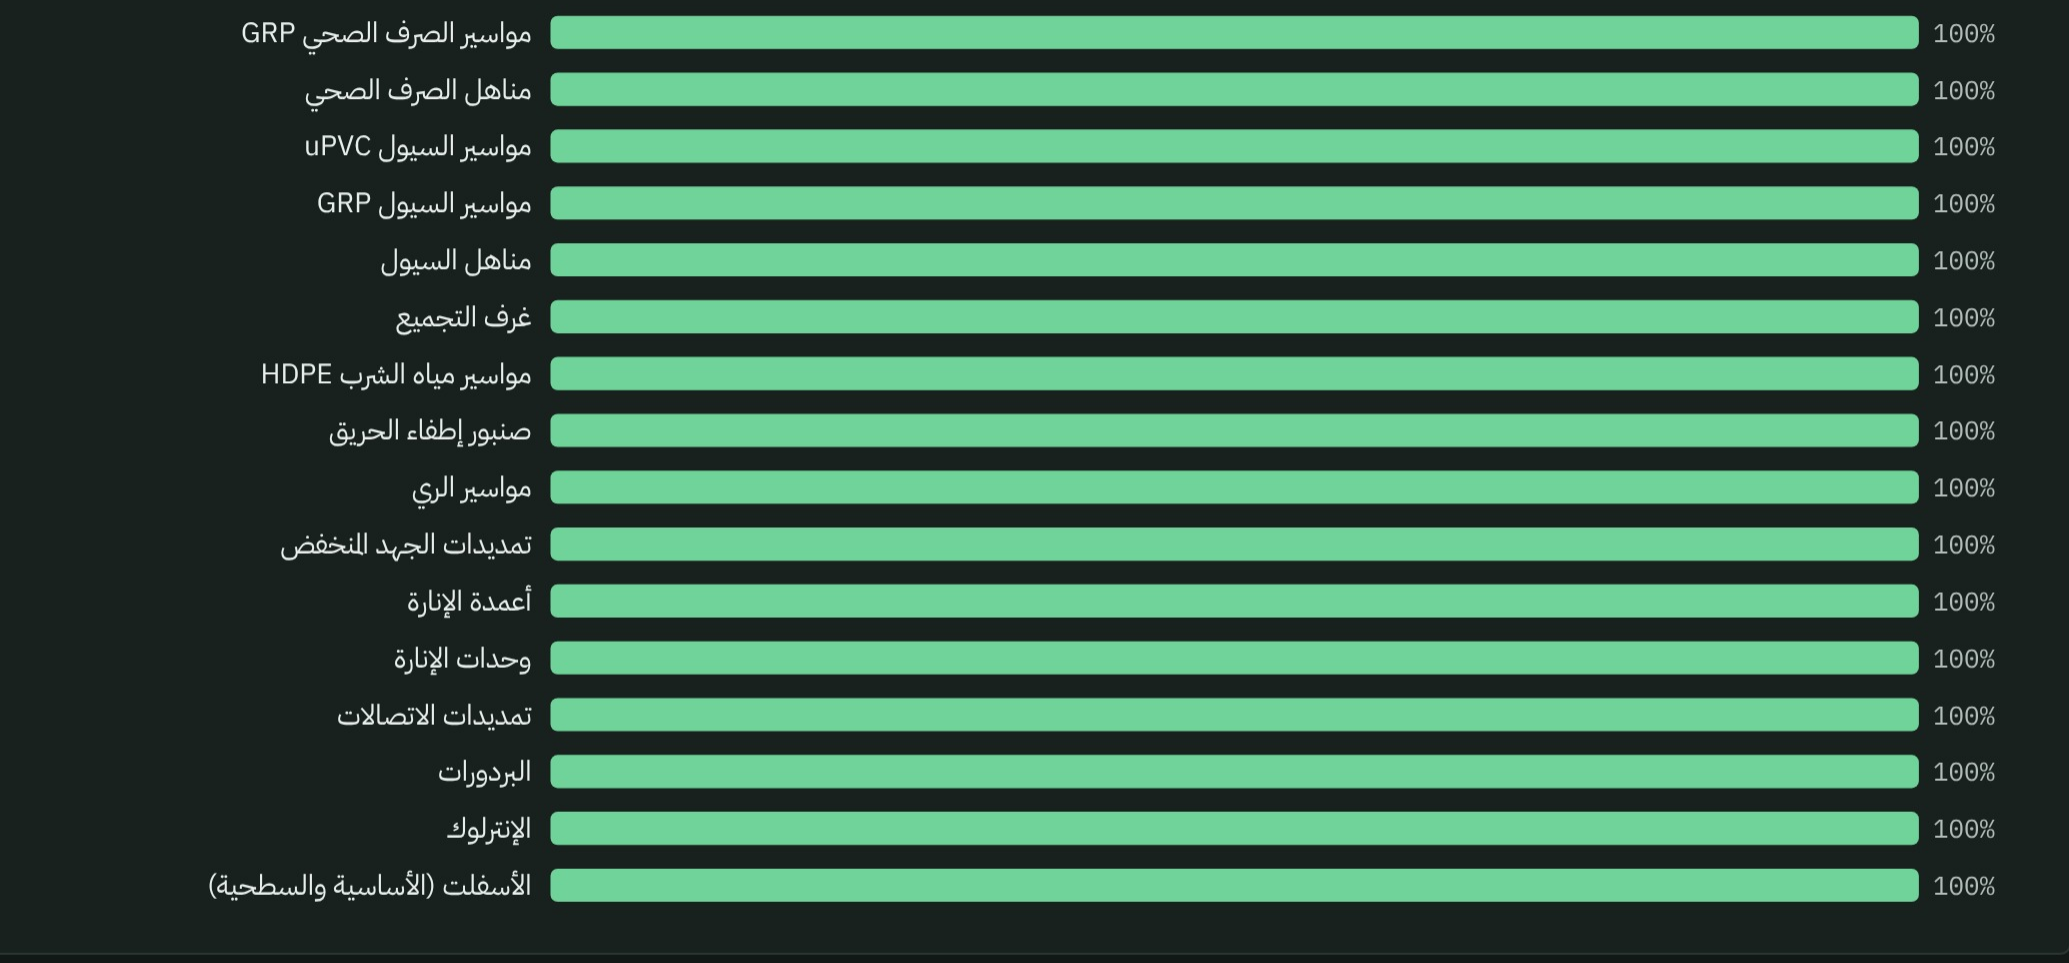

التوريدات مكتملة مقابل الكميات المعدلة


جميع المواد في ورقة Major Quantities مورّدة ومركّبة بنسبة 100% مقابل كمياتها المعدلة. ولا يزال ملخص التوريدات يُظهر إصدار 12 من 20 أمر شراء، ويتبقى 8، و10 مواد في الموقع.

ورقة التوريدات غير محدّثة

لا تزال ورقة التوريدات التفصيلية، المخفية في الملف، تعرض نسب توريد من مرحلة سابقة، مثل البردورات 4.8% والإنترلوك 6.9% وصنبور إطفاء الحريق 79%. وتسعة من بنودها الـ42 موسومة "سيتم حذفها من النطاق".

القوى العاملة

عدد العمالة اليدوية الشهري، المخطط مقابل الفعلي، من أغسطس 2024 إلى يناير 2026، آخر شهر يتوفر فيه رقم فعلي. المصدر: ورقة Manpower.

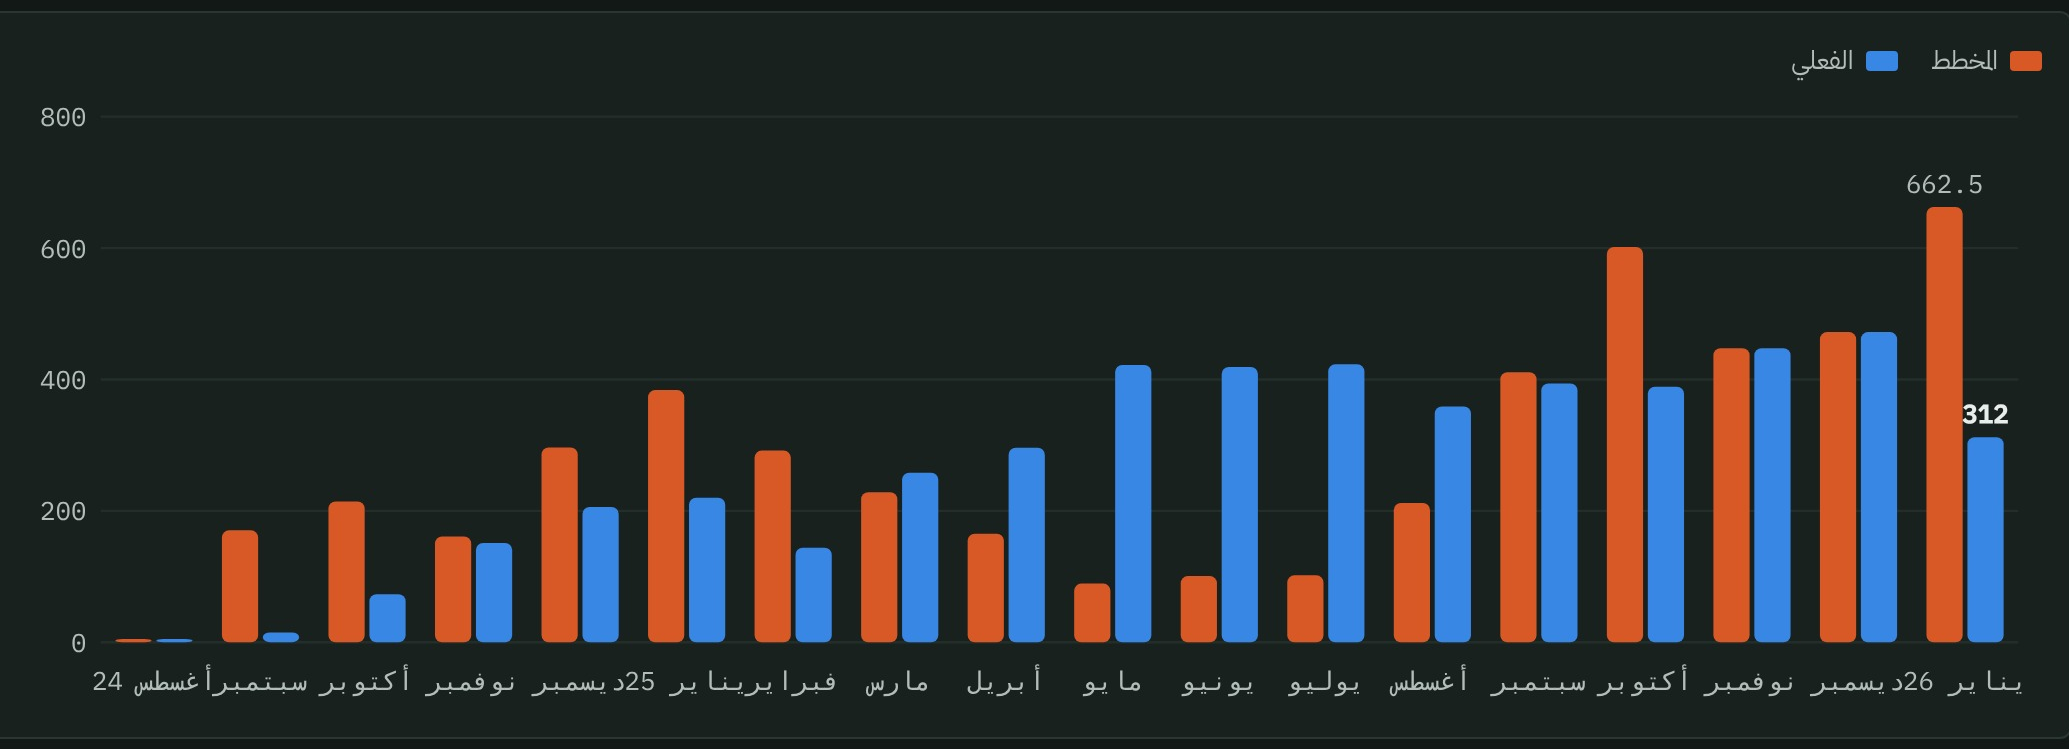

يناير 2026: 312 مقابل 662.5 مخططاً. والأرقام الفعلية لنوفمبر وديسمبر 2025 مطابقة تماماً للقيم المخططة. ولشهر أكتوبر 2026 تذكر لوحة الموارد 1,092 عاملاً و92 موظفاً للأسبوع الثالث على التوالي دون خطة للشهر. ويذكر التوزيع حسب المهنة 389 عاملاً مقابل 602 مخططاً. المعدات في الموقع: 135 مقابل 167 مخططة، منها 3 متوقفة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

شبكة تصريف السيول والأمطار	161,546,482
الطرق والرصف والعلامات الأرضية واللوحات	67,012,837
شبكة المياه المعالجة (الري)	49,057,170
شبكة الصرف الصناعي	19,706,041
الأعمال الكهربائية	13,120,144
شبكة مياه الشرب	9,302,202
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**319,744,876**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	367,706,607
أوامر التغيير	2 (دون تكلفة)

جميع القيم بالريال. أمر التغيير 1 (جدول الكميات المعدل، المعتمد في 23-يوليو-2025) وأمر التغيير 2 (تمديد المدة شهرين، المعتمد في 29-يونيو-2026) لا يغيران قيمة العقد.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	25
القيمة الإجمالية	268,762,557
استرداد الدفعة المقدمة	26,876,256
الخصومات والغرامات	260,000
المحتجزات	0
الصافي شاملاً الضريبة	277,909,247
المعتمد من مدير المشروع (24 مستخلصاً)	258,711,628
المدفوع (المسجل)	0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	278,910,229

المفوتر 84.1% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 99.18%. وقُدّم المستخلص #25 (للفترة حتى 26-سبتمبر-2026، بقيمة إجمالية 18,548,424) واعتمده الاستشاري في 01-نوفمبر-2026. ولا يسجل السجل أي دفعات.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.86

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	2,383,300
ساعات العمل هذا الأسبوع	15,300
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة (تراكمي)	11
حوادث المركبات (تراكمي)	1
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	227 / 3,410

تفتيش السلامة في الموقع بتاريخ 01-نوفمبر-2026. هذا الأسبوع: 10 اجتماعات توعية و3 تدريبات داخلية.

الجودة التقييم 0.91

تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / مفتوحة	148 / 138 / 10
تعليمات الموقع: صادرة / مفتوحة	187 / 1
طلبات فحص المواد: صادرة / مفتوحة	357 / 2
طلبات الفحص الميداني: صادرة / معلقة	32,177 / 791
طلبات الاستيضاح: صادرة / مغلقة	239 / 239
المخططات التنفيذية: مقدمة / الإجمالي	2,532 / 2,551
اعتمادات المواد المعلقة	35 من 78
مخططات حسب التنفيذ: مقدمة / معتمدة (A) / الإجمالي	655 / 530 / 980

تفتيش مراقبة الجودة 01-نوفمبر-2026. صدر هذا الأسبوع 8 تقارير عدم مطابقة وأُغلق 9، وارتفعت طلبات الفحص الميداني المعلقة من 435 إلى 791. وأرقام مخططات حسب التنفيذ من متتبعها بتاريخ 25-أكتوبر-2026، ولم يُرفع متتبع أحدث.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
مخططات حسب التنفيذ	مدن	مخططات حسب التنفيذ لا تطابق الوضع في الموقع، لذا تحتاج مناطق الربط إلى حفر لتحديد الخدمات.
المقاطع العرضية لممرات الخدمات	مدن	المقطع العرضي في وثائق العقد لا يطابق الموقع، ويحتاج كل طريق إلى مقطع عرضي معتمد خاص به.
مصنع داخل منطقة العمل	مدن	يقع أحد المصانع داخل منطقة العمل، لذا يجب إعادة توزيع الشبكات في هذه الطرق. ولم يصل رد رسمي من الاستشاري بعد.
الخطوط القائمة تغيّر النطاق	مدن	الخطوط القائمة التي كشفها المسح تغيّر توزيع الشبكات وتقلل النطاق، كما حدث في شبكتي الصرف الصناعي والمياه.
خطوط الجهد المتوسط القائمة	مدن	خطوط الجهد المتوسط القائمة تغيّر النطاق، ولم تُسلَّم بيانات حسب التنفيذ للجهد المتوسط إلى المقاول.
العبارة الصندوقية، المنطقة 01	المقاول	خدمات قائمة أكثر من المتوقع، ويستمر العمل ببطء وحذر.
العبارة الصندوقية، المنطقة 06	مدن	يتعارض الحفر مع أحد المصانع ومدخله.

جميع البنود المفتوحة في سجل المشكلات سُجلت بين سبتمبر وديسمبر 2024 ولا تزال موسومة نشطة، ولا يتضمن السجل أي إدخالات أحدث. وغير مدرج في السجل: كانت نسبة اعتماد مخططات حسب التنفيذ 54% (530 من 980) في 25-أكتوبر-2026، بينما يخطط P6 الآن لاعتمادها جميعاً بحلول 08-نوفمبر-2026 (−37 يوماً).

ملاحظات على البيانات

- رقم الأسبوع: تذكر ورقة Milestones أسبوع العقد 118 ("118 of 103") وقد اعتُمد. ويؤكد ذلك أيضاً الرقم 117 المستخدم لتقرير الأسبوع الماضي حين كانت الخانة تُظهر خطأ.
- ورقة Major Quantities لم تتغير منذ 18-أكتوبر-2026 وتُظهر جميع البنود مركّبة بنسبة 100%، بينما لا يزال تحديث P6 يُبقي شبكة السيول مفتوحة في أربع مناطق حتى 16 إلى 24 نوفمبر 2026.
- صُححت ورقة Physical-Chart Data هذا الأسبوع: أصبح التقدم الفعلي في نهاية يوليو وأغسطس وسبتمبر 77.2% و81.8% و95.8% (بدلاً من 79.3% و85.1% و100%). وتحسب الورقة النسب الآن على أساس 48,012 ساعة عمل (99.25% لشهر أكتوبر)، بينما يعتمد هذا التقرير إجمالي 48,045 ساعة في ورقة Progress (99.18%).
- نقل التقرير الأسبوعي توقع الانتهاء من 15 نوفمبر إلى 30-نوفمبر-2026، بينما يعطي P6 تاريخ 22-ديسمبر-2026. وستة معالم في P6 متوقعة في تاريخ البيانات، ويذكر التقرير الأسبوعي أن مسح الوضع القائم انتهى في يوليو 2025 بينما لا يزال مفتوحاً في P6.
- يُظهر ملف Progress Tracking Sheet (.xlsb) تركيب 19,242 من 38,652 م من مواسير غرف التجميع، و959 من 1,902 غرفة تجميع، و25,494 من 27,859 م من مواسير الصرف الصحي، ومستهدفاته لشهر يناير 2026. وهو يتعارض مع التقرير الأسبوعي ومع P6 ويبدو قديماً، لذا لم يُستخدم.
- لا توجد صور موقع هذا الأسبوع: الصور الوحيدة هي صور يونيو 2025 في ورقة Weekly Photos المخفية، وملفات PDF تحتوي على مخططات فقط. ولا تزال ملفات Progress Layouts مؤرخة 09-أغسطس-2026، وملفات As-Built Progress Layouts خرائط ملونة دون أعداد، ومتتبع التوريدات مؤرخ 23-أغسطس-2026.
- القوى العاملة: يتكرر عدد العمالة لشهر أكتوبر (1,092 عاملاً و92 موظفاً) للأسبوع الثالث ولا يطابق التوزيع حسب المهنة (389)، وتتوقف الأرقام الفعلية الشهرية عند يناير 2026.
- يُظهر ملخص المستخلصات 0 مستخلصات مقدمة بينما يدرج السجل 25 مستخلصاً. ولا تزال ورقة Testing تُظهر 0% لجميع الأنظمة، بينما يُظهر P6 أعمال الاختبار والتشغيل قيد التنفيذ.
- يعرض الملف أيضاً تقدماً مبنياً على التكلفة ويسميه مخططاً وفعلياً. ويعتمد هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي (بعدد ساعات العمل المخططة) فقط.
