# مشروع تطوير المرحلة الأولى الجزء الثاني بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام

## Development of Phase One – Part Two, Third Industrial City in Dammam

| المالك | المقاول | الاستشاري | مدير المشروع - مدن | تسليم الموقع | انتهاء العقد |
|---|---|---|---|---|---|
| مدن | مفرح الحربي وشركاه | إيجيس (EGIS) | إيهاب محمد عطية | 19-May-2025 | 18-May-2027 |

النطاق: الطرق الشريانية والمحلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والإنارة والاتصالات، ومحطات ضخ الصرف الصحي وبرك تجميع مياه الأمطار للمرحلة الأولى الجزء الثاني بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

---

## ملخص تقدم المشروع

تقاس نسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 77.6% مقابل 96.6% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 19.0%. تقدم المشروع هذا الأسبوع بنسبة 0.22% مقابل 0.12% مخطط، أي أعلى قليلاً من الخطة الأسبوعية، لكنه أقل بكثير من المعدل اللازم للانتهاء في الموعد.

| نسبة الإنجاز الفعلي | التقدم هذا الأسبوع | المدة المنقضية من العقد | المفوتر حتى تاريخه (إجمالي) |
|---|---|---|---|
| **77.6%** / 96.6% مخطط | **+0.22%** / +0.12% مخطط | **73.2%** · اليوم 534 من 730 | **15.9%** · 37.3 مليون ريال |
| ▼ مؤشر الأداء الزمني 0.80 | ▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.10% | ▼ انتهاء P6: 27-أكتوبر-2027 | 12 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 15-يوليو-2026 |
| −19.0% | | | |

**يُنهي تحديث البرنامج الزمني P6 المشروع الآن متأخراً 162 يوماً.**

يحدد تحديث P6 المرفوع هذا الأسبوع (تاريخ البيانات 31-أكتوبر-2026) انتهاء المشروع في 27-أكتوبر-2027، أي بعد 162 يوماً من تاريخ الانتهاء التعاقدي 18-مايو-2027، بفائض سالب قدره −162 يوماً، بينما لا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع 18-مايو-2027. وللانتهاء في الموعد التعاقدي تتطلب النسبة المتبقية 22.4% نحو 0.80% أسبوعياً خلال الأسابيع الثمانية والعشرين الكاملة المتبقية، بينما تحقق هذا الأسبوع 0.22%. ولا تزال أضعف المناطق شبكات المنطقة 3 (67.0% مقابل 98.2% مخطط)، وشبكات الصرف الصحي في المنطقتين 1 و3، وعبارات قطع الطرق.

# صور الموقع هذا الأسبوع

ست لوحات صور مرفوعة مع تقرير هذا الأسبوع، مؤرخة من المقاول بين 25 و28 أكتوبر 2026. تركزت الأعمال على اختبار خطوط المياه والمحابس وصنبور إطفاء الحريق، واختبار Mandrel لتمديدات الاتصالات، وتمديدات محطات الرفع، وضبط مناسيب أغطية تجميع مياه الأمطار. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.




**اختبار الضغط الهيدروستاتيكي**

اختبار الضغط لخطوط المياه. المنطقة 3، الشارع 25، 25-أكتوبر-2026.




**محبس على خط مياه الشرب**

لحام الوصلات وتركيب محبس لاستكمال الاختبار الهيدروستاتيكي. المنطقة 2، الشارع 13، 27-أكتوبر-2026.





**تركيب صنبور إطفاء الحريق**

المنطقة 2، الشارع 9، 28-أكتوبر-2026.




**اختبار Mandrel لتمديدات الاتصالات**

التحقق من خلو تمديدات الاتصالات من الانسدادات والتشوهات. المنطقتان 1 و2، 26-أكتوبر-2026.

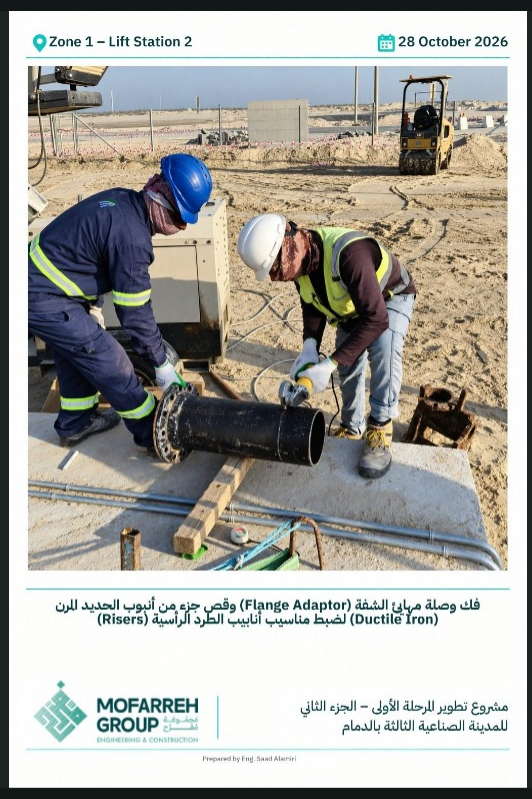


**تمديدات محطة الرفع**

فك وصلة الشفة وقص جزء من ماسورة الحديد المرن لضبط مناسيب الأنابيب الرأسية. المنطقة 1، محطة الرفع 2، 28-أكتوبر-2026.





**مناسيب أغطية تجميع مياه الأمطار**

تكسير الخرسانة المحيطة بالأغطية الشبكية لغرف تجميع مياه الأمطار لضبط مناسيبها. المنطقة 2، الشارع 11، 25-أكتوبر-2026.

## منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، وفعلي أكتوبر ونوفمبر من التقارير الأسبوعية.

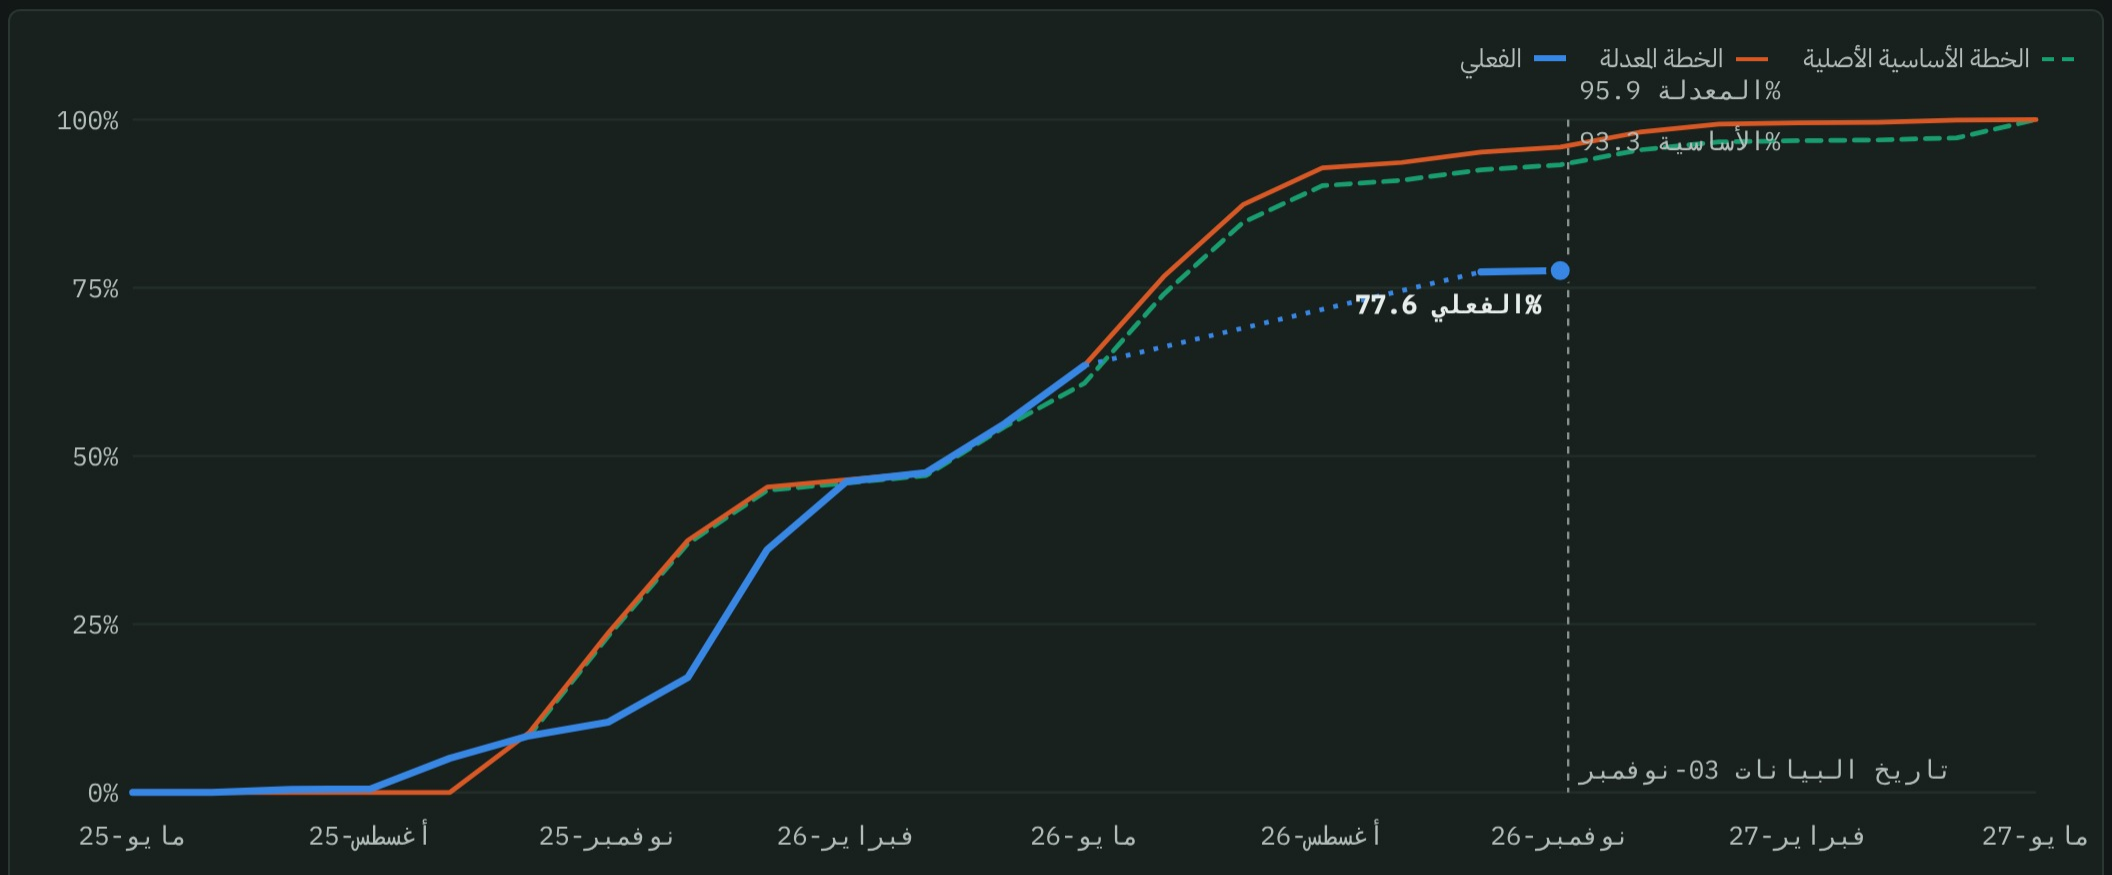


| نهاية الأسبوع | المخطط % | الفعلي % | الانحراف | المنجز خلال الأسبوع | مؤشر الأداء |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-Oct-2026 | 96.5 | 77.4 | -19.1% | +0.07% | 0.80 |
| **03-Nov-2026** | **96.6** | **77.6** | **-19.0%** | **+0.22%** | **0.80** |

رُفع تقريران أسبوعيان (27-أكتوبر و03-نوفمبر). لا تتضمن ورقة المنحنى قيماً فعلية شهرية موثوقة إلا حتى مايو 2026، ويصل الخط المنقط بين مايو والقيمتين الأسبوعيتين لأكتوبر (77.4%) ونوفمبر (77.6%). النسبة المخططة في التقرير الأسبوعي 96.6% أعلى من الخطة الأساسية (93.3%) ومن الخطة المعدلة (95.9%) لشهر نوفمبر.

## التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب المنطقة والشبكة، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات ساعات عمل، فلا يوجد لها قياس فعلي.

| المرحلة | الوزن | المخطط | الفعلي | الانحراف | مؤشر الأداء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **المنطقة 1** | 42.1% | **96.0%** | **82.0%** | **-14.0%** | **0.85** | ▼ متأخر |
| شبكة الصرف الصحي | 7.0% | 92.2% | 59.5% | -32.7% | 0.65 | ▼ متأخر |
| شبكة تصريف السيول | 4.4% | 100.0% | 81.5% | -18.5% | 0.81 | ▼ متأخر |
| شبكة مياه الشرب | 3.1% | 100.0% | 94.9% | -5.1% | 0.95 | ▼ متأخر |
| شبكة الري | 2.1% | 100.0% | 96.8% | -3.2% | 0.97 | ▲ في المسار |
| برك تجميع مياه الأمطار | 24.3% | 96.3% | 89.9% | -6.4% | 0.93 | ▼ متأخر |
| عبارات قطع الطرق | 1.3% | 80.7% | 0.0% | -80.7% | 0.00 | ▼ لم يبدأ |
| **المنطقة 2** | 20.0% | **99.8%** | **83.7%** | **-16.1%** | **0.84** | ▼ متأخر |
| شبكة الصرف الصحي | 3.9% | 100.0% | 81.4% | -18.6% | 0.81 | ▼ متأخر |
| شبكة تصريف السيول | 4.4% | 100.0% | 77.6% | -22.4% | 0.78 | ▼ متأخر |
| شبكة مياه الشرب | 0.8% | 100.0% | 88.1% | -12.0% | 0.88 | ▼ متأخر |
| شبكة الري | 2.7% | 100.0% | 96.3% | -3.7% | 0.96 | ▲ في المسار |
| برك تجميع مياه الأمطار | 6.9% | 99.5% | 98.9% | -0.6% | 0.99 | ▲ في المسار |
| عبارات قطع الطرق | 1.3% | 100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.00 | ▼ لم يبدأ |
| **المنطقة 3** | 31.5% | **98.2%** | **67.0%** | **-31.2%** | **0.68** | ▼ متأخر |
| شبكة الصرف الصحي | 7.6% | 93.0% | 49.6% | -43.4% | 0.53 | ▼ متأخر |
| شبكة تصريف السيول | 5.3% | 100.0% | 71.3% | -28.7% | 0.71 | ▼ متأخر |
| شبكة مياه الشرب | 6.1% | 100.0% | 45.2% | -54.8% | 0.45 | ▼ متأخر |
| شبكة الري | 0.8% | 100.0% | 90.4% | -9.6% | 0.90 | ▼ متأخر |
| برك تجميع مياه الأمطار | 11.0% | 99.7% | 89.3% | -10.4% | 0.90 | ▼ متأخر |
| عبارات قطع الطرق | 0.6% | 100.0% | 31.8% | -68.2% | 0.32 | ▼ متأخر |
| **أعمال عامة** | 6.4% | **62.3%** | **58.0%** | **-4.3%** | **0.93** | ▼ متأخر |
| الطرق المحلية * | 0.4% | 6.9% | 33.1% | +26.3% | 4.83 | ▲ متقدم |
| الطرق الشريانية * | 0.4% | 100.0% | 17.4% | -82.6% | 0.17 | ▼ متأخر |
| الاتصالات * | 3.8% | 82.1% | 93.0% | +10.9% | 1.13 | ▲ متقدم |
| تنسيق المواقع | 1.9% | 26.3% | 0.0% | -26.3% | 0.00 | ▼ لم يبدأ |
| **الإجمالي** | 100% | **96.6%** | **77.6%** | **-19.0%** | **0.80** | ▼ متأخر |

المخطط والفعلي من ورقة Weekly Progress Report. * تستخدم المنطقة 3 والطرق المحلية والطرق الشريانية والاتصالات ساعات العمل الفعلية التراكمية من مستخرج P6 في ورقة Progress، لأن صفوف الملخص الخاصة بها غير متسقة (انظر ملاحظات على البيانات). يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 31-أكتوبر-2026) 1,255 نشاطاً: 488 مكتملاً و416 قيد التنفيذ و351 لم تبدأ.

## نطاق العمل: الكميات

الكميات ضمن نطاق مجموعة الحربي (MG) من العرض الأسبوعي بتاريخ 03-نوفمبر-2026: مواسير الشبكات من شريحة كميات الشبكات، والمناهل والمحابس وصنبور إطفاء الحريق والإنارة من شريحة نطاق التقدم. عمود "هذا الأسبوع" هو التغير منذ عرض 27-أكتوبر-2026.

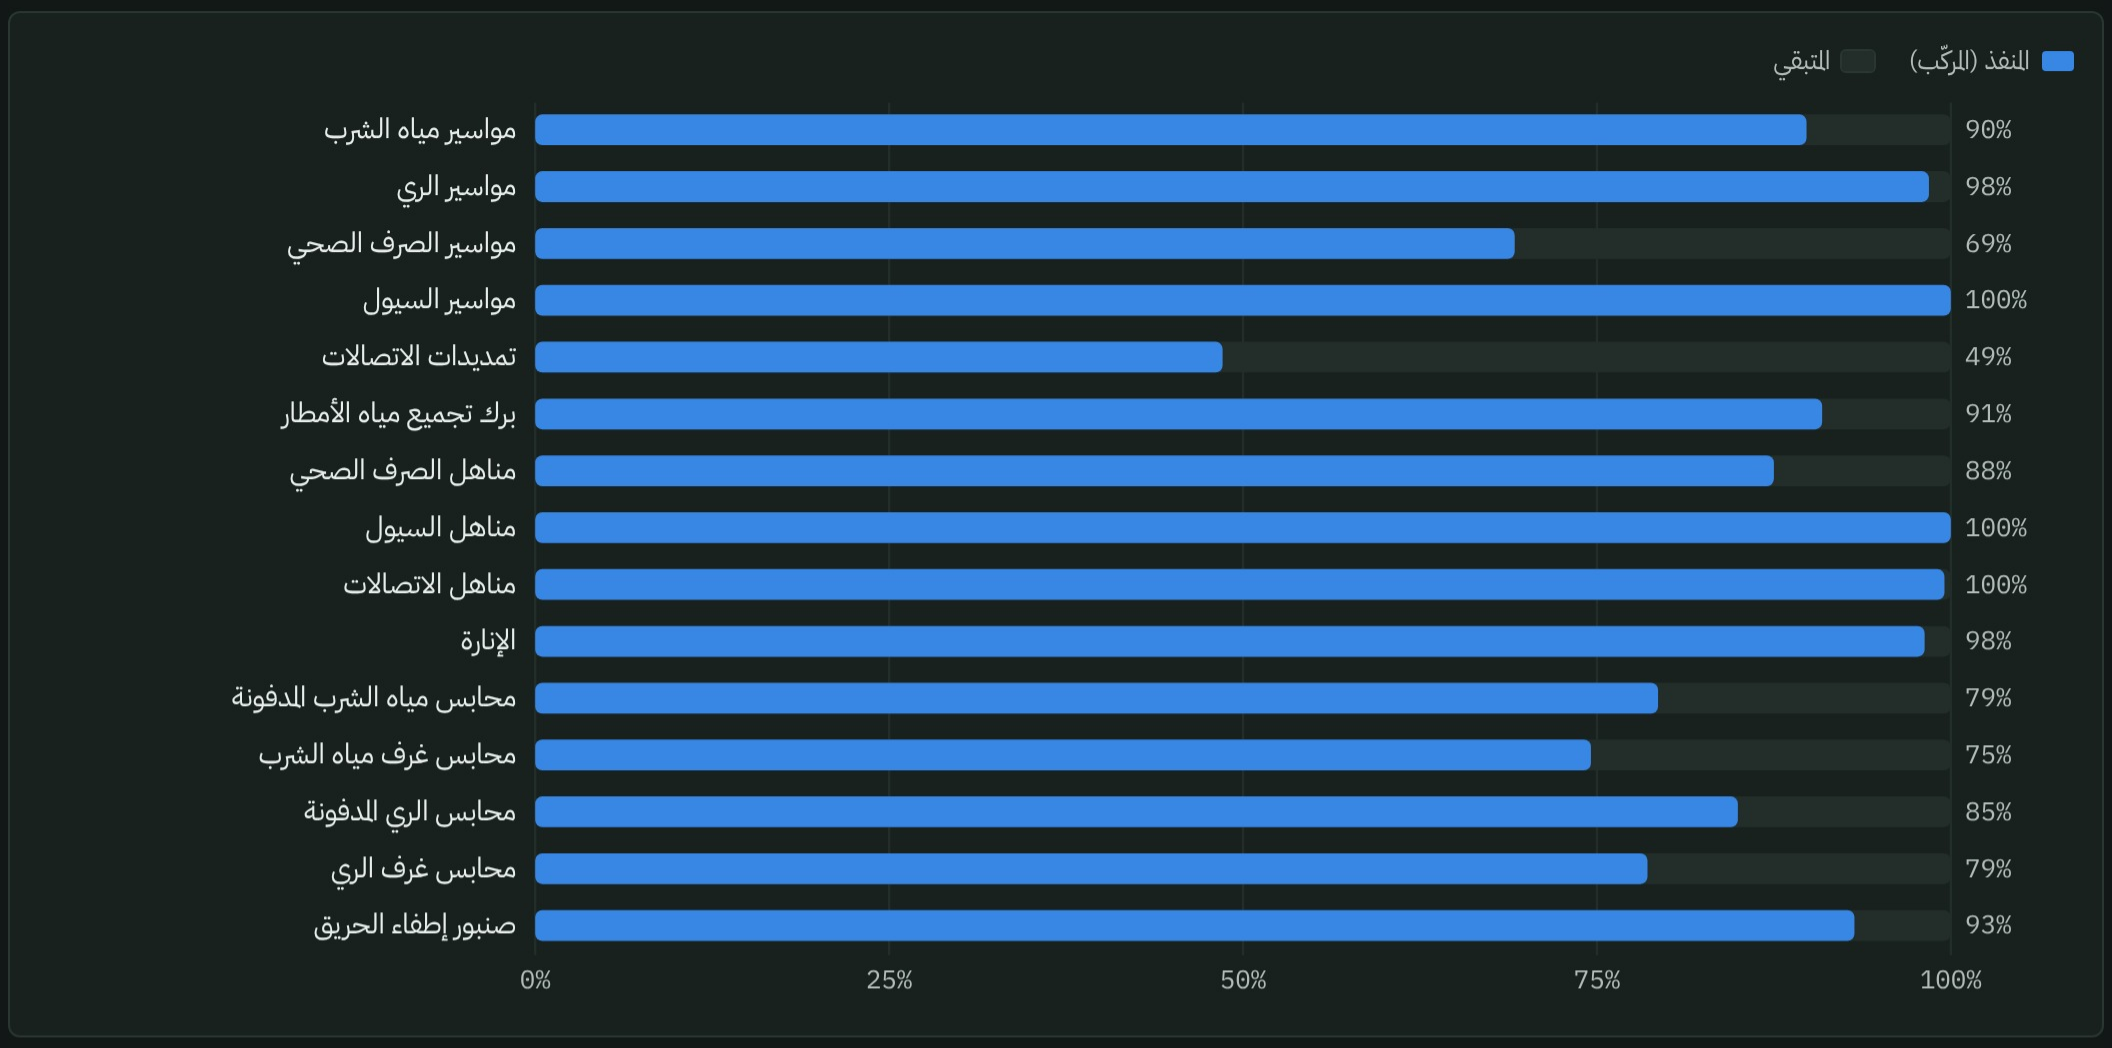


| بند النطاق | المنطقة | الوحدة | الإجمالي | المنفذ | المنفذ هذا الأسبوع | المتبقي | % المنفذ | الردم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **مواسير مياه الشرب** | جميع المناطق | م | 2,992 | 2,687 | 0 | 305 | 89.8% | – |
| **مواسير الري** | جميع المناطق | م | 4,911 | 4,835 | 0 | 76 | 98.5% | – |
| **مواسير الصرف الصحي** | جميع المناطق | م | 396 | 274 | 0 | 122 | 69.2% | – |
| **مواسير السيول** | جميع المناطق | م | 42,616 | 42,616 | 0 | 0 | 100.0% | – |
| **تمديدات الاتصالات** | جميع المناطق | م | 64,321 | 31,233 | 0 | 33,088 | 48.6% | – |
| **برك تجميع مياه الأمطار** | جميع المناطق | عدد | 11 | 10 | 0 | 1 | 90.9% | – |
| **مناهل الصرف الصحي** | جميع المناطق | عدد | 104 | 91 | 1+ | 13 | 87.5% | – |
| **مناهل السيول** | جميع المناطق | عدد | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.0% | – |
| **مناهل الاتصالات** | جميع المناطق | عدد | 444 | 442 | 0 | 2 | 99.5% | – |
| **الإنارة** | جميع المناطق | الوحدة غير محددة | 54 | 53 | 0 | 1 | 98.1% | – |
| **محابس مياه الشرب المدفونة** | جميع المناطق | عدد | 440 | 349 | 0 | 91 | 79.3% | – |
| **محابس غرف مياه الشرب** | جميع المناطق | عدد | 59 | 44 | 0 | 15 | 74.6% | – |
| **محابس الري المدفونة** | جميع المناطق | عدد | 884 | 751 | 3+ | 133 | 85.0% | – |
| **محابس غرف الري** | جميع المناطق | عدد | 70 | 55 | 0 | 15 | 78.6% | – |
| **صنبور إطفاء الحريق** | جميع المناطق | عدد | 279 | 260 | 9+ | 19 | 93.2% | – |

### الاتصالات والصرف الصحي أكبر الكميات المتبقية

لم تُضف أي أطوال من مواسير الشبكات هذا الأسبوع: لا تزال تمديدات الاتصالات منفذة بنسبة 49% (31,233 من 64,321 م) ومواسير الصرف الصحي 69% (274 من 396 م). وارتفع طول الاتصالات المسلَّم إلى الاستشاري من 6,705 م إلى 11,175 م، كما سُلّم 2,184 م من مياه الشرب و2,998 م من الري، ولم يُسلَّم شيء من الصرف الصحي أو السيول بعد.

### شبكات المقاول السابق

أعاد الحربي اختبار 74,073 م من المياه و77,912 م من الري و38,914 م من الصرف الصحي من نطاق المقاول السابق، لكن لم يُسلَّم إلى الاستشاري سوى 8,588 م و3,442 م و9,343 م على التوالي. ولا يزال 31,676 م من شبكة السيول و5,516 م من الاتصالات بانتظار الاختبار.

## المعالم الرئيسية

يُبقي التقرير الأسبوعي جميع التوقعات على تواريخ الخطة الأساسية، بينما يُظهر تحديث P6 تأخر المعالم المرحلية للشبكات وتاريخ الانتهاء. نعرض الاثنين لمعالجة الفرق مع المقاول.

| المعلم | الخطة الأساسية | توقع التقرير الأسبوعي | توقع تحديث P6 | الفائض في P6 (أيام) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| تسليم الموقع | 19-May-2025 | 19-May-2025 | 19-May-2025 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| تجهيزات الموقع | 18-Jun-2025 | 18-Jun-2025 | 17-Jun-2025 (فعلي) | – | ✓ منجز |
| تقديم التقرير وخطة العمل والبرنامج الزمني | 18-Jul-2025 | 18-Jul-2025 | 31-Oct-2026 | +200 | ؟ مفتوح في P6 |
| اعتماد المخططات والمواصفات | 18-Jul-2025 | 18-Jul-2025 | 05-Nov-2026 | −189 | ؟ مفتوح في P6 |
| إنجاز شبكات المياه والخزانات | 18-Jan-2026 | 18-Jan-2026 | 20-Jan-2027 | −20 | ▼ متأخر |
| إنجاز أعمال تصريف مياه الأمطار | 18-Jan-2026 | 18-Jan-2026 | 31-Dec-2026 | −158 | ▼ متأخر |
| إنجاز جميع خدمات المشروع | 18-May-2027 | 18-May-2027 | 19-Oct-2027 | −154 | ▼ متأخر |
| التسليم النهائي | 18-May-2027 | 18-May-2027 | 27-Oct-2027 | −162 | ▼ متأخر |

**يفصل 162 يوماً بين تحديث P6 والتقرير الأسبوعي في تاريخ الانتهاء.**

يُنهي تحديث P6 لهذا الأسبوع (1,255 نشاطاً، تاريخ البيانات 31-أكتوبر-2026) ومستخرج P6 في ملف التقرير الأسبوعي المشروعَ في 27-أكتوبر-2027. أما الملف المرفوع الأسبوع الماضي فكان جدولاً معدلاً مختلفاً من 136 نشاطاً ينتهي في 12-يونيو-2027، فلا تصح المقارنة المباشرة بين تواريخ الأسبوعين. ويتوقع التقرير الأسبوعي 18-مايو-2027 دون تأخير. وأصبح معلما المياه والأمطار (18-يناير-2026) متوقعين في 20-يناير-2027 و31-ديسمبر-2026.

## توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من إجمالي الكمية للمواد طويلة التوريد. المصدر: العرض الأسبوعي 03-نوفمبر-2026، شريحة المواد طويلة التوريد.




**المضخات: توريد 2 من 15**


يجري تركيب ملحقات مضخات Grundfos في المحطات، لكن لم يصل سوى مضختين بسبب مشاكل الشحن العالمية (ذكر عرض الأسبوع الماضي 3). ولا يُتوقع توريد لوحة تحكم محطة المياه (IGEC، مجموعة واحدة) ولوحات محطات الصرف (وامكو، 4 مجموعات) كاملةً قبل يناير 2027، وأصبح الموعد المستهدف لنظام التحكم 28-يناير-2027.

**المولدات وخزانات المطرقة المائية**

وصل المولدان (كوهلر – أبونيان) إلى المملكة وينتظران اختباري القبول في المصنع والموقع قبل توريدهما إلى الموقع. ويُتوقع الآن بدء توريد خزانات المطرقة المائية (7) نحو 05-نوفمبر-2026 بدلاً من 15-أكتوبر-2026. ولم يحدد مورد VEGA تاريخ التوريد. وأمر صيانة مضخات المياه (SPP) بانتظار قطع الغيار.

## القوى العاملة

عدد القوى العاملة الشهري في الموقع (الموظفون والعمالة)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

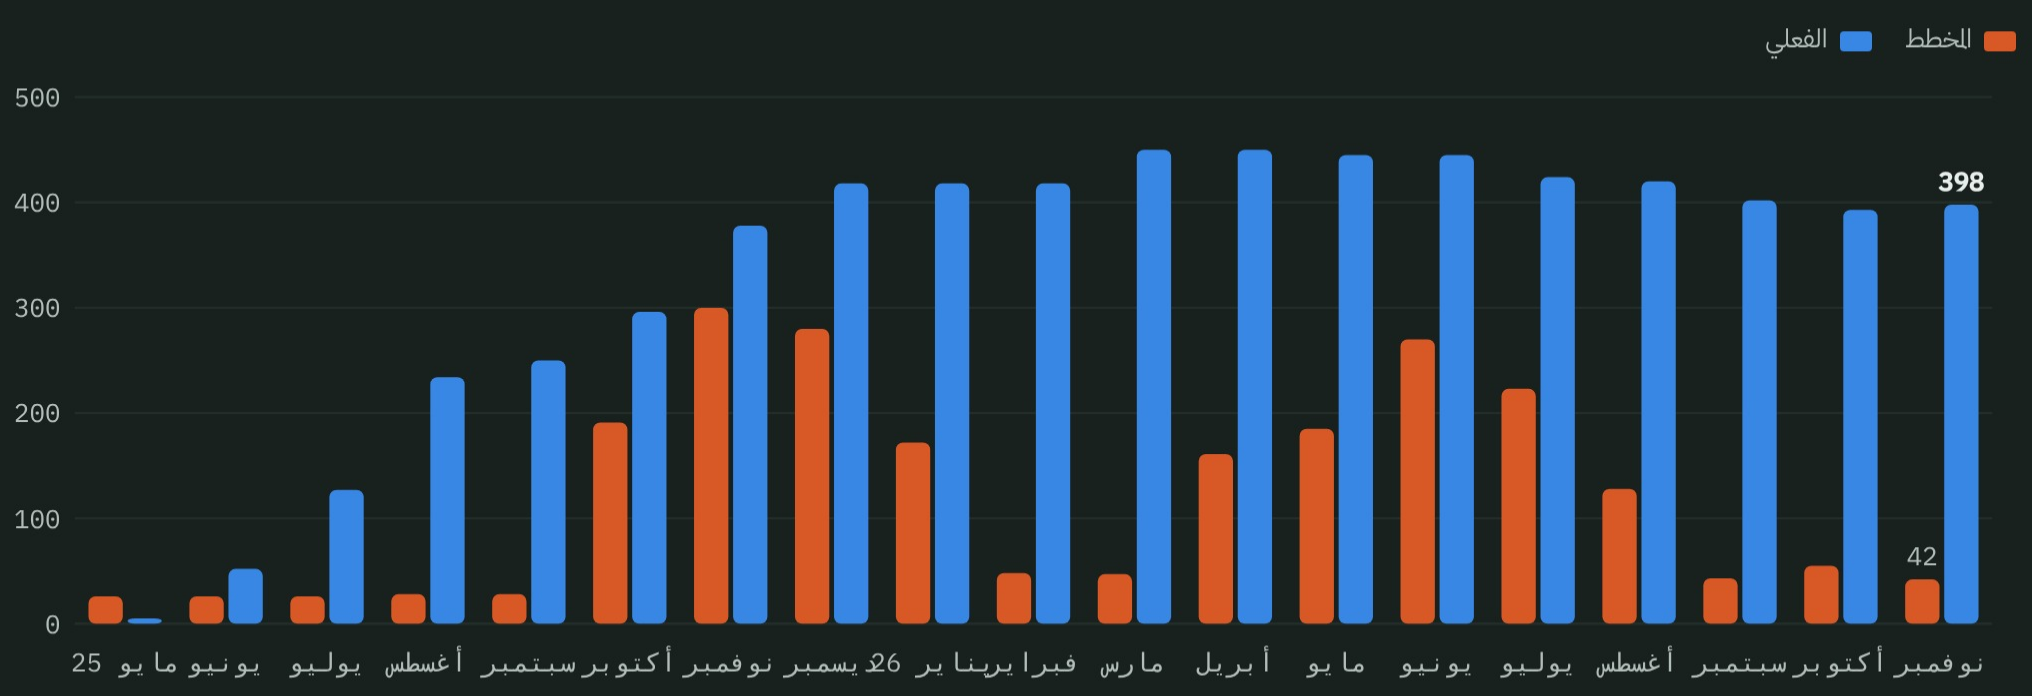


بلغ عدد القوى العاملة في نوفمبر 398 (66 موظفاً و332 عاملاً) مقابل 42 مخططاً. الخطة مأخوذة من تحميل الموارد في برنامج P6 وهي أقل بكثير من الأعداد الفعلية في الموقع، فلا تصلح مرجعاً للمقارنة. انخفضت العمالة من 397 في مارس وأبريل إلى 332، ويذكر سجل المشكلات ضعف القوى العاملة والإنتاجية سبباً للتأخير.

## التكلفة والمستخلصات

### قيمة العقد

| | |
|---|---|
| قيمة العقد الأصلية (التقرير الأسبوعي) | 233,776,077 |
| قيمة العقد (العرض الأسبوعي، بدون الضريبة) | 233,575,734 |
| قيمة المشروع الحالية بعد وفر النطاق | 164,170,171 |
| قيمة الوفر الحالي | 69,405,562 |
| أوامر التغيير | 0 |

جميع القيم بالريال السعودي. تختلف قيمتا العقد بمقدار 200,343 ريال. يسجل العرض الأسبوعي تخفيض النطاق إلى 164.2 مليون ريال، ولا يوجد أمر تغيير مسجل لذلك.

### المستخلصات

| | |
|---|---|
| المستخلصات المقدمة / المعتمدة | 12 / 12 |
| القيمة الإجمالية المقدمة | 37,272,238 |
| الدفعة المقدمة (10%) | 23,377,608 |
| المحتجزات (10%) | 6,064,985 |
| المستخلصات المدفوعة | 4 · 15,540,346 |
| إجمالي المصروف حتى المستخلص 14 (العرض الأسبوعي) | 65,141,130 |
| أعمال منفذة لم تُصرف (العرض الأسبوعي) | 13,310,176 |

The weekly report counts invoices to the period ending 15-Jul-2026; the presentation counts disbursements to invoice 14 (September 2026), 27.9% of the contract value. Invoicing stays well below the 77.6% physical progress.

## الصحة والسلامة والجودة

### السلامة التقييم 0.84

| | |
|---|---|
| ساعات العمل الآمنة (تراكمي) | 1,573,676 |
| ساعات العمل هذا الأسبوع | 25,680 |
| إصابات مضيعة للوقت | 0 |
| الوفيات | 0 |
| حالات الإسعافات الأولية | 13 |
| حوادث وشيكة | 1 |
| أضرار المتلكات | 8 |
| التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية | 1,342 / 111 |

أسبوع فحص السلامة: 28 أكتوبر – 03 نوفمبر 2026. يصنف سجل المشكلات ضعف إجراءات الصحة والسلامة والبيئة بأنه حرج.

### الجودة التقييم 0.91

| | |
|---|---|
| طلبات استلام الأعمال: صادرة / مغلقة / مفتوحة | 6,367 / 6,299 / 68 |
| تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة | 53 / 52 |
| تعليمات الموقع: صادرة / مفتوحة | 90 / 3 |
| طلبات فحص المواد: صادرة / مفتوحة | 113 / 0 |
| المخططات التنفيذية المقدمة (من 1,698) | 1,687 |
| المخططات التنفيذية المعتمدة A / B | 306 / 1,368 |
| اعتمادات المواد A / B | 7 / 101 |

يوم فحص الجودة: 03-نوفمبر-2026.

## المشكلات والمخاطر القائمة

| المشكلة | المسؤول | التفاصيل |
|---|---|---|
| البحيرة 4 | المقاول | اعتمدت مدن المقترح. يبدأ العمل بعد الانتهاء من شبكة الصرف الصحي عند تقاطع شارع 25 مع شارع 9؛ الموعد المستهدف الجديد 14-نوفمبر-2026 (كان 30-سبتمبر-2026). |
| قطع شارع 25 | المقاول | قطع الأسفلت في شارع 25 لتركيب الشبكات المدفونة: انتهى تقاطع شارع 2 ويجري العمل في تقاطع شارع 9. تليه المرحلتان الأولى والثانية بعد موافقة إدارة المدينة على إنشاء تحويلة مرورية؛ المستهدف 15-نوفمبر-2026. |
| تصاريح الشارعين 25 و1 | الاستشاري / المالك | إصدار التصاريح معلّق في الشارعين 25 و1 والأعمال فيهما متوقفة. طُلبت التصاريح وقُدمت، بانتظار الموافقة. |
| البلوك F والشارع 9 | الاستشاري / المالك | الأعمال في البلوك F متوقفة منذ 06-أكتوبر-2026 حق إطلاق التيار للمصنع الصيني، والعمل في الشارع 9 بالمنطقة F ممنوع (إيقاف جزئي) رغم وجود تصريح معتمد. |
| مناهل الصرف الصحي والعبارة الصندوقية | الاستشاري / المالك | توجد 22 غرفة صرف صحي تتعارض وصلاتها مع العبارة الصندوقية لمياه السيول والأمطار وتعيق توصيل المواسير بالغرف. سيراجع الاستشاري مقترح المقاول ويبلغ المالك؛ المستهدف 05-نوفمبر-2026. |
| معدات محطات الضخ | المقاول | صُرفت دفعات المولدات وخزانات المطرقة المائية والمضخات وجاري التصنيع، وتم توريد مضختي صرف ومضخات مياه الحريق (المستهدف 30-نوفمبر-2026). وصدر أمر شراء صيانة مضخات المياه؛ المستهدف 15-نوفمبر-2026. |
| التداخل مع جهات أخرى | الاستشاري / المالك | هبوط البلاطة بسبب أعمال شركة وتكو والعيسى: عُقدت عدة اجتماعات دون استجابة من العيسى. وتتعارض بوابة مكاتب العيسى مع قاعدة عمود إنارة. |
| اختبارات الشبكات | المقاول | الاختبارات لازمة لتسليم شبكات متكاملة. قُدمت خطة الاختبارات والاختبارات جارية. |
| القوى العاملة والإنتاجية | المقاول | انخفاض القوى العاملة والمعدات وضعف إنتاجية طواقم المقاول (سجل مشكلات مدن، أولوية عالية). ويتم الحفر يدوياً لعدم وجود مخططات للخدمات القائمة. |

المخاطر القائمة في سجل مدن: تغيّر أولويات المدينة الصناعية بما يخفض النطاق (عالية)، وتأخر المشتريات بسبب مشاكل الشحن في المنطقة (عالية)، وتكرار إيقاف الأعمال بما يضعف الإنتاج اليومي (متوسطة)، والفروقات بين قيمة العقد الموقع والأعمال الفعلية (متوسطة).

## ملاحظات على البيانات

- تُقارن قيم هذا الأسبوع برفع 27-أكتوبر-2026 في المجلد W05. وقائمة الأعمال الرئيسية لهذا الأسبوع في ورقة Photos - Progress Summary مطابقة لقائمة الأسبوع الماضي، ولم تتغير كميات مواسير الشبكات في شريحة الشبكات بالعرض الأسبوعي.
- أسبوع التقرير هو الأسبوع التعاقدي الوارد في ورقة ("Current Contract Weeks: 76 of 104") Milestones، ويطابق (03-نوفمبر-2026 – 19-مايو-2025) ÷ 7. يحمل الملف الرقم التسلسلي 64 وهو ليس رقم الأسبوع.
- تواريخ البيانات: التقرير الأسبوعي 03-نوفمبر-2026، وتحديث P6 بتاريخ 31-أكتوبر-2026. وسجل التوريدات المرفوع هذا الأسبوع هو ملف 20-أكتوبر-2026 نفسه المرفوع الأسبوع الماضي.
- لا تزال صفوف التقدم الفعلي نفسها في ورقة Weekly Progress Report خاطئة: صف التنفيذ يُظهر 190.1% مخطط و207.2% منجز؛ والمنطقة 3 تُظهر 355,540 ساعة عمل منجزة (إجمالي المشروع كله) مقابل ميزانية 147,160؛ والطرق المحلية 998.7%؛ والاتصالات والطرق الشريانية 0% رغم أن مستخرج P6 يسجل 16,514 و287 ساعة عمل فعلية. استُخدمت قيم مستخرج P6 لهذه الصفوف.
- ميزانية ساعات العمل 458,486 في صف الإجمالي، لكنها 467,288 كمجموع للمناطق (467,280 في ورقة المنحنى).
- النسبة المخططة 96.6% حتى تاريخه لا تطابق أياً من منحني ورقة Physical-Chart Data (الأساسية 93.3% والمعدلة 95.9% لشهر نوفمبر). وآخر قيمة فعلية في الورقة مدرجة تحت يونيو 2026 لكنها تمثل الإجمالي حتى تاريخه (355,636 ساعة عمل) فتتغير كل أسبوع، والقيم الفعلية لمارس إلى مايو 2026 مطابقة للخطة المعدلة.
- الانتهاء: التقرير الأسبوعي 18-مايو-2027 مقابل P6 بتاريخ 27-أكتوبر-2027. ويُبقي تحديث P6 المعلمين 3 و4 (خطة العمل، اعتماد المخططات) دون بدء بتاريخي 31-أكتوبر-2026 و05-نوفمبر-2026، بينما يُظهرهما التقرير الأسبوعي والعرض مكتملين. وكان الجدول المرفوع الأسبوع الماضي ملفاً معدلاً مختلفاً من 136 نشاطاً.
- تعرض ورقة Target schedule وشرائح العرض 3 و4 و10 نسب تقدم مرجّحة بالقيمة (على أساس التكلفة) موصوفة بأنها فعلية أو منجزة، ولم تُستخدم هذه الأرقام في هذا التقرير.
- قيمة العقد 233,776,077 ريال في التقرير الأسبوعي و233,575,734 ريال في العرض الأسبوعي. المستخلصات دون تغيير: 37.3 مليون ريال (12 مستخلصاً) في التقرير الأسبوعي، و60.6 مليون ريال في سجل المستخلصات شاملاً الدفعة المقدمة، و65.1 مليون ريال مصروفة في العرض.
- القوى العاملة: لا تزال لوحة الملخص تُظهر 388 عاملاً و57 موظفاً (445)، بينما يُظهر الجدول الشهري والعرض الأسبوعي 332 عاملاً و66 موظفاً (398) لشهر نوفمبر.

- انخفض عدد المضخات الموّردة من 3 في عرض 27-أكتوبر إلى 2 في عرض 03-نوفمبر، بينما يذكر نص الحالة مضختين في الأسبوعين. وانخفض عدد تقارير عدم المطابقة المغلقة من 53 إلى 52، فيبدو أن أحدها أعيد فتحه.
- كميات النطاق: لا تزال شريحة نطاق التقدم معنونة "تحديث 15 سبتمبر" وتختلف إجماليات الاتصالات ومياه الشرب فيها عن شريحة الشبكات. وكمية الإنارة (53 من 54) بلا وحدة.
- حقل "Modon PM" في التقرير الأسبوعي فارغ، وأُخذ اسم مدير المشروع من سجل المخاطر والمشكلات لدى مدن.

---

أُعدّ في 05-نوفمبر-2026 من التقرير الأسبوعي المرفوع للأسبوع 76 (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026)، مع الأسبوع 75 (27-أكتوبر-2026) لحساب التغيرات الأسبوعية.
