شبكات البنية التحتية للمنطقة اللوجستية لمساحة 1 كم مربع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

Infrastructure Networks for the 1 km² Logistics Zone, 2nd Industrial City, Dammam

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة شبه الجزيرة للمقاولات	إيجيس (Egis)	محمد العيسى	30-Jul-2025	29-Jan-2027

النطاق: المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية. الشبكات الرطبة (الصرف الصحي، وتصريف السيول، ومياه الشرب، ومكافحة الحريق، والمياه المعالجة، بما فيها خط الضخ الرئيسي)، والشبكات الجافة (الجهد المتوسط، والجهد المنخفض، والإنارة، والاتصالات)، ومحطة ضخ مياه الشرب، ومحطة رفع الصرف الصحي، وغرف الحراسة، وجميع طبقات الطرق حتى الطبقة الإسفلتية السطحية، وتنسيق المواقع.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026 بلغ الإنجاز 62.1% مقابل 80.1% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 18.0% عن الخطة (مؤشر الأداء الزمني 0.78). وأنجز هذا الأسبوع 1.4% مقابل 4.1% مخططاً، فاتسعت الفجوة من 15.3% إلى 18.0%.

نسبة الإنجاز الفعلي
62.1% / 80.1% مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.78 −18.0%

التقدم هذا الأسبوع
1.4% / 4.1% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 2.7%

المدة المنقضية من العقد
84.1% · اليوم 461 من 548
▼ التسليم المتوقع 15-مارس-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
31.6% · 62.9 مليون ريال
7 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 15-سبتمبر-2026

مع انقضاء 84.1% من مدة العقد، يتبقى 37.9% من الأعمال.

يتطلب الإنهاء بحلول تاريخ انتهاء العقد 29-يناير-2027 نحو 3.2% أسبوعياً خلال الأسابيع الاثني عشر الكاملة المتبقية، مقابل 1.4% تحققت هذا الأسبوع. وتتوقع ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي وتحديث P6 الآن تسليم المشروع في 15-مارس-2027، أي بتأخير 45 يوماً، وبعد توقع الأسبوع الماضي بأسبوع آخر. والتنفيذ هو المرحلة الأضعف: 52.5% منجز مقابل 84.3% مخطط.


صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من الموقع مأخوذة من عرض التقدم بتاريخ 03-نوفمبر-2026، إذ لا تتضمن ملفات هذا الأسبوع صوراً منفصلة. وتحمل الصور ختم الكاميرا من 31 أكتوبر إلى 02 نوفمبر 2026 حيث يظهر الختم. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



رش الطبقة التأسيسية، الطريق 2

رش طبقة MC1 التأسيسية على طبقة الأساس. ختم الكاميرا 02-نوفمبر-2026، 08:45، الظهران.

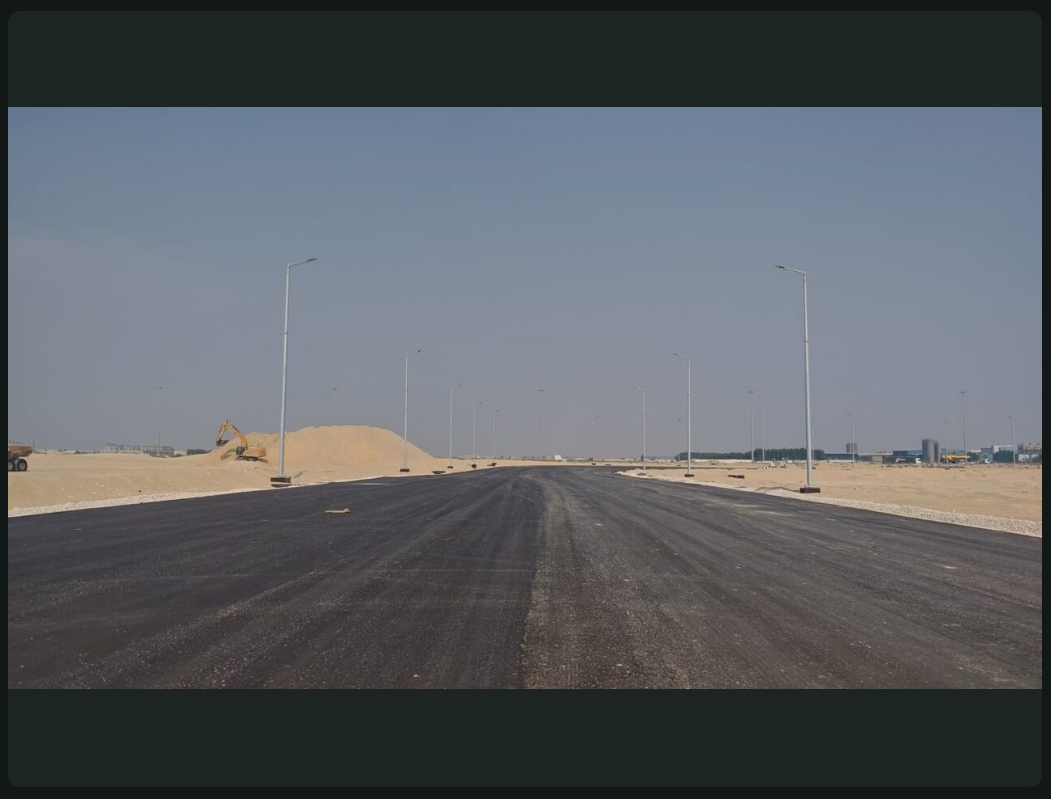

الأسفلت والإنارة، الطريق 2 المنطقة 4

أسفلت منفذ مع أعمدة إنارة مركّبة. لا يوجد ختم تاريخ.




عزل العبارة الصندوقية

أعمال العزل على جدار العبارة. ختم الكاميرا 01-نوفمبر-2026، 09:15.




تسليح الخزان

أعمال الحدادة لجدران الخزان. لا يوجد ختم تاريخ.

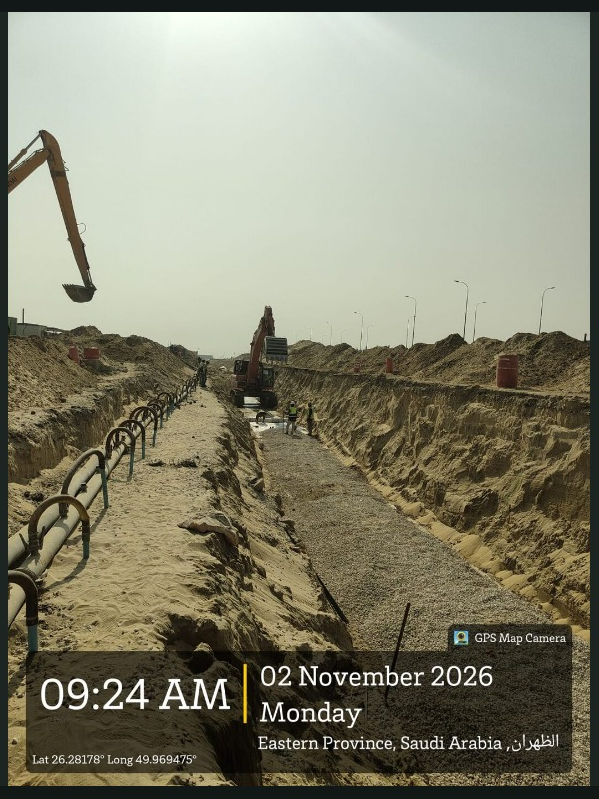

خندق مع طبقة الفرش

ختم الكاميرا 02-نوفمبر-2026، 09:24، الإحداثيات 26.28178° شمالاً، 49.969475° شرقاً.

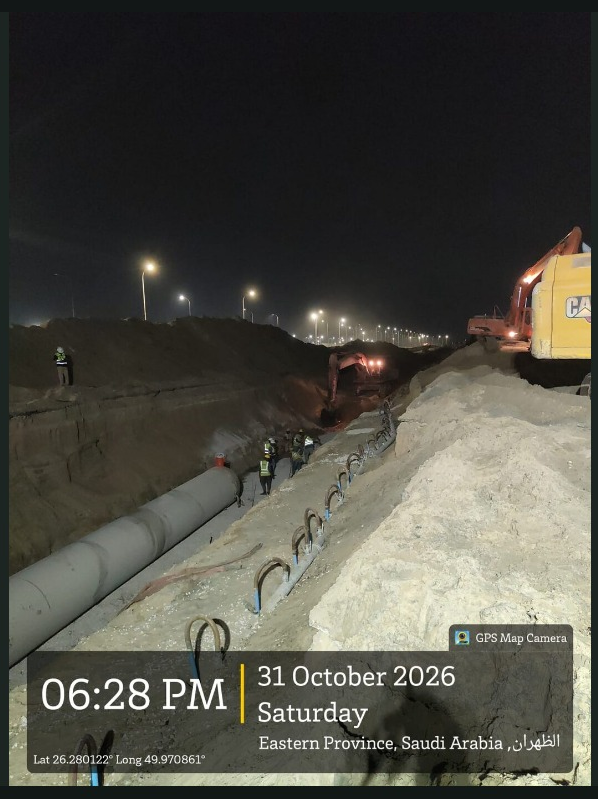


تمديد المواسير ليلاً

ختم الكاميرا 31-أكتوبر-2026، 18:28، الإحداثيات 26.280122° شمالاً، 49.970861° شرقاً.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) بقيم نهاية كل شهر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data. قيمة نوفمبر الفعلية هي قيمة 03 نوفمبر.

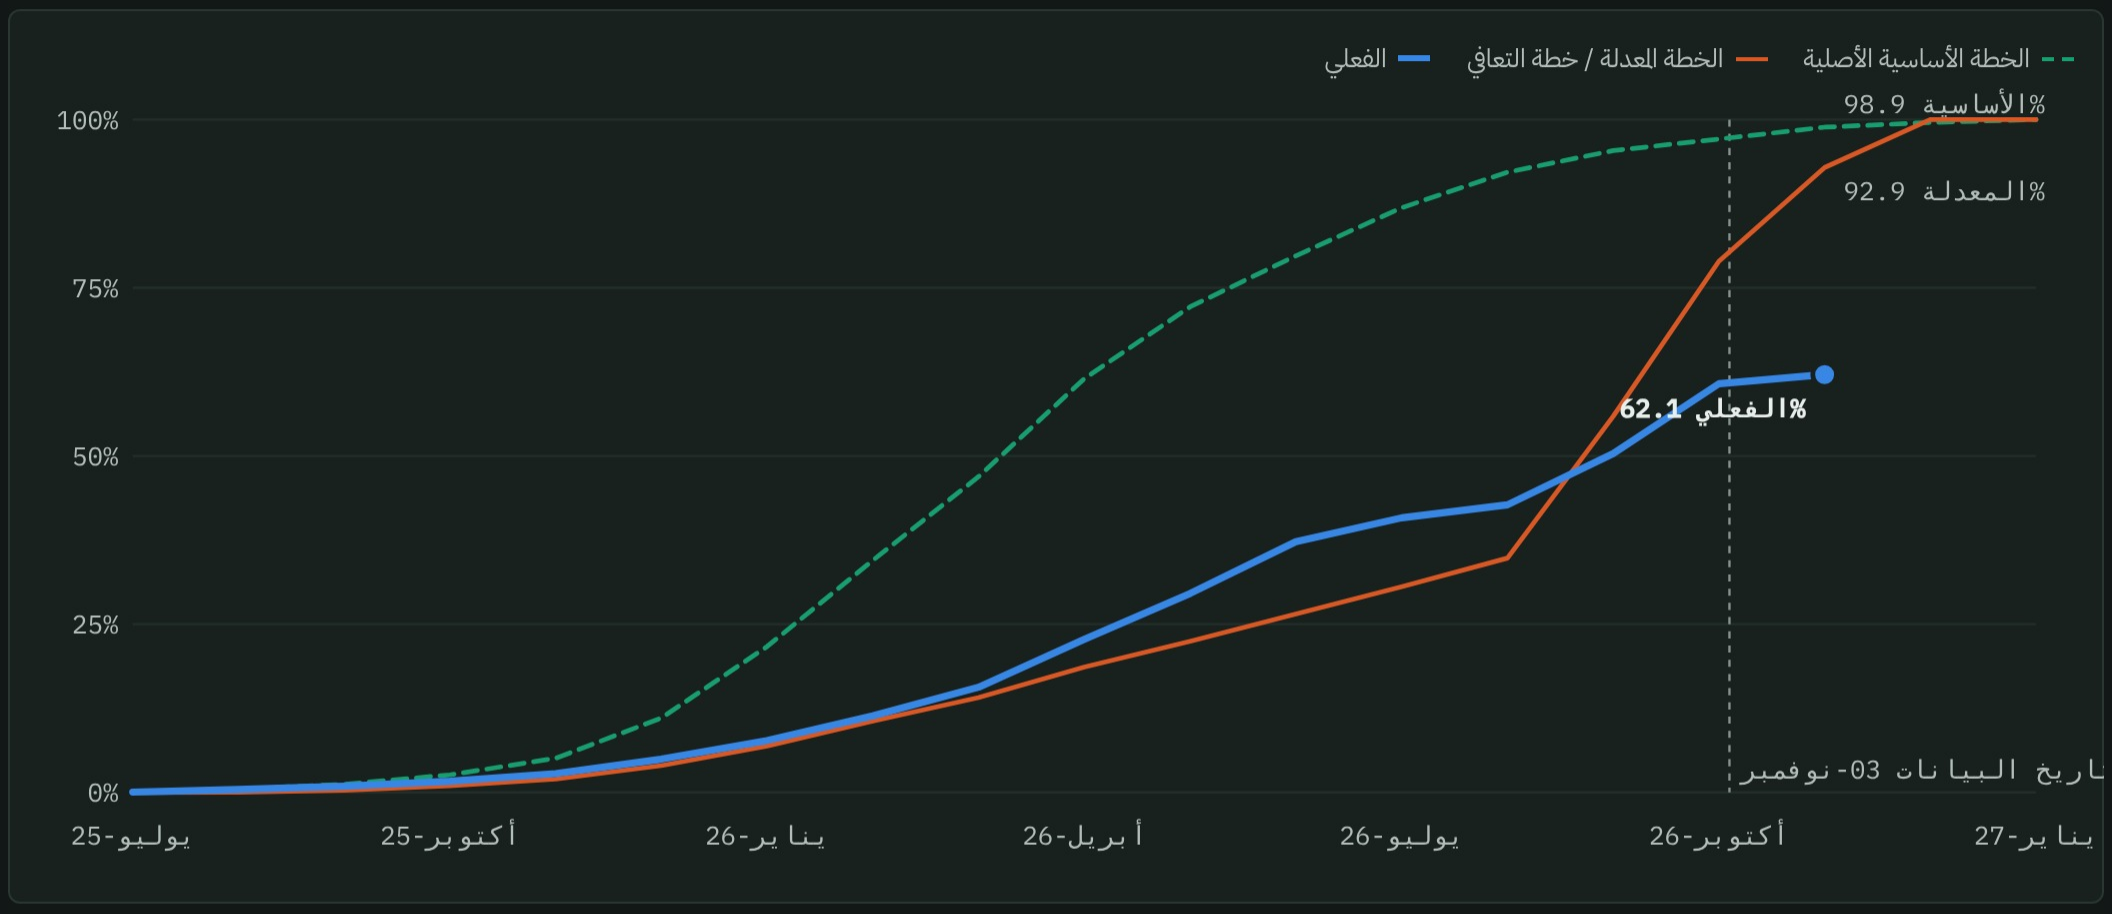

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
20-Oct-2026	71.1	57.9	−13.2	+2.1	0.81
27-Oct-2026	76.0	60.7	−15.3	+2.8	0.80
03-Nov-2026	**80.1**	**62.1**	**−18.0**	**+1.4**	**0.78**

القيم الأسبوعية من التقارير الأسبوعية بتاريخ 20 و27 أكتوبر و03 نوفمبر. ويعدّل تقرير هذا الأسبوع القيم الفعلية الشهرية السابقة مرة أخرى، وهذه المرة بالزيادة (سبتمبر 2026: 50.3% بعد أن كانت 48.9%). ويبلغ توقع المقاول 79.4% بنهاية ديسمبر و99.9% في يناير و100% في فبراير 2027.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب المرحلة، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة، مجموعاً لكل الشبكات من ورقة Progress.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الإزالة والأعمال الترابية	2.9%	100.0%	96.7%	-3.3	0.97	▼ متأخر قليلاً
التصميم الهندسي	3.0%	100.0%	97.3%	-2.7	0.97	▼ متأخر قليلاً
التوريدات	27.0%	96.5%	92.7%	-3.8	0.96	▼ متأخر قليلاً
التنفيذ	57.1%	84.3%	52.5%	-31.9	0.62	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	10.0%	0.0%	14.1%	+14.1	-	▲ بدأ مبكراً
الإجمالي	100%	**80.1%**	**62.1%**	**-18.0**	**0.78**	▼ متأخر

الشبكة / حزمة العمل	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الإزالة وتنظيف الموقع	0.4%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
الأعمال الترابية وتسوية الموقع	2.5%	100.0%	96.2%	-3.8	0.96	▼ متأخر قليلاً
شبكة الصرف الصحي	8.1%	86.6%	85.9%	-0.7	0.99	▼ متأخر قليلاً
شبكة تصريف السيول	15.6%	91.1%	87.5%	-3.6	0.96	▼ متأخر قليلاً
شبكة مياه الشرب	6.3%	82.1%	65.4%	-16.6	0.80	▼ متأخر
شبكة مكافحة الحريق	6.9%	77.8%	62.4%	-15.4	0.80	▼ متأخر
شبكة المياه المعالجة	5.2%	71.5%	45.2%	-26.3	0.63	▼ متأخر
محطة ضخ مياه الشرب	7.8%	83.9%	68.0%	-15.9	0.81	▼ متأخر
محطة رفع الصرف الصحي	7.7%	88.2%	70.3%	-17.9	0.80	▼ متأخر
شبكة الجهد المتوسط	3.7%	76.5%	48.4%	-28.1	0.63	▼ متأخر
شبكة الجهد المنخفض	3.4%	75.1%	35.5%	-39.7	0.47	▼ متأخر
شبكة الإنارة	8.3%	61.9%	41.0%	-20.9	0.66	▼ متأخر
شبكة الاتصالات	6.8%	73.5%	49.5%	-24.0	0.67	▼ متأخر
أعمال الطرق	8.7%	81.5%	35.1%	-46.4	0.43	▼ متأخر
تنسيق المواقع	4.9%	46.5%	31.6%	-14.9	0.68	▼ متأخر
غرف الحراسة	3.7%	94.3%	77.1%	-17.1	0.82	▼ متأخر
الإجمالي	100%	**80.1%**	**62.1%**	**-18.0**	**0.78**	▼ متأخر

الأوزان هي ساعات العمل المخططة. ولم تُكتسب هذا الأسبوع أي ساعات عمل في شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة والجهد المنخفض ومحطة الضخ وتنسيق المواقع. ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) عدد 4,851 نشاطاً: 2,700 مكتمل و496 قيد التنفيذ و1,655 لم يبدأ. وارتفعت الأنشطة المتأخرة عن موعد بدئها من 1,092 إلى 1,125.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 03-نوفمبر-2026. تعطي الورقة إجماليات الموقع كاملاً فقط، دون مناطق ودون أرقام الردم. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير منذ تقرير 27-أكتوبر-2026.

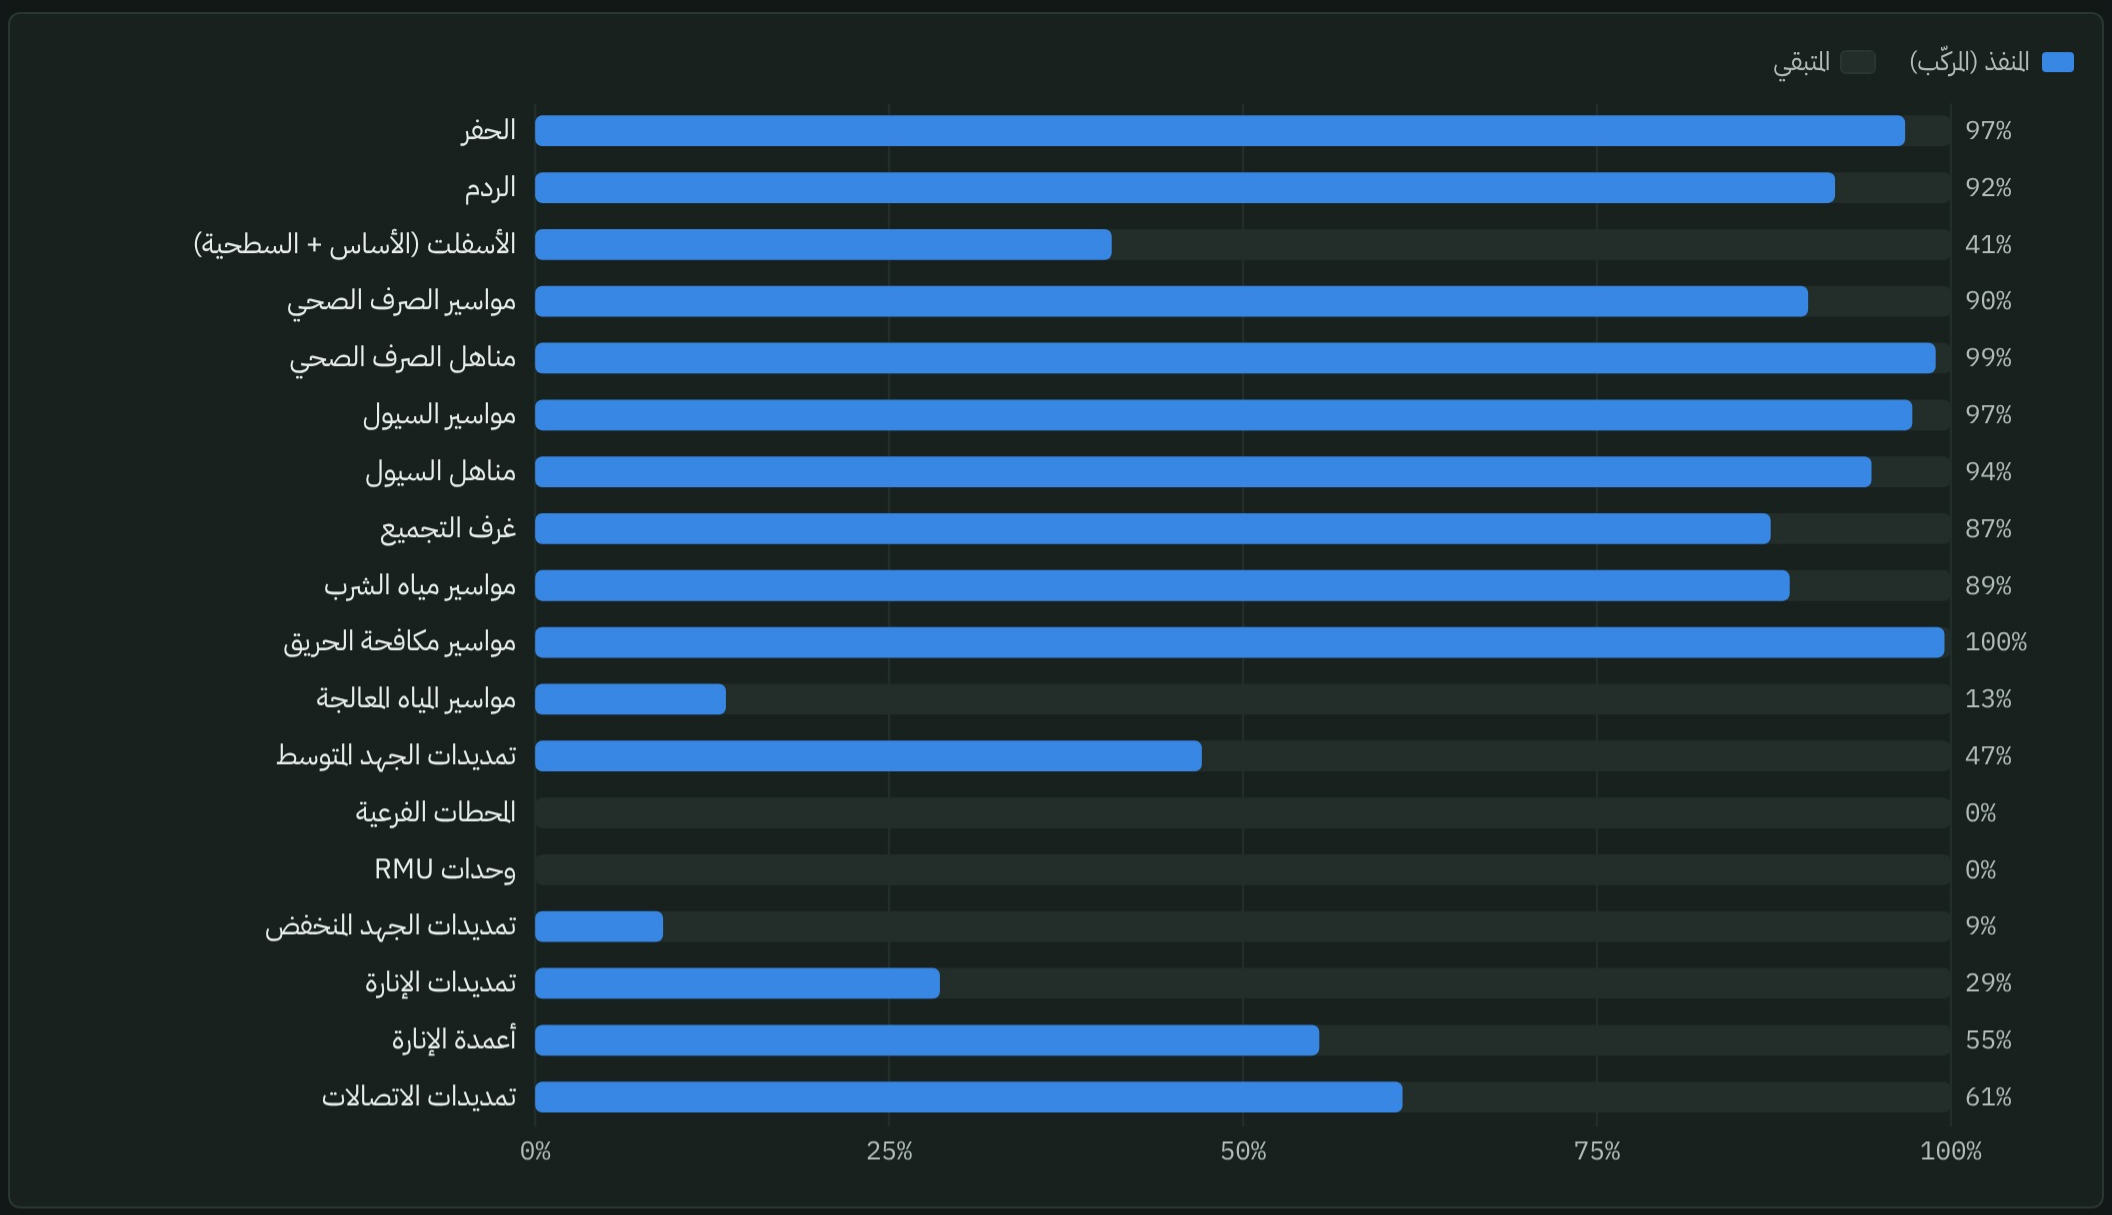

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر	الكل	م³	853,395	825,821	0	27,574	96.8%	–
الردم	الكل	م³	1,481,028	1,359,876	1,652+	121,152	91.8%	–
الأسفلت (الأساس + السطحية)	الكل	م³	64,334	26,201	109.5+	38,133	40.7%	–
مواسير الصرف الصحي	الكل	م.ط	7,567	6,804	0.9+	763	89.9%	–
مناهل الصرف الصحي	الكل	عدد	136	134.5	0.2+	1.5	98.9%	–
مواسير السيول	الكل	م.ط	14,821	14,418	309.4+	403.6	97.3%	–
مناهل السيول	الكل	عدد	160	151	2.9+	9	94.4%	–
غرف التجميع	الكل	عدد	338	295	3.7+	43	87.3%	–
مواسير مياه الشرب	الكل	م.ط	7,214	6,393	480.2+	821.2	88.6%	–
مواسير مكافحة الحريق	الكل	م.ط	6,355	6,326	197+	28.7	99.5%	–
مواسير المياه المعالجة	الكل	م.ط	57,419	7,737	0	49,682	13.5%	–
تمديدات الجهد المتوسط	الكل	م.ط	12,559	5,914	398.9+	6,645	47.1%	–
المحطات الفرعية	الكل	عدد	3	0	0	3	0.0%	–
وحدات RMU	الكل	عدد	3	0	0	3	0.0%	–
تمديدات الجهد المنخفض	الكل	م.ط	14,370	1,299	175.3+	13,071	9.0%	–
تمديدات الإنارة	الكل	م.ط	21,525	6,154	1,156+	15,371	28.6%	–
أعمدة الإنارة	الكل	عدد	565	312.9	19.9+	252.1	55.4%	–
تمديدات الاتصالات	الكل	م.ط	11,057	6,774	54.2+	4,283	61.3%	–

الشبكات الرطبة والإنارة الأكثر تقدماً

زادت مواسير مياه الشرب بمقدار 480 م.ط لتبلغ 88.6%، ومواسير السيول بمقدار 309 م.ط لتبلغ 97.3%، ومواسير مكافحة الحريق بمقدار 197 م.ط لتبلغ 99.6%. وزادت تمديدات الإنارة بمقدار 1,156 م.ط لتبلغ 28.6%، وتمديدات الجهد المتوسط بمقدار 399 م.ط لتبلغ 47.1%.

الأسفلت والمياه المعالجة والجهد المنخفض متأخرة كثيراً

الأسفلت المنفذ 26,201 م³ مقابل 57,161 م³ مخططاً حتى تاريخه (40.7% من الإجمالي)، ولم يُضف هذا الأسبوع سوى 109 م³. ولم تتقدم مواسير المياه المعالجة منذ أسبوعين (13.5%)، وتمديدات الجهد المنخفض عند 9.0%، ولم تزد تمديدات الاتصالات إلا 54 م.ط. ولم تُركّب أي من المحطات الفرعية الثلاث أو وحدات RMU الثلاث.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية والتوقع من ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي، وتواريخ P6 والفائض الكلي من تحديث P6 بتاريخ بيانات 03-نوفمبر-2026.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	30-Jul-2025	30-Jul-2025	30-Jul-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	30-Aug-2025	30-Aug-2025	25-Nov-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال الأعمال الترابية	15-Sep-2026	08-Sep-2026 (−7 أيام)	–	–	؟ تاريخ التوقع انقضى
اكتمال التقديمات وطلبات المواد طويلة الأجل	24-Sep-2026	07-Nov-2026 (+44 يوماً)	–	–	▼ متأخر
توريد جميع المعدات والمواد	03-Dec-2026	07-Nov-2026 (−26 يوماً)	–	–	؟ يتعارض مع التوريدات
جميع الشبكات الرطبة	22-Nov-2026	31-Dec-2026 (+39 يوماً)	31-Dec-2026	63	▼ متأخر
الأعمال الكهربائية	24-Nov-2026	21-Dec-2026 (+27 يوماً)	13-Jan-2027	53	▼ متأخر
محطة ضخ مياه الشرب	–	–	16-Dec-2026	26	● مجدول
محطة رفع الصرف الصحي	–	–	27-Dec-2026	42	● مجدول
أعمال الطرق والطبقة الإسفلتية السطحية	–	–	05-Jan-2027	5	▼ معرّض للتأخير
انتهاء التنفيذ	–	–	21-Jan-2027	10	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	14-Jan-2027	28-Feb-2027 (+45 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال إخلاء الموقع	25-Jan-2027	10-Mar-2027 (+44 يوماً)	–	–	▼ متأخر
تسليم المشروع	29-Jan-2027	15-Mar-2027 (+45 يوماً)	15-Mar-2027	0	▼ متأخر

يُنهي تحديث P6 المشروع في 15-مارس-2027، أي بعد تاريخ انتهاء العقد بـ45 يوماً.

تأخرت معظم معالم P6 سبعة أيام أخرى مع تقدم تاريخ البيانات، بينما أصبح انتهاء شبكة تصريف السيول أبكر (28-نوفمبر-2026 بعد أن كان 06-ديسمبر-2026) وبقي انتهاء شبكة مياه الشرب عند 05-ديسمبر-2026. ولا يتضمن الجدول قيداً للانتهاء عند تاريخ العقد، لذا يُقاس الفائض مقابل تاريخ انتهائه المتأخر. وللطبقة الإسفلتية السطحية فائض 5 أيام، ولانتهاء التنفيذ 10 أيام. وتوقعات أخرى في ملفات هذا الأسبوع: 28-فبراير-2027 (ورقة المعلومات العامة)، و20-ديسمبر-2026 (برنامج التعافي في عرض التقدم)، و30-نوفمبر-2026 (ورقة الأعمال القادمة).

توريد المواد الرئيسية

نسبة ما ورد إلى الموقع من كل مادة طويلة الأجل. المصدر: تحديث التوريدات الأسبوعي بتاريخ 03-نوفمبر-2026.
وحسب التخصص (ورقة Quality-Stat) وصلت إلى الموقع 114 من 160 مادة: المدني والطرق 61 من 82،
والكهرباء 22 من 30، والميكانيكا 31 من 48.



لا توريدات لمواد طويلة الأجل هذا الأسبوع


جميع الكميات الموّردة كما كانت في 27 أكتوبر. ولا تزال المحطات الفرعية الثلاث تحمل تاريخ 30-أكتوبر-2026 الذي انقضى، وتأجلت وحدات RMU الخمس إلى 15-نوفمبر-2026. وتأجلت مكثفات تحسين القدرة ومراكز التحكم في المحركات ولوحات التحكم المحلية ونظام PLC ومقاييس المنسوب والمحابس وخزانات التضاغط جميعها إلى 30-نوفمبر-2026.

تأجيل مواعيد اكتمال التوريد شهرين

أصبح الموعد المخطط لاكتمال التوريد 27-نوفمبر-2026 لمواد الكهرباء و28-نوفمبر-2026 لمواد الميكانيكا و09-ديسمبر-2026 لمواد المدني والطرق (بعد أن كان 27 و28 سبتمبر و09 نوفمبر 2026). ولم يُورَّد سوى 13 من 82 صنبور إطفاء حريق مقابل موعد 07-يوليو-2026. اعتماد المواد: 145 من 160 معتمدة، و3 قيد المراجعة.

القوى العاملة

عدد العاملين الشهري في الموقع (الموظفون والعمالة)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

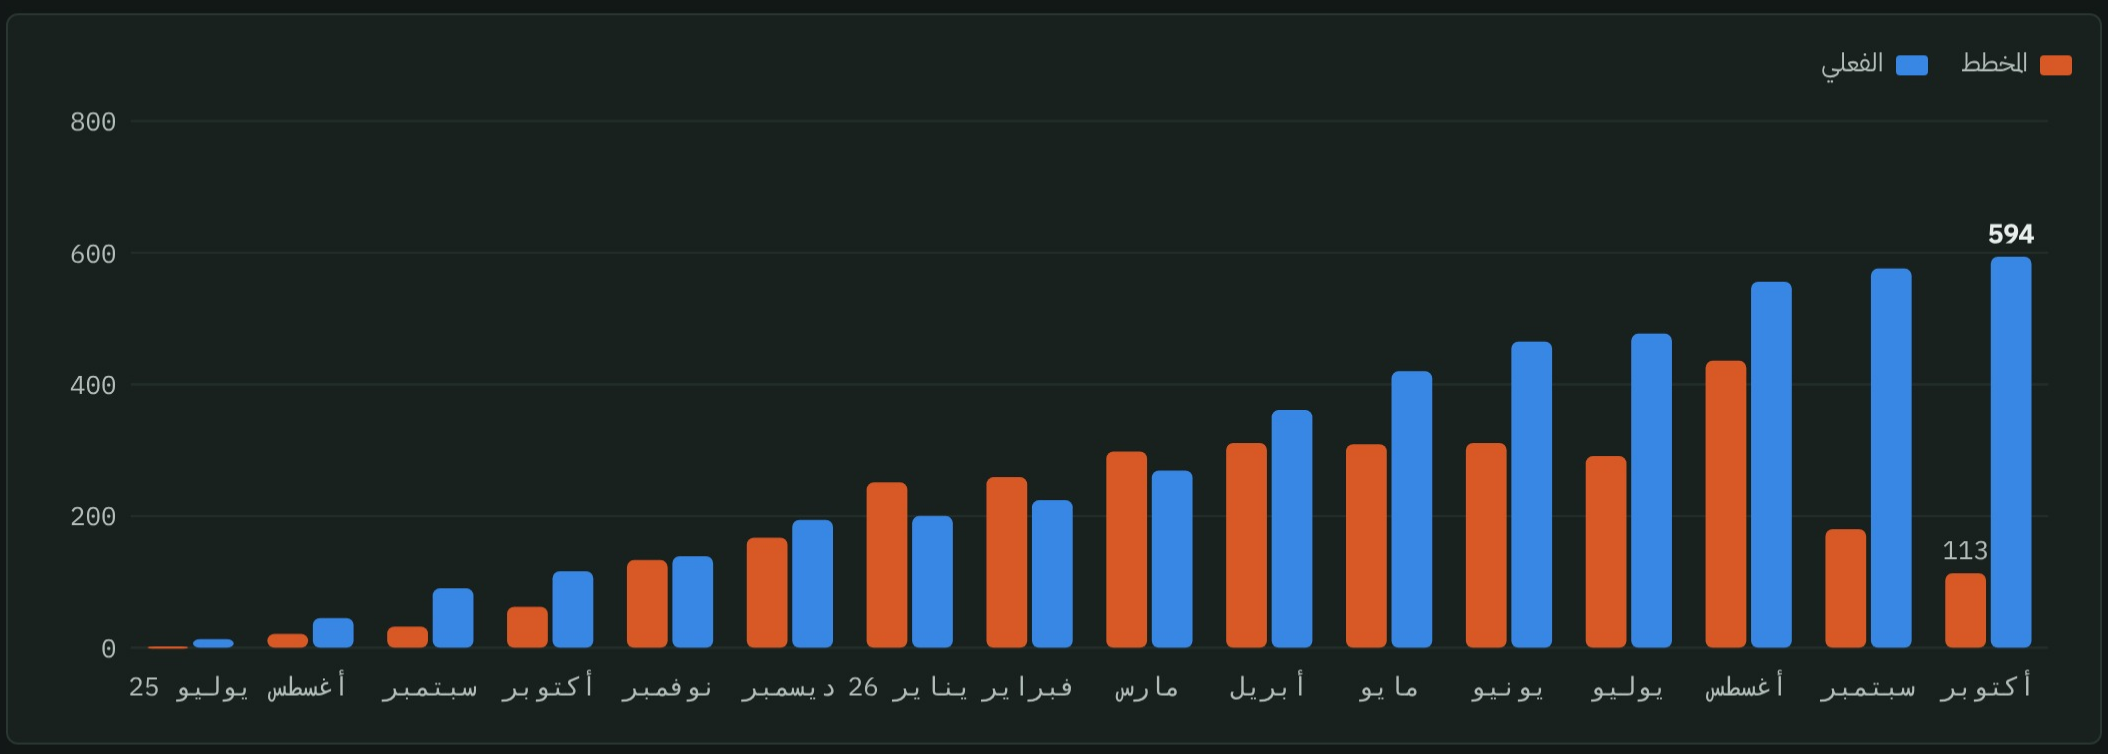

كان عدد العاملين في أكتوبر 594 (57 موظفاً و537 عاملاً) مقابل 113 مخططاً. ولم يُدخل العدد الفعلي لشهر نوفمبر في ورقة Manpower بعد (يظهر 0)، والمخطط لنوفمبر 113 وتوقع المقاول 584. ويذكر عرض التقدم وجود 537 عاملاً و330 معدة في الموقع.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	198,906,162.61
قيمة العقد المعدلة	198,906,162.61
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ والتغييرات المحتملة 0.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	7
القيمة الإجمالية	62,889,673.53
الخصومات والغرامات	−104,500
الصافي شاملاً الضريبة	72,218,624.56
معتمدة من الاستشاري	7
معتمدة من مدير المشروع - مدن / مدفوعة	0 / 0

المفوتر 31.6% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 62.1%. ولم يُقدَّم أي مستخلص جديد منذ الفترة المنتهية في 15-سبتمبر-2026. والمستخلصات السبعة جميعها معتمدة من الاستشاري، لكن لم يُسجَّل أي منها معتمداً من مدير المشروع في مدن أو مدفوعاً. يجب تأكيد حالة الدفع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.93

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	944,202
ساعات العمل هذا الأسبوع	34,740
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة (تراكمي)	148 (895)
اجتماعات التوعية (تراكمي)	57 (4,091)

تفتيش الاستشاري للسلامة بتاريخ 03-نوفمبر-2026. الأرقام بين الأقواس كما وردت في التقرير.

الجودة التقييم 0.93

طلبات الفحص: صادرة / مغلقة / معلقة	5,241 / 4,994 / 247
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	123 / 121 / 2
تعليمات الموقع: صادرة / مغلقة	52 / 42
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة	51 / 51
المخططات التنفيذية المعتمدة	1,774 من 1,774
المواد المعتمدة	145 من 160

تفتيش الاستشاري للجودة بتاريخ 03-نوفمبر-2026. أُضيف هذا الأسبوع 327 طلب فحص و3 طلبات فحص مواد، وأُغلق آخر تقرير عدم مطابقة مفتوح. ولا تزال الصفحة الأولى من التقرير تُظهر 4 تقارير عدم مطابقة صادرة و3 مغلقة.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
قلة عدد العمالة والمعدات وتوقف مقاول الباطن	المقاول	أُسند جزء من المشروع لمقاول آخر وتوفّر الشركة عمالة من لديها، ويذكر عرض التقدم وجود 537 عاملاً و306 معدات و24 مضخة نزح في الموقع. ويجب استمرار زيادة العمالة والمعدات لتحقيق مستهدفات مدن. مفتوحة منذ 01-أبريل-2026 (216 يوماً).
تأخر أعمال العبّارة بالطريق الشرياني	المقاول	تم صب أسقف 32 فاصلاً وحفر الفاصل الأخير، ولا يزال العمل بانتظار اعتماد الشركة السعودية للكهرباء لمقترح حماية الكابل القائم. مفتوحة منذ 01-يونيو-2026 (155 يوماً).
ضرورة الانتهاء من الشبكات قبل أعمال الطرق	أخرى	تم استبعاد مقاول الباطن يوناسكو وسحب اعتماده لعدم وفائه بمستهدفات مدن، ويعمل المقاول على الشبكات مباشرة، وقد انقضى موعده المستهدف لإنهائها في 19-سبتمبر-2026. مفتوحة منذ 01-يونيو-2026 (155 يوماً).

يتضمن سجل المخاطر البنود الثلاثة نفسها، وجميعها مفتوحة ومصنفة عالية الاحتمال وعالية الأثر بعد المعالجة.

ملاحظات على البيانات

- أسبوع التقرير: يذكر التقرير الأسبوعي "Current Contract Weeks: 66 of 78" (ورقة Milestones). ورقم التقرير التسلسلي (WPR048) ورقم تفتيش الاستشاري (48) ليسا رقم الأسبوع.
- قيم هذا الأسبوع ناتجة عن مقارنة هذا التقرير بتقرير 27-أكتوبر-2026 (مجلد الأسبوع السابق).
- أربعة توقعات مختلفة للانتهاء: 28-فبراير-2027 (ورقة المعلومات العامة، −30 يوماً)، و15-مارس-2027 (ورقة المعالم وتحديث P6، −45 يوماً)، و20-ديسمبر-2026 (برنامج التعافي في عرض التقدم)، و30-نوفمبر-2026 (ورقة الأعمال القادمة والتاريخ "المستهدف" في العرض).
- لا يتضمن تحديث P6 قيداً للانتهاء، لذا لا يظهر أي نشاط بفائض سالب رغم أنه ينتهي بعد تاريخ العقد. و319 نشاطاً قيد التنفيذ لها تواريخ انتهاء قبل تاريخ البيانات.
- تتغير القيم الفعلية الشهرية في ورقة Physical-Chart Data كل أسبوع: خُفضت في الأسبوع الماضي، ورُفعت هذا الأسبوع فوق قيمها السابقة (مايو 29.6%، ويوليو 40.8%، وسبتمبر 50.3%).
- تتعارض الكميات وساعات العمل: تضيف ورقة Major Quantities هذا الأسبوع 175 م.ط من تمديدات الجهد المنخفض، بينما لم تُكتسب أي ساعات عمل في شبكة الجهد المنخفض.
- لم يُدخل عدد العاملين لشهر نوفمبر في ورقة Manpower (0). ولشهر أكتوبر تُظهر الصفحة الأولى 360 عاملاً مخططاً و483 فعلياً، بينما تُظهر ورقة Manpower عدد 78 و537.
- التجهيز: يذكر التقرير الأسبوعي 30-أغسطس-2025 تاريخاً فعلياً، بينما يذكر معلم P6 "Mobilization - Finish" تاريخ 25-نوفمبر-2025.
- انقضى تاريخ توقع "اكتمال الأعمال الترابية" 08-سبتمبر-2026 ولا يزال مسجلاً كتوقع، والأعمال الترابية عند 96.2%. ويتعارض توقع "توريد جميع المواد" في 07-نوفمبر-2026 مع عدم وصول 46 من 160 مادة إلى الموقع.
- التوريدات: ارتفع عدد مواد المدني والطرق من 77 إلى 82 دون توضيح. ولا يزال سجل التوريدات في ملف التقرير غير صالح للاستخدام، ولا يزال إجمالي الصفحة الأولى يكرر صف الميكانيكا. ويذكر عرض التوريدات 5 وحدات RMU مقابل 3 في المواضع الأخرى، و377 عمود إنارة مورّداً مقابل 380 في شريحة الإنارة، و13 صنبور إطفاء حريق مقابل 12، كما انقضى تاريخ المحطات الفرعية 30-أكتوبر-2026 دون تحديث.
- تقارير عدم المطابقة: تُظهر الصفحة الأولى 4 صادرة و3 مغلقة، بينما تُظهر ورقة Quality-Stat عدد 51 صادرة و51 مغلقة.
- مواسير الصرف الصحي منفذة بنسبة 89.9% في ورقة Major Quantities، و110.7% في ورقة Conclusion (6,804 من 6,146 م.ط)، و100% في العرض (6,257 من 6,257 م.ط). ومواسير مكافحة الحريق 100.9% في ورقة Conclusion.

- انخفض العدد التراكمي لحضور اجتماعات التوعية من 9,091 إلى 4,091 بين التقريرين.
- قيمة العقد 198,906,162.61 في الصفحة الأولى و198,906,162.312 "شاملة الضريبة" في ورقة Conclusion. ويتضمن سجل المستخلصات قيماً شاردة (21,100,000 و20,900,000 و200,000)، وتُظهر خلية التكلفة المتوقعة عند الإنجاز #REF!.
- تواريخ التقديمات الرئيسية في فبراير–مارس 2024، أي قبل ترسية العقد في 30-يونيو-2025. وتتضمن ورقة الأعمال القادمة بيانات P6 من مشروع المدينة الصناعية بحائل - المرحلة الثانية، ويستخدم سجل المخاطر رقم المشروع DAM2-01-029 ويذكر المدينتين الصناعيتين الثالثة والسادسة.
- لا يزال نص المشكلة 1 في ملف التقرير يذكر 304 عمال و184 معدة، بينما يذكر العرض 537 عاملاً و306 معدات.
- تعرض الصفحة الأولى من ملف التقرير والعرض تقدماً مبنياً على القيمة المالية أيضاً، ويعتمد هذا التقرير على التقدم الفعلي فقط.
